

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO: 104/2026					
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M.Nº 04						ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 01/07/2026 A 19/07/2026						DATA: 30/07/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
02	CANTEIRO - MARCO "JOÃO DE DEUS SOUSA"								67.160,56	30.891,35	7.825,32	38.716,67	28.443,89	57,65	
02.02	PAVIMENTAÇÃO								12.881,07	9.253,77	3.627,30	12.881,07	0,00	100,00	
02.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	95,00	95,00		95,00	0,00	41,29	3.922,55	3.922,55	-	3.922,55	0,00	100,00	
02.02.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	87,81	87,81		87,81	0,00	49,95	4.386,11	4.386,11	-	4.386,11	0,00	100,00	
02.02.003	Lona plástica preta	m2	87,81	87,81		87,81	0,00	7,05	619,06	619,06	-	619,06	0,00	100,00	
02.02.004	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	23,22		23,22	23,22	0,00	120,11	2.788,95	-	2.788,95	2.788,95	0,00	100,00	
02.02.005	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,3975		1,3975	1,3975	0,0000	599,89	838,35	-	838,35	838,35	0,00	100,00	
02.02.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,85	2,85		2,85	0,00	52,73	150,28	150,28	-	150,28	0,00	100,00	
02.02.007	Regularização Manual	m2	14,25	14,25		14,25	0,00	5,28	75,24	75,24	-	75,24	0,00	100,00	
02.02.008	Colchão de areia	m3	0,71	0,71		0,71	0,00	141,59	100,53	100,53	-	100,53	0,00	100,00	
02.03	VOLUMETRIAS EM CONCRETO ARMADO								24.467,92	-	-	-	24.467,92	-	
02.03.001	TIPO 1 (3X)								10.114,07	-	-	-	10.114,07	-	
02.03.001.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,78			0,00	1,78	2.936,04	5.226,15	-	-	-	5.226,15	-	
02.03.001.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,91			0,00	23,91	45,39	1.085,27	-	-	-	1.085,27	-	
02.03.001.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	23,91			0,00	23,91	23,94	572,41	-	-	-	572,41	-	
02.03.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,91			0,00	23,91	135,10	3.230,24	-	-	-	3.230,24	-	
02.03.002	TIPO 2 (3X)								10.627,69	-	-	-	10.627,69	-	
02.03.002.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,98			0,00	1,98	2.936,04	5.813,36	-	-	-	5.813,36	-	
02.03.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,55			0,00	23,55	45,39	1.068,93	-	-	-	1.068,93	-	
02.03.002.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	23,55			0,00	23,55	23,94	563,79	-	-	-	563,79	-	
02.03.002.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,55			0,00	23,55	135,10	3.181,61	-	-	-	3.181,61	-	
02.02.003	TIPO 3 (1X)								3.726,16	-	-	-	3.726,16	-	
02.02.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,71			0,00	0,71	2.936,04	2.084,59	-	-	-	2.084,59	-	
02.02.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,03			0,00	8,03	45,39	364,48	-	-	-	364,48	-	
02.02.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	8,03			0,00	8,03	23,94	192,24	-	-	-	192,24	-	
02.02.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	8,03			0,00	8,03	135,10	1.084,85	-	-	-	1.084,85	-	
02.04	MARCO "AV. JOAO DE DEUS SOUZA"								11.113,14	5.510,69	4.198,02	9.708,71	1.404,43	87,36	

SEM EFEITO
 R. 100, 2026, 07/04/2026
 E. 100, 2026, 07/04/2026
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 270936244

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO					BOLETIM DE MEDIÇÃO							CONTRATO: 104/2026		
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					B.M.Nº 04							ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					Período: 01/07/2026 A 19/07/2026							DATA: 30/07/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.04.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	18,23	18,23		18,23	0,00	120,18	2.190,88	2.190,88	-	2.190,88	0,00	100,00
02.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,46	36,46		36,46	0,00	45,39	1.654,92	1.654,92	-	1.654,92	0,00	100,00
02.04.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	36,46	36,46		36,46	0,00	23,94	872,85	872,85	-	872,85	0,00	100,00
02.04.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev 04	m³	2,88	2,88		2,88	0,00	173,82	500,60	500,60	-	500,60	0,00	100,00
02.04.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	3,60	3,60		3,60	0,00	1,21	4,36	4,36	-	4,36	0,00	100,00
02.04.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	64,82	64,82		64,82	0,00	1,07	69,36	69,36	-	69,36	0,00	100,00
02.04.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,31	0,31		0,31	0,00	702,31	217,72	217,72	-	217,72	0,00	100,00
02.04.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	24,40		24,40	24,40	0,00	172,05	4.198,02	-	4.198,02	4.198,02	-	100,00
02.04.009	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	2,25			0,00	2,25	624,19	1.404,43	-	-	-	1.404,43	-
02.05	MARCO "BUSTO JOAO DE DEUS SOUZA"								3.281,99	2.826,27	-	2.826,27	455,72	86,11
02.05.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	4,00	4,00		4,00	0,00	120,18	480,72	480,72	-	480,72	0,00	100,00
02.05.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,00	8,00		8,00	0,00	45,39	363,12	363,12	-	363,12	0,00	100,00
02.05.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	8,00	8,00		8,00	0,00	23,94	191,52	191,52	-	191,52	0,00	100,00
02.05.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev 04	m³	8,03	8,03		8,03	0,00	173,82	1.395,77	1.395,77	-	1.395,77	0,00	100,00
02.05.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	10,04	10,04		10,04	0,00	1,21	12,15	12,15	-	12,15	0,00	100,00
02.05.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	180,72	180,72		180,72	0,00	1,07	193,37	193,37	-	193,37	0,00	100,00
02.05.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,27	0,27		0,27	0,00	702,31	189,62	189,62	-	189,62	0,00	100,00
02.05.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	9,35			0,00	9,35	48,74	455,72	-	-	-	455,72	-
02.06	DIVERSOS								15.415,84	13.300,63	-	13.300,63	2.115,21	86,28
02.06.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	430,62	430,62		430,62	0,00	24,05	10.356,41	10.356,41	-	10.356,41	-	100,00
02.06.002	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af_05/2021	m2	18,64			0,00	18,64	18,56	345,96	-	-	-	345,96	-
02.06.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	13,50	13,50		13,50	0,00	218,09	2.944,22	2.944,22	-	2.944,22	0,00	100,00
02.06.004	Limpeza geral	m2	603,84			0,00	603,84	2,93	1.769,25	-	-	-	1.769,25	-
03	ROTATÓRIA 1								238.713,80	140.296,36	8.531,64	148.828,00	89.885,82	62,35
03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								46.902,60	46.902,60	-	46.902,60	0,00	100,00
03.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	118,72	118,72		118,72	0,00	2,41	286,12	286,12	-	286,12	0,00	100,00
03.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	118,72	118,72		118,72	0,00	1,14	135,34	135,34	-	135,34	0,00	100,00
03.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	786,35	786,35		786,35	0,00	14,82	11.653,71	11.653,71	-	11.653,71	0,00	100,00

SEM EFEITO
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 2/11

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 270936244

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO					BOLETIM DE MEDIÇÃO							CONTRATO: 104/2026		
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					B.M.Nº 04							ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					Período: 01/07/2026 A 19/07/2026							DATA: 30/07/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	14.154,30	14.154,30		14.154,30	0,00	1,07	15.145,10	15.145,10	-	15.145,10	0,00	100,00
03.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	786,35	786,35		786,35	0,00	25,03	19.682,34	19.682,34	-	19.682,34	0,00	100,00
03.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	-			0,00	0,00	0,63	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!
03.002	PAVIMENTAÇÃO								104.752,95	66.414,71	7.770,32	74.185,03	30.567,92	70,82
03.002.001	Lona plástica preta	m2	632,44	632,44		632,44	0,00	7,05	4.458,70	4.458,70	-	4.458,70	0,00	100,00
03.002.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	632,44	632,44		632,44	0,00	49,95	31.590,38	31.590,38	-	31.590,38	0,00	100,00
03.002.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	188,74			0,00	188,74	18,56	3.503,01	-	-	-	3.503,01	-
03.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	91,71	91,71		91,71	0,00	111,19	10.197,23	10.197,23	-	10.197,23	0,00	100,00
03.002.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	426,30	426,30		426,30	0,00	41,29	17.601,93	17.601,93	-	17.601,93	0,00	100,00
03.002.006	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1.8362	1.8362		1.8362	0,00	599,89	1.101,52	1.101,52	-	1.101,52	0,00	100,00
03.002.007	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	34,78			0,00	34,78	120,11	4.177,43	-	-	-	4.177,43	-
03.002.008	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	164,11		75,44	75,44	88,67	103,00	16.903,33	-	7.770,32	7.770,32	9.133,01	45,97
03.002.009	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	135,86			0,00	135,86	101,24	13.754,47	-	-	-	13.754,47	-
03.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,79	12,79		12,79	0,00	52,73	674,36	674,36	-	674,36	0,00	100,00
03.002.011	Regularização Manual	m2	63,945	63,945		63,945	0,00	5,28	337,89	337,89	-	337,89	0,00	100,00
03.002.012	Colchão de areia	m3	3,19725	3,19725		3,19725	0,00	141,59	452,70	452,70	-	452,70	0,00	100,00
03.003	VOLUMETRIA EM CONCRETO ARMADO								12.453,32	-	-	-	12.453,32	-
03.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,76			0,00	1,76	2.936,04	5.167,43	-	-	-	5.167,43	-
03.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	35,64			0,00	35,64	45,39	1.617,70	-	-	-	1.617,70	-
03.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	35,64			0,00	35,64	23,94	853,22	-	-	-	853,22	-
03.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	35,64			0,00	35,64	135,10	4.814,96	-	-	-	4.814,96	-
03.004	MARCO "SIMBOLO ITABAIANA"								18.881,80	8.909,25	-	8.909,25	9.972,55	47,18
03.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	16,10	16,10		16,10	0,00	120,18	1.934,90	1.934,90	-	1.934,90	0,00	100,00
03.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	32,20	32,20		32,20	0,00	45,39	1.461,56	1.461,56	-	1.461,56	0,00	100,00
03.004.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	32,20	32,20		32,20	0,00	23,94	770,87	770,87	-	770,87	0,00	100,00
03.004.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev 04	m³	16,56	16,56		16,56	0,00	173,82	2.878,46	2.878,46	-	2.878,46	0,00	100,00

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng. Civil - CREA/SE 270936/244
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

3/11

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Eng. Civil - CREA/SE 270936/244

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO					BOLETIM DE MEDIÇÃO								CONTRATO: 104/2026		
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					B.M.Nº 04								ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					Período: 01/07/2026 A 19/07/2026								DATA: 30/07/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						
			Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido	
03.004.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	20,70	20,70		20,70	0,00	1,21	25,05	25,05	-	25,05	0,00	100,00	
03.004.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	372,60	372,60		372,60	0,00	1,07	398,68	398,68	-	398,68	0,00	100,00	
03.004.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,05	2,05		2,05	0,00	702,31	1.439,74	1.439,74	-	1.439,74	0,00	100,00	
03.004.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	41,10			0,00	41,10	18,56	762,82	-	-	-	762,82	-	
03.004.009	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	16,10			0,00	16,10	135,10	2.175,11	-	-	-	2.175,11	-	
03.004.010	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	11,27			0,00	11,27	624,19	7.034,62	-	-	-	7.034,62	-	
03.005	CANTEIRO "PERGOLADOS"								29.733,78	775,85	-	775,85	28.957,93	2,61	
03.005.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina	m2	24,94			0,00	24,94	110,95	2.767,09	-	-	-	2.767,09	-	
03.005.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina	m2	25,82			0,00	25,82	103,00	2.659,46	-	-	-	2.659,46	-	
03.005.003	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	32,26	32,26		32,26	0,00	24,05	775,85	775,85	-	775,85	-	100,00	
03.005.004	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af. 11/2021	m2	56,57			0,00	56,57	328,07	18.558,92	-	-	-	18.558,92	-	
03.005.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	22,80			0,00	22,80	218,09	4.972,45	-	-	-	4.972,45	-	
03.006	DIVERSOS								25.989,35	17.293,94	761,32	18.055,26	7.934,09	69,47	
03.006.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	420,83	420,83		420,83	0,00	24,05	10.120,96	10.120,96	-	10.120,96	0,00	100,00	
03.006.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	32,89	32,89		32,89	0,00	218,09	7.172,98	7.172,98	-	7.172,98	0,00	100,00	
03.006.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00		2,00	2,00	0,00	380,66	761,32	-	761,32	761,32	-	100,00	
03.006.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00			0,00	3,00	410,89	1.232,67	-	-	-	1.232,67	-	
03.006.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	112,79			0,00	112,79	18,56	2.093,38	-	-	-	2.093,38	-	
03.006.006	Limpeza geral	m2	1.572,71			0,00	1.572,71	2,93	4.608,04	-	-	-	4.608,04	-	
04	ROTATÓRIA 2								291.942,62	158.589,80	38.513,34	197.103,15	94.839,48	67,51	
04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								58.031,25	58.031,25	-	58.031,25	0,00	100,00	
04.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75	981,75		981,75	0,00	14,82	14.549,54	14.549,54	-	14.549,54	0,00	100,00	
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50	17.671,50		17.671,50	0,00	1,07	18.908,51	18.908,51	-	18.908,51	0,00	100,00	
04.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75	981,75		981,75	0,00	25,03	24.573,20	24.573,20	-	24.573,20	0,00	100,00	
04.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								134.150,94	66.198,31	35.781,38	101.979,69	32.171,25	76,02	
04.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	421,90	421,90		421,90	0,00	41,29	17.420,25	17.420,25	-	17.420,25	0,00	100,00	
04.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1.561,4	1.561,4		1.561,4	0,00	599,89	936,67	936,67	-	936,67	0,00	100,00	

Rita Milene S. Rodrigues Araújo
 Engª Civil - CREA/SE 270936-4/11
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 270936-4/11

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO						BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO: 104/2026		
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						B.M.Nº 04						ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						Período: 01/07/2026 A 19/07/2026						DATA: 30/07/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04.002.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	105,00	105,00		105,00	0,00	14,82	1.556,10	1.556,10	-	1.556,10	0,00	100,00
04.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.890,00	1.890,00		1.890,00	0,00	1,07	2.022,30	2.022,30	-	2.022,30	0,00	100,00
04.002.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	105,00	105,00		105,00	0,00	25,03	2.628,15	2.628,15	-	2.628,15	0,00	100,00
04.002.006	Lona plastica preta	m2	957,60	705,00		705,00	252,60	7,05	6.751,08	4.970,25	-	4.970,25	1.780,83	73,62
04.002.007	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	957,60	705,00		705,00	252,60	49,95	47.832,12	35.214,75	-	35.214,75	12.617,37	73,62
04.002.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af_05/2021	m2	957,60			0,00	957,60	18,56	17.773,06	-	-	-	17.773,06	-
04.002.009	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina	m2	322,50		322,50	322,50	0,00	110,95	35.781,38	-	35.781,38	35.781,38	0,00	100,00
04.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,66	12,66		12,66	0,00	52,73	667,40	667,40		667,40	0,00	100,00
04.002.011	Regularização Manual	m2	63,285	63,29		63,285	0,00	5,28	334,40	334,40	-	334,40	0,00	100,00
04.002.012	Colchão de areia	m3	3,1642	3,16		3,1642	0,00	141,59	448,03	448,03	-	448,03	0,00	100,00
04.003	ALVENARIA DE PEDRA								16.971,42	8.695,27	1.970,64	10.665,91	6.305,51	62,85
04.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,04	7,04		7,04	0,00	64,72	455,63	455,62	-	455,62	0,01	100,00
04.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	8,40	8,40		8,40	0,00	12,91	108,44	108,44	-	108,44	0,00	100,00
04.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	30,40	30,40		30,40	0,00	1,07	32,53	32,52	-	32,52	0,01	99,96
04.003.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	19,47	12,73		12,73	6,74	636,19	12.386,62	8.098,69	-	8.098,69	4.287,93	65,38
04.003.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	39,10		39,10	39,10	0,00	8,12	317,49	-	317,49	317,49	0,00	100,00
04.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	39,10		39,10	39,10	0,00	42,28	1.653,15	-	1.653,15	1.653,15	0,00	100,00
04.003.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	39,10			0,00	39,10	51,60	2.017,56	-	-	-	2.017,56	-
04.004	ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO								40.820,51	-	-	-	40.820,51	-
04.004.001	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	36,72			0,00	36,72	23,94	879,08	-	-	-	879,08	-
04.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,72			0,00	36,72	45,39	1.666,72	-	-	-	1.666,72	-
04.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	36,72			0,00	36,72	135,10	4.960,87	-	-	-	4.960,87	-
04.004.004	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,54			0,00	3,54	2.936,04	10.393,58	-	-	-	10.393,58	-
04.004.005	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	36,72			0,00	36,72	624,19	22.920,26	-	-	-	22.920,26	-

SEM EFEITO
 Rizeleide S. M. de Jesus
 Eng. Civil - CREA/SE 3224
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

5/11

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Eng. Civil - CREA/SE 270936244

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO							BOLETIM DE MEDIÇÃO							CONTRATO: 104/2026		
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							B.M.Nº 04							ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Período: 01/07/2026 A 19/07/2026							DATA: 30/07/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido		
			Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
04.005	DIVERSOS															
04.005.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	608,30	608,30		608,30	0,00	24,05	41.960,49	25.664,97	761,32	26.426,29	15.534,20	0,01	62,98	
04.005.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	73,10	50,60		50,60	22,50	218,09	15.942,38	11.035,35	-	11.035,35	4.907,03		69,22	
04.005.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00		2,00	2,00	0,00	380,66	761,32	-	761,32	761,32	-		100,00	
04.005.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00			0,00	4,00	410,89	1.643,56	-	-	-	1.643,56		-	
04.005.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	174,06			0,00	174,06	18,56	3.230,55	-	-	-	3.230,55		-	
04.005.006	Limpeza geral	m2	1.963,50			0,00	1.963,50	2,93	5.753,06	-	-	-	5.753,06		-	
05	RÓTULA 3								298.464,70	130.150,01	52.998,80	183.148,81	115.315,89		61,36	
05.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								58.031,25	58.031,25	-	58.031,25	0,00		100,00	
05.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75	981,75		981,75	0,00	14,82	14.549,54	14.549,54	-	14.549,54	0,00		100,00	
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50	17.671,50		17.671,50	0,00	1,07	18.908,51	18.908,51	-	18.908,51	0,00		100,00	
05.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75	981,75		981,75	0,00	25,03	24.573,20	24.573,20	-	24.573,20	0,00		100,00	
05.002	PAVIMENTAÇÃO								130.157,85	54.254,79	52.237,48	106.492,27	23.665,58		81,82	
05.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	161,25	161,25		161,25	0,00	41,29	6.658,01	6.658,01	-	6.658,01	0,00		100,00	
05.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1.4515	1.4515		1.4515	0,00	599,89	870,74	870,74	-	870,74	0,00		100,00	
05.002.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	114,06	114,06		114,06	0,00	14,82	1.690,37	1.690,37	-	1.690,37	0,00		100,00	
05.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	171,09	171,09		171,09	0,00	1,07	183,07	183,07	-	183,07	0,00		100,00	
05.002.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	114,06	114,06		114,06	0,00	25,03	2.854,92	2.854,92	-	2.854,92	0,00		100,00	
05.002.006	Lona plástica preta	m2	858,61	723,00		723,00	135,61	7,05	6.053,20	5.097,15	-	5.097,15	956,05		84,21	
05.002.007	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	858,61	723,00		723,00	135,61	49,95	42.687,57	36.113,85	-	36.113,85	6.773,72		84,21	
05.002.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	858,61			0,00	858,61	18,56	15.935,80	-	-	-	15.935,80		-	
05.002.009	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina	m2	470,82		470,82	470,82	0,00	110,95	52.237,48	-	52.237,48	52.237,48	0,00		100,00	
05.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4.8375	4.8375		4.8375	0,00	52,73	255,08	255,08	-	255,08	0,00		100,00	
05.002.011	Regularização Manual	m2	24.1875	24.1875		24.1875	0,00	5,28	127,81	127,81	-	127,81	0,00		100,00	
05.002.012	Colchão de areia	m3	2.8519	2.8519		2.8519	0,00	141,59	403,80	403,80	-	403,80	0,00		100,00	
05.003	ALVENARIA DE PEDRA E BLOCO CERÂMICO								22.394,77	-	-	-	22.394,77		-	
05.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,00			0,00	15,00	64,72	970,80	-	-	-	970,80		-	
05.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00			0,00	18,00	1,21	21,78	-	-	-	21,78		-	
05.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00			0,00	54,00	1,07	57,78	-	-	-	57,78		-	

SEM EFEITO
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Coordenadora de Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Frore
 Engº Civil - CREA/SE 270936244

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Nucleo

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO						BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO: 104/2026			
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						B.M.Nº 04						ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						Período: 01/07/2026 A 19/07/2026						DATA: 30/07/2026			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
05.003.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	15,00			0,00	15,00	636,19	9.542,85	-	-	-	9.542,85	-	
05.003.005	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	43,64			0,00	43,64	80,17	3.498,62	-	-	-	3.498,62	-	
05.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	87,28			0,00	87,28	45,39	3.961,64	-	-	-	3.961,64	-	
05.003.007	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev.02_04/2022	m2	87,28			0,00	87,28	23,94	2.089,48	-	-	-	2.089,48	-	
05.003.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev.03	m2	43,64			0,00	43,64	51,60	2.251,82	-	-	-	2.251,82	-	
05.004	ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO								28.682,63	-	-	-	28.682,63	-	
05.004.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	64,33			0,00	64,33	45,39	2.919,94	-	-	-	2.919,94	-	
05.004.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev.02_04/2022	m2	64,33			0,00	64,33	23,94	1.540,06	-	-	-	1.540,06	-	
05.004.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	5,29			0,00	5,29	2.936,04	15.531,65	-	-	-	15.531,65	-	
05.004.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	64,33			0,00	64,33	135,10	8.690,98	-	-	-	8.690,98	-	
05.005	DIVERSOS								59.190,18	17.863,97	761,32	18.625,29	40.564,90	31,47	
05.005.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af. 11/2021	m2	58,80			0,00	58,80	328,07	19.290,52	-	-	-	19.290,52	-	
05.005.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	558,70	439,00		439,00	119,70	24,05	13.436,74	10.557,95	-	10.557,95	2.878,79	78,58	
05.005.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	54,00	33,50		33,50	20,50	218,09	11.776,86	7.306,02	-	7.306,02	4.470,85	62,04	
05.005.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00			2,00	0,00	380,66	761,32	-	761,32	761,32	-	100,00	
05.005.005	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00			0,00	4,00	410,89	1.643,56	-	-	-	1.643,56	-	
05.005.006	Mesa banco (padrão emurb)	un	4,00			0,00	4,00	1.123,95	4.495,80	-	-	-	4.495,80	-	
05.005.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	109,50			0,00	109,50	18,56	2.032,32	-	-	-	2.032,32	-	
05.005.008	Limpeza geral	m2	1.963,50			0,00	1.963,50	2,93	5.753,06	-	-	-	5.753,06	-	
06	CANTEIRO 1								24.590,17	2.647,42	2.376,86	5.024,28	19.565,89	20,43	
06.002	PAVIMENTAÇÃO								6.848,03	-	1.234,88	1.234,88	5.613,15	18,03	
06.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,0585		2,0585	2,0585	0,00	599,89	1.234,88	-	1.234,88	1.234,88	0,00	100,00	
06.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev.01	m²	39,01			0,00	39,01	143,89	5.613,15	-	-	-	5.613,15	-	
06.003	DIVERSOS								17.742,15	2.647,42	1.141,98	3.789,40	13.952,75	167,75	
06.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	162,47	110,08		110,08	52,39	24,05	3.907,40	2.647,42	-	2.647,42	1.259,98	67,75	
06.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00		3,00	3,00	0,00	380,66	1.141,98	-	1.141,98	1.141,98	-	100,00	

Rizja Milene S. Rodrigues Araújo
SEM EFEITO
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

7/11

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engº Civil - CREA/SE 270936244

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO					BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 104/2026				
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					B.M.Nº 04					ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					Período: 01/07/2026 A 19/07/2026					DATA: 30/07/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
06.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	464,72			0,00	464,72	18,56	8.625,20	-	-	-	8.625,20	-
06.003.004	Limpeza geral	m2	1.388,25			0,00	1.388,25	2,93	4.067,57	-	-	-	4.067,57	-
07	CANTEIRO 2								158.852,06	24.358,56	8.145,09	32.503,65	126.348,41	20,46
07.002	PAVIMENTAÇÃO								77.662,96	-	5.861,13	5.861,13	71.801,83	7,55
07.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	9,7703		9,7703	9,7703	0,0000	599,89	5.861,13	-	5.861,13	5.861,13	0,00	100,00
07.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	499,005			0,00	499,01	143,89	71.801,83	-	-	-	71.801,83	-
07.003	DIVERSOS								81.173,24	24.358,56	2.283,96	26.642,52	54.530,72	175,00
07.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.012,83	1.012,83		1.012,83	0,00	24,05	24.358,56	24.358,56	-	24.358,56	0,00	100,00
07.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	8,00		6,00	6,00	2,00	380,66	3.045,28	-	2.283,96	2.283,96	761,32	75,00
07.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	2.269,38			0,00	2.269,38	18,56	42.119,69	-	-	-	42.119,69	-
07.003.004	Limpeza geral	m2	3.976,01			0,00	3.976,01	2,93	11.649,71	-	-	-	11.649,71	-
08	CANTEIRO 3								51.776,87	11.238,32	761,32	11.999,64	39.777,22	23,18
08.002	PAVIMENTAÇÃO								3.460,66	-	-	-	3.460,66	-
08.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	5,7688			0,0000	5,77	599,89	3.460,66	-	-	-	3.460,66	-
08.003	DIVERSOS								48.316,20	11.238,32	761,32	11.999,64	36.316,55	150,00
08.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	467,29	467,29		467,29	0,00	24,05	11.238,32	11.238,32	-	11.238,32	0,00	100,00
08.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00		2,00	2,00	2,00	380,66	1.522,64	-	761,32	761,32	761,32	50,00
08.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	1.510,28			0,00	1.510,28	18,56	28.030,80	-	-	-	28.030,80	-
08.003.004	Limpeza geral	m2	2.568,07			0,00	2.568,07	2,93	7.524,45	-	-	-	7.524,45	-
09	CANTEIRO 4								128.106,69	85.333,52	761,32	86.094,84	42.011,84	67,21
09.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								2.441,23	2.441,23	-	2.441,23	0,00	100,00
09.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	42,48	42,48		42,48	0,00	2,41	102,38	102,38	-	102,38	0,00	100,00
09.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	42,48	42,48		42,48	0,00	1,14	48,43	48,43	-	48,43	0,00	100,00
09.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	21,24	21,24		21,24	0,00	14,82	314,78	314,78	-	314,78	0,00	100,00
09.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	382,32	382,32		382,32	0,00	1,07	409,08	409,08	-	409,08	0,00	100,00
09.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	21,24	21,24		21,24	0,00	25,03	531,64	531,64	-	531,64	0,00	100,00
09.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	1.642,76	1.642,76		1.642,76	0,00	0,63	1.034,94	1.034,94	-	1.034,94	0,00	100,00
09.002	PAVIMENTAÇÃO								88.351,32	72.339,88	-	72.339,88	16.011,44	81,88
09.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	418,02	142,00		142,00	276,02	41,29	17.260,05	5.863,18	-	5.863,18	11.396,87	33,97
09.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	5,3446	5,3446		5,3446	0,00	599,89	3.206,19	3.206,19	-	3.206,19	0,00	100,00
09.002.003	Lona plástica preta	m2	1.102,39	1.102,39		1.102,39	0,00	7,05	7.771,85	7.771,85	-	7.771,85	0,00	100,00
09.002.004	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.102,39	1.102,39		1.102,39	0,00	49,95	55.064,38	55.064,38	-	55.064,38	0,00	100,00
09.002.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	81,1026	3,79		3,79	77,31	52,70	4.274,11	199,73	-	199,73	4.074,37	4,67

SEM EFEITO
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinho Freire
 Engª Civil - CREA/SE 2709362446

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO							BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO: 104/2026			
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							B.M.Nº 04						ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Período: 01/07/2026 A 19/07/2026						DATA: 30/07/2026			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Quantidades				Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						% Medid
				Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Contratado			Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
09.002.006	Regularização Manual	m2	62,703	18,96		18,96	43,74	5,28	331,07	100,11	-	100,11	230,96	30,24		
09.002.007	Colchão de areia	m3	3.1352	0,95		0,95	2,19	141,52	443,69	134,44	-	134,44	309,25	30,30		
09.003	DIVERSOS						0,00		37.314,14	10.552,42	761,32	11.313,74	26.000,40	30,32		
09.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	438,77	438,77		438,77	0,00	24,05	10.552,42	10.552,42	-	10.552,42	0,00	100,00		
09.003.002	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	250,00			0,00	250,00	26,73	6.683,03	-	-	-	6.683,03	-		
09.003.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00		2,00	2,00	1,00	380,66	1.141,98	-	761,32	761,32	380,66	66,67		
09.003.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m2	760,96			0,00	760,96	18,56	14.123,42	-	-	-	14.123,42	-		
09.003.005	Limpeza geral	m2	1.642,76			0,00	1.642,76	2,93	4.813,29	-	-	-	4.813,29	-		
10	IRRIGAÇÃO								402.689,11	289.824,35	8.143,73	297.968,08	104.621,03	74,01		
10.001	POÇOS ARTESIANOS								63.760,88	63.422,40	-	63.422,40	338,48	99,47		
10.001.001	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m	m	240,00	240,00		240,00	0,00	127,25	30.540,00	30.540,00	-	30.540,00	0,00	100,00		
10.001.002	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	240,00	240,00		240,00	0,00	137,01	32.882,40	32.882,40	-	32.882,40	0,00	100,00		
10.001.003	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	2,00			0,00	2,00	65,50	131,00	-	-	-	131,00	-		
10.001.004	Análise Bacteriológica da Água	un	3,00			0,00	3,00	69,16	207,48	-	-	-	207,48	-		
10.002	CASA DE BOMBAS								8.143,73	-	8.143,73	8.143,73	-	100,00		
10.002.001	Tampa de Inspeção em chapa metálica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive pintura e cadeado - Rev. 01	un	3,00		3,00	3,00	0,00	523,57	1.570,71	-	1.570,71	1.570,71	0,00	100,00		
10.002.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,46		2,46	2,46	0,00	2.671,96	6.573,02	-	6.573,02	6.573,02	0,00	100,00		
10.003	REDE DE IRRIGAÇÃO								330.684,50	226.401,95	-	226.401,95	104.282,55	68,46		
10.003.001	Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)	Un	3,00	3,00		3,00	0,00	6.939,83	20.819,49	20.819,49	-	20.819,49	0,00	100,00		
10.003.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	3.188,49	3.188,49		3.188,49	0,00	16,44	52.418,78	52.418,78	-	52.418,78	0,00	100,00		
10.003.003	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	un	6,00	6,00		6,00	0,00	53,68	322,08	322,08	-	322,08	0,00	100,00		
10.003.004	Tê 90° redução pvc rígido roscavel diâm = 1" x 3/4"	un	1.615,00	960,00		960,00	655,00	21,71	35.061,65	20.841,60	-	20.841,60	14.220,05	59,44		
10.003.005	Adaptador head d= 20mm x 3/4"	un	1.615,00	960,00		960,00	655,00	18,73	30.248,95	17.980,80	-	17.980,80	12.268,15	59,44		
10.003.006	Bocal para aspersor spray - 5F, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00	960,00		960,00	655,00	18,62	30.071,30	17.875,20	-	17.875,20	12.196,10	59,44		
10.003.007	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00	960,00		960,00	655,00	100,15	161.742,25	96.144,00	-	96.144,00	65.598,25	59,44		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								429.116,81	327.525,29	-	327.525,29	101.591,52	76,33		
11.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	6,00	6,00		6,00	0,00	545,34	3.272,04	3.272,04	-	3.272,04	0,00	100,00		
11.002	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	200,00	200,00		200,00	0,00	17,04	3.408,00	3.408,00	-	3.408,00	0,00	100,00		
11.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	6,00	6,00		6,00	0,00	20,90	125,40	125,40	-	125,40	0,00	100,00		
11.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	81,00	81,00		81,00	0,00	148,57	12.034,17	12.034,17	-	12.034,17	0,00	100,00		
11.005	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	10,00	10,00		10,00	0,00	64,30	643,00	643,00	-	643,00	0,00	100,00		
11.006	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	1,00		1,00	0,00	116,29	116,29	116,29	-	116,29	0,00	100,00		
11.007	Armação secundária, com 3 estribos e 3 isoladores - fornecimento e instalação. af. 07/2020	un	3,00	3,00		3,00	0,00	145,00	435,00	435,00	-	435,00	0,00	100,00		
11.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	6,00	6,00		6,00	0,00	457,80	2.746,80	2.746,80	-	2.746,80	0,00	100,00		

SEM FEITO
 Eng.º CIVIL - CREA/SE 270936244
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Eng.º CIVIL - CREA/SE 270936244

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq.º Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO							BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 104/2026			
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							B.M.Nº 04					ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Período: 01/07/2026 A 19/07/2026					DATA: 30/07/2026			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		
11.009	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	11,00	11,00		11,00	0,00	66,87	735,57	735,57	-	735,57	0,00	100,00	
11.010	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	4,00	4,00		4,00	0,00	24,77	99,08	99,08	-	99,08	0,00	100,00	
11.011	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	6,00	6,00		6,00	0,00	91,58	549,48	549,48	-	549,48	0,00	100,00	
11.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	2,00		2,00	0,00	21,06	42,12	42,12	-	42,12	0,00	100,00	
11.013	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação af. 10/2020	un	6,00	6,00		6,00	0,00	363,18	2.179,08	2.179,08	-	2.179,08	0,00	100,00	
11.014	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação af. 08/2020	un	6,00	6,00		6,00	0,00	38,14	228,84	228,84	-	228,84	0,00	100,00	
11.015	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	6,00	6,00		6,00	0,00	9,20	55,20	55,20	-	55,20	0,00	100,00	
11.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	11,00	11,00		11,00	0,00	183,09	2.013,99	2.013,99	-	2.013,99	0,00	100,00	
11.018	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	683,00	683,00		683,00	0,00	23,29	15.907,07	15.907,07	-	15.907,07	0,00	100,00	
11.020	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	227,00	227,00		227,00	0,00	4,95	1.123,65	1.123,65	-	1.123,65	0,00	100,00	
11.022	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	18,00	18,00		18,00	0,00	2,29	41,22	41,22	-	41,22	0,00	100,00	
11.023	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	75,00			0,00	75,00	317,29	23.796,75	-	-	-	23.796,75	-	
11.024	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	2.480,00			0,00	2.480,00	9,56	23.708,80	-	-	-	23.708,80	-	
11.025	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	18,00			0,00	18,00	1.972,46	35.504,28	-	-	-	35.504,28	-	
11.026	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob. g light ou similar	un	30,00			0,00	30,00	129,17	3.875,10	-	-	-	3.875,10	-	
11.027	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	288,00	288,00		288,00	0,00	14,81	4.263,93	4.263,93	-	4.263,93	0,00	100,00	
11.028	Poste aço galv. cônico ornamental, modelo ref. PORTOFINO, h total=12m, base flangeada, c/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/suporte p/2 luminárias, exceto luminárias e lampadas, Conipost ou similar	un	18,00	18,00		18,00	0,00	8.215,99	147.887,82	147.887,82	-	147.887,82	0,00	100,00	
11.029	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	44,00	44,00		44,00	0,00	1.538,39	67.689,16	67.689,16	-	67.689,16	0,00	100,00	
11.030	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	1.200,00			0,00	1.200,00	11,07	13.284,00	-	-	-	13.284,00	-	
11.031	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	60,00	60,00		60,00	0,00	18,31	1.098,60	1.098,60	-	1.098,60	0,00	100,00	
11.032	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	3.600,00	3.600,00		3.600,00	0,00	9,56	34.416,00	34.416,00	-	34.416,00	0,00	100,00	
11.033	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	75,00	75,00		75,00	0,00	349,83	26.237,25	26.237,25	-	26.237,25	0,00	100,00	
11.034	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	60,00			0,00	60,00	23,71	1.422,60	-	-	-	1.422,60	-	
11.038	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	3,00	3,00		3,00	0,00	58,84	176,52	176,52	-	176,52	0,00	100,00	
12	ARBORIZAÇÃO								129.338,16	-	129.338,16	129.338,16	-	100,00	
12.001	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af. 05/2018	un	1,00		1,00	1,00	0,00	522,38	522,38	-	522,38	522,38	-	100,00	

SEM EFEITO
 Eng.º Civil - E.º 1342
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Eng.º Civil - CREA/SE 270936244

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO							BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 104/2026		
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							B.M.Nº 04					ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Período: 01/07/2026 A 19/07/2026					DATA: 30/07/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
12.002	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	368,00		368,00	368,00	0,00	72,49	26.676,32	-	26.676,32	26.676,32	-	100,00
12.003	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	343,00		343,00	343,00	0,00	26,78	9.185,54	-	9.185,54	9.185,54	-	100,00
12.004	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	88,00		88,00	88,00	0,00	24,31	2.139,28	-	2.139,28	2.139,28	-	100,00
12.005	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	356,00		356,00	356,00	0,00	55,20	19.651,20	-	19.651,20	19.651,20	-	100,00
12.006	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	50,00		50,00	50,00	0,00	749,70	37.485,00	-	37.485,00	37.485,00	-	100,00
12.007	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	40,00		40,00	40,00	0,00	103,56	4.142,40	-	4.142,40	4.142,40	-	100,00
12.008	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	92,00		92,00	92,00	0,00	98,83	9.092,36	-	9.092,36	9.092,36	-	100,00
12.009	Planta - Canafistula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	52,00		52,00	52,00	0,00	107,27	5.578,04	-	5.578,04	5.578,04	-	100,00
12.010	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	44,00		44,00	44,00	0,00	101,09	4.447,96	-	4.447,96	4.447,96	-	100,00
12.011	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	3,00		3,00	3,00	0,00	14,10	42,30	-	42,30	42,30	-	100,00
12.012	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea), fornecimento e plantio	un	63,00		63,00	63,00	0,00	23,08	1.454,04	-	1.454,04	1.454,04	-	100,00
12.013	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	3,00		3,00	3,00	0,00	42,21	126,63	-	126,63	126,63	-	100,00
12.014	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	27,00		27,00	27,00	0,00	94,92	2.562,84	-	2.562,84	2.562,84	-	100,00
12.015	Planta - Pata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	27,00		27,00	27,00	0,00	230,81	6.231,87	-	6.231,87	6.231,87	-	100,00
13	DIVERSOS								3.421,36	-	-	-	3.421,36	-
13.001	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00			0,00	1,00	868,73	868,73	-	-	-	868,73	-
13.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	1,00	2.552,63	2.552,63	-	-	-	2.552,63	-
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								98.593,58	53.230,01	11.417,95	64.647,96	33.945,62	65,57
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	379,0749	204,66	43,90	248,56	130,51	146,83	55.659,56	30.050,23	6.445,84	36.496,06	19.163,50	65,57
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	758,1498	409,32	87,80	497,12	261,03	56,63	42.934,02	23.179,78	4.972,11	28.151,90	14.782,13	65,57
TOTAL:									2.322.666,51	1.254.084,99	268.813,52	1.522.898,51	799.768,00	65,57
PERCENTUAL									53,99	11,57		65,57	34,43	
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº _____ FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PERFEITA ORDEM EM _____			MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98988546515 ASSINATURA DA EMPRESA						APROVADO PARA PAGAMENTO _____/_____/_____ PROTÓCOLO					

SEM EFEITO
Rafaela Maria de Almeida Araújo
Eng. Civil - CRE-270936244-5
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CRE/SE 2709362445

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
02	CANTEIRO - MARCO "JOÃO DE DEUS SOUSA"		
02.002	PAVIMENTAÇÃO		
02.002.004	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	23,22
> 23,22m2 (levantamento in loco)			
02.002.005	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,3975
> 8,57m2 x 0,163m = 1,3975m3 (levantamento in loco)			
02.004	MARCO "AV. JOAO DE DEUS SOUZA"		
02.004.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	24,40
> (10,23m x 0,90m x 2 paredes) + (0,50m x 0,90m x 2 paredes) + (10,14m x 0,50m) = 24,40m2			
03	ROTATÓRIA 1		
03.002	PAVIMENTAÇÃO		
03.002.008	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	75,44
> 75,44m2 (levantamento em projeto)			
03.006	DIVERSOS		
03.006.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	und	2,00
> 02 rampas			
04	ROTATÓRIA 2		
04.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
04.002.009	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	322,50
> 271,15m2 + 139,20m2 = 410,35m2 (levantado em projeto) - 322,50m2 (contratado) = 87,85m2 (a aditar)			
04.003	ALVENARIA DE PEDRA		
04.003.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	39,10
> Circulo interno: (16,21m x 0,80m x 2 lados) + Circulo externo: (28,77m x 0,50m x 2 lados) = 54,71m2 (levantado) - 39,10m2 (contratado) = 15,61m2 (a aditar)			
04.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	39,10
> Circulo interno: (16,21m x 0,80m x 2 lados) + Circulo externo: (28,77m x 0,50m x 2 lados) = 54,71m2 (levantado) - 39,10m2 (contratado) = 15,61m2 (a aditar)			
04.005	DIVERSOS		
04.005.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	und	2,00
> 02 rampas			
05	ROTULA 3		
05.002	PAVIMENTAÇÃO		
05.002.009	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	470,82
> 24,19m2 x 0,06m = 1,4515m3			

SEM EFEITO
R. ...
E. ...
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362446

Matheus dos Santos Rodrigues
Arg e Lib. CAU/SE A204219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
05.005	DIVERSOS		
05.005.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	und	2,00
> 02 rampas			
06	CANTEIRO 01		
06.002	PAVIMENTAÇÃO		
06.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,0585
> (6,11m + 8,15m) x 0,50m x 0,29m = 2,0585m2			
06.003	DIVERSOS		
06.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	und	3,00
> 03 rampas			
07	CANTEIRO 02		
07.002	PAVIMENTAÇÃO		
07.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	9,7703
> 2,00m x 2,00m x 0,08m x 30 placas = 9,7703m3			
07.003	DIVERSOS		
07.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	und	6,00
> 06 rampas			
08	CANTEIRO 03		
08.003	DIVERSOS		
08.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	und	2,00
> 02 rampas			
09	CANTEIRO 04		
09.003	DIVERSOS		
09.003.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	und	2,00
> 02 rampas			
10	IRRIGAÇÃO		
10.002	CASA DE BOMBAS		
10.002.001	Tampa de Inspeção em chapa metálica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive pintura e cadeado - Rev. 01	un	3,00
> 03 unidades			
10.002.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,46
> 1,00m x 1,00 x 0,82m x 3 und = 2,46m3			
12	ARBORIZAÇÃO		
12.001	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af 05/2018	un	1,00
> 01 unidade			
12.002	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	368,00
> 368 unidades			

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
7745218424
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362446

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO MARCO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO


CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 04


CONTRATO nº 104/2026

ORDEM DE SERVIÇO


INICIO - 07/04/2026



PLACA DE OBRA

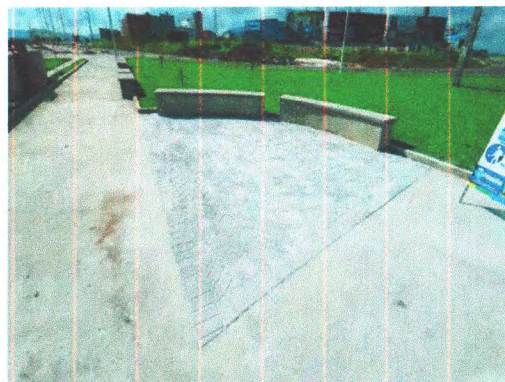

PISO DE BLOCOS SEXTAVADO DO MARCO JOÃO DE DEUS SOUSA

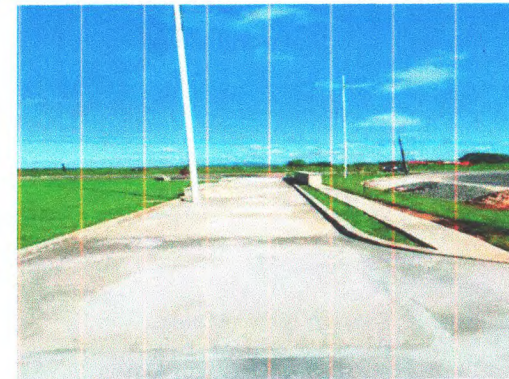


CONCRETO COMPLEMENTAÇÃO DO MARCO JOÃO DE DEUS SOUSA



REVESTIMENTO CERÂMICO DO MARCO JOÃO DE DEUS SOUSA



PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NA ROTATÓRIA 01

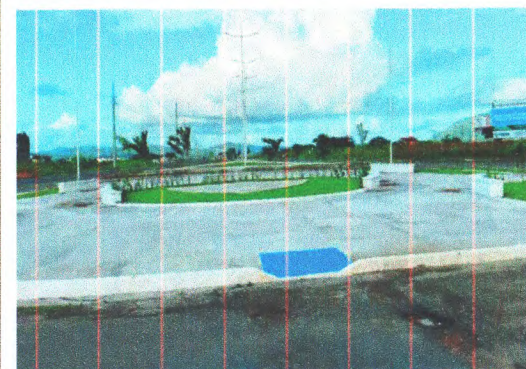

RAMPA DE DEFICIENTE NA ROTATÓRIA 01

ELABORADO POR:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 270936244

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil - CREA/SE 270936244
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
SEM EFEITO

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 1 de 4


OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO MONTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 04

CONTRATO nº 104/2026

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 07/04/2026

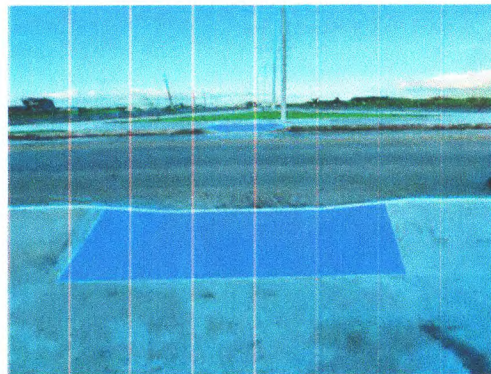

RAMPA DE DEFICIENTE NA ROTATÓRIA 01



PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NA
ROTATÓRIA 02



CHAPISCO E REBOCO NA ROTATÓRIA 02



RAMPA DE DEFICIENTE NA ROTATÓRIA 02



PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NA
ROTATÓRIA 03



RAMPA DE DEFICIENTE NA ROTATÓRIA 03

Kelly Pinto Freire
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Engº Civil - CREA/SE 270936244

Rizio Milene S. Rodrigues Araújo
Engr. Civil - CREA/SE 270936244
Prefeitura Municipal de Itabaiana
SEM EFEITO

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

FOLHA 2 de 4


OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 04

CONTRATO nº 104/2026

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 07/04/2026

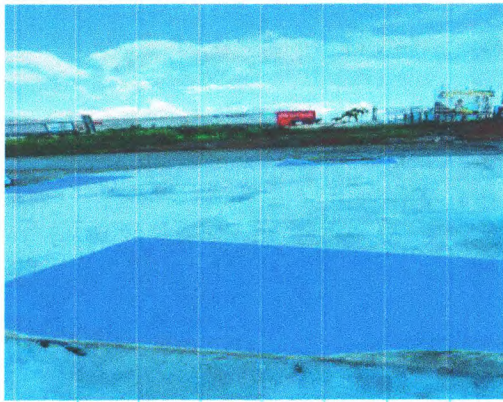

RAMPA DE DEFICIENTE DO CANTEIRO 01

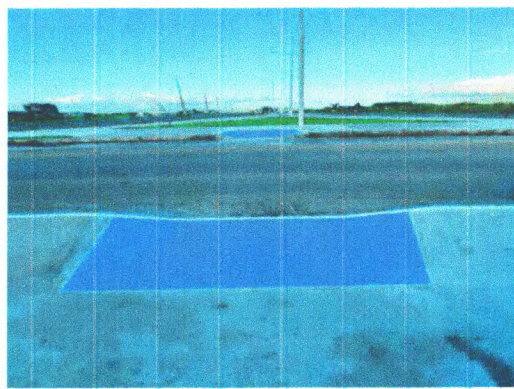

RAMPA DE DEFICIENTE DO CANTEIRO 02



RAMPA DE DEFICIENTE DO CANTEIRO 03



RAMPA DE DEFICIENTE DO CANTEIRO 04



CASA DE BOMBAS DA AVENIDA JOAO DE DEUS SOUSA



ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA JOAO DE DEUS SOUSA

Kb
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 270936244

Riz
SEM EFEITO
Riz...
Eng...
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus
Matheus dos Santos Rodrigues
Arg e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

FOLHA 3 de 4

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO MONTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 04

CONTRATO nº 104/2026

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 07/04/2026




ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA JOAO DE DEUS SOUSA




ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA JOAO DE DEUS SOUSA



ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA JOAO DE DEUS SOUSA

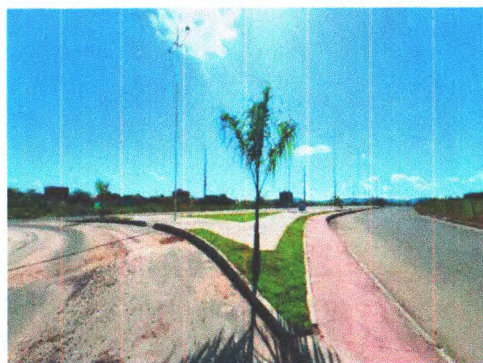

ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA JOAO DE DEUS SOUSA

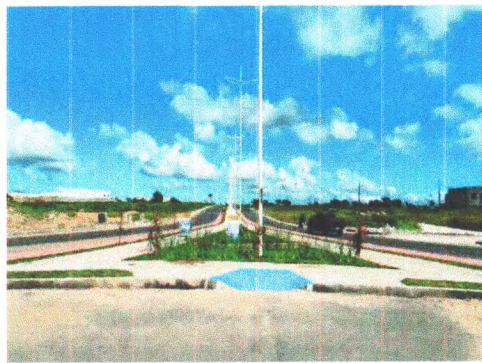

ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA JOAO DE DEUS SOUSA



ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA JOAO DE DEUS SOUSA

SEM EFEITO
Matheus dos Santos Rodrigues Araújo
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:9898
6546515

Assinado digitalmente por
DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
ND: C=BR, CN=DANYELSON LEITE
DOS SANTOS:98986546515, O=ICP-
Brasil, OU=Certificado PP A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.30 10:04:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ELABORADO POR:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 270936244

FOLHA 4 de 4

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
