

Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCÉLA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023			CONTRATO Nº: 22/2023 Data da medição: 31/10/2023			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								42.484,06	42.484,06	0,00	42.484,06	0,00	100,00
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00		6,00	0,00	319,52	1.917,12	1.917,12	0,00	1.917,12	0,00	100,00
01.002	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	267,00	267,00		267,00	0,00	5,92	1.580,64	1.580,64	0,00	1.580,64	0,00	100,00
01.003	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	260,00	260,00		260,00	0,00	92,00	23.920,00	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00	100,00
01.004	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km	m2	997,00	997,00		997,00	0,00	5,50	5.483,50	5.483,50	0,00	5.483,50	0,00	100,00
01.005	Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à área construída acrescida da área de cobertura (para compensar a fundação).	m2	303,00	303,00		303,00	0,00	8,15	2.469,45	2.469,45	0,00	2.469,45	0,00	100,00
01.006	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	0,00	1.417,04	1.417,04	1.417,04	0,00	1.417,04	0,00	100,00
01.007	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	496,95	496,95	496,95	0,00	496,95	0,00	100,00
01.008	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	24,00	24,00		24,00	0,00	216,64	5.199,36	5.199,36	0,00	5.199,36	0,00	100,00
02	FUNDAÇÃO								63.220,76	61.874,97	1.345,79	63.220,76	0,00	100,00
02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	48,50	48,50		48,50	0,00	40,04	1.941,94	1.941,94	0,00	1.941,94	0,00	100,00
02.002	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	4,85	1,18	3,67	4,85	0,00	366,70	1.778,50	432,71	1.345,79	1.778,50	0,00	100,00
02.003	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	26,19	26,19		26,19	0,00	387,40	10.146,01	10.146,01	0,00	10.146,01	0,00	100,00
02.004	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m3	22,31	22,31		22,31	0,00	23,11	515,58	515,58	0,00	515,58	0,00	100,00
02.005	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	32,74	32,74		32,74	0,00	7,99	261,59	261,59	0,00	261,59	0,00	100,00
02.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	98,21	98,21		98,21	0,00	1,20	117,85	117,85	0,00	117,85	0,00	100,00
02.007	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	9,32	9,32		9,32	0,00	2.147,34	20.013,21	20.013,21	0,00	20.013,21	0,00	100,00
02.008	Impermeabilização semi-flexível com tinta alifática, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar	m2	349,20	349,20		349,20	0,00	15,37	5.367,20	5.367,20	0,00	5.367,20	0,00	100,00
02.009	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	169,20	169,20		169,20	0,00	136,40	23.078,88	23.078,88	0,00	23.078,88	0,00	100,00
03	ESTRUTURA								82.860,50	31.200,85	51.659,64	82.860,50	0,00	100,00
03.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	15,75	14,53	1,22	15,75	0,00	2.147,34	33.820,61	31.200,85	2.619,75	33.820,61	0,00	100,00

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Vicente Mathias Rocha Bezerra

José Roberto Santos da Paixão
Eng.º Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Teófilo Santana
Eng.º Civil CREA 715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCÉLA							BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº: 22/2023		
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME							B.M.Nº: 04					Data da medição: 31/10/2023		
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE							Período: 01/10/2023 a 31/10/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.002	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiraço 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	267,00		267,00	267,00	0,00	183,67	49.039,89	0,00	49.039,89	49.039,89	0,00	100,00
04	ELEVAÇÕES								32.485,98	32.485,98	0,00	32.485,98	0,00	100,00
04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	765,00	765,00		765,00	0,00	36,31	27.777,15	27.777,15	0,00	27.777,15	0,00	100,00
04.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	119,00	119,00		119,00	0,00	39,57	4.708,83	4.708,83	0,00	4.708,83	0,00	100,00
05	COBERTURA								55.954,50	0,00	0,00	0,00	55.954,50	0,00
05.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	303,00			0,00	303,00	64,18	19.446,54	0,00	0,00	0,00	19.446,54	0,00
05.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m2	303,00			0,00	303,00	42,29	12.813,87	0,00	0,00	0,00	12.813,87	0,00
05.003	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	59,00			0,00	59,00	102,76	6.062,84	0,00	0,00	0,00	6.062,84	0,00
05.004	Ruífo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	95,70			0,00	95,70	32,96	3.154,27	0,00	0,00	0,00	3.154,27	0,00
05.005	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	30,45			0,00	30,45	17,62	536,53	0,00	0,00	0,00	536,53	0,00
05.006	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	19,00			0,00	19,00	74,68	1.418,92	0,00	0,00	0,00	1.418,92	0,00
05.007	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, incluso mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	kg	279,75			0,00	279,75	15,06	4.213,04	0,00	0,00	0,00	4.213,04	0,00
05.008	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m2	29,00			0,00	29,00	274,38	7.957,02	0,00	0,00	0,00	7.957,02	0,00
05.009	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	1,60			0,00	1,60	120,74	193,18	0,00	0,00	0,00	193,18	0,00
05.010	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	1,60			0,00	1,60	98,93	158,29	0,00	0,00	0,00	158,29	0,00
06	REVESTIMENTOS								134.000,41	14.455,26	30.334,71	44.789,97	89.210,44	37,78
06.001	PISO								28.438,30	8.778,96	0,00	8.778,96	19.659,34	33,33
06.001.001	Lona plástica preta	m2	267,00	267,00		267,00	0,00	4,29	1.145,43	1.145,43	0,00	1.145,43	0,00	100,00
06.001.002	Camada impermeabilizadora, espessura ≈ 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	267,00	267,00		267,00	0,00	28,59	7.633,53	7.633,53	0,00	7.633,53	0,00	100,00
06.001.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	267,00			0,00	267,00	20,98	5.601,66	0,00	0,00	0,00	5.601,66	0,00
06.001.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	267,00			0,00	267,00	35,36	9.441,12	0,00	0,00	0,00	9.441,12	0,00


José Robson Santos de Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Vicente de Albuquerque Rocha Bezerra
Engenheiro Civil
CREA - SE 2707034-703


Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCELA							BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº: 22/2023		
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME							B.M.Nº: 04					Data da medição: 31/10/2023		
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE							Período: 01/10/2023 a 31/10/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
06.001.005	Rodapé cerâmico 8,5 x 41 cm, eliane, linha cargo plus bone, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar)	m	212,00			0,00	212,00	15,83	3.355,96	0,00	0,00	0,00	3.355,96	0,00
06.001.006	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	30,00			0,00	30,00	42,02	1.260,60	0,00	0,00	0,00	1.260,60	0,00
06.002	PAREDE								80.309,25	5.676,30	24.466,05	30.142,35	50.166,90	30,00
06.002.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m2	1.530,00	1.530,00		1.530,00	0,00	3,71	5.676,30	5.676,30	0,00	5.676,30	0,00	100,00
06.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	450,00		135,00	135,00	315,00	26,99	12.145,50	0,00	3.643,65	3.643,65	8.501,85	30,00
06.002.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	1.080,00		864,00	864,00	216,00	24,10	26.028,00	0,00	20.822,40	20.822,40	5.205,60	80,00
06.002.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	203,89			0,00	203,89	35,36	7.209,55	0,00	0,00	0,00	7.209,55	0,00
06.002.005	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	594,90			0,00	594,90	31,96	19.013,00	0,00	0,00	0,00	19.013,00	0,00
06.002.006	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	30,00			0,00	30,00	61,03	1.830,90	0,00	0,00	0,00	1.830,90	0,00
06.002.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	450,00			0,00	450,00	18,68	8.406,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00	0,00
06.003	TETO								25.252,86	0,00	5.868,66	5.868,66	19.384,20	50,00
06.003.001	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	267,00			0,00	267,00	60,55	16.166,85	0,00	0,00	0,00	16.166,85	0,00
06.003.002	Chapisco em tetó, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	267,00		267,00	267,00	0,00	9,93	2.651,31	0,00	2.651,31	2.651,31	0,00	100,00
06.003.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	267,00		133,50	133,50	133,50	24,10	6.434,70	0,00	3.217,35	3.217,35	3.217,35	50,00
07	ESQUADRIAS								50.631,94	0,00	0,00	0,00	50.631,94	0,00
07.001	MADEIRA								19.361,04	0,00	0,00	0,00	19.361,04	0,00
07.001.001	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	6,00			0,00	6,00	789,17	4.735,02	0,00	0,00	0,00	4.735,02	0,00
07.001.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	12,00			0,00	12,00	666,81	8.001,72	0,00	0,00	0,00	8.001,72	0,00
07.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,00 x 2,10 m - fornecimento	un	1,00			0,00	1,00	718,03	718,03	0,00	0,00	0,00	718,03	0,00
07.001.004	Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Lider ou similar)	cj	1,00			0,00	1,00	233,02	233,02	0,00	0,00	0,00	233,02	0,00



 José Robson Santos
 Eng. Civil CREA 272029/954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Yan Henrique Javores Santana
 Eng. Civil CREA 7715638/53
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Vitor Martins Rêder Alcantara
 Engenheiro Civil
 CREA - SC - 270703-703

Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCELA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023				CONTRATO Nº: 22/2023 Data da medição: 31/10/2023		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
07.001.005	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			0,00	1,00	1.042,48	1.042,48	0,00	0,00	0,00	1.042,48	0,00
07.001.006	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	1,00			0,00	1,00	1.109,06	1.109,06	0,00	0,00	0,00	1.109,06	0,00
07.001.007	Porta em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m2	2,56			0,00	2,56	629,93	1.612,62	0,00	0,00	0,00	1.612,62	0,00
07.001.008	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	122,85			0,00	122,85	15,54	1.909,09	0,00	0,00	0,00	1.909,09	0,00
07.002	ALUMÍNIO								20.184,66	0,00	0,00	0,00	20.184,66	0,00
07.002.001	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fornecimento e instalação. af. 12/2019	m2	30,40			0,00	30,40	375,66	11.420,06	0,00	0,00	0,00	11.420,06	0,00
07.002.002	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis	m2	1,60			0,00	1,60	336,36	538,18	0,00	0,00	0,00	538,18	0,00
07.002.003	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af. 12/2019	m2	10,74			0,00	10,74	483,59	5.193,76	0,00	0,00	0,00	5.193,76	0,00
07.002.004	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2,1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	1,00			0,00	1,00	3.032,66	3.032,66	0,00	0,00	0,00	3.032,66	0,00
07.003	VIDRO								11.086,24	0,00	0,00	0,00	11.086,24	0,00
07.003.001	Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af. 01/2021_p	m2	17,43			0,00	17,43	563,16	9.815,88	0,00	0,00	0,00	9.815,88	0,00
07.003.002	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m2	2,84			0,00	2,84	447,31	1.270,36	0,00	0,00	0,00	1.270,36	0,00
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								81.832,39	4.335,86	0,00	4.335,86	77.496,53	9,52
08.001	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS								35.064,06	0,00	0,00	0,00	35.064,06	0,00
08.001.001	Vaso sanitário convencional, linha ravenna P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico	un	1,00			0,00	1,00	372,62	372,62	0,00	0,00	0,00	372,62	0,00
08.001.002	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	4,00			0,00	4,00	599,37	2.397,48	0,00	0,00	0,00	2.397,48	0,00
08.001.003	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	5,00			0,00	5,00	59,99	299,95	0,00	0,00	0,00	299,95	0,00
08.001.004	Lavatório louça (Deca-Ravenna ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	11,00			0,00	11,00	221,31	2.434,41	0,00	0,00	0,00	2.434,41	0,00
08.001.005	Tanque de louça (deca ref 03) com coluna (deca refct 25), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares	un	1,00			0,00	1,00	1.113,24	1.113,24	0,00	0,00	0,00	1.113,24	0,00
08.001.006	Lavatório Hospitalar coletivo aço inox AISI 304, chapa 1,0mm, tipo calha, med. 1000x340x520mm C/ acabamento escovado- Modelo Especial A - Palmetal ou similar	un	1,00			0,00	1,00	2.984,13	2.984,13	0,00	0,00	0,00	2.984,13	0,00
08.001.007	Saboneteira para sabão líquido	un	12,00			0,00	12,00	69,19	830,28	0,00	0,00	0,00	830,28	0,00


 José Robson Santos
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil CREA 545638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Vicente Martins Rocha Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA - SE 27107034703


Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCELA							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 22/2023			
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME							B.M.Nº: 04				Data da medição: 31/10/2023			
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE							Período: 01/10/2023 a 31/10/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
08.001.008	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	12,00			0,00	12,00	98,97	1.187,64	0,00	0,00	0,00	1.187,64	0,00
08.001.009	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	1,00			0,00	1,00	598,34	598,34	0,00	0,00	0,00	598,34	0,00
08.001.010	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m	10,30			0,00	10,30	985,03	10.145,81	0,00	0,00	0,00	10.145,81	0,00
08.001.011	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	10,00			0,00	10,00	424,29	4.242,90	0,00	0,00	0,00	4.242,90	0,00
08.001.012	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	10,00			0,00	10,00	65,39	653,90	0,00	0,00	0,00	653,90	0,00
08.001.013	Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.	un	1,00			0,00	1,00	3.975,01	3.975,01	0,00	0,00	0,00	3.975,01	0,00
08.001.014	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	4,00			0,00	4,00	53,15	212,60	0,00	0,00	0,00	212,60	0,00
08.001.015	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	2,00			0,00	2,00	93,96	187,92	0,00	0,00	0,00	187,92	0,00
08.001.016	Assento para banho articulável, ref. 2355 EBR, linha conforto, DECA ou similar	un	1,00			0,00	1,00	3.427,83	3.427,83	0,00	0,00	0,00	3.427,83	0,00
08.002	PONTO DE HIDRÁULICA								8.142,26	4.335,86	0,00	4.335,86	3.806,40	66,67
08.002.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	39,00			0,00	39,00	97,60	3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
08.002.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	6,00	6,00		6,00	0,00	110,70	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	100,00
08.002.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	34,00	34,00		34,00	0,00	107,99	3.671,66	3.671,66	0,00	3.671,66	0,00	100,00
08.003	METAIS E ACESSÓRIOS								3.397,59	0,00	0,00	0,00	3.397,59	0,00
08.003.001	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00			0,00	2,00	67,19	134,38	0,00	0,00	0,00	134,38	0,00
08.003.002	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	18,00			0,00	18,00	70,78	1.274,04	0,00	0,00	0,00	1.274,04	0,00
08.003.003	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00			0,00	1,00	1.524,35	1.524,35	0,00	0,00	0,00	1.524,35	0,00
08.003.004	Torneira de bóia p/caixa d'água d= 3/4" (deca ou similar)	un	1,00			0,00	1,00	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	68,54	0,00
08.003.005	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00			0,00	1,00	96,94	96,94	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00
08.003.006	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	9,00			0,00	9,00	33,26	299,34	0,00	0,00	0,00	299,34	0,00
08.004	REDE EXTERNA								11.567,90	0,00	0,00	0,00	11.567,90	0,00
08.004.001	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00			0,00	10,00	507,79	5.077,90	0,00	0,00	0,00	5.077,90	0,00
08.004.002	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm	m	30,00			0,00	30,00	31,40	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00


José Robson Santos da Silva
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 155638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
T. Valério Martins de Aguiar Fleckner
Engenheiro Civil
CREA - SP. 470705-4/03


Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCELA							BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº: 22/2023		
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME							B.M.Nº: 04					Data da medição: 31/10/2023		
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE							Período: 01/10/2023 a 31/10/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
08.004.003	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 100mm	m	100,00			0,00	100,00	55,48	5.548,00	0,00	0,00	0,00	5.548,00	0,00
08.005	REDE DE AR COMPRIMIDO								7.328,85	0,00	0,00	0,00	7.328,85	0,00
08.005.001	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe e, com isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de hidráulica predial - fornecimento e instalação. af_04/2022	m	30,00			0,00	30,00	70,07	2.102,10	0,00	0,00	0,00	2.102,10	0,00
08.005.002	Valvula de esfera em bronze d = 1/2" (fornecimento)	un	1,00			0,00	1,00	36,85	36,85	0,00	0,00	0,00	36,85	0,00
08.005.003	Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, p/instalação de gás	un	10,00			0,00	10,00	26,04	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40	0,00
08.005.004	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	un	10,00			0,00	10,00	492,95	4.929,50	0,00	0,00	0,00	4.929,50	0,00
08.006	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS								5.418,89	0,00	0,00	0,00	5.418,89	0,00
08.006.001	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00			0,00	1,00	1.524,35	1.524,35	0,00	0,00	0,00	1.524,35	0,00
08.006.002	Torneira de bóia p/caixa d'água d = 1" (deca ou similar)	un	1,00			0,00	1,00	69,55	69,55	0,00	0,00	0,00	69,55	0,00
08.006.003	Filtro modelo Hidro Filter Big Poe 10", da Pentair Hidro Filtros ou similar	un	1,00			0,00	1,00	837,44	837,44	0,00	0,00	0,00	837,44	0,00
08.006.004	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00			0,00	1,00	690,51	690,51	0,00	0,00	0,00	690,51	0,00
08.006.005	Bóia automática p/caixa d'água - 15 amperes	un	1,00			0,00	1,00	67,79	67,79	0,00	0,00	0,00	67,79	0,00
08.006.006	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(5-3,9)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1,00			0,00	1,00	1.665,36	1.665,36	0,00	0,00	0,00	1.665,36	0,00
08.006.007	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00			0,00	1,00	42,19	42,19	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00
08.006.008	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	30,00			0,00	30,00	17,39	521,70	0,00	0,00	0,00	521,70	0,00
08.007	SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO								10.912,84	0,00	0,00	0,00	10.912,84	0,00
08.007.001	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	1,00			0,00	1,00	9.918,12	9.918,12	0,00	0,00	0,00	9.918,12	0,00
08.007.002	Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1,50 x 0,50m, tampa conc d=1,60x0,05m (v=3390 litros)	un	1,00			0,00	1,00	994,72	994,72	0,00	0,00	0,00	994,72	0,00
09	SINALIZAÇÃO								1.042,65	0,00	0,00	0,00	1.042,65	0,00
09.001	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	2,50			0,00	2,50	384,85	962,13	0,00	0,00	0,00	962,13	0,00
09.002	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	un	1,00			0,00	1,00	80,52	80,52	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								52.234,92	0,00	0,00	0,00	52.234,92	0,00
10.001	PADRÃO DE ENTRADA								7.833,02	0,00	0,00	0,00	7.833,02	0,00
10.001.001	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw	un	1,00			0,00	1,00	7.833,02	7.833,02	0,00	0,00	0,00	7.833,02	0,00
10.002	PONTOS ELÉTRICOS								34.505,05	0,00	0,00	0,00	34.505,05	0,00
10.002.001	Luminária de embutir para fluorescente tubular T5, 2x28w, inclusive lâmpadas e reatores, ref.: C-06, da Abalux ou similar	un	37,00			0,00	37,00	292,38	10.818,06	0,00	0,00	0,00	10.818,06	0,00



 José Robson Santos de Azevedo
 Eng. Civil CREA 272023954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Yan Henrique Toyares Santana
 Eng. Civil CREA 272023954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua Manoel de Barros, 1234
 CEP: 55.000-000
 CNPJ: 08.000.000/0001-00


Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCELA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023				CONTRATO Nº: 22/2023 Data da medição: 31/10/2023		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
10.002.002	Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lampadas - Rev. 01	un	8,00			0,00	8,00	118,92	951,36	0,00	0,00	0,00	951,36	0,00
10.002.003	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	18,00			0,00	18,00	102,49	1.844,82	0,00	0,00	0,00	1.844,82	0,00
10.002.004	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	3,00			0,00	3,00	133,83	401,49	0,00	0,00	0,00	401,49	0,00
10.002.005	Projeto p/ lâmpada vapor mercúrio 250w, completo (tecnolux - ref. bw -90 ou similar) - Fornecimento	Un	2,00			0,00	2,00	264,76	529,52	0,00	0,00	0,00	529,52	0,00
10.002.006	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/basê móvel	un	2,00			0,00	2,00	29,74	59,48	0,00	0,00	0,00	59,48	0,00
10.002.007	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	68,00			0,00	68,00	112,40	7.643,20	0,00	0,00	0,00	7.643,20	0,00
10.002.008	Ponto de tomada 2p+tt, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	59,00			0,00	59,00	170,52	10.060,68	0,00	0,00	0,00	10.060,68	0,00
10.002.009	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	2,00			0,00	2,00	201,80	403,60	0,00	0,00	0,00	403,60	0,00
10.002.010	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	7,00			0,00	7,00	256,12	1.792,84	0,00	0,00	0,00	1.792,84	0,00
10.003	QDPG								1.793,17	0,00	0,00	0,00	1.793,17	0,00
10.003.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00			0,00	1,00	660,65	660,65	0,00	0,00	0,00	660,65	0,00
10.003.002	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	2,00			0,00	2,00	451,59	903,18	0,00	0,00	0,00	903,18	0,00
10.003.003	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00			0,00	1,00	229,34	229,34	0,00	0,00	0,00	229,34	0,00
10.004	QUADROS								3.184,58	0,00	0,00	0,00	3.184,58	0,00
10.004.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00			0,00	1,00	660,65	660,65	0,00	0,00	0,00	660,65	0,00
10.004.002	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	2,00			0,00	2,00	451,59	903,18	0,00	0,00	0,00	903,18	0,00
10.004.003	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	25,00			0,00	25,00	64,83	1.620,75	0,00	0,00	0,00	1.620,75	0,00
10.005	LÓGICA E TELEFONIA								4.919,10	0,00	0,00	0,00	4.919,10	0,00
10.005.001	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	11,00			0,00	11,00	147,63	1.623,93	0,00	0,00	0,00	1.623,93	0,00
10.005.002	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un	7,00			0,00	7,00	152,45	1.067,15	0,00	0,00	0,00	1.067,15	0,00
10.005.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°C	m	33,00			0,00	33,00	5,93	195,69	0,00	0,00	0,00	195,69	0,00
10.005.004	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios	un	1,00			0,00	1,00	1.397,02	1.397,02	0,00	0,00	0,00	1.397,02	0,00
10.005.005	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00			0,00	1,00	449,69	449,69	0,00	0,00	0,00	449,69	0,00



 José Robson Santos da Silva
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Yan Henrique Traves Santana
 Eng. Civil - CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Vitoria Maria de Nogueira Duarte
 Engenheira Civil
 CREA - SP 2.10.024/703


Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCELA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023				CONTRATO Nº: 22/2023 Data da medição: 31/10/2023		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
10.005.006	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	2,00			0,00	2,00	17,23	34,46	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00
10.005.007	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	1,00			0,00	1,00	151,16	151,16	0,00	0,00	0,00	151,16	0,00
11	ÁREA EXTERNA								111.083,00	63.746,20	4.685,20	68.431,40	42.651,60	27,19
11.001	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020	m	90,00			0,00	90,00	117,25	10.552,50	0,00	0,00	0,00	10.552,50	0,00
11.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	23,07		6,92	6,92	16,15	629,82	14.529,95	0,00	4.358,35	4.358,35	10.171,60	30,00
11.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	153,40			0,00	153,40	19,09	2.928,41	0,00	0,00	0,00	2.928,41	0,00
11.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00		1,00	1,00	0,00	326,85	326,85	0,00	326,85	326,85	0,00	100,00
11.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar	m	4,80			0,00	4,80	184,58	885,98	0,00	0,00	0,00	885,98	0,00
11.006	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	70,15			0,00	70,15	72,20	5.064,83	0,00	0,00	0,00	5.064,83	0,00
11.007	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	335,65	170,00		170,00	165,65	29,32	9.841,26	4.984,40	0,00	4.984,40	4.856,86	50,65
11.008	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m2	-			0,00	0,00	196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.009	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	393,43	4.721,16	4.721,16	0,00	4.721,16	0,00	100,00
11.010	Limpeza geral	m2	997,00			0,00	997,00	1,88	1.874,36	0,00	0,00	0,00	1.874,36	0,00
11.011	Cascalho (piçarra branca) aplicado	m3	39,65			0,00	39,65	101,25	4.014,56	0,00	0,00	0,00	4.014,56	0,00
11.012	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00			0,00	1,00	641,78	641,78	0,00	0,00	0,00	641,78	0,00
11.013	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	1,00	1.660,72	1.660,72	0,00	0,00	0,00	1.660,72	0,00
11.014	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	215,80	215,80		215,80	0,00	250,42	54.040,64	54.040,64	0,00	54.040,64	0,00	100,00
12	PAISAGISMO								12.904,30	0,00	0,00	0,00	12.904,30	0,00
12.001	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	1,00			0,00	1,00	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
12.002	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	14,00			0,00	14,00	76,10	1.065,40	0,00	0,00	0,00	1.065,40	0,00
12.003	Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	7,00			0,00	7,00	68,08	476,56	0,00	0,00	0,00	476,56	0,00



 José Robson Santos da Silva
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Yan Henrique Torres Santana
 Eng. Civil CREA 115638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua: Itabaiana, s/nº, Centro, Itabaiana - MS
 CEP: 78.300-000
 CNPJ: 08.447.009/0001-03


Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARZELA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023				CONTRATO Nº: 22/2023 Data da medição: 31/10/2023		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
12.004	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	3,00			0,00	3,00	587,04	1.761,12	0,00	0,00	0,00	1.761,12	0,00
12.005	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	9,00			0,00	9,00	68,08	612,72	0,00	0,00	0,00	612,72	0,00
12.006	Planta - Carambola (averrhoa carambola), fornecimento e plantio	un	3,00			0,00	3,00	68,08	204,24	0,00	0,00	0,00	204,24	0,00
12.007	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	9,00			0,00	9,00	27,48	247,32	0,00	0,00	0,00	247,32	0,00
12.008	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	36,00			0,00	36,00	35,93	1.293,48	0,00	0,00	0,00	1.293,48	0,00
12.009	Planta - Iresine (iresine herbstii), fornecimento e plantio	un	116,00			0,00	116,00	45,75	5.307,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00
12.010	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	52,00			0,00	52,00	35,93	1.868,36	0,00	0,00	0,00	1.868,36	0,00
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								47.344,75	16.097,21	5.681,37	21.778,59	25.566,16	46,00
13.001	Mestre de obras com encargos complementares	h	410,00	139,40	49,20	188,60	221,40	52,78	21.639,80	7.357,53	2.596,78	9.954,31	11.685,49	46,00
13.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	205,00	69,70	24,60	94,30	110,70	125,39	25.704,95	8.739,68	3.084,59	11.824,28	13.880,67	46,00
TOTAIS									768.080,16	266.680,40	93.706,71	360.387,11	407.693,05	46,92%
PERCENTUAL									100,00%	34,72%	12,20%	46,92%	53,08%	
 CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Vicente Matheus Rocha Bezerra Engenheiro Civil CREA - SE 2707034703			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:					APROVADO PARA PAGAMENTO DATA: 210.852,48						
CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra														


 Yan Henrique Torres Santana
 Engº Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCELA		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº: 22/2023
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		B.M.Nº: 04		
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE		Período: 01/10/2023 a 31/10/2023		Data da medição: 31/10/2023
MEMORIAL DE CÁLCULO				
02	FUNDAÇÃO			
02.002	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual, af. 05/2021	m3	Volume total: Área de acesso de veículos x 0,06m = (20,95m ² + 40,08m ²) x 0,06m = 3,67m ³	
03	ESTRUTURA			
03.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	Volume total: 0,30m x 0,15m x 1,49m x 21 pilares = 1,22m ³	
03.002	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	Área total (Em projeto): 267,00m ²	
06	REVESTIMENTOS			
06.002	PAREDE			
06.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	Área total: 45,00m x 3,00m = 135,00m ²	
06.002.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	Área total: 864,00m x 3,00m = 864,00m ²	
06.003	TETO			
06.003.002	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	Área total (Em projeto): 267,00m ²	
06.003.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	Área total: 26,70m x 5,00m = 133,50m ²	
11	ÁREA EXTERNA			
11.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af. 08/2022	m3	Área total (Em projeto): 33,74m x 2,93m x 0,07m = 6,92m ³	
11.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	Quantidade total: 1,00und	
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
13.001	Mestre de obras com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: 46,00% x 410,00h = 188,60h - 139,40h (Já medido) = 49,20h	
13.002	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: 46,00% x 205,00h = 94,30h - 69,70h (Já medido) = 24,60h	
 CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:		APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:


 Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil CREA 27.5638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

<p>Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCELA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</p>	<p>CONTRATO Nº: 22/2023 Data da medição: 31/10/2023</p>
--	--	--



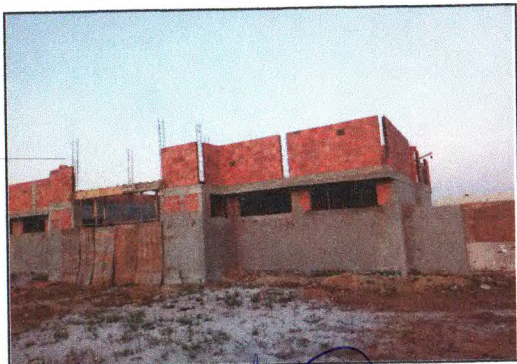
Visão da estrutura 01



Visão da estrutura 02



Visão da estrutura 03



Visão da estrutura 04



Visão da estrutura 05



Visão da estrutura 06

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Vicente Matheus Rocha Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA - SE 2707034703

Yan Henrique Torres Santana
 Engº Civil CREA RJ 15638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCELA**
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE**

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 22/2023

B.M.Nº: 04
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data da medição: 31/10/2023



Detelhe da laje 01



Detelhe da laje 02



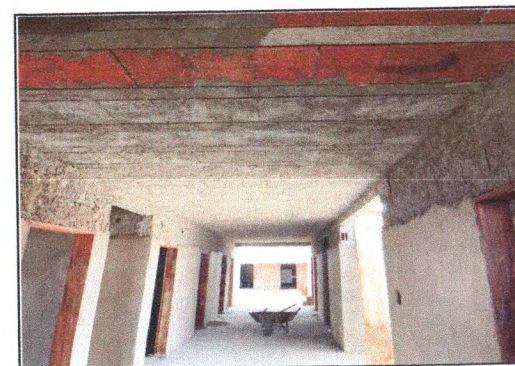
Detelhe da laje 03



Detalhe do reboco 01



Detalhe do reboco 02










Detalhe do reboco do teto 01

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Victor Mathias Rocha Bezerra
Engenheiro Civil
CREA - SE 2707034703

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2705638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

<p>Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCELA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</p>	<p>CONTRATO Nº: 22/2023 Data da medição: 31/10/2023</p>
		
<p>Detalhe do reboco do teto 02</p>	<p>Detalhe do reboco do teto 03</p>	<p>Detalhe do reboco do teto 04</p>
		
<p>Detalhe da calçada 01</p>	<p>Detalhe da calçada 02</p>	<p>Detalhe da calçada 03</p>
<p>CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  Vicente Matheus Rocha Bezerra Engenheiro Civil CREA - SE 2707034703</p>	<p>ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:</p>	<p>APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:</p>
<p>CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra</p>		

Yan Henrique Loures Santana
 Engº Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
