

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 03/01/2026 a 18/02/2026				CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 18/02/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								88.162,36	86.492,86	1.669,50	88.162,36	0,00	100,00
01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	4.042,58	4.042,58		4.042,58	0,00	4,27	17.261,82	17.261,82	0,00	17.261,82	0,00	100,00
01.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	8,00	8,00		8,00	0,00	349,93	2.799,44	2.799,44	0,00	2.799,44	0,00	100,00
01.003	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30,00	30,00		30,00	0,00	231,52	6.945,60	6.945,60	0,00	6.945,60	0,00	100,00
01.004	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022	un	1,00	1,00		1,00	0,00	480,85	480,85	480,85	0,00	480,85	0,00	100,00
01.005	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	0,00	1.602,13	1.602,13	1.602,13	0,00	1.602,13	0,00	100,00
01.006	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	630,00	630,00		630,00	0,00	87,33	55.017,90	55.017,90	0,00	55.017,90	0,00	100,00
01.007	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	630,00		630,00	630,00	0,00	2,65	1.669,50	0,00	1.669,50	1.669,50	0,00	100,00
01.008	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	4.042,58	4.042,58		4.042,58	0,00	0,59	2.385,12	2.385,12	0,00	2.385,12	0,00	100,00
02	PAVIMENTAÇÃO								388.563,32	366.520,42	16.973,57	383.493,99	5.069,33	90,00
02.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1.346,71	1.316,71	30,00	1.346,71	0,00	38,08	51.282,72	50.140,32	1.142,40	51.282,72	0,00	100,00
02.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.316,71			0,00	1.316,71	3,85	5.069,33	0,00	0,00	0,00	5.069,33	0,00
02.003	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	404,25	404,25		404,25	0,00	148,05	59.849,21	59.849,21	0,00	59.849,21	0,00	100,00
02.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	12.127,74	12.127,74		12.127,74	0,00	1,10	13.340,51	13.340,51	0,00	13.340,51	0,00	100,00
02.005	Lona plástica preta	m2	1.533,20	1.533,20		1.533,20	0,00	5,67	8.693,24	8.693,24	0,00	8.693,24	0,00	100,00
02.006	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m2	361,30	361,30		361,30	0,00	43,88	15.853,84	15.853,84	0,00	15.853,84	0,00	100,00
02.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	361,30	180,65	180,65	361,30	0,00	63,49	22.938,94	11.469,47	11.469,47	22.938,94	0,00	100,00
02.008	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	1.049,19	1.049,19		1.049,19	0,00	105,62	110.815,45	110.815,45	0,00	110.815,45	0,00	100,00
02.009	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	351,02	351,02		351,02	0,00	102,14	35.853,18	35.853,18	0,00	35.853,18	0,00	100,00
02.010	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.256,38	1.171,90	84,48	1.256,38	0,00	51,63	64.866,90	60.505,20	4.361,70	64.866,90	0,00	100,00
03	ESTACIONAMENTO								21.804,20	20.771,94	0,00	20.771,94	1.032,26	50,00

Rildo M. S. Rodrigues Araújo
 Eng.º Civil CREA - 27158184/24
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jenei Vitor M. das M. Santos
 Eng.º Civil CREA - 27235922/0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 03/01/2026 a 18/02/2026				CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 18/02/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
03.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	188,75	188,75		188,75	0,00	110,05	20.771,94	20.771,94	0,00	20.771,94	0,00	100,00
03.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	2,00			0,00	2,00	516,13	1.032,26	0,00	0,00	0,00	1.032,26	0,00
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								249.389,23	11.984,72	27.397,51	39.382,23	210.007,00	92,86
04.001	PADRÃO DE ENTRADA								3.684,44	0,00	3.684,44	3.684,44	0,00	100,00
04.001.001	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	36,00		36,00	36,00	0,00	51,18	1.842,48	0,00	1.842,48	1.842,48	0,00	100,00
04.001.002	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00		1,00	1,00	0,00	68,26	68,26	0,00	68,26	68,26	0,00	100,00
04.001.003	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	12,00		12,00	12,00	0,00	33,59	403,08	0,00	403,08	403,08	0,00	100,00
04.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	8,00		8,00	8,00	0,00	3,53	28,24	0,00	28,24	28,24	0,00	100,00
04.001.005	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00		1,00	1,00	0,00	437,49	437,49	0,00	437,49	437,49	0,00	100,00
04.001.006	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00		1,00	1,00	0,00	17,17	17,17	0,00	17,17	17,17	0,00	100,00
04.001.007	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00		2,00	2,00	0,00	14,97	29,94	0,00	29,94	29,94	0,00	100,00
04.001.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00		1,00	1,00	0,00	383,74	383,74	0,00	383,74	383,74	0,00	100,00
04.001.009	Contator LC1-D1810 - Telemecanick	un	1,00		1,00	1,00	0,00	348,51	348,51	0,00	348,51	348,51	0,00	100,00
04.001.010	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00		2,00	2,00	0,00	51,45	102,90	0,00	102,90	102,90	0,00	100,00
04.001.011	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	1,00		1,00	1,00	0,00	22,63	22,63	0,00	22,63	22,63	0,00	100,00
04.002	ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURA								243.553,20	10.876,44	22.669,76	33.546,20	210.007,00	78,57
04.002.001	Luminária Decorativa, IP66, IK08, bivolt, 80w, 10.400lm, distribuição luminosa simétrica, fixação em topo de poste 60,3mm, conforme projeto	un	54,00			0,00	54,00	2.281,74	123.213,96	0,00	0,00	0,00	123.213,96	0,00
04.002.002	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m - fornecimento e instalação. af_04/2025	un	54,00			0,00	54,00	1.600,32	86.417,28	0,00	0,00	0,00	86.417,28	0,00
04.002.003	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00			0,00	8,00	46,97	375,76	0,00	0,00	0,00	375,76	0,00
04.002.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	56,00	30,00	26,00	56,00	0,00	147,76	8.274,56	4.432,80	3.841,76	8.274,56	0,00	100,00
04.002.005	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	54,00		54,00	54,00	0,00	117,19	6.328,26	0,00	6.328,26	6.328,26	0,00	100,00
04.002.006	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	772,00		772,00	772,00	0,00	9,59	7.403,48	0,00	7.403,48	7.403,48	0,00	100,00
04.002.007	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	502,00		502,00	502,00	0,00	8,54	4.287,08	0,00	4.287,08	4.287,08	0,00	100,00

João Vitor Reis
 Eng. Civil CREA - 27235922-0
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rivaldo de B. Rodrigues Anjo
 Eng.º Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 03/01/2026 a 18/02/2026				CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 18/02/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04.002.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	386,00	386,00		386,00	0,00	16,31	6.295,66	6.295,66	0,00	6.295,66	0,00	100,00
04.002.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	14,00	14,00		14,00	0,00	10,57	147,98	147,98	0,00	147,98	0,00	100,00
04.002.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	129,00		129,00	129,00	0,00	2,99	385,71	0,00	385,71	385,71	0,00	100,00
04.002.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	5,00		5,00	5,00	0,00	1,27	6,35	0,00	6,35	6,35	0,00	100,00
04.002.012	Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	54,00		54,00	54,00	0,00	6,88	371,52	0,00	371,52	371,52	0,00	100,00
04.002.013	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	2,00		2,00	2,00	0,00	11,12	22,24	0,00	22,24	22,24	0,00	100,00
04.002.014	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	2,00		2,00	2,00	0,00	11,68	23,36	0,00	23,36	23,36	0,00	100,00
04.003	INTERNET PÚBLICA								2.151,59	1.108,28	1.043,31	2.151,59	0,00	100,00
04.003.001	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1,00		1,00	0,00	1.108,28	1.108,28	1.108,28	0,00	1.108,28	0,00	100,00
04.003.002	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af 07/2020	un	1,00		1,00	1,00	0,00	38,08	38,08	0,00	38,08	38,08	0,00	100,00
04.003.003	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00		1,00	1,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	100,00
04.003.004	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00		1,00	1,00	0,00	383,74	383,74	0,00	383,74	383,74	0,00	100,00
04.003.005	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	45,00		45,00	45,00	0,00	7,32	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00	100,00
04.003.006	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00		1,00	1,00	0,00	22,68	22,68	0,00	22,68	22,68	0,00	100,00
04.003.007	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	m	10,00		10,00	10,00	0,00	16,19	161,90	0,00	161,90	161,90	0,00	100,00
04.003.008	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00		1,00	1,00	0,00	45,42	45,42	0,00	45,42	45,42	0,00	100,00
04.003.009	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	3,00		3,00	3,00	0,00	5,03	15,09	0,00	15,09	15,09	0,00	100,00
05	PLAYGROUND								15.876,99	0,00	15.876,99	15.876,99	0,00	100,00
05.001	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00		2,00	2,00	0,00	1.565,86	3.131,72	0,00	3.131,72	3.131,72	0,00	100,00
05.002	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00		1,00	1,00	0,00	2.622,14	2.622,14	0,00	2.622,14	2.622,14	0,00	100,00
05.003	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00		1,00	1,00	0,00	3.696,94	3.696,94	0,00	3.696,94	3.696,94	0,00	100,00
05.004	Carrocel universal em aço galvanizado diam=1,60m - Sergipark ou similar	un	1,00		1,00	1,00	0,00	2.714,79	2.714,79	0,00	2.714,79	2.714,79	0,00	100,00
05.005	Brinquedo - Labirinto (trepá-trepá) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	1,00		1,00	1,00	0,00	3.711,40	3.711,40	0,00	3.711,40	3.711,40	0,00	100,00
06	ACADEMIA								37.180,68	0,00	37.180,68	37.180,68	0,00	100,00
06.001	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00		2,00	2,00	0,00	3.932,06	7.864,12	0,00	7.864,12	7.864,12	0,00	100,00

Jéssica Vilhena Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA 27235922-0
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rômulo de Jesus
 Eng. Civil CREA 27235922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 03/01/2026 a 18/02/2026				CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 18/02/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
06.002	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	2,00		2,00	2,00	0,00	5.698,04	11.396,08	0,00	11.396,08	11.396,08	0,00	100,00
06.003	Instalação de rotação vertical duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	2,00		2,00	2,00	0,00	1.822,41	3.644,82	0,00	3.644,82	3.644,82	0,00	100,00
06.004	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00		2,00	2,00	0,00	3.181,35	6.362,70	0,00	6.362,70	6.362,70	0,00	100,00
06.005	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar	Un	2,00		2,00	2,00	0,00	1.737,85	3.475,70	0,00	3.475,70	3.475,70	0,00	100,00
06.006	Instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	2,00		2,00	2,00	0,00	2.218,63	4.437,26	0,00	4.437,26	4.437,26	0,00	100,00
07	MONUMENTO - CRUZ								5.327,04	4.964,97	0,00	4.964,97	362,07	85,71
07.001	Demolição de concreto manualmente	m3	1,00	1,00		1,00	0,00	249,99	249,99	249,99	0,00	249,99	0,00	100,00
07.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,55	0,55		0,55	0,00	2.239,54	1.231,75	1.231,75	0,00	1.231,75	0,00	100,00
07.003	Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa	m3	1,00	1,00		1,00	0,00	455,65	455,65	455,65	0,00	455,65	0,00	100,00
07.004	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	12,80	12,80		12,80	0,00	12,57	160,90	160,90	0,00	160,90	0,00	100,00
07.005	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 201 a 400m	m3	1,00	1,00		1,00	0,00	6,39	6,39	6,39	0,00	6,39	0,00	100,00
07.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	9,26			0,00	9,26	39,10	362,07	0,00	0,00	0,00	362,07	0,00
07.007	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,07	15,07		15,07	0,00	189,80	2.860,29	2.860,29	0,00	2.860,29	0,00	100,00
08	PAISAGISMO								35.536,90	0,00	1.138,83	1.138,83	34.398,07	0,55
08.001	Planta - Pata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	6,00			0,00	6,00	197,16	1.182,96	0,00	0,00	0,00	1.182,96	0,00
08.002	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00			0,00	6,00	96,43	578,58	0,00	0,00	0,00	578,58	0,00
08.003	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	5,00			0,00	5,00	98,85	494,25	0,00	0,00	0,00	494,25	0,00
08.004	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	18,00			0,00	18,00	98,85	1.779,30	0,00	0,00	0,00	1.779,30	0,00
08.005	média	un	19,00			0,00	19,00	81,54	1.549,26	0,00	0,00	0,00	1.549,26	0,00
08.006	Planta - Moreira (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	79,00			0,00	79,00	45,36	3.583,44	0,00	0,00	0,00	3.583,44	0,00
08.007	Planta - Canafistula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00			0,00	6,00	98,85	593,10	0,00	0,00	0,00	593,10	0,00
08.008	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	871,40		38,50	38,50	832,90	29,58	25.776,01	0,00	1.138,83	1.138,83	24.637,18	4,42
09	DIVERSOS								71.862,05	22.525,98	47.483,15	70.009,13	1.852,92	84,62

Eng. Civil CREA 7235922-0
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA 7235922-0
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 03/01/2026 a 18/02/2026				CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 18/02/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
09.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	5,00		5,00	5,00	0,00	386,20	1.931,00	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	100,00
09.002	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	0,00			0,00	0,00	162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	89,10	89,10		89,10	0,00	189,80	16.911,18	16.911,18	0,00	16.911,18	0,00	100,00
09.004	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	8,00	8,00		8,00	0,00	701,85	5.614,80	5.614,80	0,00	5.614,80	0,00	100,00
09.005	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	8,00		8,00	8,00	0,00	33,95	271,60	0,00	271,60	271,60	0,00	100,00
09.006	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	6,00			0,00	6,00	308,82	1.852,92	0,00	0,00	0,00	1.852,92	0,00
09.007	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	85,91		85,91	85,91	0,00	137,43	11.806,61	0,00	11.806,61	11.806,61	0,00	100,00
09.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	85,91		85,91	85,91	0,00	6,18	530,92	0,00	530,92	530,92	0,00	100,00
09.009	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	85,91		85,91	85,91	0,00	35,86	3.080,73	0,00	3.080,73	3.080,73	0,00	100,00
09.010	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	9,00		9,00	9,00	0,00	966,77	8.700,93	0,00	8.700,93	8.700,93	0,00	100,00
09.011	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1 1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps	m	44,10		44,10	44,10	0,00	454,34	20.036,39	0,00	20.036,39	20.036,39	0,00	100,00
09.012	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	3,00		3,00	3,00	0,00	296,79	890,37	0,00	890,37	890,37	0,00	100,00
09.013	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	6,00		6,00	6,00	0,00	39,10	234,60	0,00	234,60	234,60	0,00	100,00
10	PERGOLADO								74.380,21	0,00	73.208,42	73.208,42	1.171,79	66,67
10.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 01 demão de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m2	87,84			0,00	87,84	13,34	1.171,79	0,00	0,00	0,00	1.171,79	0,00
10.002	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af_11/2021	m2	0,00			0,00	0,00	208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.003	Pilar de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, fixado com vergalhão, diâmetro de 30 a 34 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024	m	77,00		77,00	77,00	0,00	245,37	18.893,15	0,00	18.893,15	18.893,15	0,00	100,00
10.004	Viga de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, diâmetro de 16 a 20 cm. af_03/2024	m	54,00		54,00	54,00	0,00	101,23	5.466,45	0,00	5.466,45	5.466,45	0,00	100,00

João Miguel Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 27235922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Miguel Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 27235922-0
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 03/01/2026 a 18/02/2026				CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 18/02/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
10.005	Viga de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, diâmetro de 12 a 15 cm. af_03/2024	m	210,00		210,00	210,00	0,00	70,62	14.829,40	0,00	14.829,40	14.829,40	0,00	100,00
10.006	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m2	77,00		77,00	77,00	0,00	441,81	34.019,41	0,00	34.019,41	34.019,41	0,00	100,00
11	MARCO INAUGURAL								3.159,22	0,00	0,00	0,00	3.159,22	0,00
11.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00			0,00	1,00	1.876,55	1.876,55	0,00	0,00	0,00	1.876,55	0,00
11.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,49			0,00	0,49	2.239,54	1.097,37	0,00	0,00	0,00	1.097,37	0,00
11.003	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 201 a 400m	m3	0,24			0,00	0,24	6,39	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
11.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	4,70			0,00	4,70	39,10	183,77	0,00	0,00	0,00	183,77	0,00
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								38.682,00	22.048,74	6.575,94	28.624,68	10.057,32	74,00
12.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	100,00	57,00	17,00	74,00	26,00	163,80	16.380,00	9.336,60	2.784,60	12.121,20	4.258,80	74,00
12.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	200,00	114,00	34,00	148,00	52,00	60,73	12.146,00	6.923,22	2.064,82	8.988,04	3.157,96	74,00
12.003	Vigia diurno com encargos complementares	h	400,00	228,00	68,00	296,00	104,00	25,39	10.156,00	5.788,92	1.726,52	7.515,44	2.640,56	74,00
	TOTAIS								1.029.924,20	535.309,63	227.504,59	762.814,23	267.109,97	74,07%
	PERCENTUAL								100,00%	51,98%	22,09%	74,07%	25,93%	
Assinado de forma digital por VICENTE MATHEUS ROCHA BEZERRA:00748836586 Dados: 2026.02.23 09:38:27 -03'00' CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:						APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:					

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			MEMORIAL DE CÁLCULO B.M.Nº: 04 Período: 03/01/2026 a 18/02/2026	CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 18/02/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.007	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	Área total: 315,00m x 2,00m = 630,00m2	
02	PAVIMENTAÇÃO			
02.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	Quantidade utilizada no ajuste da área de pavimentação: 30,00m	
02.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	Área total: 108,39m x 2,00m = 180,65m2	
02.010	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	Área 1 ajustada na pavimentação: 7,50m x 2,00 = 15,00m2 Área 2 ajustada na pavimentação: 6,00m x 1,65m = 9,90m2 Área 3 ajustada na pavimentação: 3,00m x 9,00m = 27,00m2 Área dos piso dos degraus da escada da igreja: (16,50m + 5,50m + 9,10m) x 0,90m = 31,10m x 0,90m = 27,99m2 Área dos piso dos degraus da escada do playground: 5,10m x 0,90m = 4,59m2 Área total: 15,00m2 + 9,90m2 + 27,00m2 + 27,99m2 + 4,59m2 = 84,48m2	
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
04.001	PADRÃO DE ENTRADA			
04.001.001	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	Comprimento total: 36,00m	
04.001.002	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	Quantidade total: 1,00und	
04.001.003	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	Quantidade total: 12,00und	
04.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	Comprimento total: 8,00m	
04.001.005	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	Quantidade total: 1,00und	
04.001.006	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	Quantidade total: 1,00und	
04.001.007	Cabecote de alumínio de 1 1/4"	un	Quantidade total: 2,00und	
04.001.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	Quantidade total: 1,00und	
04.001.009	Contator LC1-D1810 - Telemecanick	un	Quantidade total: 1,00und	
04.001.010	Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	Quantidade total: 2,00und	

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			MEMORIAL DE CÁLCULO B.M.Nº: 04 Período: 03/01/2026 a 18/02/2026		CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 18/02/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO					
04.001.011	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	Quantidade total: 1,00und		
04.002	ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
04.002.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	Quantidade total: 26,00und		
04.002.005	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	Quantidade total: 54,00und		
04.002.006	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	Comprimento total: 772,00m		
04.002.007	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	Comprimento total: 502,00m		
04.002.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	Quantidade total: 129,00und		
04.002.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	Quantidade total: 5,00und		
04.002.012	Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	Comprimento total: 54,00m		
04.002.013	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	Quantidade total: 2,00und		
04.002.014	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	Quantidade total: 2,00und		
04.003	INTERNET PÚBLICA				
04.003.002	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af 07/2020	un	Quantidade total: 1,00und		
04.003.003	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	Quantidade total: 1,00und		
04.003.004	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	Quantidade total: 1,00und		
04.003.005	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	Comprimento total: 45,00m		
04.003.006	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	Quantidade total: 1,00und		
04.003.007	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	m	Comprimento total: 10,00m		
04.003.008	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	Quantidade total: 1,00und		
04.003.009	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	Quantidade total: 3,00und		
05	PLAYGROUND				
05.001	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	Quantidade total: 2,00und		



Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng. Civil CREA - 27158184/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0




 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng. Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			MEMORIAL DE CÁLCULO B.M.Nº: 04 Período: 03/01/2026 a 18/02/2026	CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 18/02/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO				
05.002	Balço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	Quantidade total: 1,00und	
05.003	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	Quantidade total: 1,00und	
05.004	Carrocel universal em aço galvanizado diam=1,60m - Sergipark ou similar	un	Quantidade total: 1,00und	
05.005	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	Quantidade total: 1,00und	
06	ACADEMIA			
06.001	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	Quantidade total: 2,00und	
06.002	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af 10/2021	un	Quantidade total: 2,00und	
06.003	Instalação de rotação vertical duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af 10/2021	un	Quantidade total: 2,00und	
06.004	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	Quantidade total: 2,00und	
06.005	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar	Un	Quantidade total: 2,00und	
06.006	Instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af 10/2021	un	Quantidade total: 2,00und	
08	PAISAGISMO			
08.008	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	Área ajustada de pavimentação: (11,00m x 7,00m) / 2 = 77,00m2 / 2 = 38,50m2	
09	DIVERSOS			
09.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	Quantidade total: 5,00und	
09.005	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	Quantidade total: 8,00und	


 Riza Muelhe S. Rodrigues Araujo
 Eng.ª Civil CREA - 271581842-0
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiara

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiara

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			MEMORIAL DE CÁLCULO B.M.Nº: 04 Período: 03/01/2026 a 18/02/2026	CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 18/02/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO				
09.007	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	Área de alvenaria da contenção abaixo dos bancos de concreto: $(18,30m + 6,40m) \times 0,70m \times 2vezes = 34,58m^2$ Área de alvenaria do degrau da igreja: $((16,30m + 5,50m + 9,10m) \times 0,20m \times 3\text{ degraus}) + (0,90m \times 0,65m \times 2\text{ lados}) = 18,54m^2 + 1,17m^2 = 19,71m^2$ Área de alvenaria da rampa para o playground: $13,00m \times (0,70m / 2) \times 2vezes = 13,00m \times 0,35m \times 2 = 9,10m^2$ Área de alvenaria de contenção da rampa para o playground: $13,00m \times 0,70m \times 2\text{ vezes} = 18,20m^2$ Área de alvenaria dos degraus da escada do playground: $(5,10m \times 0,20m \times 3\text{ degraus}) + (0,90m \times 0,70m \times 2\text{ lados}) = 3,06m^2 + 1,26m^2 = 4,32m^2$ Área total: $34,58m^2 + 19,71m^2 + 9,10m^2 + 18,20m^2 + 4,32m^2 = 85,91m^2$	
09.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	Área de alvenaria da contenção abaixo dos bancos de concreto: $(18,30m + 6,40m) \times 0,70m \times 2vezes = 34,58m^2$ Área de alvenaria do degrau da igreja: $((16,30m + 5,50m + 9,10m) \times 0,20m \times 3\text{ degraus}) + (0,90m \times 0,65m \times 2\text{ lados}) = 18,54m^2 + 1,17m^2 = 19,71m^2$ Área de alvenaria da rampa para o playground: $13,00m \times (0,70m / 2) \times 2vezes = 13,00m \times 0,35m \times 2 = 9,10m^2$ Área de alvenaria de contenção da rampa para o playground: $13,00m \times 0,70m \times 2\text{ vezes} = 18,20m^2$ Área de alvenaria dos degraus da escada do playground: $(5,10m \times 0,20m \times 3\text{ degraus}) + (0,90m \times 0,70m \times 2\text{ lados}) = 3,06m^2 + 1,26m^2 = 4,32m^2$ Área total: $34,58m^2 + 19,71m^2 + 9,10m^2 + 18,20m^2 + 4,32m^2 = 85,91m^2$	
09.009	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	Área de alvenaria da contenção abaixo dos bancos de concreto: $(18,30m + 6,40m) \times 0,70m \times 2vezes = 34,58m^2$ Área de alvenaria do degrau da igreja: $((16,30m + 5,50m + 9,10m) \times 0,20m \times 3\text{ degraus}) + (0,90m \times 0,65m \times 2\text{ lados}) = 18,54m^2 + 1,17m^2 = 19,71m^2$ Área de alvenaria da rampa para o playground: $13,00m \times (0,70m / 2) \times 2vezes = 13,00m \times 0,35m \times 2 = 9,10m^2$ Área de alvenaria de contenção da rampa para o playground: $13,00m \times 0,70m \times 2\text{ vezes} = 18,20m^2$ Área de alvenaria dos degraus da escada do playground: $(5,10m \times 0,20m \times 3\text{ degraus}) + (0,90m \times 0,70m \times 2\text{ lados}) = 3,06m^2 + 1,26m^2 = 4,32m^2$ Área total: $34,58m^2 + 19,71m^2 + 9,10m^2 + 18,20m^2 + 4,32m^2 = 85,91m^2$	
09.010	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	Quantidade total de bancos a ser substituído: 9,00und	 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo Eng.ª Civil CREA - 27158184/24 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana
09.011	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af 04/2019 ps	m	Comprimento total: 19,40m (rampa do playground) + 18,30m (contenção do playground) + 6,40m (escada do playground) = 44,10m	
09.012	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	Área total = $2,50m \times 1,20m = 3,00m^2$	
09.013	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	Área total = $2,50m \times 1,20m = 3,00m^2 \times 2\text{ lados} = 6,00m^2$	 João Vitor Reis dos Santos Eng. Civil CREA - 27233592/40 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana
10	PERGOLADO			
10.003	Pilar de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, fixado com vergalhão, diâmetro de 30 a 34 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af 03/2024	m	Comprimento total = $(10\text{ pilares de } 3,50m = 35,00m) + (12\text{ pilares de } 3,50m = 42,00m) = 35,00m + 42,00m = 77,00m$	
10.004	Viga de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, diâmetro de 16 a 20 cm. af 03/2024	m	Comprimento total = $(4,00und \times 4,00m) + (4,00und \times 3,50m) + (8,00und \times 3,00m) = 16,00m + 14,00m + 24,00m = 54,00m$	

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			MEMORIAL DE CÁLCULO B.M.Nº: 04 Período: 03/01/2026 a 18/02/2026		CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 18/02/2026	
MEMORIAL DE CÁLCULO						
10.005	Viga de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, diâmetro de 12 a 15 cm. af. 03/2024	m	Comprimento total = 3,50m x 60und = 210,00m			
10.006	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m2	Área total = (8,50m x 3,50m) + (13,50m x 3,50m) = 29,75m2 + 47,25m2 = 77,00m2			
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
12.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: 74,00% x 100,00h = 74,00h (-) 57,00h (Já medido) = 17,00h			
12.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: 74,00% x 200,00h = 148,00h (-) 114,00h (Já medido) = 34,00h			
12.003	Vigia diurno com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: 74,00% x 400,00h = 296,00h (-) 228,00h (Já medido) = 68,00h			
VICENTE MATHEUS ROCHA BEZERRA:00748836586 CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra		Assinado de forma digital por VICENTE MATHEUS ROCHA BEZERRA:00748836586 Dados: 2026.02.25 15:29:42 -03'00'		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:  João Vitor Reis Eng. Civil CREA - 272335922-0 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:  Rizia Menez B. Rodrigues Araújo Eng.ª Civil CREA - 2715818424 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO

CONTRATO Nº: 335/2025

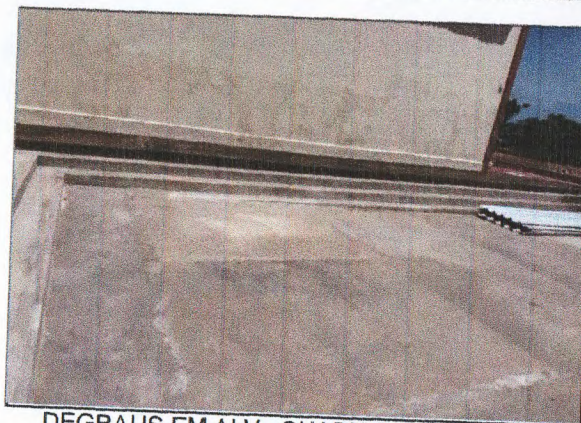
B.M.Nº: 04

Período: 03/01/2026 a 18/02/2026

Data da medição: 18/02/2026



REVESTIMENTO CERÂMICO E MESAS



DEGRAUS EM ALV., CHAPISCO E REBOCO



DEGRAUS EM ALV., CHAPISCO E REBOCO



DEGRAUS EM ALV., CHAPISCO E REBOCO




DEGRAUS EM ALV., CHAPISCO E REBOCO



DEGRAUS EM ALV., CHAPISCO E REBOCO


Riza M. S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO

B.M.Nº: 04
Período: 03/01/2026 a 18/02/2026

CONTRATO Nº: 335/2025

Data da medição: 18/02/2026



MEIO-FIO E PISO EM CONCRETO



MEIO-FIO E PISO EM CONCRETO



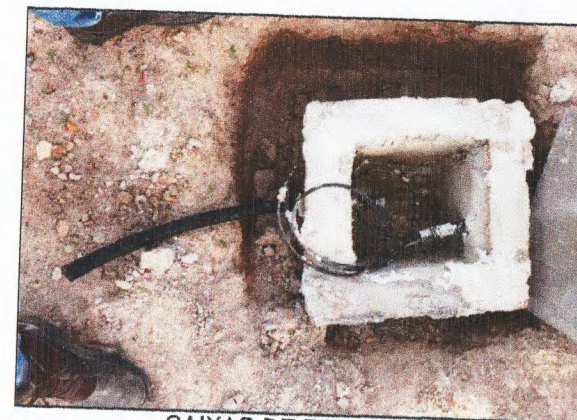
MEIO-FIO E PISO EM CONCRETO




PADRÃO DE ENTRADA




CAIXAS DE PASSAGEM



CAIXAS DE PASSAGEM


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

B.M.Nº: 04

Período: 03/01/2026 a 18/02/2026

CONTRATO Nº: 335/2025

Data da medição: 18/02/2026



CAIXAS DE PASSAGEM, HASTE E CABOS



CAIXAS DE PASSAGEM, HASTE E CABOS



CAIXAS DE PASSAGEM, HASTE E CABOS




CAIXAS DE PASSAGEM, HASTE E CABOS




TAMPA DE CONCRETO DAS CAIXAS



CAIXAS DE PASSAGEM FINALIZADAS


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

B.M.Nº: 04

Período: 03/01/2026 a 18/02/2026

CONTRATO Nº: 335/2025

Data da medição: 18/02/2026



QUADRO DE COMANDO, INST. DA INTERNET



QUADRO DE COMANDO, INST. DA INTERNET



VISÃO GERAL DA ACADEMIA



VISÃO GERAL DO PLAYGROUND




GUARDA-CORPO



GUARDA-CORPO


Rízia Menezes S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

B.M.Nº: 04

Período: 03/01/2026 a 18/02/2026

CONTRATO Nº: 335/2025

Data da medição: 18/02/2026



GRAMA



GRAMA



GRAMA



EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA



BRINQUEDOS DO PLAYGROUND



BRINQUEDOS DO PLAYGROUND


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

B.M.Nº: 04

Período: 03/01/2026 a 18/02/2026

CONTRATO Nº: 335/2025

Data da medição: 18/02/2026



BRINQUEDOS DO PLAYGROUND



BRINQUEDOS DO PLAYGROUND



PERGOLAGO



PERGOLADO



PERGOLADO



PERGOLADO

VICENTE MATHEUS
ROCHA

BEZERRA:00748836586

Assinado de forma digital por
VICENTE MATHEUS ROCHA
BEZERRA:00748836586
Dados: 2026.02.26 09:32:47 -03'00'

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Kizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
