

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 162/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERIODO: 04/07/2023 A 31/07/2023					ORDEN DE SERVIÇO: 02/05/2023						DATA: 01/08/2023
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	SALDO		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.990,30	2.597,64	464,22	3.061,86	928,44	76,73
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00		6,00	-	278,20	1.669,20	1.669,20	-	1.669,20	-	100,00
01.002	Locação de container - Almoarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	5,00	2,00	1,00	3,00	2,00	464,22	2.321,10	928,44	464,22	1.392,66	928,44	60,00
02	TRECHO 01								282.980,09	51.106,13	148.888,39	199.994,52	82.985,57	70,67
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								11.553,71	2.009,07	6.196,89	8.205,96	3.347,75	71,02
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.182,95	540,35	1.711,23	2.251,58	931,37	1,21	3.851,37	653,82	2.070,59	2.724,41	1.126,96	70,74
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	3.311,04	582,59	1.773,80	2.356,39	954,65	1,02	3.377,26	594,24	1.809,28	2.403,52	973,74	71,17
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.034,74	182,06	554,31	736,37	298,37	0,73	755,36	132,90	404,65	537,55	217,81	71,16
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	3.104,10	546,18	1.662,93	2.209,11	894,99	1,15	3.569,72	628,11	1.912,37	2.540,48	1.029,24	71,17
02.002	PAVIMENTAÇÃO								252.377,64	43.277,23	134.071,30	177.348,53	75.029,11	70,27
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.926,77	455,87	1.586,10	2.041,97	884,80	68,89	201.625,19	31.404,88	109.266,43	140.671,31	60.953,88	69,77
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	853,92	281,60	417,10	698,70	155,22	29,33	25.045,47	8.259,33	12.233,54	20.492,87	4.552,60	81,82
02.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	853,92	-	-	-	853,92	2,94	2.510,52	-	-	-	2.510,52	-
02.002.004	Colchão de areia	m3	204,87	31,91	111,03	142,94	61,93	101,15	20.722,60	3.227,70	11.230,68	14.458,38	6.264,22	69,77
02.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	2.151,18	335,06	1.165,78	1.500,84	650,34	1,15	2.473,86	385,32	1.340,65	1.725,97	747,89	69,77
02.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								17.648,24	5.819,83	8.620,20	14.440,03	3.208,21	81,82
02.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	256,18	84,48	125,13	209,61	46,57	68,89	17.648,24	5.819,83	8.620,20	14.440,03	3.208,21	81,82
02.004	LIMPEZA								1.400,50	-	-	-	1.400,50	-
02.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.182,95	-	-	-	3.182,95	0,44	1.400,50	-	-	-	1.400,50	-
03	TRECHO 02								141.128,73	139.111,02	-	139.111,02	2.017,71	98,57
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								5.738,49	5.738,49	-	5.738,49	-	100,00
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.578,35	1.578,35		1.578,35	-	1,21	1.909,80	1.909,80	-	1.909,80	-	100,00
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	1.645,86	1.645,86		1.645,86	-	1,02	1.678,78	1.678,78	-	1.678,78	-	100,00
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	514,33	514,33		514,33	-	0,73	375,46	375,46	-	375,46	-	100,00
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.543,00	1.543,00		1.543,00	-	1,15	1.774,45	1.774,45	-	1.774,45	-	100,00
03.002	PAVIMENTAÇÃO								125.394,24	124.071,00	-	124.071,00	1.323,24	98,94
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.443,33	1.443,33		1.443,33	-	68,89	99.431,00	99.431,00	-	99.431,00	-	100,00
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	450,08	450,08		450,08	-	29,33	13.200,85	13.200,85	-	13.200,85	-	100,00
03.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	450,08	-	-	-	450,08	2,94	1.323,24	-	-	-	1.323,24	-
03.002.004	Colchão de areia	m3	101,03	101,03		101,03	-	101,15	10.219,18	10.219,18	-	10.219,18	-	100,00
03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.060,84	1.060,84		1.060,84	-	1,15	1.219,97	1.219,97	-	1.219,97	-	100,00

Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 27066653/87
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robinson Santos da Paiva
Eng. Civil CREA 27202935/4

José Cristiano Silva Weber
Engenheiro Civil
CREA 27066653/87

Engenharia e Construções LTM EPP
Ana Maria Silva Sampaio
Gerente

CPF 255.988.995.15

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 162/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			B.M.Nº. 04/2023					ORDEM DE SERVIÇO: 02/05/2023						
			PERÍODO: 04/07/2023 A 31/07/2023					DATA: 01/08/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	SALDO		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	
03.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								9.301,53	9.301,53	-	9.301,53	-	100,00
03.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	135,02	135,02		135,02	-	68,89	9.301,53	9.301,53	-	9.301,53	-	100,00
03.004	LIMPEZA								694,47	-	-	-	694,47	-
03.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.578,35	-		-	1.578,35	0,44	694,47	-	-	-	694,47	-
04	TRECHO 03								171.367,38	168.972,73	-	168.972,73	2.394,65	98,60
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								6.987,48	6.987,48	-	6.987,48	-	100,00
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.924,00	1.924,00		1.924,00	-	1,21	2.328,04	2.328,04	-	2.328,04	-	100,00
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af. 11/2019	m2	2.002,98	2.002,98		2.002,98	-	1,02	2.043,04	2.043,04	-	2.043,04	-	100,00
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	625,93	625,93		625,93	-	0,73	456,93	456,93	-	456,93	-	100,00
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.877,80	1.877,80		1.877,80	-	1,15	2.159,47	2.159,47	-	2.159,47	-	100,00
04.002	PAVIMENTAÇÃO								152.650,79	151.102,70	-	151.102,70	1.548,09	98,99
04.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.766,03	1.766,03		1.766,03	-	68,89	121.661,81	121.661,81	-	121.661,81	-	100,00
04.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	526,56	526,56		526,56	-	29,33	15.444,00	15.444,00	-	15.444,00	-	100,00
04.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	526,56	-		-	526,56	2,94	1.548,09	-	-	-	1.548,09	-
04.002.004	Colchão de areia	m3	123,62	123,62		123,62	-	101,15	12.504,16	12.504,16	-	12.504,16	-	100,00
04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.298,03	1.298,03		1.298,03	-	1,15	1.492,73	1.492,73	-	1.492,73	-	100,00
04.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								10.882,55	10.882,55	-	10.882,55	-	100,00
04.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	157,97	157,97		157,97	-	68,89	10.882,55	10.882,55	-	10.882,55	-	100,00
04.004	LIMPEZA								846,56	-	-	-	846,56	-
04.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.924,00	-		-	1.924,00	0,44	846,56	-	-	-	846,56	-
05	TRECHO 04								192.551,28	-	-	-	192.551,28	-
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								7.527,54	-	-	-	7.527,54	-
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.037,53	-		-	2.037,53	1,21	2.465,41	-	-	-	2.465,41	-
05.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af. 11/2019	m2	2.176,09	-		-	2.176,09	1,02	2.219,61	-	-	-	2.219,61	-
05.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	680,03	-		-	680,03	0,73	496,42	-	-	-	496,42	-
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	2.040,09	-		-	2.040,09	1,15	2.346,10	-	-	-	2.346,10	-
05.002	PAVIMENTAÇÃO								165.036,43	-	-	-	165.036,43	-
05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.760,41	-		-	1.760,41	68,89	121.274,64	-	-	-	121.274,64	-
05.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	923,74	-		-	923,74	29,33	27.093,29	-	-	-	27.093,29	-
05.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	923,74	-		-	923,74	2,94	2.715,80	-	-	-	2.715,80	-
05.002.004	Colchão de areia	m3	123,23	-		-	123,23	101,15	12.464,71	-	-	-	12.464,71	-
05.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.293,90	-		-	1.293,90	1,15	1.487,99	-	-	-	1.487,99	-

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 0715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paiva
Eng.º Civil CREA 27202939-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Cristiano Silva Weber
Engenheiro Civil
E.A. 27.066.65387


Dias Engenharia e Construções LTDA EPP
Ana Maria Silva Santos
Procuradora

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 162/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			B.M.º. 04/2023					ORDEM DE SERVIÇO: 02/05/2023						
			PERÍODO: 04/07/2023 A 31/07/2023					DATA: 01/08/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	SALDO		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	
05.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								19.090,80	-	-	-	19.090,80	-
05.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	277,12	-		-	277,12	68,89	19.090,80	-	-	-	19.090,80	-
05.004	LIMPEZA								896,51	-	-	-	896,51	-
05.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.037,53	-		-	2.037,53	0,44	896,51	-	-	-	896,51	-
06	EQUIPE DIRIGENTE								60.801,80	27.373,22	11.466,09	38.839,31	21.962,49	63,88
06.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	220,00	96,87	41,49	138,36	81,64	112,59	24.769,80	10.906,59	4.671,36	15.577,95	9.191,85	62,89
06.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	800,00	365,60	150,86	516,46	283,54	45,04	36.032,00	16.466,63	6.794,73	23.261,36	12.770,64	64,56
	Total geral								852.819,58	389.160,74	160.818,70	549.979,44	302.840,14	64,49
 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___					Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						

Dias Engenharia e Construções LTDA EPP
Ana Maria Silva Santos
Procuradora
CPF 255.988 995 15


José Cristiano Silva Weber
Engenheiro Civil
CREA 2706685387



Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Robinson Santos da Paiva
Eng. Civil CREA 2720293534
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04/2023

CONTRATO Nº: 162/2022	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
01	SERVIÇOS PRELIMINARES
01.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,30m - Rev 02_02/2022 = 1,00 mês
02	TRECHO 01
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES
	<p>Locação de serviços de pavimentação:</p> <p>$[(6,20 + 6,00) / 2,00] \times 26,10 = 159,21\text{m}^2$</p> <p>$[(6,00 + 7,20) / 2,00] \times 6,10 = 40,26\text{m}^2$</p> <p>$[(14,50 + 10,00) \times 8,50] / 2,00 = 104,13\text{m}^2$</p> <p>$[(10,00 + 4,63) \times 2,20] / 2,00 = 16,09\text{m}^2$</p> <p>$[(8,60 + 5,20) \times 6,60] / 2,00 = 45,54\text{m}^2$</p> <p>$[(7,10 + 6,00) / 2,00] \times 10,00 = 65,50\text{m}^2$</p> <p>$[(6,00 + 6,20) / 2,00] \times 20,00 = 122,00\text{m}^2$</p> <p>$[(6,20 + 6,10) / 2,00] \times 20,00 = 123,00\text{m}^2$</p> <p>$[(5,00 + 5,00) / 2,00] \times 1,00 = 5,00\text{m}^2$</p> <p>$[(6,10 + 6,10) / 2,00] \times 20,00 = 122,00\text{m}^2$</p> <p>$[(6,10 + 6,10) / 2,00] \times 20,00 = 122,00\text{m}^2$</p> <p>$[(6,10 + 6,10) / 2,00] \times 20,00 = 122,00\text{m}^2$</p> <p>$[(6,10 + 5,90) / 2,00] \times 20,00 = 120,00\text{m}^2$</p> <p>$[(5,90 + 6,00) / 2,00] \times 20,00 = 119,00\text{m}^2$</p> <p>$[(6,00 + 6,10) / 2,00] \times 20,00 = 121,00\text{m}^2$</p> <p>$[(6,10 + 6,10) / 2,00] \times 20,00 = 122,00\text{m}^2$</p> <p>$[(6,10 + 6,10) / 2,00] \times 25,00 = 152,50\text{m}^2$</p> <p>$[(6,00 + 6,00) / 2,00] \times 5,00 = 30,00\text{m}^2$</p> <p>02.001.001 Total = 1.711,23m²</p> <p>02.001.002 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019 = $1.711,23 + (417,10 \times 0,15) = \mathbf{1.773,80\text{m}^2}$</p> <p>02.001.003 Carga mecânica de material de 1ª categoria = $1.773,80 \times 0,25 \times 1,25 = \mathbf{554,31\text{m}^3}$</p> <p>02.001.004 Transporte local com caminhão basculante de 10m^3, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=$1,5\text{t/m}^3 = 554,31 \times 1,50 \times 2,00 = \mathbf{1.662,93\text{TKm}}$</p>


José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Dias Engenharia e Construções LTDA EPP
Ana Maria Silva Santos
 Procuradora
 CPF: 255.988.995-15


José Cristiano Silva Weber
 Engenheiro Civil
 CREA: 2706685387


Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04/2023

CONTRATO Nº: 162/2022	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
02.002	PAVIMENTAÇÃO
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico = $1.711,23 - 125,13 = 1.586,10m^2$
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 = $(3,55 + 20,00 + 20,00 + 60,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00 + 45,00) \times 2,00 = 417,10m$
02.002.004	Colchão de areia = $1.586,10 \times 0,07 = 111,03m^3$
02.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ = $111,03 \times 1,50 \times 7,00 = 1.165,78TKM$
02.003	DRENAGEM SUPERFICIAL
02.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico = $417,10 \times 0,30 = 125,13m^2$
06	EQUIPE DIRIGENTE
06.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares = $(149.352,61 \times 220,00) / 792.017,78 = 41,49h$
06.002	Mestre de obras com encargos complementares = $(149.352,61 \times 800,00) / 792.017,78 = 150,86h$

Dias Engenharia e Construções LTDA EPP
Ana Maria Silva Santos
Procuradora
CPF 255.988.995.15


José Cristiano Silva Weber
Engenheiro Civil
CREA 27066885387

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720290954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Van Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana




PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

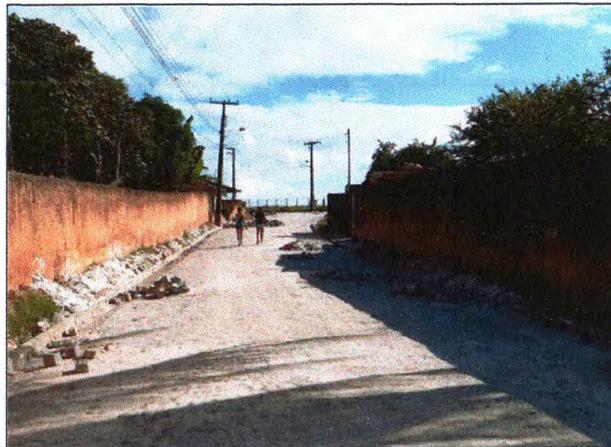


PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

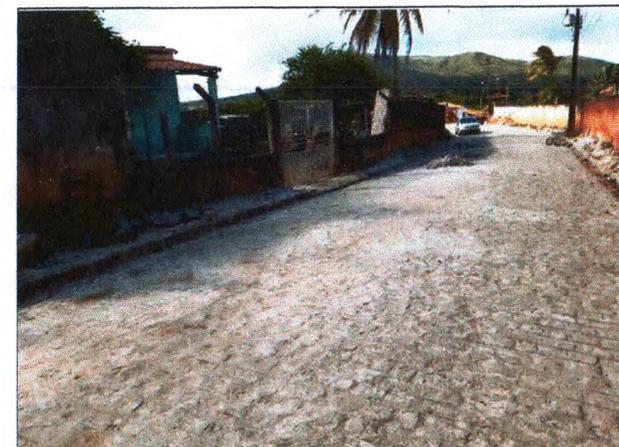

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

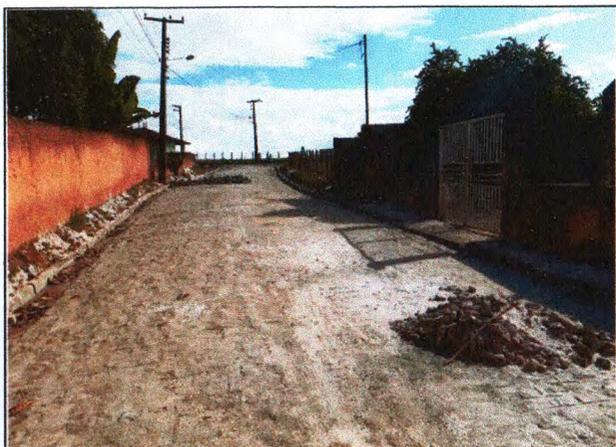

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

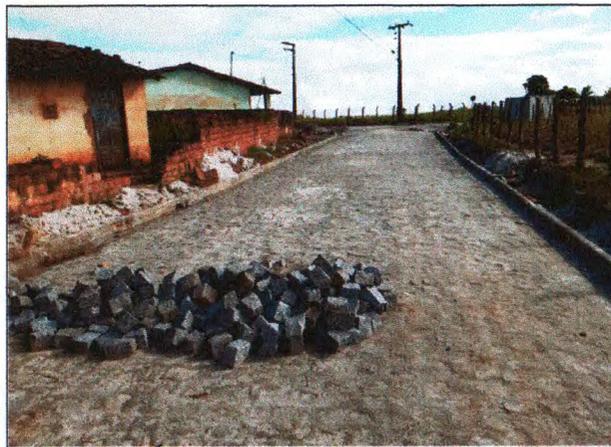

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01



PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO
RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA/SE

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
002/2022


DATA DA MEDIÇÃO: 01/08/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4

PERÍODO DOS SERVIÇOS:
04/07/2023 A 31/07/2023

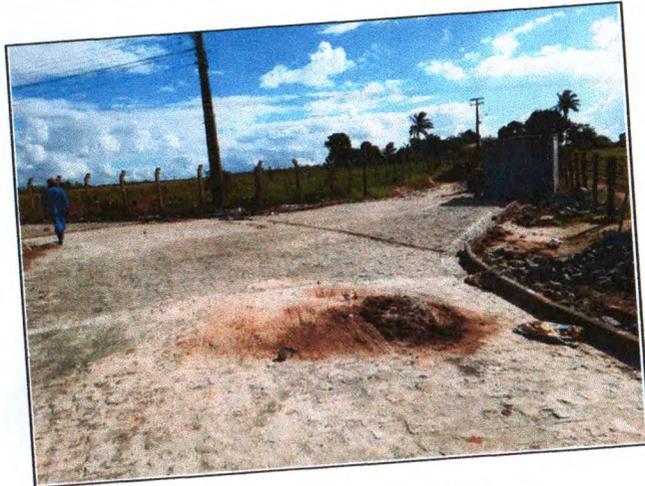


PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

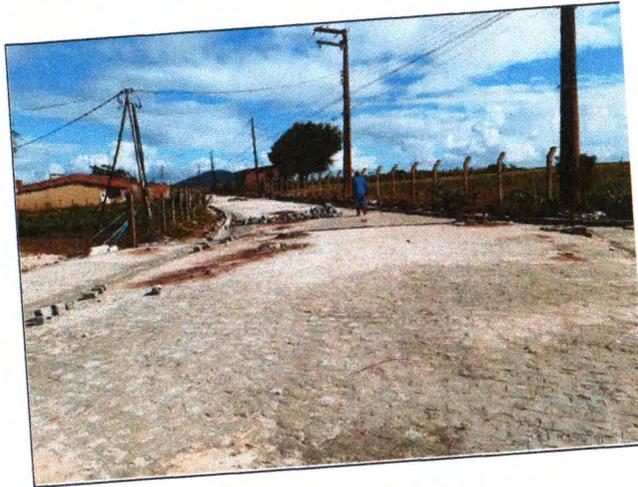


PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01




PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

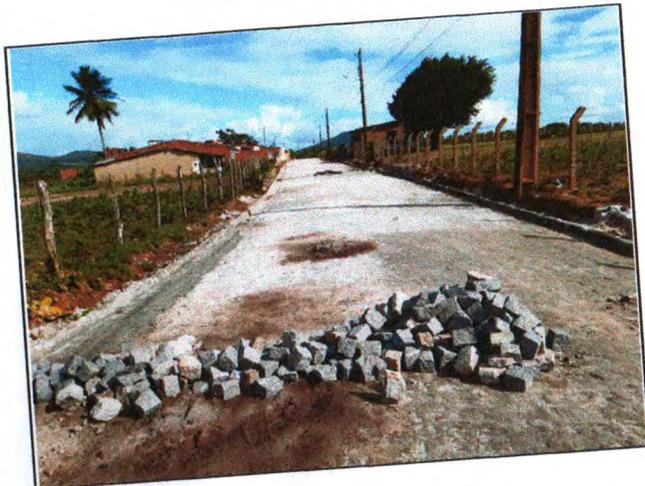

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

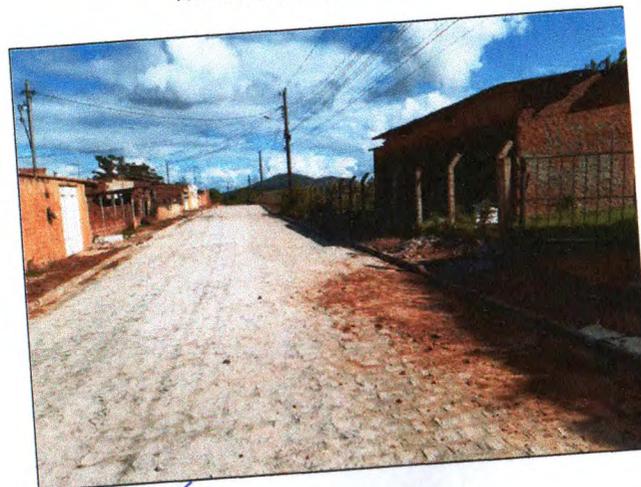

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

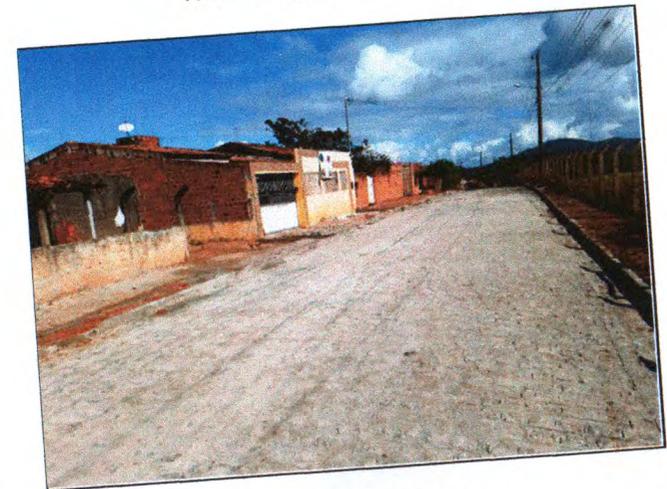

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

José Robson Santos da Silva
Eng. Civil CREA 27202939-4
Coordenador de Núcleo

José Cristiano Silva Weber
Engenheiro Civil
CREA. 2706685387

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO
RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA/SE

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
002/2022


DATA DA MEDIÇÃO: 01/08/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4


PERÍODO DOS SERVIÇOS:
04/07/2023 A 31/07/2023




PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

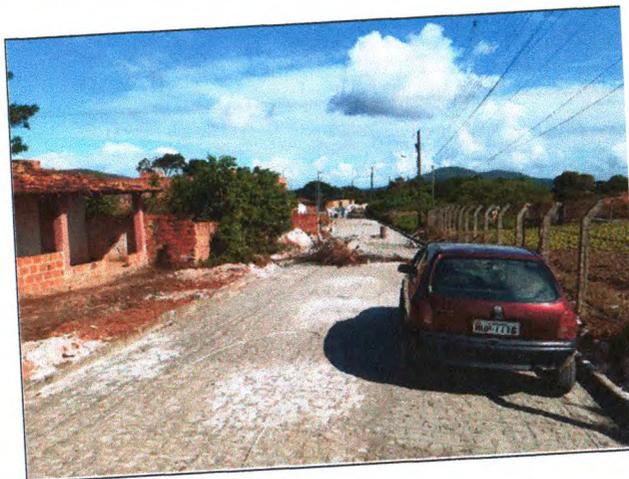

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

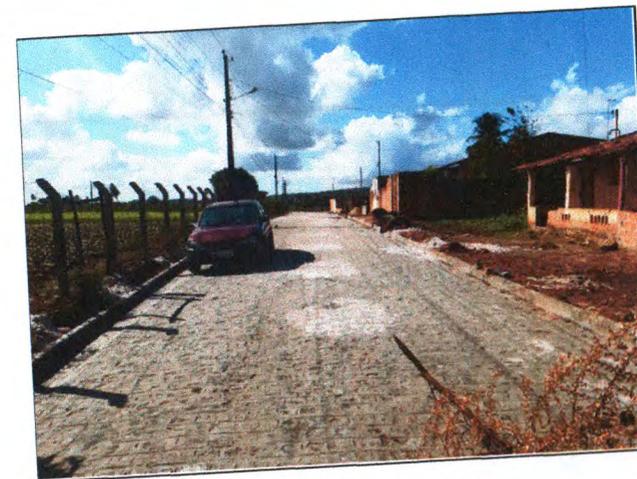


PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

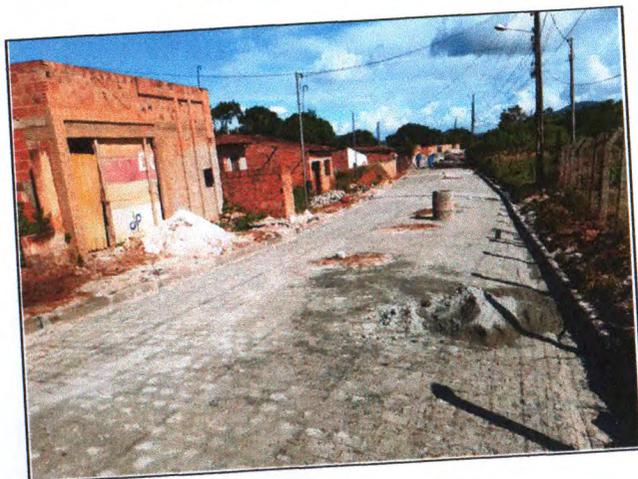

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01



PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

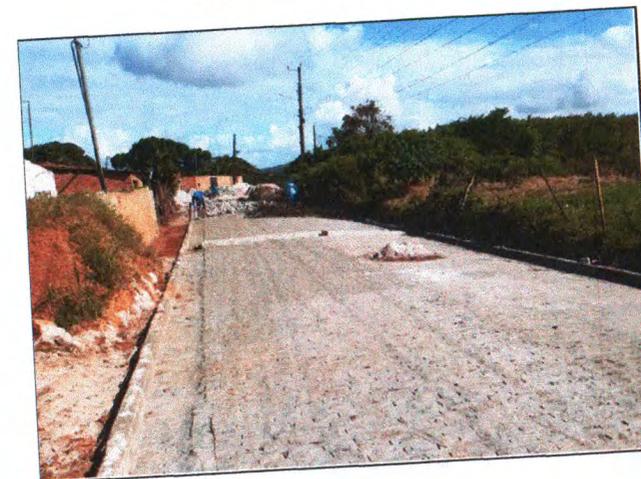

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01

José Reilson Santos da Paiva
Eng. Civil CREA 27202935-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Cristiano Silva Weber
Engenheiro Civil
CREA: 2706685387

Ivan Henrique Toyares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
