

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATO:
070/2022

Boletim de Medição: 04



CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

VIGÊNCIA:
EXECUÇÃO:

Período: 21/10/2023 à 30/11/2023

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Data de medição: 30/11/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ													
01.01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE													
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	410,00	349,00	61,00	410,00	-	112,86	90.904,15	77.404,31	13.499,84	90.904,15	-	100,00
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	820,00	698,00	122,00	820,00	-	45,29	46.272,60	39.388,14	6.884,46	46.272,60	-	100,00
01.01.001.003	Topógrafo com encargos complementares	h	275,00	235,00	40,00	275,00	-	18,56	37.137,80	31.612,42	5.525,38	37.137,80	-	100,00
01.01.001.004	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	275,00	235,00	40,00	275,00	-	8,69	5.104,00	4.361,60	742,40	5.104,00	-	100,00
01.01.002	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								34.494,42	31.951,26	-	31.951,26	2.543,16	
01.01.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	12,00	6,00	-	6,00	6,00	423,86	5.086,32	2.543,16	-	2.543,16	2.543,16	50,00
01.01.002.002	Ensaio Marshall	un.	100,00	100,00	-	100,00	-	286,70	28.670,00	28.670,00	-	28.670,00	-	100,00
01.01.002.003	Locação de container - Almoarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	5,00	5,00	-	5,00	-	147,62	738,10	738,10	-	738,10	-	100,00
01.01.003	TRECHO 01								255.381,30	215.917,48	8.738,07	224.655,55	30.725,75	
01.01.003.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.973,33	2.590,25	0,00	2.590,25	383,08	
01.01.003.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.708,81	1.488,65	-	1.488,65	220,16	1,74	2.973,33	2.590,25	-	2.590,25	383,08	87,12
01.01.003.002	PAVIMENTAÇÃO								243.088,67	213.327,23	-	213.327,23	29.761,44	
01.01.003.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	768,96	614,96	-	614,96	154,00	1,27	976,58	780,99	-	780,99	195,59	79,97
01.01.003.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	2.308,89	1.844,88	-	1.844,88	464,01	0,38	877,38	701,05	-	701,05	176,33	79,90
01.01.003.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.708,81	1.488,65	-	1.488,65	220,16	1,50	2.563,22	2.232,97	-	2.232,97	330,25	87,12
01.01.003.002.004	Reforço do sub-leito	m3	341,76	297,73	-	297,73	44,03	20,03	6.845,45	5.963,53	-	5.963,53	881,92	87,12
01.01.003.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	6.151,72	5.359,14	-	5.359,14	792,58	0,38	2.337,65	2.036,47	-	2.036,47	301,18	87,12
01.01.003.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	341,76	297,73	-	297,73	44,03	130,47	44.589,43	38.844,83	-	38.844,83	5.744,60	87,12
01.01.003.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	2.050,57	1.788,38	-	1.788,38	264,19	0,38	779,22	678,82	-	678,82	100,40	87,12
01.01.003.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	1.708,81	1.488,65	-	1.488,65	220,16	13,38	22.863,88	19.918,13	-	19.918,13	2.945,75	87,12
01.01.003.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.708,81	1.708,81	-	1.708,81	-	3,00	5.126,43	5.126,43	-	5.126,43	-	100,00
01.01.003.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	85,44	74,42	-	74,42	11,02	1.428,00	122.008,32	106.271,76	-	106.271,76	15.736,56	87,10
01.01.003.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t.km). af_07/2020	tkm	6.151,72	5.582,43	-	5.582,43	569,29	1,56	9.596,68	8.708,58	-	8.708,58	888,10	90,75
01.01.003.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t.km). af_07/2020	tkm	5.126,43	1.135,08	-	1.135,08	3.991,35	0,81	3.127,12	692,39	-	692,39	2.434,73	22,14
01.01.003.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	702,81	702,81	-	702,81	-	28,89	20.304,18	20.304,18	-	20.304,18	-	100,00
01.01.003.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,98	18,27	-	18,27	0,71	36,85	695,62	669,59	-	669,59	26,03	96,26
01.01.003.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	23,72	23,72	-	23,72	-	0,73	17,32	17,32	-	17,32	-	100,00
01.01.003.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	71,16	71,16	-	71,16	-	0,38	27,04	27,04	-	27,04	-	100,00
01.01.003.002.017	Colchão de areia	m3	3,16	3,16	-	3,16	-	104,91	331,52	331,52	-	331,52	-	100,00
01.01.003.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	56,93	56,93	-	56,93	-	0,38	21,63	21,63	-	21,63	-	100,00
01.01.003.003	DIVERSOS								9.319,30	-	8.738,07	8.738,07	681,23	
01.01.003.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	140,62	-	-	140,62	-	14,20	1.996,80	-	1.996,80	1.996,80	-	100,00
01.02.003.002.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	702,81	-	-	702,81	-	4,00	2.811,24	-	2.811,24	2.811,24	-	100,00
01.01.003.002.003	Limpeza geral	m2	1.708,81	-	-	1.488,65	220,16	2,84	4.511,26	-	3.930,03	3.930,03	581,23	87,12
01.01.004	TRECHO 02								259.341,67	235.408,23	8.085,32	243.493,55	16.848,12	
01.01.004.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.102,00	2.869,85	0,00	2.869,85	232,15	
01.01.004.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.782,76	1.649,34	-	1.649,34	133,42	1,74	3.102,00	2.869,85	-	2.869,85	232,15	92,52
01.01.004.002	PAVIMENTAÇÃO								247.802,11	232.538,38	-	232.538,38	15.263,73	
01.01.004.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	802,24	94,04	-	94,04	708,20	1,27	1.018,84	119,43	-	119,43	899,41	11,72
01.01.004.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	2.406,73	282,12	-	282,12	2.124,61	0,38	914,56	107,20	-	107,20	807,36	11,72
01.01.004.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.782,76	1.649,34	-	1.649,34	133,42	1,50	2.674,14	2.474,01	-	2.474,01	200,13	92,52
01.01.004.002.004	Reforço do sub-leito	m3	356,55	329,86	-	329,86	26,69	20,03	7.141,70	6.607,09	-	6.607,09	534,61	92,51
01.01.004.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	6.417,94	5.937,64	-	5.937,64	480,30	0,38	2.438,82	2.256,30	-	2.256,30	182,52	92,52
01.01.004.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	356,55	329,86	-	329,86	26,69	130,47	46.519,08	43.036,83	-	43.036,83	3.482,25	92,51
01.01.004.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	2.139,31	1.979,21	-	1.979,21	160,10	0,38	812,94	752,09	-	752,09	60,85	92,51
01.01.004.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	1.782,76	1.649,34	-	1.649,34	133,42	13,38	23.853,33	22.068,16	-	22.068,16	1.785,17	92,52

AGC CONSTRUÇÕES
EMPREENDEIMENTOS LTDA
Pedro Luiz C. O. Pessoa
Engenheiro Civil
CREA 13669/0

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Henrique Moraes Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATO: 070/2022

Boletim de Medição: 04

CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

VIGÊNCIA: Período: 21/10/2023 à 30/11/2023

EEXECUÇÃO: Data de medição: 30/11/2023



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
SERVIÇOS														
01.01.004.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.782,76	1.782,76	-	1.782,76	-	3,00	5.348,28	5.348,28	-	5.348,28	-	100,00
01.01.004.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	89,14	85,76	-	85,76	3,38	1.428,00	127.291,92	122.465,28	-	122.465,28	4.826,64	96,21
01.01.004.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: btkm). af_07/2020	tkm	6.417,94	6.417,94	-	6.417,94	-	1,56	10.011,99	10.011,99	-	10.011,99	-	100,00
01.01.004.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: btkm). af_07/2020	tkm	5.348,28	1.307,92	-	1.307,92	4.040,36	0,61	3.262,45	797,82	-	797,82	2.464,63	24,45
01.01.004.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	542,41	542,41	-	542,41	-	28,89	15.670,22	15.670,22	-	15.670,22	-	100,00
01.01.004.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	14,65	14,10	-	14,10	0,55	36,65	536,92	516,76	-	516,76	20,16	96,25
01.01.004.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,31	18,31	-	18,31	-	0,73	13,37	13,37	-	13,37	-	100,00
01.01.004.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	54,92	54,92	-	54,92	-	0,38	20,87	20,87	-	20,87	-	100,00
01.01.004.002.017	Colchão de areia	m3	2,44	2,44	-	2,44	-	104,91	255,98	255,98	-	255,98	-	100,00
01.01.004.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	43,94	43,94	-	43,94	-	0,38	16,70	16,70	-	16,70	-	100,00
01.01.004.003	DIVERSOS								8.437,66	-	8.085,32	8.085,32	352,24	
01.01.004.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	109,96	-	-	109,96	-	14,20	1.561,43	-	1.561,43	1.561,43	-	100,00
01.01.004.002.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	542,41	-	-	542,41	-	4,00	2.169,64	-	2.169,64	2.169,64	-	100,00
01.01.004.002.003	Limpeza geral	m2	1.782,76	-	-	1.649,34	133,42	2,64	4.706,49	-	4.354,25	4.354,25	352,24	92,52
01.01.005	TRECHO 03								263.607,19	239.334,24	9.044,77	248.379,01	5.228,11	
01.01.005.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.997,85	2.958,00	0,00	2.958,00	39,84	
01.01.005.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.722,90	1.700,00	-	1.700,00	22,90	1,74	2.997,85	2.958,00	-	2.958,00	39,84	98,67
01.01.005.002	PAVIMENTAÇÃO								241.504,11	236.376,24	-	236.376,24	5.127,81	
01.01.005.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	775,31	775,31	-	775,31	-	1,27	984,64	984,64	-	984,64	-	100,00
01.01.005.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	2.325,92	2.325,92	-	2.325,92	-	0,36	883,85	883,85	-	883,85	-	100,00
01.01.005.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.722,90	1.700,00	-	1.700,00	22,90	1,50	2.584,35	2.550,00	-	2.550,00	34,34	98,67
01.01.005.002.004	Reforço do sub-leito	m3	344,58	340,00	-	340,00	4,58	20,03	6.901,94	6.810,20	-	6.810,20	91,73	98,67
01.01.005.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	6.202,44	6.120,00	-	6.120,00	82,44	0,36	2.356,93	2.325,60	-	2.325,60	31,32	98,67
01.01.005.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples, exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	344,58	340,00	-	340,00	4,58	130,47	44.957,35	44.359,80	-	44.359,80	597,54	98,67
01.01.005.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	2.067,48	2.040,00	-	2.040,00	27,48	0,36	785,64	775,20	-	775,20	10,43	98,67
01.01.005.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	1.722,90	1.700,00	-	1.700,00	22,90	13,36	23.052,40	22.746,00	-	22.746,00	306,40	98,67
01.01.005.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.722,90	1.722,90	-	1.722,90	-	3,00	5.168,70	5.168,70	-	5.168,70	-	100,00
01.01.005.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	86,15	85,00	-	85,00	1,15	1.428,00	123.022,20	121.380,00	-	121.380,00	1.642,20	98,67
01.01.005.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: btkm). af_07/2020	tkm	6.202,44	6.202,44	-	6.202,44	-	1,56	9.675,81	9.675,81	-	9.675,81	-	100,00
01.01.005.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: btkm). af_07/2020	tkm	5.168,70	1.296,25	-	1.296,25	3.872,45	0,61	3.152,91	790,70	-	790,70	2.362,21	25,06
01.01.005.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	590,47	589,47	-	589,47	1,00	28,89	17.058,68	17.029,78	-	17.029,78	28,90	99,83
01.01.005.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,94	15,32	-	15,32	0,62	36,65	584,20	561,47	-	561,47	22,73	96,11
01.01.005.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	19,93	19,92	-	19,92	0,01	0,73	14,55	14,54	-	14,54	0,01	99,93
01.01.005.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	59,79	59,77	-	59,77	0,02	0,36	22,72	22,71	-	22,71	-	99,96
01.01.005.002.017	Colchão de areia	m3	2,66	2,66	-	2,66	-	104,91	279,06	279,06	-	279,06	-	100,00
01.01.005.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	47,83	47,83	-	47,83	-	0,36	18,18	18,18	-	18,18	-	100,00
01.01.005.003	DIVERSOS								9.105,23	-	9.044,77	9.044,77	60,46	
01.01.005.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	154,57	-	-	154,57	-	14,20	2.194,89	-	2.194,89	2.194,89	-	100,00
01.01.005.002.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	590,47	-	-	590,47	-	4,00	2.361,88	-	2.361,88	2.361,88	-	100,00
01.01.005.002.003	Limpeza geral	m2	1.722,90	-	-	1.700,00	22,90	2,64	4.548,46	-	4.488,00	4.488,00	60,46	98,67
01.01.006	TRECHO 04								270.060,60	258.319,36	9.221,11	267.540,47	2.520,12	
01.01.006.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.186,38	3.186,38	0,00	3.186,38	0,00	
01.01.006.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.831,25	1.831,25	-	1.831,25	-	1,74	3.186,38	3.186,38	-	3.186,38	-	100,00
01.01.006.002	PAVIMENTAÇÃO								257.653,11	255.132,98	-	255.132,98	2.520,12	

AGC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA
 EMPREENDIMENTOS LTDA
 Pedro Luiz G.O. Pessoa
 Engenheiro Civil
 CREA 13699/D

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATO:
070/2022

Boletim de Medição: 04

CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

VIGÊNCIA:
EXECUÇÃO:

Período: 21/10/2023 à 30/11/2023



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Data de medição: 30/11/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
SERVIÇOS														
01.01.006.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	824,06	793,46	-	793,46	30,60	1,27	1.046,56	1.007,69	-	1.007,69	38,86	96,29
01.01.006.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	2.472,19	2.380,38	-	2.380,38	91,81	0,38	939,43	904,54	-	904,54	34,89	96,29
01.01.006.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.831,25	1.831,25	-	1.831,25	-	1,50	2.746,88	2.746,88	-	2.746,88	-	100,00
01.01.006.002.004	Reforço do sub-leito	m3	366,25	366,25	-	366,25	-	20,03	7.335,99	7.335,99	-	7.335,99	-	100,00
01.01.006.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	6.592,50	6.592,50	-	6.592,50	-	0,38	2.905,15	2.505,15	-	2.505,15	-	100,00
01.01.006.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	366,25	366,25	-	366,25	-	130,47	47.784,64	47.784,64	-	47.784,64	-	100,00
01.01.006.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	2.197,50	2.197,50	-	2.197,50	-	0,38	835,05	835,05	-	835,05	-	100,00
01.01.006.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	1.831,25	1.831,25	-	1.831,25	-	13,38	24.502,13	24.502,13	-	24.502,13	-	100,00
01.01.006.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.831,25	1.831,25	-	1.831,25	-	3,00	5.493,75	5.493,75	-	5.493,75	-	100,00
01.01.006.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	91,56	91,56	-	91,56	-	1.428,00	130.747,68	130.747,68	-	130.747,68	-	100,00
01.01.006.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t.km). af_07/2020	tkm	6.592,50	6.592,50	-	6.592,50	-	1,56	10.284,30	10.284,30	-	10.284,30	-	100,00
01.01.006.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t.km). af_07/2020	tkm	5.493,75	1.523,58	-	1.523,58	3.970,17	0,61	3.351,19	929,38	-	929,38	2.421,81	27,73
01.01.006.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	659,54	659,54	-	659,54	-	28,89	19.054,11	19.054,11	-	19.054,11	-	100,00
01.01.006.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	17,81	17,14	-	17,14	0,67	36,65	652,74	628,18	-	628,18	24,56	96,24
01.01.006.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	22,26	22,26	-	22,26	-	0,73	16,25	16,25	-	16,25	-	100,00
01.01.006.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	66,78	66,78	-	66,78	-	0,38	25,38	25,38	-	25,38	-	100,00
01.01.006.002.017	Colchão de areia	m3	2,97	2,97	-	2,97	-	104,91	311,58	311,58	-	311,58	-	100,00
01.01.006.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	53,42	53,42	-	53,42	-	0,38	20,30	20,30	-	20,30	-	100,00
01.01.006.003	DIVERSOS								9.221,11	-	9.221,11	9.221,11	-	
01.01.006.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	123,13	-	-	123,13	-	14,20	1.748,45	-	-	1.748,45	1.748,45	100,00
01.01.006.002.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	659,54	-	-	659,54	-	4,00	2.638,16	-	-	2.638,16	2.638,16	100,00
01.01.006.002.003	Limpeza geral	m2	1.831,25	-	-	1.831,25	-	2,84	4.834,50	-	-	4.834,50	4.834,50	100,00
01.01.007	TRECHO 05								184.908,02	169.941,44	6.327,03	176.168,47	6.739,62	
01.01.007.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.162,79	2.064,96	0,00	2.064,96	97,82	
01.01.007.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.242,98	1.186,76	-	1.186,76	56,22	1,74	2.162,79	2.064,96	-	2.064,96	97,82	95,48
01.01.007.002	PAVIMENTAÇÃO								176.269,77	167.776,48	-	167.776,48	8.493,27	
01.01.007.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	559,34	536,51	-	536,51	22,83	1,27	710,36	681,36	-	681,36	29,00	95,92
01.01.007.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	1.678,02	1.609,53	-	1.609,53	68,49	0,38	637,65	611,62	-	611,62	26,03	95,92
01.01.007.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.242,98	1.186,76	-	1.186,76	56,22	1,50	1.864,47	1.780,14	-	1.780,14	84,32	95,48
01.01.007.002.004	Reforço do sub-leito	m3	248,60	237,35	-	237,35	11,25	20,03	4.979,46	4.754,12	-	4.754,12	225,34	95,47
01.01.007.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	4.474,73	4.272,33	-	4.272,33	202,40	0,38	1.700,40	1.623,48	-	1.623,48	76,92	95,48
01.01.007.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	248,60	237,35	-	237,35	11,25	130,47	32.434,84	30.967,05	-	30.967,05	1.467,79	95,47
01.01.007.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	1.491,58	1.424,11	-	1.424,11	67,47	0,38	566,80	541,16	-	541,16	25,64	95,48
01.01.007.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	1.242,98	1.186,76	-	1.186,76	56,22	13,38	16.631,07	15.878,84	-	15.878,84	752,23	95,48
01.01.007.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.242,98	1.242,98	-	1.242,98	-	3,00	3.728,94	3.728,94	-	3.728,94	-	100,00
01.01.007.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	62,15	59,33	-	59,33	2,82	1.428,00	88.750,20	84.723,24	-	84.723,24	4.026,95	95,46
01.01.007.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t.km). af_07/2020	tkm	4.474,73	4.450,35	-	4.450,35	24,38	1,56	6.980,58	6.942,53	-	6.942,53	38,05	99,45
01.01.007.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t.km). af_07/2020	tkm	3.728,94	904,90	-	904,90	2.824,04	0,61	2.274,65	551,98	-	551,98	1.722,67	24,27
01.01.007.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	493,02	493,02	-	493,02	-	28,89	14.243,35	14.243,35	-	14.243,35	-	100,00
01.01.007.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	13,31	12,81	-	12,81	0,50	36,65	487,81	469,48	-	469,48	18,33	96,24
01.01.007.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	16,64	16,64	-	16,64	-	0,73	12,15	12,15	-	12,15	-	100,00
01.01.007.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	49,92	49,92	-	49,92	-	0,38	18,97	18,97	-	18,97	-	100,00

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Pedro Luiz C. O. Pessoa
Engenheiro Civil
CREA 13699/D

José Robson Santos da Paixã
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATO:
070/2022

Boletim de Medição: 04

CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

VIGÊNCIA:
EXECUÇÃO:

Período: 21/10/2023 à 30/11/2023



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Data de medição: 30/11/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
SERVIÇOS														
01.01.007.002.017	Colchão de areia	m3	2,22	2,22	-	2,22	-	104,91	232,90	232,90	-	232,90	-	100,00
01.01.007.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	39,93	39,93	-	39,93	-	0,38	15,17	15,17	-	15,17	-	100,00
01.01.007.003	DIVERSOS								6.475,46	-	6.327,03	6.327,03	146,43	
01.01.007.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	86,05	-	86,05	86,05	-	14,20	1.221,91	-	1.221,91	1.221,91	-	100,00
01.01.007.002.002	Pintura de meio fio (caliação)	m	493,02	-	493,02	493,02	-	4,00	1.972,08	-	1.972,08	1.972,08	-	100,00
01.01.007.002.003	Limpeza geral	m2	1.242,98	-	1.186,76	1.186,76	56,22	2,64	3.281,47	-	3.133,04	3.133,04	148,43	95,48
01.01.008	TRECHO 06								374.949,78	303.263,05	11.663,85	314.969,90	60.022,86	
01.01.008.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								4.421,58	3.253,36	0,00	3.253,36	1.168,22	
01.01.008.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.541,14	1.869,75	-	1.869,75	671,39	1,74	4.421,58	3.253,36	-	3.253,36	1.168,22	73,58
01.02.008.002	PAVIMENTAÇÃO								367.091,88	300.009,69	-	300.009,69	57.082,17	
01.01.008.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1.143,51	919,80	-	919,80	223,71	1,27	1.452,26	1.168,14	-	1.168,14	284,12	80,44
01.01.008.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	3.430,54	2.759,40	-	2.759,40	671,14	0,38	1.303,61	1.048,57	-	1.048,57	255,04	80,44
01.01.008.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	2.541,14	1.869,75	-	1.869,75	671,39	1,50	3.811,71	2.804,62	-	2.804,62	1.007,09	73,58
01.01.008.002.004	Reforço do sub-leito	m3	508,23	373,95	-	373,95	134,28	20,03	10.179,85	7.490,21	-	7.490,21	2.689,64	73,58
01.01.008.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	1.524,68	1.524,68	-	1.524,68	-	0,38	579,38	579,38	-	579,38	-	100,00
01.01.008.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	508,23	373,95	-	373,95	134,28	130,47	66.308,77	48.789,25	-	48.789,25	17.519,52	73,58
01.01.008.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	3.049,37	2.243,70	-	2.243,70	805,67	0,38	1.158,76	852,60	-	852,60	306,16	73,58
01.01.008.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	2.541,14	1.869,75	-	1.869,75	671,39	13,38	34.000,45	25.017,25	-	25.017,25	8.983,20	73,58
01.01.008.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	2.541,14	2.541,14	-	2.541,14	-	3,00	7.623,42	7.623,42	-	7.623,42	-	100,00
01.01.008.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	127,06	112,18	-	112,18	14,88	1.428,00	181.441,68	160.193,04	-	160.193,04	21.248,64	88,29
01.01.008.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	9.148,10	8.413,86	-	8.413,86	734,24	1,56	14.271,04	13.125,62	-	13.125,62	1.145,42	91,97
01.01.008.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	7.623,42	1.710,82	-	1.710,82	5.912,60	0,61	4.650,29	1.043,60	-	1.043,60	3.606,69	22,44
01.01.008.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	995,57	995,57	-	995,57	-	28,89	28.762,02	28.762,02	-	28.762,02	-	100,00
01.01.008.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	26,88	25,88	-	25,88	1,00	36,65	985,15	948,50	-	948,50	36,65	96,28
01.01.008.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	33,60	33,60	-	33,60	-	0,73	24,53	24,53	-	24,53	-	100,00
01.01.008.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	100,80	100,80	-	100,80	-	0,38	38,30	38,30	-	38,30	-	100,00
01.01.008.002.017	Colchão de areia	m3	4,48	4,48	-	4,48	-	104,91	470,00	470,00	-	470,00	-	100,00
01.01.008.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	80,64	80,64	-	80,64	-	0,38	30,64	30,64	-	30,64	-	100,00
01.01.008.003	DIVERSOS								13.436,32	-	11.663,85	11.663,85	1.772,47	
01.01.008.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	193,34	-	193,34	193,34	-	14,20	2.745,43	-	2.745,43	2.745,43	-	100,00
01.01.008.002.002	Pintura de meio fio (caliação)	m	995,57	-	995,57	995,57	-	4,00	3.982,28	-	3.982,28	3.982,28	-	100,00
01.01.008.002.003	Limpeza geral	m2	2.541,14	-	1.869,75	1.869,75	671,39	2,64	6.708,61	-	4.936,14	4.936,14	1.772,47	73,58
01.01.009	TRECHO 07								133.775,09	115.116,42	11.869,10	126.985,52	6.789,54	
01.01.009.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.614,27	1.441,31	0,00	1.441,31	172,96	
01.01.009.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	870,27	828,34	-	828,34	41,93	1,74	1.514,27	1.441,31	-	1.441,31	72,96	95,18
01.01.009.002	PAVIMENTAÇÃO								120.281,02	113.675,11	-	113.675,11	6.605,98	
01.01.009.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	391,62	208,18	-	208,18	183,44	1,27	497,36	264,38	-	264,38	232,98	53,16
01.01.009.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	1.174,86	624,55	-	624,55	550,31	0,38	446,45	237,32	-	237,32	209,13	53,16
01.01.009.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	870,27	828,34	-	828,34	41,93	1,50	1.305,41	1.242,51	-	1.242,51	62,90	95,18
01.01.009.002.004	Reforço do sub-leito	m3	174,05	165,66	-	165,66	8,39	20,03	3.486,22	3.318,16	-	3.318,16	168,06	95,18
01.01.009.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	522,16	522,16	-	522,16	-	0,38	198,42	198,42	-	198,42	-	100,00
01.01.009.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	174,05	165,66	-	165,66	8,39	130,47	22.708,30	21.613,66	-	21.613,66	1.094,64	95,18
01.01.009.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	1.044,32	994,00	-	994,00	50,32	0,38	396,84	377,72	-	377,72	19,11	95,18
01.01.009.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	870,27	828,34	-	828,34	41,93	13,38	11.644,21	11.083,18	-	11.083,18	561,02	95,18

AGC CONSTRUÇÕES
EMPRESA DE
EMPRESAMENTOS LTDA
R. Luiz C. O. Pessoa
Engenheiro Civil
CREA 13699/D

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Luiz Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ	CONTRATO: 070/2022	Boletim de Medição: 04
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.	VIGÊNCIA: EXECUÇÃO:	Período: 21/10/2023 à 30/11/2023
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		Data de medição: 30/11/2023






Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
SERVIÇOS														
01.01.009.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	870,27	870,27	-	870,27	-	3,00	2.610,81	2.610,81	-	2.610,81	-	100,00
01.01.009.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	43,51	41,41	-	41,41	2,10	1.428,00	62.132,28	59.133,48	-	59.133,48	2.998,80	95,17
01.01.009.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	3.132,97	3.106,27	-	3.106,27	26,70	1,56	4.887,43	4.845,77	-	4.845,77	41,65	99,15
01.01.009.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	2.610,81	631,60	-	631,60	1.979,21	0,61	1.592,59	385,27	-	385,27	1.207,32	24,19
01.01.009.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	275,06	275,06	-	275,06	-	28,89	7.946,48	7.946,48	-	7.946,48	-	100,00
01.01.009.002.014	Escavação manual de vaia ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,43	7,15	-	7,15	0,28	36,65	272,31	262,04	-	262,04	10,27	96,23
01.01.009.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	9,28	9,28	-	9,28	-	0,73	6,77	6,77	-	6,77	-	100,00
01.01.009.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	27,85	27,85	-	27,85	-	0,38	10,58	10,58	-	10,58	-	100,00
01.01.009.002.017	Colchão de areia	m3	1,24	1,24	-	1,24	-	104,91	130,09	130,09	-	130,09	-	100,00
01.01.009.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	22,28	22,28	-	22,28	-	0,38	8,47	8,47	-	8,47	-	100,00
01.01.009.003	DIVERSOS								4.608,44	-	4.497,74	4.497,74	110,70	
01.01.009.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	85,26	-	-	85,26	-	14,20	1.210,69	-	1.210,69	1.210,69	-	100,00
01.01.009.002.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	275,06	-	-	275,06	-	4,00	1.100,24	-	1.100,24	1.100,24	-	100,00
01.01.009.002.003	Limpeza geral	m2	870,27	-	-	828,34	41,93	2,64	2.297,51	-	2.186,81	2.186,81	110,70	95,18
01.01.010	SINALIZAÇÃO VERTICAL								7.371,36	-	7.371,36	7.371,36	-	
01.01.010.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un.	12,00	-	-	12,00	-	614,28	7.371,36	-	7.371,36	7.371,36	-	100,00
TOTAL:									1.857.422,20	1.646.555,79	78.449,09	1.725.004,88	132.417,32	92,86%
PERCENTUAL										88,64%	4,22%	92,86%	7,14%	


AGC CONSTRUÇÕES -
EMPRESA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
Pedro Luiz C. O. Pessoa
Engenheiro Civil
CREA 13699/D


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ					
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.		MEDIDAÇÃO		4	
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.		Período: 21/10/2023 à 30/11/2023			
SERVIÇO:	01.01.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
ITEM:	01.01.010.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50			
Serviço		VALORES		UNID.	QUANT.
		Quantidade		UNID.	Total
Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de		12,00		UND	12,000
EXECUTADO NO PERÍODO:					12,000
ACUMULADO ANTERIOR:					
ACUMULADO ATUAL:					12,000
SALDO DO CONTRATO:					
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					
À MEDIR NO PERÍODO:					12,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CONTRATO: 070/2022				CÁLCULO EXPLICATIVO	



 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil CREA 105638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 AGC CONSTRUÇÕES
 EMPREENDIMENTOS LTDA
 Pedro Luiz C. O. Pessoa
 Engenheiro Civil
 CREA 13699/D

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ			
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.		MEDIÇÃO	4
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.		Período: 21/10/2023 à 30/11/2023	
SERVIÇO:	01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE	
ITEM:	01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	
Serviço	VALORES	UNID.	QUANT.
	Quantidade	H	Total
Período	61,00	H	61,000
EXECUTADO NO PERÍODO:			61,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			
À MEDIR NO PERÍODO:			61,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CONTRATO: 070/2022		CÁLCULO EXPLICATIVO	


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil CREA 2115638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 AGC CONSTRUÇÕES
 EMPREENDIMENTOS LTDA
 Pedro Luiz C. O. Pessoa
 Engenheiro Civil
 CREA 13699/D


MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAÇÃO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ


CONTRATADA: AGC

CONTRATANTE: Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - Itabaiana

RUAS	ESTACA		Extensão de OS / Ligações Prediais	Extensão executada no período	EMPOLAMENTO	CONTRAÇÃO DE MATERIAL	DENSIDADE DE DESCARTE	LARGURA SUB-LEITO	Volume de corte	ESPESURA SUB-LEITO	ESPESURA SUB-BASE	ESPESURA BASE	ESPESURA CONCRETO BETUMINOSO	PAVIMENTAÇÃO						
	INICIO	FINAL												01.01.004.002.001-	01.01.004.002.002-	01.01.004.002.003-				
LEGENDAS			A1	A2	A3	A4	A5	A10	A11	A12	A13	A14	A15	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal	Pintura de meio fio (caiação)	Limpeza geral				
CALCULOS UTILIZADOS			proj	proj	FATOR	FATOR	FATOR	PREU	Execução	Execução	proj	Campo	Campo							
UNIDADES			(m)	(m)	FATOR	FATOR	FATOR		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	m2	m	m2				
PAVIMENTAÇÃO																				
Ruas																				
THECHO 02 RUA "D"			+	12	+	12,42	252,42	252,42	1,30	1,15	1,50			0,50	0,20	0,20	0,05	109,96	542,41	1.649,34
			+		+															
			+		+															
			+		+															
			+		+															
			+		+															
			+		+															
			+		+															
			+		+															
			+		+															
			+		+															
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO (A):														109,96	542,41	1.649,34				
QUANTIDADES:																				
REMANESCENTES ANTERIORES (ITEM SEM SALDO OU INEXISTENTE NA "OS")(B):																				
TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (C) = (A)+(B):														109,96	542,41	1.649,34				
DO SALDO DA ORDEM DE SERVIÇO(ANTERIOR À ESTA MEDIÇÃO) (D):														109,96	542,41	1.782,76				
DESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO (LIMITADAS AO SALDO DA "OS") (E):														109,96	542,41	1.649,34				
SERVIÇOS COM SALDO INEXISTENTE SERÃO MEDIDOS EM ADITIVO																				


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 AGC CONSTRUÇÃO E
 EMPREENDIMENTOS LTDA
 Pedro Luiz C. O. Pessoa
 Engenheiro Civil
 CREA 13699/D


MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAÇÃO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ


CONTRATADA: AGC

CONTRATANTE: Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - Itabaiana

RUAS	ESTACA		Extensão da OS / Ligações Prediais	Extensão executada no período	EMPOLAMENTO	CONTRAÇÃO DE MATERIAL	DENSIDADE DE DESCARTE	LARGURA SUB-LEITO	Volume de corte	ESPESURA SUB-LEITO	ESPESURA SUB-BASE	ESPESURA BASE	ESPESURA CONCRETO BETUMINOSO	PAVIMENTAÇÃO						
	INCIO	FINAL												01.01.006.002.001-	01.01.006.002.002-	01.01.006.002.003-				
														Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal	Pintura de meio fio (caiação)	Limpeza geral				
LEGENDAS			A1	A2	A3	A4	A5	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A35	A36	A37				
CALCULOS UTILIZADOS			proj	proj	FATOR	FATOR	FATOR		Execução	Execução	proj	Campo	Campo							
UNIDADES			(m)	(m)	FATOR	FATOR	FATOR		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	m2	m	m2				
PAVIMENTAÇÃO																				
Ruas																				
THECHO 04 - RUA "B"																				
		+	19	+	8	388,07	388,07	1,30	1,15	1,50	5,00		0,50	0,20	0,20	0,05	123,13	659,54	1.831,25	
		5	+	10	+	8														
		10	+	15	+	8														
		15	+	18	+	9														
		+		+																
		+		+																
		+		+																
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO (A):														123,13	659,54	1.831,25				
QUANTIDADES:														REMANESCENTES ANTERIORES (ITEM SEM SALDO OU INEXISTENTE NA "OS")(B):						
TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (C) = (A)+(B):														123,13	659,54	1.831,25				
DO SALDO DA ORDEM DE SERVIÇO(ANTERIOR À ESTA MEDIÇÃO) (D):														123,13	659,54	1.831,25				
DESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO (LIMITADAS AO SALDO DA"OS") (E):														123,13	659,54	1.831,25				
SERVIÇOS COM SALDO INEXISTENTE SERÃO MEDIDOS EM ADITIVO																				


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Yan Henrique Tomaz de Santana
 Eng. Civil CREA 1113638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 AGC CONSTRUÇÕES
 EMPREENDIMENTOS LTDA
 Pedro Luiz C. O. Pessoa
 Engenheiro Civil
 CREA 13699/D

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ



CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

Boletim de Medição: 04 Período: 21/10/2023 à 30/11/2023

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PINTURA DE MEIO FIO



PINTURA DE MEIO FIO



PINTURA DE MEIO FIO



PINTURA DE MEIO FIO



PINTURA DE MEIO FIO



PINTURA DE MEIO FIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATO: 070/2022


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

José Wilson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 272029954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AGC CONSTRUÇÕES
EMPREENDIMIENTOS LTDA
Pedro Luiz C. O. Pessoc
Engenheiro Civil
CREA 13699/D

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ



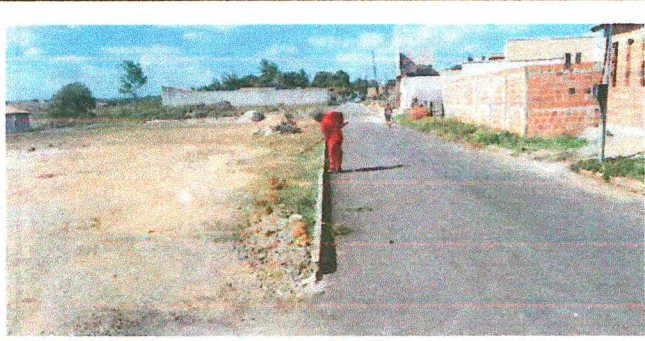
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

Boletim de Medição: 04 Período: 21/10/2023 à 30/11/2023

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LIMPEZA GERAL



LIMPEZA GERAL



LIMPEZA GERAL



LIMPEZA GERAL



PINTURA DE MEIO FIO



PINTURA DE MEIO FIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATO: 070/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

José Rubson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 27202/33954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Torres Santana
Eng.º Civil CREA 715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AGC CONSTRUÇÕES E
EMPREENHIMENTOS LTDA
Pedro Luiz C. O. Pessoa
Engenheiro Civil
CREA 13699/D

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ



Boletim de Medição: 04 Período: 21/10/2023 à 30/11/2023

CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATO: 070/2022

José Robson Santos da Paiva
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Antônio Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AGC CONSTRUÇÕES
EMPREENDEIMENTOS LTDA
Pedro Luiz C. O. Pessoa
Engenheiro Civil
CREA 13699/D
