

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS								BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 09/2026		
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME								B.M.Nº: 04				Data da medição: 07/07/2026		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Período: 27/05/2026 a 07/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
01	EQUIPE ADMINISTRATIVA								29.993,60	19.495,84	5.398,85	24.894,69	5.098,91	83,00
	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	100,00	65,00	18,00	83,00	17,00	117,20	11.720,00	7.618,00	2.109,60	9.727,60	1.992,40	83,00
01.001														
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	200,00	130,00	36,00	166,00	34,00	59,96	11.992,00	7.794,80	2.158,56	9.953,36	2.038,64	83,00
01.003	Vigia diurno com encargos complementares	h	320,00	208,00	57,60	265,60	54,40	19,63	6.281,60	4.083,04	1.130,69	5.213,73	1.067,87	83,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES								51.684,49	48.756,49	1.464,00	50.220,49	1.464,00	96,67
	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	313,97	3.767,64	3.767,64	0,00	3.767,64	0,00	100,00
02.001														
02.002	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	225,00	225,00		225,00	0,00	164,32	36.972,00	36.972,00	0,00	36.972,00	0,00	100,00
02.003	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	0,00	1.590,53	1.590,53	1.590,53	0,00	1.590,53	0,00	100,00
02.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	570,32	570,32	570,32	0,00	570,32	0,00	100,00
02.005	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	4,00	1,00	5,00	1,00	1.464,00	8.784,00	5.856,00	1.464,00	7.320,00	1.464,00	83,33
03	DEMOLIÇÃO/LIMPEZA								12.020,08	12.020,08	0,00	12.020,08	0,00	100,00
03.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	138,54	138,54		138,54	0,00	9,51	1.317,52	1.317,52	0,00	1.317,52	0,00	100,00
03.002	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	17,86	17,86		17,86	0,00	45,58	814,06	814,06	0,00	814,06	0,00	100,00
03.003	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	30,35	30,35		30,35	0,00	94,91	2.880,52	2.880,52	0,00	2.880,52	0,00	100,00
03.004	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	14,59	14,59		14,59	0,00	94,91	1.384,74	1.384,74	0,00	1.384,74	0,00	100,00
03.005	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1.373,40	1.373,40		1.373,40	0,00	1,80	2.472,12	2.472,12	0,00	2.472,12	0,00	100,00
03.006	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	81,21	81,21		81,21	0,00	10,18	826,72	826,72	0,00	826,72	0,00	100,00
03.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.192,83	2.192,83		2.192,83	0,00	1,06	2.324,40	2.324,40	0,00	2.324,40	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO								108.014,72	105.116,09	0,00	105.116,09	2.898,63	94,37
04.001	LOCAÇÃO OBRA								1.209,47	1.209,47	0,00	1.209,47	0,00	100,00
04.001.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.015,78	2.015,78		2.015,78	0,00	0,60	1.209,47	1.209,47	0,00	1.209,47	0,00	100,00
04.002	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO								106.805,25	103.906,62	0,00	103.906,62	2.898,63	88,73
04.003	PISO CONCRETO DESEMPOLADO								39.555,56	37.937,19	0,00	37.937,19	1.618,37	80,00
04.003.001	Lona plástica preta	m2	386,86	386,86		386,86	0,00	5,58	2.158,68	2.158,68	0,00	2.158,68	0,00	100,00
04.003.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	386,86	386,86		386,86	0,00	51,61	19.965,84	19.965,84	0,00	19.965,84	0,00	100,00
04.003.003	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	428,14	428,14		428,14	0,00	36,05	15.434,45	15.434,45	0,00	15.434,45	0,00	100,00
04.003.004	Pintura de meio fio (calção)	m	428,14			0,00	428,14	3,78	1.618,37	0,00	0,00	0,00	1.618,37	0,00
04.003.005	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	1,00		1,00	0,00	378,22	378,22	378,22	0,00	378,22	0,00	100,00
04.004	PISO AZUL								9.155,19	8.305,90	0,00	8.305,90	849,29	66,67

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Vicente Matheus Rocha Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA - SE 2707034703

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº: 09/2026			
								B.M.Nº: 04 Período: 27/05/2026 a 07/07/2026			Data da medição: 07/07/2026			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
04.004.001	Lona plástica preta	m2	103,32	103,32		103,32	0,00	5,58	576,53	576,53	0,00	576,53	0,00	100,00
04.004.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	103,32	103,32		103,32	0,00	74,81	7.729,37	7.729,37	0,00	7.729,37	0,00	100,00
04.004.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	103,32			0,00	103,32	8,22	849,29	0,00	0,00	0,00	849,29	0,00
04.005	PISO (PALCO)								6.938,11	6.507,14	0,00	6.507,14	430,97	85,71
04.005.001	Lona plástica preta	m2	42,20	42,20		42,20	0,00	5,58	235,48	235,48	0,00	235,48	0,00	100,00
04.005.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	42,20	42,20		42,20	0,00	74,81	3.156,98	3.156,98	0,00	3.156,98	0,00	100,00
04.005.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	2,73	2,73		2,73	0,00	76,40	208,57	208,57	0,00	208,57	0,00	100,00
04.005.004	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	3,27	3,27		3,27	0,00	10,18	33,29	33,29	0,00	33,29	0,00	100,00
04.005.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	4,67	4,67		4,67	0,00	19,57	91,39	91,39	0,00	91,39	0,00	100,00
04.005.006	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidrator sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.	m2	10,23	10,23		10,23	0,00	271,89	2.781,43	2.781,43	0,00	2.781,43	0,00	100,00
04.005.007	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	52,43			0,00	52,43	8,22	430,97	0,00	0,00	0,00	430,97	0,00
04.006	ESPAÇO AREIA								2.957,09	2.957,09	0,00	2.957,09	0,00	100,00
04.006.001	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	157,37	157,37		157,37	0,00	6,85	1.077,98	1.077,98	0,00	1.077,98	0,00	100,00
04.006.002	Colchão de areia	m3	15,73	15,73		15,73	0,00	119,46	1.879,11	1.879,11	0,00	1.879,11	0,00	100,00
04.007	PISO INTERTRAVADO VERMELHO								39.674,37	39.674,37	0,00	39.674,37	0,00	100,00
04.007.001	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af. 10/2022	m2	362,82	362,82		362,82	0,00	109,35	39.674,37	39.674,37	0,00	39.674,37	0,00	100,00
04.008	PISO INTERTRAVADO AMARELO								8.524,93	8.524,93	0,00	8.524,93	0,00	100,00
04.008.001	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af. 10/2022	m2	77,96	77,96		77,96	0,00	109,35	8.524,93	8.524,93	0,00	8.524,93	0,00	100,00
05	QUADRA								198.122,24	134.459,86	57.759,30	192.219,15	5.903,09	88,10
05.001	PISO QUADRA								67.176,08	66.022,98	0,00	66.022,98	1.153,10	83,33
05.001.001	Lona plástica preta	m2	431,41	431,41		431,41	0,00	5,58	2.407,27	2.407,27	0,00	2.407,27	0,00	100,00
05.001.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	431,41	431,41		431,41	0,00	16,32	7.040,61	7.040,61	0,00	7.040,61	0,00	100,00
05.001.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	431,41	431,41		431,41	0,00	34,62	14.935,41	14.935,41	0,00	14.935,41	0,00	100,00
05.001.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	431,41	431,41		431,41	0,00	63,23	27.278,05	27.278,05	0,00	27.278,05	0,00	100,00
05.001.005	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	431,41	431,41		431,41	0,00	33,29	14.361,64	14.361,64	0,00	14.361,64	0,00	100,00
05.001.006	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af. 05/2021	m	130,00			0,00	130,00	8,87	1.153,10	0,00	0,00	0,00	1.153,10	0,00
05.002	ALAMBRADO E MURETA								130.946,16	68.436,88	57.759,30	126.196,17	4.749,99	92,86

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS								BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 09/2026		
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME								B.M.Nº: 04				Data da medição: 07/07/2026		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Período: 27/05/2026 a 07/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
05.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	11,60	11,60		11,60	0,00	76,40	886,24	886,24	0,00	886,24	0,00	100,00
05.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	13,92	13,92		13,92	0,00	10,18	141,71	141,71	0,00	141,71	0,00	100,00
05.002.003	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	13,20	13,20		13,20	0,00	50,93	672,28	672,28	0,00	672,28	0,00	100,00
05.002.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	17,86	17,86		17,86	0,00	482,27	8.613,34	8.613,34	0,00	8.613,34	0,00	100,00
05.002.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	25,78	25,78		25,78	0,00	49,09	1.265,54	1.265,54	0,00	1.265,54	0,00	100,00
05.002.006	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,81	2,81		2,81	0,00	2.252,50	6.329,52	6.329,53	0,00	6.329,53	-0,01	100,00
05.002.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	109,07	109,07		109,07	0,00	35,92	3.917,79	3.917,79	0,00	3.917,79	0,00	100,00
05.002.008	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 10/2022	m2	109,07	109,07		109,07	0,00	6,06	660,96	660,96	0,00	660,96	0,00	100,00
05.002.009	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	109,07			0,00	109,07	43,55	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
05.002.010	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	2,88		2,88	2,88	0,00	711,75	2.049,84	0,00	2.049,84	2.049,84	0,00	100,00
05.002.011	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	383,84	191,92	191,92	383,84	0,00	239,42	91.898,97	45.949,49	45.949,49	91.898,97	0,00	100,00
05.002.012	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	31,25		31,25	31,25	0,00	26,77	836,56	0,00	836,56	836,56	0,00	100,00
05.002.013	Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência	kg	10,02		10,02	10,02	0,00	7,32	73,35	0,00	73,35	73,35	0,00	100,00
05.002.014	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	483,61		483,61	483,61	0,00	18,30	8.850,06	0,00	8.850,06	8.850,06	0,00	100,00
06	ARQUIBANCADA								12.549,11	11.288,77	0,00	11.288,77	1.260,34	85,71
06.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	7,38	7,38		7,38	0,00	76,40	563,83	563,83	0,00	563,83	0,00	100,00
06.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	8,86	8,86		8,86	0,00	10,18	90,19	90,19	0,00	90,19	0,00	100,00
06.003	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidrator sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.	m2	34,26	34,26		34,26	0,00	271,89	9.314,95	9.314,95	0,00	9.314,95	0,00	100,00
06.004	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	5,36	5,36		5,36	0,00	19,57	104,90	104,90	0,00	104,90	0,00	100,00
06.005	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 10/2022	m2	28,94	28,94		28,94	0,00	6,06	175,38	175,38	0,00	175,38	0,00	100,00

Obra: **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS**
 Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 09/2026

B.M.Nº: 04

Período: 27/05/2026 a 07/07/2026

Data da medição: 07/07/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
06.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	28,94	28,94		28,94	0,00	35,92	1.039,52	1.039,52	0,00	1.039,52	0,00	100,00
06.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	28,94			0,00	28,94	43,55	1.260,34	0,00	0,00	0,00	1.260,34	0,00
07	PAISAGISMO								17.972,19	17.972,19	0,00	17.972,19	0,00	100,00
07.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	389,60	389,60		389,60	0,00	29,06	11.321,78	11.321,78	0,00	11.321,78	0,00	100,00
07.002	Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata), fornecimento e plantio	un	17,00	17,00		17,00	0,00	136,49	2.320,33	2.320,33	0,00	2.320,33	0,00	100,00
07.003	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	78,00	78,00		78,00	0,00	35,27	2.751,06	2.751,06	0,00	2.751,06	0,00	100,00
07.004	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	8,00	8,00		8,00	0,00	97,27	778,16	778,16	0,00	778,16	0,00	100,00
07.005	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	23,00	23,00		23,00	0,00	34,82	800,86	800,86	0,00	800,86	0,00	100,00
08	BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS								34.583,94	0,00	34.583,94	34.583,94	0,00	100,00
08.001	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00		1,00	1,00	0,00	3.564,67	3.564,67	0,00	3.564,67	3.564,67	0,00	100,00
08.002	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/manguera plástica transp., fixado em tubo ferro galv. 4"	un	1,00		1,00	1,00	0,00	3.398,45	3.398,45	0,00	3.398,45	3.398,45	0,00	100,00
08.003	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00		1,00	1,00	0,00	8.860,91	8.860,91	0,00	8.860,91	8.860,91	0,00	100,00
08.004	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00		1,00	1,00	0,00	5.627,01	5.627,01	0,00	5.627,01	5.627,01	0,00	100,00
08.005	Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00		1,00	1,00	0,00	5.934,03	5.934,03	0,00	5.934,03	5.934,03	0,00	100,00
08.006	Instalação de simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00		1,00	1,00	0,00	4.795,48	4.795,48	0,00	4.795,48	4.795,48	0,00	100,00
08.007	Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00		1,00	1,00	0,00	2.403,39	2.403,39	0,00	2.403,39	2.403,39	0,00	100,00
09	DIVERSOS								32.858,55	11.689,92	19.010,91	30.700,83	2.157,72	83,33
09.001	MOBILIARIO URBANO								6.062,56	4.842,44	1.220,12	6.062,56	0,00	100,00
09.001.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	25,62	25,62		25,62	0,00	189,01	4.842,44	4.842,44	0,00	4.842,44	0,00	100,00
09.001.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD 1085 ou similar	un	4,00		4,00	4,00	0,00	305,03	1.220,12	0,00	1.220,12	1.220,12	0,00	100,00

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Vicente Mathews Rocha Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA - SE 2707034703

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 272103169J
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS								BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 09/2026		
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME								B.M.Nº: 04				Data da medição: 07/07/2026		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Período: 27/05/2026 a 07/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
09.001.003	MURETA LETREIRO								9.005,20	6.847,48	0,00	6.847,48	2.157,72	33,33
09.001.004	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	20,36	20,36		20,36	0,00	336,32	6.847,48	6.847,48	0,00	6.847,48	0,00	100,00
09.001.005	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	40,72			0,00	40,72	43,55	1.773,36	0,00	0,00	0,00	1.773,36	0,00
09.001.006	Letra em pvc expandido - fornecimento e instalação	un	12,00			0,00	12,00	32,03	384,36	0,00	0,00	0,00	384,36	0,00
09.002	PERGOLADO								11.280,50	0,00	11.280,50	11.280,50	0,00	100,00
09.002.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente, af. 11/2021	m2	51,01		51,01	51,01	0,00	206,24	10.520,30	0,00	10.520,30	10.520,30	0,00	100,00
09.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	51,02		51,02	51,02	0,00	14,90	760,20	0,00	760,20	760,20	0,00	100,00
09.003	ARTIGOS ESPORTIVOS								6.510,29	0,00	6.510,29	6.510,29	0,00	100,00
09.003.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00		1,00	1,00	0,00	3.479,66	3.479,66	0,00	3.479,66	3.479,66	0,00	100,00
09.003.002	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	1,00		1,00	1,00	0,00	3.030,63	3.030,63	0,00	3.030,63	3.030,63	0,00	100,00
10	INSTAÇÕES ELÉTRICAS								157.676,25	66.734,30	0,00	66.734,30	90.941,95	82,53
10.001	PADRAO ENTRADA								3.897,05	3.897,05	0,00	3.897,05	0,00	100,00
10.001.001	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af. 10/2020	m	31,00	31,00		31,00	0,00	49,89	1.546,59	1.546,59	0,00	1.546,59	0,00	100,00
10.001.002	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	1,00		1,00	0,00	67,42	67,42	67,42	0,00	67,42	0,00	100,00
10.001.003	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	10,00	10,00		10,00	0,00	33,17	331,70	331,70	0,00	331,70	0,00	100,00
10.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	8,00	8,00		8,00	0,00	3,48	27,84	27,84	0,00	27,84	0,00	100,00
10.001.005	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	1,00		1,00	0,00	433,28	433,28	433,28	0,00	433,28	0,00	100,00
10.001.006	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00		1,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	100,00
10.001.007	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00	2,00		2,00	0,00	14,79	29,58	29,58	0,00	29,58	0,00	100,00
10.001.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	1,00		1,00	0,00	379,07	379,07	379,07	0,00	379,07	0,00	100,00
10.001.009	Contator LC1-D1810 - Telemecanick	un	1,00	1,00		1,00	0,00	344,25	344,25	344,25	0,00	344,25	0,00	100,00
10.001.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	62,00	62,00		62,00	0,00	9,56	592,72	592,72	0,00	592,72	0,00	100,00
10.001.011	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	2,00		2,00	0,00	52,63	105,26	105,26	0,00	105,26	0,00	100,00
10.001.012	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	1,00	1,00		1,00	0,00	22,34	22,34	22,34	0,00	22,34	0,00	100,00
10.002	ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURA								142.608,21	56.242,08	0,00	56.242,08	86.366,13	80,12
10.002.001	Luminária Decorativa, IP65, IK08, bivoit, 80w, 10.400lm, distribuição luminosa simétrica, fixação em topo de poste 60,3mm, conforme projeto, fornecimento e instalação	un	30,00			0,00	30,00	2.244,86	67.345,80	0,00	0,00	0,00	67.345,80	0,00

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Vicente Matheus Rocha Bezerra
Engenheiro Civil
CREA - SE 2707034703

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 272103189-9
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS**
 Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 09/2026

B.M.Nº: 04

Período: 27/05/2026 a 07/07/2026

Data da medição: 07/07/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
10.002.002	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m - fornecimento e instalação. af. 04/2025	un	30,00	21,00		21,00	9,00	1.581,49	47.444,70	33.211,29	0,00	33.211,29	14.233,41	70,00
10.002.003	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00			0,00	3,00	46,45	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35	0,00
10.002.004	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00			0,00	12,00	127,10	1.525,20	0,00	0,00	0,00	1.525,20	0,00
10.002.005	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	35,00	26,00		26,00	9,00	146,77	5.136,95	3.816,02	0,00	3.816,02	1.320,93	74,29
10.002.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	30,00	21,00		21,00	9,00	115,86	3.475,80	2.433,06	0,00	2.433,06	1.042,74	70,00
10.002.007	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	480,00	480,00		480,00	0,00	9,56	4.588,80	4.588,80	0,00	4.588,80	0,00	100,00
10.002.008	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm², 450/750v - fornecimento e instalação	M	284,00	194,00		194,00	90,00	8,43	2.394,12	1.635,42	0,00	1.635,42	758,70	68,31
10.002.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	240,00	240,00		240,00	0,00	16,15	3.876,00	3.876,00	0,00	3.876,00	0,00	100,00
10.002.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	80,00	80,00		80,00	0,00	2,95	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	100,00
10.002.011	Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	29,00	29,00		29,00	0,00	6,79	196,91	196,91	0,00	196,91	0,00	100,00
10.002.012	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	4,00	4,00		4,00	0,00	1.095,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	100,00
10.002.013	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "I" 1700mm	un	4,00	4,00		4,00	0,00	178,44	713,76	713,76	0,00	713,76	0,00	100,00
10.002.014	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento	m	76,00	76,00		76,00	0,00	7,60	577,60	577,60	0,00	577,60	0,00	100,00
10.002.015	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	40,00	40,00		40,00	0,00	8,88	355,20	355,20	0,00	355,20	0,00	100,00
10.002.016	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	13,00	13,00		13,00	0,00	1,86	24,18	24,18	0,00	24,18	0,00	100,00
10.002.017	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	4,00	4,00		4,00	0,00	5,45	21,80	21,80	0,00	21,80	0,00	100,00
10.002.018	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	12,00	12,00		12,00	0,00	3,48	41,76	41,76	0,00	41,76	0,00	100,00
10.002.019	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	un	4,00	4,00		4,00	0,00	22,32	89,28	89,28	0,00	89,28	0,00	100,00
10.002.020	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	2,00	2,00		2,00	0,00	10,97	21,94	21,94	0,00	21,94	0,00	100,00
10.002.021	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	2,00	2,00		2,00	0,00	11,53	23,06	23,06	0,00	23,06	0,00	100,00
10.003	INTERNET PUBLICA								2.408,79	2.408,79	0,00	2.408,79	0,00	100,00
10.003.001	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1,00		1,00	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	100,00
10.003.002	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af. 07/2020	un	1,00	1,00		1,00	0,00	37,76	37,76	37,76	0,00	37,76	0,00	100,00
10.003.003	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	1,00		1,00	0,00	46,51	46,51	46,51	0,00	46,51	0,00	100,00
10.003.004	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	1,00		1,00	0,00	379,07	379,07	379,07	0,00	379,07	0,00	100,00
10.003.005	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento	m	80,00	80,00		80,00	0,00	7,60	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	100,00
10.003.006	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00	1,00		1,00	0,00	22,43	22,43	22,43	0,00	22,43	0,00	100,00
10.003.007	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	m	10,00	10,00		10,00	0,00	16,02	160,20	160,20	0,00	160,20	0,00	100,00

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Vicente Matheus Rocha Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA - SE 2707034703

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 272103189-9
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 27/05/2026 a 07/07/2026				CONTRATO Nº: 09/2026 Data da medição: 07/07/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
10.003.008	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	1,00		1,00	0,00	44,85	44,85	44,85	0,00	44,85	0,00	100,00
10.003.009	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	3,00	3,00		3,00	0,00	4,99	14,97	14,97	0,00	14,97	0,00	100,00
10.004	SERVIÇOS FINAIS								8.762,20	4.186,38	0,00	4.186,38	4.575,82	50,00
10.004.001	MARCO INAUGURAL H=1,80m,base 1,20x0,75 cm - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA- EXECUÇÃO NA OBRA,inclusive placas.	un	1,00	1,00		1,00	0,00	4.186,38	4.186,38	4.186,38	0,00	4.186,38	0,00	100,00
10.004.002	Limpeza geral	m2	2.015,78			0,00	2.015,78	2,27	4.575,82	0,00	0,00	0,00	4.575,82	0,00
TOTAIS									655.475,17	427.533,54	118.217,00	545.750,53	109.724,64	83,26%
PERCENTUAL									100,00%	65,22%	18,04%	83,26%	16,74%	
CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  Vicente Matheus Rocha Bezerra Engenheiro Civil CREA - SE 2707034703			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:						APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:					
CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra														

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 272103189-9
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 09/2026
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	B.M.Nº: 04	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 27/05/2026 a 07/07/2026	Data da medição: 07/07/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

01	EQUIPE ADMINISTRATIVA		
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: $83,00\% \times 100,00h = 83,00h$ (-) 65,00h (Já medido) = 18,00h
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: $83,00\% \times 200,00h = 166,00h$ (-) 130,00h (Já medido) = 36,00h
01.003	Vigia diurno com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: $83,00\% \times 320,00h = 265,60h$ (-) 208,00h (Já medido) = 57,60h
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.005	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	Quantidade total: 1,00 mês
05	QUADRA		
05.002	ALAMBRADO E MURETA		
05.002.010	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	Área total: $1,28m \times 2,25m = 2,88m^2$
05.002.011	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	Área total: $85,68m \times 2,24m = 191,92m^2$
05.002.012	Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência	kg	Área total: $156,25m \times 0,20m = 31,25m^2$
05.002.013	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	Peso total: 10,02kg
05.002.014			Área total: $23,15m \times 20,89m = 483,61m^2$
08	BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS		
08.001	Brinquedo - Gira-gira (carrossel $\varnothing=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	Quantidade total: 1,00und
08.002	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/manguera plástica transp., fixado em tubo ferro galv. 4"	un	Quantidade total: 1,00und
08.003	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	Quantidade total: 1,00und
08.004	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af 10/2021	un	Quantidade total: 1,00und
08.005	Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af 10/2021	un	Quantidade total: 1,00und
08.006	Instalação de simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af 10/2021	un	Quantidade total: 1,00und

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Vicente Mathheus Rocha Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA - SE 2707034703

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 27/05/2026 a 07/07/2026	CONTRATO Nº: 09/2026 Data da medição: 07/07/2026
MEMORIAL DE CALCULO				
08.007	Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af. 10/2021	un	Quantidade total: 1,00und	
09	DIVERSOS			
09.001	MOBILIARIO URBANO			
09.001.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085	un	Quantidade total: 4,00und	
09.002	PERGOLADO			
09.002.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af. 11/2021	m2	Área total: (5,16m x 2,00m) + (16,02m x 2,54m) = 10,32m2 + 40,69m2 = 51,01m2	
09.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	Área total: (5,16m x 2,00m) + (16,02m x 2,54m) = 10,32m2 + 40,69m2 = 51,02m2	
09.003	ARTIGOS ESPORTIVOS			
09.003.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	Quantidade total: 1,00par	
09.003.002	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	Quantidade total: 1,00und	
CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Vicente Matheus Rocha Bezerra Engenheiro Civil CREA - SE 2707034703			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:	APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra				

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS**
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 09/2026

B.M.Nº: 04

Período: 27/05/2026 a 07/07/2026

Data da medição: 07/07/2026



QUADRA (ALAMBRADO E ART. ESPORTIVOS)



QUADRA (ALAMBRADO E ART. ESPORTIVOS)



QUADRA (ALAMBRADO E ART. ESPORTIVOS)



QUADRA (ALAMBRADO E ART. ESPORTIVOS)



QUADRA (ALAMBRADO E ART. ESPORTIVOS)



QUADRA (ALAMBRADO E ART. ESPORTIVOS)

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 972335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS**

Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº: **04**

Período: **27/05/2026 a 07/07/2026**

CONTRATO Nº: **09/2026**

Data da medição: **07/07/2026**



QUADRA (ALAMBRADO E ART. ESPORTIVOS)



QUADRA (ALAMBRADO E ART. ESPORTIVOS)



BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO



BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO



BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO



BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS**
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 09/2026

B.M.Nº: 04

Período: 27/05/2026 a 07/07/2026


Data da medição: 07/07/2026



BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO



BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO

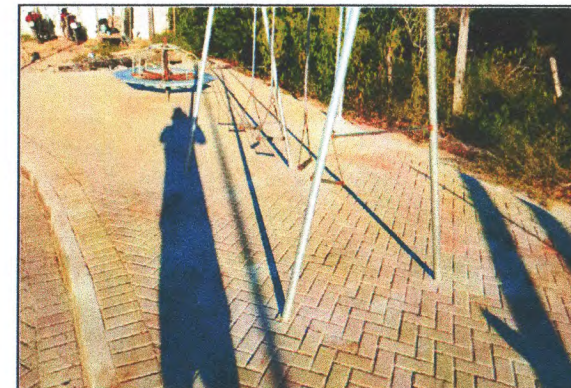

BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO



BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO



BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO



BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS**
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 09/2026

B.M.Nº: 04

Período: 27/05/2026 a 07/07/2026

Data da medição: 07/07/2026



PERGOLADO



PERGOLADO



PERGOLADO



PERGOLADO



PERGOLADO



PERGOLADO

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 2311322-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 04 Período: 27/05/2026 a 07/07/2026	CONTRATO Nº: 09/2026 Data da medição: 07/07/2026
---	---	---



ARTIGOS ESPORTIVOS



ARTIGOS ESPORTIVOS



ARTIGOS ESPORTIVOS



ARTIGOS ESPORTIVOS



ARTIGOS ESPORTIVOS

VICENTE MATHEUS
ROCHA
BEZERRA:00748836586
 CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra

Assinado de forma digital por
 VICENTE MATHEUS ROCHA
 BEZERRA:00748836586
 Dados: 2026.07.27 08:20:32 -03'00'

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM
 FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
 DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
 DATA:

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Joao Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
