



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M. Nº. 52/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 24/05/2024 a 29/05/2024				DATA: 29/05/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO												
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	40.937,60	672,28	41.609,88	44,52	2.282.232,50	1.861.904,33	30.542,14	1.892.446,47	389.786,03	82,92
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	40,95	0,65	41,60	941,89	47.094,50	38.570,40	612,23	39.182,63	7.911,87	83,20
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	97.462,52	1.397,55	98.860,07	20.359,93	82,92
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	409,28	5,50	414,78	123,60	61.800,00	50.587,01	679,80	51.266,81	10.533,19	82,96
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	979,63	15,00	994,63	47,85	57.420,00	46.875,51	717,75	47.593,26	9.826,74	82,89
Total geral								2.401.452,50	1.959.366,85	31.939,69	1.991.306,54	410.145,96	82,92
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.05.29 14:10:00 -03:00				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____		Aprovado para pagamento Data: __/__/____				

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA: 2715638353
 Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 52/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 24/05/2024 a 29/05/2024	DATA: 29/05/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m ²)
1	24/05/2024	RUA DRª WEDNA MENDES RODRIGUES	PARAÍSO DA SERRA	32,80	6,00	196,80
2	27/05/2024	RUA DRª WEDNA MENDES RODRIGUES	PARAÍSO DA SERRA	3,20	3,00	9,60
3	27/05/2024	RUA LUAR DO SERTÃO	LUIZ GONZAGA	46,00	4,00	184,00
4	28/05/2024	RUA JOSÉ ANTÔNIO NUNES	SÃO CRISTÓVÃO	23,50	1,30	30,55
5	28/05/2024	RUA PROJETADA A	RIO DAS PEDRAS	6,40	2,30	14,72
6	28/05/2024	RUA PROJETADA A	RIO DAS PEDRAS	8,50	2,40	20,40
7	28/05/2024	RUA PROJETADA A	RIO DAS PEDRAS	4,00	0,80	3,20
8	28/05/2024	RUA PROJETADA A	RIO DAS PEDRAS	32,80	2,10	68,88
9	29/05/2024	RUA PROJETADA 2	LOT. SÃO JOÃO	18,60	1,70	31,62
10	29/05/2024	RUA PROJETADA 2	LOT. SÃO JOÃO	25,20	2,20	55,44
11	29/05/2024	RUA JOSÉ ANTÔNIO NUNES	SÃO CRISTÓVÃO	43,90	1,30	57,07
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						672,28

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.05.29
14:09:13 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 52/2024**



RUA DRª WEDNA MENDES RODRIGUES



RUA DRª WEDNA MENDES RODRIGUES



RUA LUAR DO SERTÃO



RUA JOSÉ ANTÔNIO NUNES




RUA PROJETADA A



RUA PROJETADA A



RUA PROJETADA A

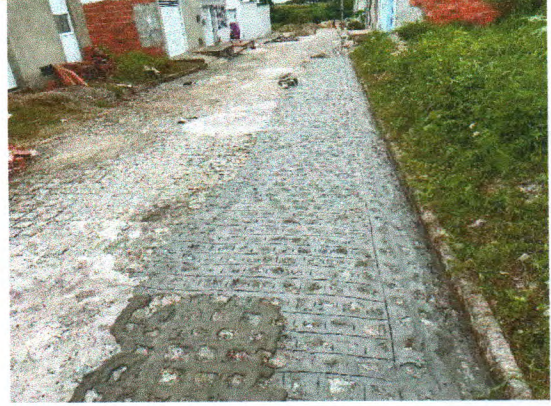

RUA PROJETADA A



RUA PROJETADA 2



RUA PROJETADA 2



RUA JOSÉ ANTÔNIO NUNES

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil / CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.05.29 14:08:48 -03'00'
