




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 53/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 30/05/2024 a 06/06/2024				DATA: 06/06/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.892.446,47	40.118,79	1.932.565,26	349.667,24	84,68	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	41.609,88	882,10	42.491,98	44,52	2.226.000,00	1.852.471,88	39.271,09	1.891.742,97	334.257,03	84,98	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	41,60	0,90	42,50	941,89	47.094,50	39.182,63	847,70	40.030,33	7.064,17	85,00	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	98.860,07	2.093,33	100.953,40	18.266,60	84,68	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	414,78	9,00	423,78	123,60	61.800,00	51.266,81	1.112,40	52.379,21	9.420,79	84,76	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	994,63	20,50	1.015,13	47,85	57.420,00	47.593,26	980,93	48.574,19	8.845,81	84,59	
Total geral								2.401.452,50	1.991.306,54	42.212,12	2.033.518,66	367.933,84	84,68	
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.06.06 16:21:54 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___			


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 53/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 30/05/2024 a 06/06/2024	DATA: 06/06/2024			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	31/05/2024	RUA LUAR DO SERTÃO	LUIZ GONZAGA	36,20	3,90	141,18
2	31/05/2024	RUA PROJETADA A	RIO DAS PEDRAS	17,90	2,40	42,96
3	03/06/2024	RUA PROJETADA A	RIO DAS PEDRAS	15,20	2,00	30,40
4	03/06/2024	RUA PROJETADA F	RIO DAS PEDRAS	24,50	2,20	53,90
5	03/06/2024	RUA PROJETADA F	RIO DAS PEDRAS	0,90	2,20	1,98
6	03/06/2024	RUA PROJETADA F	RIO DAS PEDRAS	0,90	1,80	1,62
7	03/06/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	26,00	3,90	101,40
8	04/06/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	17,40	3,90	67,86
9	04/06/2024	RUA PROJETADA 2	LOT. SÃO JOÃO	54,60	2,30	125,58
10	05/06/2024	RUA PROJETADA 2	LOT. SÃO JOÃO	13,00	1,50	19,50
11	05/06/2024	RUA DRª. WEDNA MENDES RODRIGUES	PARAÍSO DA SERRA	17,10	6,90	117,99
12	05/06/2024	RUA JOSÉ ANTÔNIO NUNES	SÃO CRISTÓVÃO	13,00	4,10	53,30
13	06/06/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	10,50	4,50	47,25
14	06/06/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	9,00	4,50	40,50
15	06/06/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	8,50	2,80	23,80
16	06/06/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	4,60	2,80	12,88
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>						882,10

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.06.06 16:24:25 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 53/2024**



RUA LUAR DO SERTÃO



RUA PROJETADA A



RUA PROJETADA A



RUA PROJETADA F



RUA PROJETADA F



RUA PROJETADA F

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2024.06.06
16:19:40 -03'00'



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA PROJETADA 2



RUA PROJETADA 2



RUA DRª WEDNA MENDES RODRIGUES



RUA JOSÉ ANTÔNIO NUNES

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.06.06
16:20:25 -03'00'




RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA




RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA




RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA

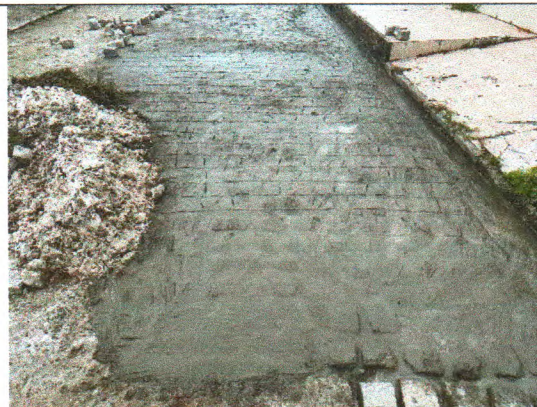

RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.06.06
16:20:38 -03'00'
