


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 54/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 07/06/2024 a 20/06/2024				DATA: 20/06/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.932.565,26	70.839,35	2.003.404,61		
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	42.491,98	1.557,33	44.049,31	44,52	2.226.000,00	1.891.742,97	69.332,33	1.961.075,30	264.924,70	88,10
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	42,50	1,60	44,10	941,89	47.094,50	40.030,33	1.507,02	41.537,35	5.557,15	88,20
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	100.953,40	3.700,20	104.653,60	14.566,40	87,78
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	423,78	16,00	439,78	123,60	61.800,00	52.379,21	1.977,60	54.356,81	7.443,19	87,96
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.015,13	36,00	1.051,13	47,85	57.420,00	48.574,19	1.722,60	50.296,79	7.123,21	87,59
Total geral								2.401.452,50	2.033.518,66	74.539,55	2.108.058,21	293.394,29	87,78
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA.06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2024.06.20 14:55:13 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____							

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Javares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÉDEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº: 54/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 07/06/2024 a 20/06/2024	DATA: 20/06/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	07/06/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	7,20	5,60	40,32
2	07/06/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	29,40	3,70	108,78
3	07/06/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	8,90	3,00	26,70
4	10/06/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	4,10	2,30	9,43
5	10/06/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	1,70	3,80	6,46
6	10/06/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	9,90	2,00	19,80
7	10/06/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	16,00	4,80	76,80
8	10/06/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	8,80	4,20	36,96
9	11/06/2024	RUA ADUILSON DE JESUS	PARAÍSO DA SERRA	28,80	4,20	120,96
10	11/06/2024	RUA ADUILSON DE JESUS	PARAÍSO DA SERRA	16,00	2,50	40,00
11	12/06/2024	RUA MARIA CLAUDICE CORCINIO	PARAÍSO DA SERRA	23,70	3,30	78,21
12	12/06/2024	RUA MARIA CLAUDICE CORCINIO	PARAÍSO DA SERRA	6,30	3,20	20,16
13	12/06/2024	RUA F	RIO DAS PEDRAS	6,20	1,00	6,20
14	12/06/2024	RUA F	RIO DAS PEDRAS	12,30	0,80	9,84
15	12/06/2024	RUA F	RIO DAS PEDRAS	4,90	5,00	24,50
16	12/06/2024	RUA F	RIO DAS PEDRAS	4,80	6,50	31,20
17	14/06/2024	RUA F	RIO DAS PEDRAS	11,30	1,40	15,82
18	14/06/2024	RUA F	RIO DAS PEDRAS	10,50	1,40	14,70
19	14/06/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	19,70	2,30	45,31
20	14/06/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	5,60	1,10	6,16
21	14/06/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	21,00	2,90	60,90
22	14/06/2024	RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS	SÃO CRISTÓVÃO	6,10	2,60	15,86
23	14/06/2024	RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS	SÃO CRISTÓVÃO	4,10	2,20	9,02
24	17/06/2024	RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS	SÃO CRISTÓVÃO	10,90	2,50	27,25
25	17/06/2024	RUA ADUILSON DE JESUS	PARAÍSO DA SERRA	14,50	6,90	100,05
26	17/06/2024	RUA JUAZEIRO	LUIZ GONZAGA	2,90	11,50	33,35
27	17/06/2024	RUA JUAZEIRO	LUIZ GONZAGA	2,00	10,40	20,80
28	18/06/2024	RUA JUAZEIRO	LUIZ GONZAGA	3,60	14,50	52,20
29	18/06/2024	RUA JUAZEIRO	LUIZ GONZAGA	4,50	2,70	12,15
30	18/06/2024	RUA JUAZEIRO	LUIZ GONZAGA	6,90	15,00	103,50
31	19/06/2024	RUA MARIA CLAUDICE CORCINIO	PARAÍSO DA SERRA	2,70	8,10	21,87
32	19/06/2024	RUA MARIA CLAUDICE CORCINIO	PARAÍSO DA SERRA	4,30	7,20	30,96
33	19/06/2024	RUA MARIA CLAUDICE CORCINIO	PARAÍSO DA SERRA	15,20	8,00	121,60
34	20/06/2024	RUA MARIA CLAUDICE CORCINIO	PARAÍSO DA SERRA	4,90	7,50	36,75
35	20/06/2024	RUA MARIA CLAUDICE CORCINIO	PARAÍSO DA SERRA	2,40	3,20	7,68
36	20/06/2024	RUA MARIA CLAUDICE CORCINIO	PARAÍSO DA SERRA	3,40	3,20	10,88
37	20/06/2024	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS	PARAÍSO DA SERRA	3,70	13,40	49,58
38	20/06/2024	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS	PARAÍSO DA SERRA	3,40	4,30	14,62
39	20/06/2024	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS	PARAÍSO DA SERRA	3,50	9,70	33,95
40	20/06/2024	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS	PARAÍSO DA SERRA	3,40	6,50	22,10
41	20/06/2024	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS	PARAÍSO DA SERRA	3,50	2,50	33,95
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===>						1.557,33



MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.06.20 14:54:46 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 54/2024



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA BAIÃO DE DOIS

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA: 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.06.20 14:55:53 -03'00'



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA ADUILSON DE JESUS



RUA ADUILSON DE JESUS



RUA MARIA CLAUDICE CORCÍNIO



RUA MARIA CLAUDICE CORCÍNIO

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.06.20 14:56:23 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo



RUA F



RUA F



RUA F



RUA F



RUA F



RUA F

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma
digital por
MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2024.06.20
14:56:36 -03'00'



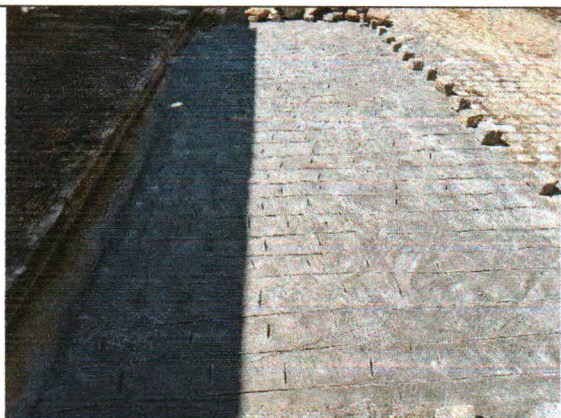
RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GOIS



RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GOIS



RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GOIS

José Robson Santos da Paixa
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.06.20
14:56:55 -03'00'



RUA ADULSON DE JESUS



RUA JUAZEIRO



RUA JUAZEIRO



RUA JUAZEIRO



RUA JUAZEIRO



RUA JUAZEIRO

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.06.20 14:57:09 -03'00'



RUA MARIA CLAUDICE CORCÍNIO



RUA MARIA CLAUDICE CORCÍNIO



RUA MARIA CLAUDICE CORCÍNIO




RUA MARIA CLAUDICE CORCÍNIO




RUA MARIA CLAUDICE CORCÍNIO



RUA MARIA CLAUDICE CORCÍNIO


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.06.20 14:57:25 -03'00'



RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS



RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS




RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS




RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS



RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS


 José Robson Santos da Paixão:
 Eng. Civil CREA 272029395-6
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil CREA: 2715638353
 Coordenador de Núcleo

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:066
 41211525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211
 525
 Dados: 2024.06.20
 14:57:42 -03'00'
