



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 55/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 21/06/2024 a 27/06/2024				DATA: 27/06/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2.282.232,50</b>	<b>2.003.404,61</b>	<b>29.706,59</b>	<b>2.033.111,20</b>	<b>249.121,30</b>	<b>89,08</b>
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	44.049,31	654,57	44.703,88	44,52	2.226.000,00	1.961.075,30	29.141,46	1.990.216,76	235.783,24	89,41
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00		9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	44,10	0,60	44,70	941,89	47.094,50	41.537,35	565,13	42.102,48	4.992,02	89,40
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>119.220,00</b>	<b>104.653,60</b>	<b>1.549,46</b>	<b>106.203,06</b>	<b>13.016,94</b>	<b>89,08</b>
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	439,78	7,00	446,78	123,60	61.800,00	54.356,81	865,20	55.222,01	6.577,99	89,36
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.051,13	14,30	1.065,43	47,85	57.420,00	50.296,79	684,26	50.981,05	6.438,95	88,79
<b>Total geral</b>								<b>2.401.452,50</b>	<b>2.108.058,21</b>	<b>31.256,05</b>	<b>2.139.314,26</b>	<b>262.138,24</b>	<b>89,08</b>
Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2024.06.28 08:16:50 -03'00'			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603													

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 55/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 21/06/2024 a 27/06/2024	DATA: 27/06/2024			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	21/06/2024	RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS	SÃO CRISTÓVÃO	19,70	1,70	33,49
2	21/06/2024	RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS	SÃO CRISTÓVÃO	6,00	1,80	10,80
3	21/06/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	15,30	2,10	32,13
4	21/06/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	5,00	2,30	11,50
5	21/06/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	3,90	5,40	21,06
6	21/06/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	3,70	6,50	24,05
7	21/06/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	8,30	6,70	55,61
8	24/06/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	3,70	11,70	43,29
9	24/06/2024	RUA DAS PALMEIRAS	SÃO CRISTÓVÃO	2,20	2,50	5,50
10	24/06/2024	RUA DAS PALMEIRAS	SÃO CRISTÓVÃO	2,20	2,00	4,40
11	24/06/2024	RUA B	RIO DAS PEDRAS	3,30	1,30	4,29
12	24/06/2024	RUA B	RIO DAS PEDRAS	8,40	1,70	14,28
13	24/06/2024	RUA B	RIO DAS PEDRAS	3,80	1,70	6,46
14	24/06/2024	RUA B	RIO DAS PEDRAS	6,10	1,60	9,76
15	24/06/2024	RUA B	RIO DAS PEDRAS	6,20	6,30	39,06
16	24/06/2024	RUA B	RIO DAS PEDRAS	1,50	9,50	14,25
17	26/06/2024	RUA B	RIO DAS PEDRAS	20,40	2,00	40,80
18	26/06/2024	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS	PARAÍSO DA SERRA	3,10	18,80	58,28
19	26/06/2024	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS	PARAÍSO DA SERRA	1,50	16,10	24,15
20	26/06/2024	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS	PARAÍSO DA SERRA	3,10	12,30	38,13
21	26/06/2024	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS	PARAÍSO DA SERRA	3,10	4,40	13,64
22	27/06/2024	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS	PARAÍSO DA SERRA	2,90	6,10	17,69
23	27/06/2024	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS	PARAÍSO DA SERRA	2,90	3,00	8,70
24	27/06/2024	RUA JÚLIA MARSSOLA FARIA	PARAÍSO DA SERRA	2,70	4,90	13,23
25	27/06/2024	RUA JÚLIA MARSSOLA FARIA	PARAÍSO DA SERRA	3,10	6,20	19,22
26	27/06/2024	RUA MANOEL ALVES FERREIRA	PARAÍSO DA SERRA	47,00	1,80	84,60
27	27/06/2024	RUA G	RIO DAS PEDRAS	6,20	1,00	6,20
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==&gt;</b>						<b>654,57</b>

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:066  
41211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211  
525  
Dados: 2024.06.28  
08:14:40 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO: 55/2024**



RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS



RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng. Civil - CREA: 2715638353  
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0664  
1211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.06.28 08:15:13 -03'00'



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA DAS PALMEIRAS



RUA DAS PALMEIRAS



RUA B



RUA B

**Prefeitura Municipal de Itabaiana**  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng. Civil - CREA: 2715638353  
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixá,  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:066412  
11525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.06.28  
08:15:30 -03'00'



RUA B



RUA B



RUA B



RUA B



RUA B



RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng. Civil - CREA: 2715638353  
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06  
641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.06.28 08:15:48 -03'00'



RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS



RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS



RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS



RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS



RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS



RUA JÚLIA MARSSOLA FARIA

Prefeitura Municipal de Itabiana  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng. Civil - CREA: 2715638353  
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixã  
Eng. Civil CREA: 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06  
641211525


Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.06.28 08:16:04 -03'00'



RUA JÚLIA MARSSOLA FARIA



RUA MANOEL ALVES FERREIRA

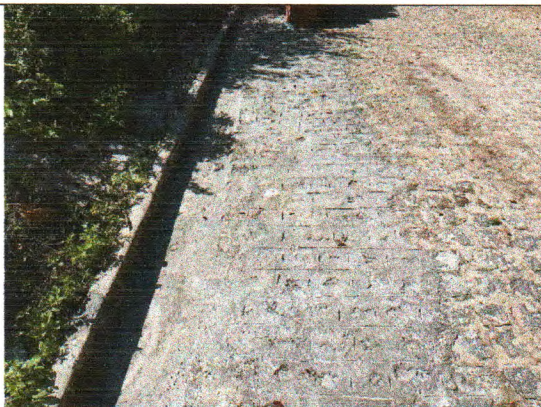

RUA G

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121  
1525  
Dados: 2024.06.28  
08:16:21 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng. Civil - CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720243954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana
