

Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabalana/SE							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO N°: 391/2025		
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA							B.M.N°: 05				Data da medição: 01/06/2026		
CNPJ:	04.460.699/0001-23							Período: 13/05/2026 a 01/06/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO								9.080,34	9.080,34	0,00	9.080,34	0,00	100,00%
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								9.080,34	9.080,34	0,00	9.080,34	0,00	
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	366,63	4.399,56	4.399,56	0,00	4.399,56	0,00	100,00%
01.001.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	6,00		6,00	0,00	780,13	4.680,78	4.680,78	0,00	4.680,78	0,00	100,00%
02	TRECHO 1								986.940,05	0,00	0,00	0,00	986.940,05	0,00%
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								46.631,49	0,00	0,00	0,00	46.631,49	
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6.246,67			0,00	6.246,67	1,64	10.244,54	0,00	0,00	0,00	10.244,54	0,00%
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	6.246,67			0,00	6.246,67	2,41	15.054,47	0,00	0,00	0,00	15.054,47	0,00%
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	624,67			0,00	624,67	1,21	755,85	0,00	0,00	0,00	755,85	
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	16.866,09			0,00	16.866,09	1,22	20.576,63	0,00	0,00	0,00	20.576,63	0,00%
02.002	PAVIMENTAÇÃO								936.685,49	0,00	0,00	0,00	936.685,49	0,00%
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.246,67			0,00	6.246,67	106,01	662.209,49	0,00	0,00	0,00	662.209,49	0,00%
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.180,24			0,00	2.180,24	42,14	91.875,31	0,00	0,00	0,00	91.875,31	0,00%
02.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	59,39			0,00	59,39	42,14	2.502,69	0,00	0,00	0,00	2.502,69	0,00%
02.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	2.239,63			0,00	2.239,63	4,81	10.772,62	0,00	0,00	0,00	10.772,62	0,00%
02.002.005	Colchão de areia	m3	1.061,93			0,00	1.061,93	126,51	134.345,27	0,00	0,00	0,00	134.345,27	0,00%
02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	28.672,22			0,00	28.672,22	1,22	34.980,11	0,00	0,00	0,00	34.980,11	0,00%
02.003	LIMPEZA								3.623,07	0,00	0,00	0,00	3.623,07	0,00%
02.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.246,67			0,00	6.246,67	0,58	3.623,07	0,00	0,00	0,00	3.623,07	0,00%
03	TRECHO 2								1.973.376,93	1.119.619,43	211.177,10	1.330.796,53	642.580,38	67,44%
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								93.137,03	52.683,17	9.939,76	62.622,93	30.514,10	67,24%
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	12.476,49	6.995,50	1.330,50	8.326,00	4.150,49	1,64	20.461,44	11.472,62	2.182,02	13.654,64	6.806,80	66,73%
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	12.476,49	6.995,50	1.333,50	8.329,00	4.147,49	2,41	30.068,34	16.859,15	3.213,73	20.072,88	9.995,46	66,76%
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.247,65	698,90	133,35	832,25	415,40	1,21	1.509,66	845,66	161,35	1.007,01	502,65	66,70%
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	33.686,55	19.267,00	3.592,35	22.859,35	10.827,20	1,22	41.097,59	23.505,74	4.382,66	27.888,40	13.209,19	67,86%
03.002	PAVIMENTAÇÃO								1.873.003,54	1.062.878,89	200.465,65	1.263.344,54	609.659,00	67,45%
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	12.476,49	6.995,50	1.330,50	8.326,00	4.150,49	106,01	1.322.632,70	741.592,95	141.046,30	882.639,25	439.993,45	66,73%
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	4.444,26	2.439,83	473,94	2.913,77	1.530,49	42,14	187.281,12	102.814,43	19.971,83	122.786,26	64.494,86	65,56%
03.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	74,95	54,95	23,50	78,45	-3,50	42,14	3.158,39	2.315,59	990,29	3.305,88	-147,49	104,67%
03.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.519,21	2.439,83	497,44	2.937,27	1.581,94	4,81	21.737,40	11.735,58	2.392,68	14.128,26	7.609,14	65,00%
03.002.005	Colchão de areia	m3	2.121,00	1.304,20	226,18	1.530,38	590,62	126,51	268.328,09	164.994,34	28.614,03	193.608,37	74.719,72	72,15%
03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	57.267,08	32.316,40	6.106,99	38.423,39	18.843,69	1,22	69.865,84	39.426,00	7.450,52	46.876,52	22.989,32	67,10%
03.003	LIMPEZA								7.236,36	4.057,39	771,69	4.829,08	2.407,28	66,73%
03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	12.476,49	6.995,50	1.330,50	8.326,00	4.150,49	0,58	7.236,36	4.057,39	771,69	4.829,08	2.407,28	66,73%
04	TRECHO 3								285.991,69	285.991,67	0,00	285.991,67	0,02	100,00%
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								13.287,70	13.287,70	0,00	13.287,70	0,00	100,00%

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2723394692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana


Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE						BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 391/2025			
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA						B.M.Nº: 05				Data da medição: 01/06/2026			
CNPJ:	04.460.699/0001-23						Período: 13/05/2026 à 01/06/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	1,64	2.919,20	2.919,20	0,00	2.919,20	0,00	100,00%
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	2,41	4.289,80	4.289,80	0,00	4.289,80	0,00	100,00%
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	178,00	178,00		178,00	0,00	1,21	215,38	215,38	0,00	215,38	0,00	100,00%
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.806,00	4.806,00		4.806,00	0,00	1,22	5.863,32	5.863,32	0,00	5.863,32	0,00	100,00%
04.002	PAVIMENTAÇÃO								271.671,59	271.671,57	0,00	271.671,57	0,02	100,00%
04.002.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	734,60	734,60		734,60	0,00	42,14	30.956,04	30.956,04	0,00	30.956,04	0,00	100,00%
04.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	5,00	5,00		5,00	0,00	42,14	210,70	210,70	0,00	210,70	0,00	100,00%
04.002.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	106,01	188.697,80	188.697,80	0,00	188.697,80	0,00	100,00%
04.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	739,60	739,60		739,60	0,00	4,81	3.557,48	3.557,47	0,00	3.557,47	0,01	100,00%
04.002.005	Colchão de areia	m3	302,60	302,60		302,60	0,00	126,51	38.281,93	38.281,92	0,00	38.281,92	0,01	100,00%
04.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	8.170,20	8.170,20		8.170,20	0,00	1,22	9.967,64	9.967,64	0,00	9.967,64	0,00	100,00%
04.003	LIMPEZA								1.032,40	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	100,00%
04.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	0,58	1.032,40	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	100,00%
05	TRECHO 4								1.058.059,05	0,00	230.048,38	230.048,38	828.010,67	21,74%
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								50.831,59	0,00	11.050,87	11.050,87	39.780,72	21,74%
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6.809,34		1.480,40	1.480,40	5.328,94	1,64	11.167,32	0,00	2.427,85	2.427,85	8.739,47	21,74%
05.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	6.809,34		1.480,40	1.480,40	5.328,94	2,41	16.410,51	0,00	3.567,76	3.567,76	12.842,75	21,74%
05.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	680,93		148,04	148,04	532,89	1,21	823,93	0,00	179,12	179,12	644,81	21,74%
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	18.385,11		3.996,84	3.996,84	14.388,27	1,22	22.429,83	0,00	4.876,14	4.876,14	17.553,69	21,74%
05.002	PAVIMENTAÇÃO								1.003.278,04	0,00	218.138,88	218.138,88	785.139,16	21,74%
05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.809,34		1.480,40	1.480,40	5.328,94	106,01	721.858,13	0,00	156.937,20	156.937,20	564.920,93	21,74%
05.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.050,70		445,84	445,84	1.604,86	42,14	86.416,50	0,00	18.787,69	18.787,69	67.628,81	21,74%
05.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	12,00		3,00	3,00	9,00	42,14	505,68	0,00	126,42	126,42	379,26	25,00%
05.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	2.062,70		448,84	448,84	1.613,86	4,81	9.921,59	0,00	2.158,92	2.158,92	7.762,67	21,76%
05.002.005	Colchão de areia	m3	1.157,58		251,67	251,67	905,91	126,51	146.445,45	0,00	31.838,77	31.838,77	114.606,68	21,74%
05.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	31.254,66		6.794,99	6.794,99	24.459,67	1,22	38.130,69	0,00	8.289,88	8.289,88	29.840,81	21,74%
05.003	LIMPEZA								3.949,42	0,00	858,63	858,63	3.090,79	21,74%
05.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.809,34		1.480,40	1.480,40	5.328,94	0,58	3.949,42	0,00	858,63	858,63	3.090,79	21,74%
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								101.372,04	32.490,32	10.107,01	42.597,33	58.774,71	42,02%
06.001	EQUIPE DIRIGENTE								101.372,04	32.490,32	10.107,01	42.597,33	58.774,71	42,02%
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	378,00	121,16	37,69	158,85	219,15	131,94	49.873,32	15.985,02	4.972,81	20.957,83	28.915,49	42,02%
06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	756,00	242,30	75,37	317,67	438,33	68,12	51.498,72	16.505,30	5.134,20	21.639,50	29.859,22	42,02%
									4.414.820,10	1.447.181,76	451.332,49	1.898.514,25	2.516.305,85	43,00%
PERCENTUAL									100,00%	32,78%	10,22%	43,00%	57,00%	


João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA

Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO N°: 391/2025		
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA								B.M.N°: 05			Data da medição: 01/06/2026		
CNPJ:	04.460.699/0001-23					Período: 13/05/2026 à 01/06/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
 Documento assinado digitalmente LEANDRO DE ASSIS FERREIRA Data: 02/06/2026 10:41:42-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			DATA: ____/____/____						VALOR DA MEDIÇÃO:					
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA									R\$ 451.332,49					


 João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 2723359/22-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



D&C CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23

Objeto:

Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE

Contratada:

D&C CONSTRUTORA LTDA

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO Nº 391/2025

B.M.Nº: 05

Período: 13/05/2026 a 01/06/2026

Data da medição: 01/06/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO						
				COMP.	ALTURA	LARGURA	PERÍMETRO	ÁREA	UNIDADE	TOTAL
03	TRECHO 2									
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES									
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.330,50	274,90		4,84				1.330,50
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	1.330,50	274,90		4,84				1.330,50
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	133,35	27,55	0,10	4,84				133,35
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.592,35						3.592,35	3.592,35
03.002	PAVIMENTAÇÃO									
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.330,50	274,90		4,84				1.330,50
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	473,94	473,94						473,94
03.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	23,50	23,50						23,50
03.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	497,44	497,44						497,44
03.002.005	Colchão de areia	m3	226,18	274,89	0,17	4,84				226,18

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 1721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	6.106,99					6.106,99	6.106,99
03.003	LIMPEZA								
03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.330,50	274,90		4,84			1.330,50
5	TRECHO 4								
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.480,40	305,87		4,84			1.480,40
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	1.480,40	305,87		4,84			1.480,40
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	148,04	30,59	0,10	4,84			148,04
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia	tkm	3.996,84					3.996,84	3.996,84
05.002	PAVIMENTAÇÃO								
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.480,40	305,87		4,84			1.480,40
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	445,84	445,84					445,84
03.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	3,00	3,00					3,00
03.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	448,84	448,84					448,84
03.002.005	Colchão de areia	m3	251,67	305,87	0,17	4,84			251,67
03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	6.794,99					6.794,99	6.794,99
05.003	LIMPEZA								
03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.480,40	305,87		4,84			1.480,40
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
06.001	EQUIPE DIRIGENTE								
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	37,69					37,69	37,69

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabairão

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2521894592
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabairão

06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	75,37						75,37	75,37
D&C CONSTRUTORA LTDA			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL DE CÁLCULO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:							



Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
 Data: 02/06/2026 10:41:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM Nº 05

Ref.: Contrato 391/2025

Objeto: Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE.

A Empresa D&C Construtora LTDA, empresa privada, com CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23, localizada na Travessa José Mecnas Filho, nº 46-A – Centro, São Domingos/SE, CEP: 49525-000, neste ato representada pelo senhor Evaldir da Silva Ramos R.G. nº: 40.642.163-8 – SSP/SP e CPF nº: 324.302.278-94, vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico do Boletim de medição nº 05 da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 13/05/2026 até 01/06/2026**, conforme **Boletim de Medição nº 05**.



Travessa José Mecnas Filho
Nº46A – Centro São Domingos – se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@deconstrutora
deconstrucoesltda@gmail.com

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Acesse o nosso
site através
do QR CODE





📍 Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

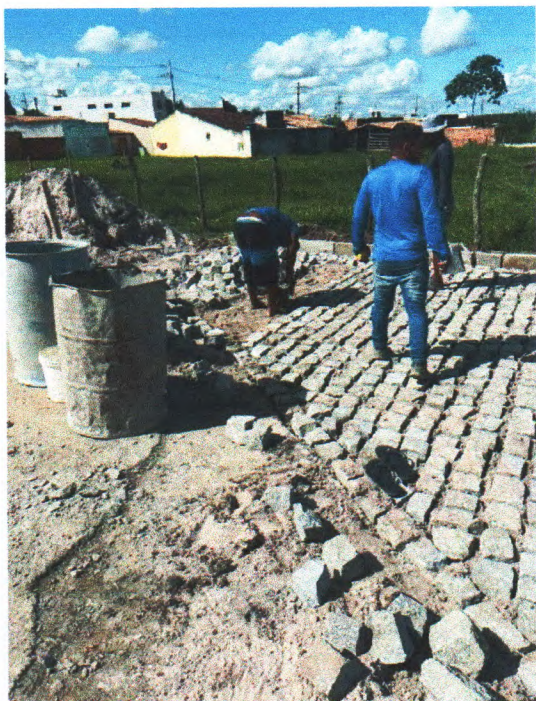
☎ 79 9 9154-1021
@deconstrutora
deconstrucoesltada@gmail.com

Acesse o nosso
site através
do QR CODE



João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabairão

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabairão



📍 Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

☎ 79 9 9154-1021
@deconstrutora
✉ deconstrucoesltda@gmail.com



João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Itabaiana/SE, em 02 de junho de 2026.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 02/06/2026 10:41:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leandro de Assis Ferreira
Engenheiro Civil CREA/SE nº 270963955-6

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335622-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

📍 Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

📞 79 9 9154-1021
📧 @deconstrutora
✉ deconstrucoesltda@gmail.com

Acesse o nosso
site através
do QR CODE

