

REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 186/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 05 / 2024				ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO				PERÍODO: 26/03/2024 a 26/04/2024				DATA: 29/04/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>16.664,26</b>	<b>16.664,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.664,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00		6,00	317,53	1.905,18	1.905,18	0,00	1.905,18	0,00	100,00
01.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00	4,00		4,00	705,32	2.821,28	2.821,28	0,00	2.821,28	0,00	100,00
01.003	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	383,02	383,02		383,02	25,57	9.793,82	9.793,82	0,00	9.793,82	0,00	100,00
01.004	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	3.403,15	3.403,15		3.403,15	0,63	2.143,98	2.143,98	0,00	2.143,98	0,00	100,00
<b>02</b>	<b>DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>							<b>57.154,35</b>	<b>57.154,34</b>	<b>0,00</b>	<b>57.154,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
02.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	955,92	955,92		955,92	7,99	7.637,80	7.637,80	0,00	7.637,80	0,00	100,00
02.002	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	13,98	13,98		13,98	30,96	432,82	432,82	0,00	432,82	0,00	100,00
02.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	587,01	587,01		587,01	20,91	12.274,38	12.274,38	0,00	12.274,38	0,00	100,00
02.004	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	587,00	587,00		587,00	9,59	5.629,33	5.629,33	0,00	5.629,33	0,00	100,00
02.005	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	12,00	12,00		12,00	32,44	389,28	389,28	0,00	389,28	0,00	100,00
02.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	510,47	510,47		510,47	42,49	21.689,87	21.689,87	0,00	21.689,87	0,00	100,00
02.007	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	781,19	781,19		781,19	8,47	6.616,68	6.616,68	0,00	6.616,68	0,00	100,00
02.008	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.343,57	2.343,57		2.343,57	1,06	2.484,19	2.484,19	0,00	2.484,19	0,00	100,00
<b>03</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>276.826,45</b>	<b>275.485,27</b>	<b>1.341,18</b>	<b>276.826,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
03.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	755,68	755,68		755,68	39,04	29.501,75	29.501,75	0,00	29.501,75	0,00	100,00
03.002	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	837,83	837,83		837,83	81,76	68.500,98	68.500,98	0,00	68.500,98	0,00	100,00
03.003	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	1.005,40	1.005,40		1.005,40	8,47	8.515,74	8.515,74	0,00	8.515,74	0,00	100,00
03.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	22.621,50	22.621,50		22.621,50	1,06	23.978,79	23.978,79	0,00	23.978,79	0,00	100,00
03.005	Lona plástica preta	m2	826,93	826,93		826,93	4,87	4.027,15	4.027,15	0,00	4.027,15	0,00	100,00
03.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	826,93	826,93		826,93	45,67	37.765,89	37.765,89	0,00	37.765,89	0,00	100,00
03.007	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022	m2	633,79	633,79		633,79	79,55	50.417,99	50.417,99	0,00	50.417,99	0,00	100,00
03.008	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	874,66	874,66		874,66	60,34	52.776,98	52.776,98	0,00	52.776,98	0,00	100,00
03.009	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	83,20	0,00	83,20	83,20	16,12	1.341,18	0,00	1.341,18	1.341,18	0,00	100,00

**Luis Mario Nori Alfaro Junior**  
Engenheiro Civil

**José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo

**Yan Henrique Soares Santana**  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo



REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 186/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 05 / 2024					ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO			PERÍODO: 26/03/2024 a 26/04/2024					DATA: 29/04/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir <sup>a</sup>	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
03.010	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	1,00	1,00		1,00	166,05	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	100,00
03.011	Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	1,00	1,00		1,00	448,86	448,86	448,86	0,00	448,86	0,00	100,00
<b>04</b>	<b>QUADRA</b>							<b>151.625,32</b>	<b>138.446,74</b>	<b>6.181,30</b>	<b>144.628,04</b>	<b>6.997,28</b>	<b>95,39</b>
04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	16,50	16,50		16,50	42,49	701,09	701,09	0,00	701,09	0,00	100,00
04.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	19,80	19,80		19,80	8,47	167,71	167,71	0,00	167,71	0,00	100,00
04.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	59,40	59,40		59,40	1,06	62,96	62,96	0,00	62,96	0,00	100,00
04.004	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	1,65	1,65		1,65	413,08	681,58	681,58	0,00	681,58	0,00	100,00
04.005	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	21,95	21,95		21,95	429,66	9.431,04	9.431,04	0,00	9.431,04	0,00	100,00
04.006	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,62	2,62		2,62	2760,82	7.233,35	7.233,35	0,00	7.233,35	0,00	100,00
04.007	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaletas. af_03/2016	m	66,00	0,00		0,00	34,35	2.267,10	0,00	0,00	2.267,10	0,00	0,00
04.008	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	26,40	26,40		26,40	38,24	1.009,54	1.009,54	0,00	1.009,54	0,00	100,00
04.009	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	151,80	151,80		151,80	16,27	2.469,79	2.469,79	0,00	2.469,79	0,00	100,00
04.010	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	151,80	151,80		151,80	30,23	4.588,91	4.588,91	0,00	4.588,91	0,00	100,00
04.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	151,80	0,00	151,80	151,80	40,72	6.181,30	0,00	6.181,30	6.181,30	0,00	100,00
04.012	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	335,80	335,80		335,80	277,14	93.063,61	93.063,61	0,00	93.063,61	0,00	100,00
04.013	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	242,00	0,00		0,00	17,44	4.220,48	0,00	0,00	4.220,48	0,00	0,00
04.014	Fornecimento de cabo de aço 9,5mm, média resistência	kg	27,14	0,00		0,00	11,23	304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	0,00
04.015	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	4,20	4,20		4,20	631,56	2.652,55	2.652,55	0,00	2.652,55	0,00	100,00

**Luiz Marcelo Neri Aljuno Junior**  
Engenheiro Civil  
CREA/SE: 21.090522

**José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil CREA 2720293954

**Yon Henrique Tavares Santana**  
Eng. Civil CREA 2715638353



REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 186/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.º. 05 / 2024					ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO			PERÍODO: 26/03/2024 a 26/04/2024					DATA: 29/04/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir <sup>a</sup>	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
04.016	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	121,00	121,00		121,00	111,56	13.498,76	13.498,76	0,00	13.498,76	0,00	100,00
04.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.722,50	2.722,50		2.722,50	1,06	2.885,85	2.885,85	0,00	2.885,85	0,00	100,00
04.018	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	0,00		0,00	204,92	204,92	0,00	0,00	0,00	204,92	0,00
<b>05</b>	<b>ELEVAÇÕES (PALCOS)</b>							<b>23.675,32</b>	<b>21.786,99</b>	<b>1.731,41</b>	<b>23.518,40</b>	<b>156,92</b>	<b>99,34</b>
05.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,67	12,89		12,89	42,49	665,82	547,70	0,00	547,70	118,12	82,26
05.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	18,80	15,47		15,47	8,47	159,24	131,03	0,00	131,03	28,21	82,28
05.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	56,40	46,41		46,41	1,06	59,78	49,19	0,00	49,19	10,59	82,29
05.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	11,94	11,94		11,94	429,66	5.130,14	5.130,14	0,00	5.130,14	0,00	100,00
05.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	51,60	51,60		51,60	38,24	1.973,18	1.973,18	0,00	1.973,18	0,00	100,00
05.006	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	51,60	51,60		51,60	16,27	839,53	839,53	0,00	839,53	0,00	100,00
05.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	51,60	51,60		51,60	30,23	1.559,87	1.559,87	0,00	1.559,87	0,00	100,00
05.008	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	72,74	72,74		72,74	91,30	6.641,16	6.641,16	0,00	6.641,16	0,00	100,00
05.009	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	87,29	87,29		87,29	8,47	739,35	739,35	0,00	739,35	0,00	100,00
05.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.964,03	1.964,03		1.964,03	1,06	2.081,87	2.081,87	0,00	2.081,87	0,00	100,00
05.011	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	45,85	45,85		45,85	45,67	2.093,97	2.093,97	0,00	2.093,97	0,00	100,00
05.012	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	42,52	0,00	42,52	42,52	40,72	1.731,41	0,00	1.731,41	1.731,41	0,00	100,00
<b>06</b>	<b>PAISAGISMO</b>							<b>27.504,77</b>	<b>-</b>	<b>27.504,77</b>	<b>27.504,77</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
06.001	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea), fornecimento e plantio	un	141,00	0,00	141,00	141,00	19,16	2.701,56	0,00	2.701,56	2.701,56	0,00	100,00
06.002	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	0,00	3,00	3,00	481,15	1.443,45	0,00	1.443,45	1.443,45	0,00	100,00
06.003	Planta - Moreia (Diets bicolor), fornecimento e plantio	un	83,00	0,00	83,00	83,00	39,81	3.304,23	0,00	3.304,23	3.304,23	0,00	100,00
06.004	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	48,00	0,00	48,00	48,00	33,67	1.616,16	0,00	1.616,16	1.616,16	0,00	100,00

Luiz Mario Nori Alfaro Junior  
Engenheiro Civil

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo

Yan Henrique Vazares Santos  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo



REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 186/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 05 / 2024				ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO				PERÍODO: 26/03/2024 a 26/04/2024				DATA: 29/04/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir <sup>a</sup>	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
06.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	0,00	4,00	4,00	68,45	273,80	0,00	273,80	273,80	0,00	100,00
06.006	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	10,00	0,00	10,00	10,00	74,91	749,10	0,00	749,10	749,10	0,00	100,00
06.007	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	12,00	0,00	12,00	12,00	74,91	898,92	0,00	898,92	898,92	0,00	100,00
06.008	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	2,00	0,00	2,00	2,00	710,29	1.420,58	0,00	1.420,58	1.420,58	0,00	100,00
06.009	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	638,08	0,00	638,08	638,08	23,66	15.096,97	0,00	15.096,97	15.096,97	0,00	100,00
<b>07</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>29.873,47</b>	<b>3.397,68</b>	<b>837,10</b>	<b>4.234,78</b>	<b>25.638,69</b>	<b>14,18</b>
07.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	9,00	9,00		9,00	377,52	3.397,68	3.397,68	0,00	3.397,68	0,00	100,00
07.002	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	153,00	0,00		0,00	83,90	12.836,70	0,00	0,00	0,00	12.836,70	0,00
07.003	Limpeza geral	m2	3.403,15	0,00		0,00	1,96	6.670,17	0,00	0,00	0,00	6.670,17	0,00
07.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	0,00		0,00	1.778,37	1.778,37	0,00	0,00	0,00	1.778,37	0,00
07.005	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	837,10	837,10	0,00	837,10	837,10	0,00	100,00
07.006	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	15,00	0,00		0,00	290,23	4.353,45	0,00	0,00	0,00	4.353,45	0,00
<b>08</b>	<b>ACADEMIA A CÉU ABERTO</b>							<b>25.239,86</b>	<b>-</b>	<b>25.239,86</b>	<b>25.239,86</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
08.001	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	2,00	0,00	2,00	2,00	2.537,34	5.074,68	0,00	5.074,68	5.074,68	0,00	100,00
08.002	Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01	un	2,00	0,00	2,00	2,00	1.617,95	3.235,90	0,00	3.235,90	3.235,90	0,00	100,00
08.003	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	2,00	0,00	2,00	2,00	2.683,81	5.367,62	0,00	5.367,62	5.367,62	0,00	100,00
08.004	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	804,71	804,71	0,00	804,71	804,71	0,00	100,00
08.005	Instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.334,93	2.334,93	0,00	2.334,93	2.334,93	0,00	100,00
08.006	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.548,52	3.548,52	0,00	3.548,52	3.548,52	0,00	100,00
08.007	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	0,00	2,00	2,00	2.436,75	4.873,50	0,00	4.873,50	4.873,50	0,00	100,00
<b>09</b>	<b>PARQUE</b>							<b>16.869,10</b>	<b>-</b>	<b>16.869,10</b>	<b>16.869,10</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
09.001	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.722,27	3.722,27	0,00	3.722,27	3.722,27	0,00	100,00
09.002	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	2,00	0,00	2,00	2,00	3.831,20	7.662,40	0,00	7.662,40	7.662,40	0,00	100,00

**Luiz Manoel Neri Affonso Junior**  
Secretaria de Planejamento

**José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo

**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng. Civil - CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo




REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 186/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 05 / 2024					ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO			PERÍODO: 26/03/2024 a 26/04/2024					DATA: 29/04/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir <sup>a</sup>	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
09.003	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2486,97	2.486,97	0,00	2.486,97	2.486,97	0,00	100,00
09.004	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00	0,00	2,00	2,00	1498,73	2.997,46	0,00	2.997,46	2.997,46	0,00	100,00
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>10.980,66</b>	<b>8.787,83</b>	<b>2.192,83</b>	<b>10.980,66</b>	-	<b>100,00</b>
10.001	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	4,00	4,00	4,00	4,00	1702,91	6.811,64	6.811,64	0,00	6.811,64	0,00	100,00
10.002	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	0,00	12,00	12,00	119,89	1.438,68	0,00	1.438,68	1.438,68	0,00	100,00
10.003	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	0,00	1,00	1,00	45,83	45,83	0,00	45,83	45,83	0,00	100,00
10.004	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	1,00	1,00	34,92	34,92	0,00	34,92	34,92	0,00	100,00
10.005	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	0,00	2,00	2,00	15,28	30,56	0,00	30,56	30,56	0,00	100,00
10.006	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	4,00	4,00	4,00	4,00	15,70	62,80	62,80	0,00	62,80	0,00	100,00
10.007	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	4,00	4,00	4,00	4,00	151,10	604,40	604,40	0,00	604,40	0,00	100,00
10.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	2,00	2,00	2,00	2,00	128,56	257,12	257,12	0,00	257,12	0,00	100,00
10.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	92,00	92,00	92,00	92,00	10,81	994,52	994,52	0,00	994,52	0,00	100,00
10.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	31,00	31,00	31,00	31,00	1,85	57,35	57,35	0,00	57,35	0,00	100,00
10.011	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	132,00	0,00	132,00	132,00	4,87	642,84	0,00	642,84	642,84	0,00	100,00
<b>11</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>26.461,00</b>	<b>21.565,72</b>	<b>3.572,24</b>	<b>25.137,95</b>	<b>1.323,05</b>	<b>95,00</b>
11.001	Mestre de obras com encargos complementares	h	200,00	163,00	27,00	190,00	66,90	13.380,00	10.904,70	1.806,30	12.711,00	669,00	95,00
11.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	100,00	81,50	13,50	95,00	130,81	13.081,00	10.661,02	1.765,94	12.426,95	654,05	95,00
<b>12</b>	<b>ADITIVO (ROTATÓRIA)</b>							<b>18.763,11</b>	<b>12.253,28</b>	<b>6.509,83</b>	<b>18.763,11</b>	-	<b>100,00</b>
12.001	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	132,73	132,73	132,73	132,73	16,51	2.191,37	2.191,37	0,00	2.191,37	0,00	100,00
12.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	95,66	95,66	95,66	95,66	39,04	3.734,57	3.734,57	0,00	3.734,57	0,00	100,00
12.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	78,23	0,00	78,23	78,23	23,66	1.850,92	0,00	1.850,92	1.850,92	0,00	100,00
12.004	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	17,00	0,00	17,00	17,00	33,67	572,39	0,00	572,39	572,39	0,00	100,00
12.005	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	3,00	0,00	3,00	3,00	710,29	2.130,87	0,00	2.130,87	2.130,87	0,00	100,00
12.006	Planta - Moreia (Diets bicolor), fornecimento e plantio	un	9,00	0,00	9,00	9,00	39,81	358,29	0,00	358,29	358,29	0,00	100,00
12.007	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1963,50	1.963,50	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00	100,00

*Luiz Manoel Nori Alfano Junior*  
Engenheiro Civil  
CPF: 01.208572


*José Robson Santos da Paiva*  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


*Yan Henrique Tavares Santana*  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 186/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 05 / 2024				ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO			PERÍODO: 26/03/2024 a 26/04/2024				DATA: 29/04/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir <sup>a</sup>	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
12.008	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	328,00	0,00	328,00	328,00	4,87	1.597,36	0,00	1.597,36	1.597,36	0,00	100,00
12.009	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	13,00	13,00		13,00	175,07	2.275,91	2.275,91	0,00	2.275,91	0,00	100,00
10.010	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m	un	13,00	13,00		13,00	160,61	2.087,93	2.087,93	0,00	2.087,93	0,00	100,00
<b>Total geral</b>								<b>681.637,87</b>	<b>555.542,13</b>	<b>91.979,61</b>	<b>647.521,74</b>	<b>34.115,93</b>	<b>95,00</b>
 Engº Civil Luiz Mario Neri Alfano Junior CREA RN 2706905522			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						

**Luiz Mario Neri Alfano Junior**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/SE: 27.06905522**


  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil CREA 2705638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana




REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 186/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 05/ 2024	ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO				PERÍODO: 26/03/2024 a 26/04/2024	DATA: 29/04/2024
ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO	
<b>03</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
03.009	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	83,20	> 12,51+26,23+17,41+27,05 = 83,20m²	
<b>04</b>	<b>QUADRA</b>				
04.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	151,80	> Alvenaria de pedra = (0,80+0,50)/2 x 11,00 = 7,15m² (0,50+0,30)/2 x 22,00 = 8,80m² (0,30+0,60)/2 x 11,00 = 4,95m² (0,60+0,80)/2 x 22,00 = 15,40m² Total = 36,30 x 2 = 72,60m² > Parede = (66,00 x 0,60) = 39,60 x 2 = 79,20m² Total geral = 151,80m²	
<b>05</b>	<b>ELEVAÇÕES (PALCOS)</b>				
05.012	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de	m2	42,52	> 21,26x2,00 = 42,52m²	
<b>06</b>	<b>ELEVAÇÕES (PALCOS)</b>				
06.001	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio	un	141,00	> 141 und	
06.002	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	> 3 und	
06.003	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	83,00	> 83 und	
06.004	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	48,00	> 48 und	
06.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	> 4 und	
06.006	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	10,00	> 10 und	
06.007	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	12,00	> 12 und	
06.008	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	2,00	> 2 und	
06.009	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	638,08	> > Área em projeto = 34,09 + 43,16 + 32,05 + 12,29 + 82,50 + 31,11 + 48,67 + 39,74 + 7,23 + 9,47 + 4,75 + 33,10 + 44,67 + 10,87 + 3,36 + 54,96 + 43,69 + 92,90 + 9,47 = 638,08m²	
<b>07</b>	<b>DIVERSOS</b>				
07.005	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00	> 1 und	
<b>08</b>	<b>ACADEMIA A CÉU ABERTO</b>				
08.001	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	2,00	> 2 und	
08.002	Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01	un	2,00	> 2 und	
08.003	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	2,00	> 2 und	

  
**Mario Neri Alfano Junior**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SE: 216090532

  
**José Robson Santos da Paixão**  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
 Engº Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO
08.004	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	1,00	> 1 und
08.005	Instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati,	un	1,00	> 1 und
08.006	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	> 1 und
08.007	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	> 2 und
<b>09</b>	<b>PARQUE</b>			
09.001	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	> 1 und
09.002	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	2,00	> 2 und
09.003	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	> 1 und
09.004	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00	> 2 und
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
10.002	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	> 12 und
10.003	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	> 1 und
10.004	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	> 1 und
10.005	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	> 2 und
10.011	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	132,00	> 132,00 m
<b>11</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>			
11.001	Mestre de obras com encargos complementares	h	27,00	-> 200 x 95,00% = 190,00 - 163,00 (acumulado anterior) = 27,00h
11.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	13,50	-> 100 x 95,00% = 95,00 - 81,50 (acumulado anterior) = 13,50h
<b>12</b>	<b>ADITIVO (ROTATÓRIA)</b>			
12.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	78,23	> Área em projeto = 60,39+3,18+14,66 = 78,23m²
12.004	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	17,00	> 17 und
12.005	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	3,00	> 3 und
12.006	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	9,00	> 9 und
12.008	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos	m	328,00	-> 328,00 m
 Engº Civil Luiz Mario Neri Alfano Junior CREA RN 2706905522		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____		Aprovado para pagamento Data: __/__/____

**Luiz Mario Neri Alfano Junior**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/RN: 2706905522**

**Jose Robson Santos da Paixão**  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Yan Henrique Tavares Santana**  
 Engº Civil CREA 1715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 05

PERÍODO: 26/03/2024 A 26/04/2024

CONTRATO Nº 186/2023

ORDEM DE SERVIÇO

INÍCIO - 06/09/2023



MARCO INAUGURAL, PINTURA, GRAMA E PLANTAS



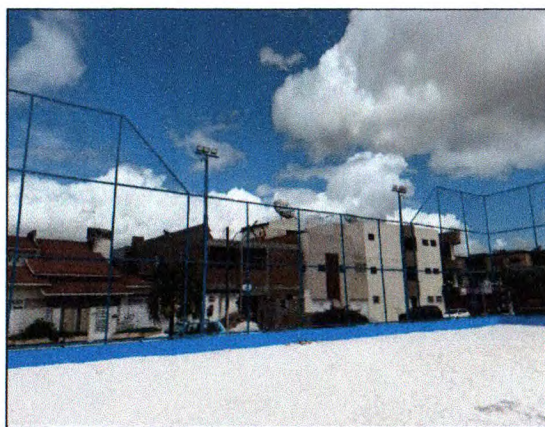
PINTURA, GRAMA E PLANTAS



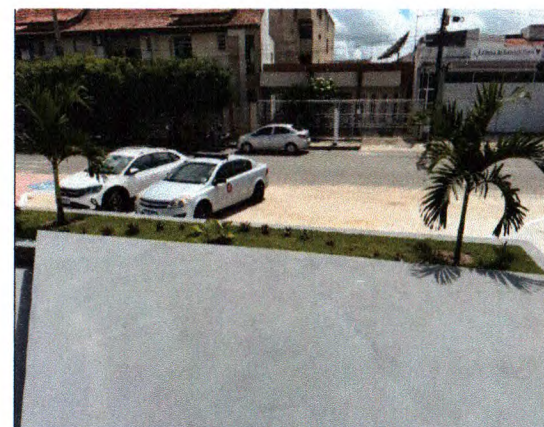
PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS





REFLETORES E PINTURA



PINTURA, GRAMA E PLANTAS

  
**Luis Mario Napi Alfano Junior**  
Engenheiro Civil  
CREA/SE: 21.6905622

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng.º Civil CREA 2115638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

FOLHA 1 de 6



REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 05

PERÍODO: 26/03/2024 A 26/04/2024

CONTRATO Nº 186/2023

ORDEM DE SERVIÇO

INÍCIO - 06/09/2023



PINTURA, GRAMA E PLANTAS



REFLETORES E PINTURA



PINTURA E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA



PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA




PINTURA E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA

ELABORADO POR:

  
**Luiz Mario Neri Alfano Junior**  
Engenheiro Civil  
CREA/SE, 27/030532

  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador do Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana.

  
**José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 2 de 6





PINTURA, GRAMA E PLANTAS



BRINQUEDOS, PINTURA, GRAMA E PLANTAS



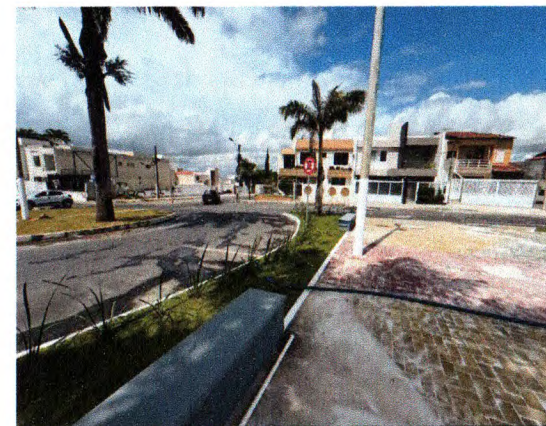
BRINQUEDOS, PINTURA, GRAMA E PLANTAS



BRINQUEDOS, PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS

ELABORADO POR:

  
**Luiz Mario Neri Alfano Junior**  
Engenheiro Civil  
CREA/E: 2.12.00552

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Yan Henrique Torres Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana:





PINTURA, GRAMA E PLANTAS



PINTURA, GRAMA E PLANTAS



PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS




GRAMA E PLANTAS

  
**Luiz Marco Neri Alfano Junior**  
Engenheiro Civil  
CREA/SE: 2146305522

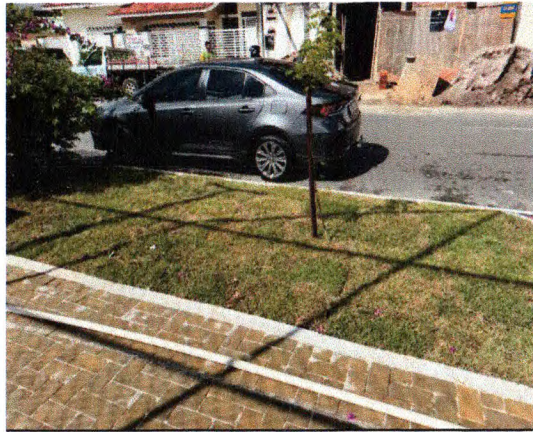
ELABORADO POR:

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 4 de 6





GRAMA E PLANTAS



PINTURA, GRAMA E PLANTAS



GRAMA E PLANTAS



GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS

  
**Leda Maria Nepi Affonso Junior**  
Engenheiro Civil  
CREA: 27.220.562/2

ELABORADO POR:

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil CREA 0715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 5 de 6





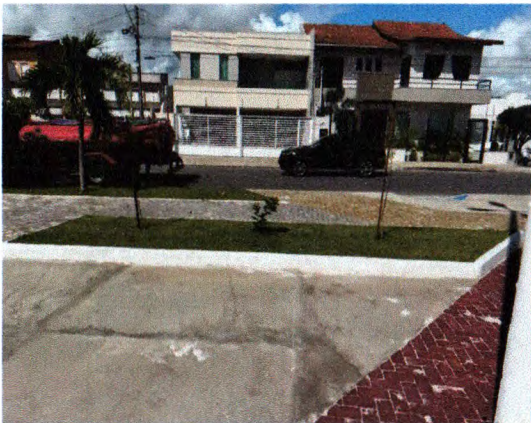
PINTURA, GRAMA E PLANTAS



PINTURA, GRAMA E PLANTAS



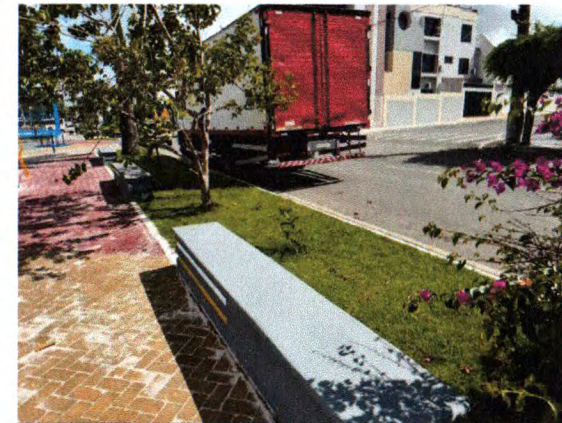
PINTURA, GRAMA E PLANTAS



GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS

ELABORADO POR:

  
**Luiz Otávio Neri Alfano Junior**  
Engenheiro Civil  
CREA/SE: 270305532

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Yan Henrique Borges Santana  
Eng.º Civil CREA 4775638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana
