

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE				DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 05				CONTRATO Nº 032/2024					
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA				VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024			Período: 01/09/2024 a 30/09/2024				CONTRATO DE REPASSE					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Data de medição: 01/10/2024									
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)							
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES															
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00		6,00	0,00	468,11	2.808,66	2.808,66	-	2.808,66	-	2.808,66	-	100,00
01.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	6,00		6,00	0,00	965,84	5.795,04	5.795,04	-	5.795,04	-	5.795,04	-	100,00
02	RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS								619.184,52	320.605,30	-	320.605,30	298.579,22	51,78		
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								28.350,29	28.350,29	-	28.350,29	-	28.350,29	-	100,00
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.847,01	3.847,01		3.847,01	0,00	1,68	6.462,98	6.462,98	-	6.462,98	-	6.462,98	-	100,00
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	3.971,41	3.971,41		3.971,41	0,00	1,36	5.401,12	5.401,12	-	5.401,12	-	5.401,12	-	100,00
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.241,07	1.241,07		1.241,07	0,00	1,12	1.390,00	1.390,00	-	1.390,00	-	1.390,00	-	100,00
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	3.723,20	3.723,20		3.723,20	0,00	1,29	4.802,93	4.802,93	-	4.802,93	-	4.802,93	-	100,00
02.001.005	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	4,88	4,88		4,88	0,00	28,02	136,60	136,60	-	136,60	-	136,60	-	100,00
02.001.006	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	und	6,00	6,00		6,00	0,00	204,70	1.228,20	1.228,20	-	1.228,20	-	1.228,20	-	100,00
02.001.007	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	13,00	13,00		13,00	0,00	24,75	321,75	321,75	-	321,75	-	321,75	-	100,00
02.001.008	Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 5 fios arame farpado	m	227,21	227,21		227,21	0,00	37,88	8.606,71	8.606,71	-	8.606,71	-	8.606,71	-	100,00
02.002	PAVIMENTAÇÃO								557.370,99	278.209,01	-	278.209,01	279.161,98	49,91		
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.598,21	1.828,49		1.828,49	1.769,72	125,68	452.223,03	229.804,62	-	229.804,62	222.418,41	50,82		
02.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	829,35	372,53		372,53	456,82	54,87	45.506,43	20.440,72	-	20.440,72	25.065,71	44,92		
02.002.003	Pintura de meio fio (calçamento)	m	829,35			829,35	0,00	4,39	3.640,85	-	-	-	3.640,85	-		
02.002.004	Colchão de areia	m3	251,87	127,99		127,99	123,88	156,22	39.347,13	19.994,60	-	19.994,60	19.352,53	50,82		
02.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	6.422,80	3.263,75		3.263,75	3.159,05	1,29	8.285,41	4.210,24	-	4.210,24	4.075,17	50,82		
02.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	829,35	372,53		372,53	456,82	10,09	8.368,14	3.758,83	-	3.758,83	4.609,31	44,92		
02.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								31.270,44	14.046,00	-	14.046,00	17.224,44	44,92		
02.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	248,81	111,76		111,76	137,05	125,68	31.270,44	14.046,00	-	14.046,00	17.224,44	44,92		
02.004	LIMPEZA GERAL								2.192,80	-	-	-	2.192,80	-		
02.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.847,01				3.847,01	0,57	2.192,80	-	-	-	2.192,80	-		
03	RUA PADRE FILISMINO								207.536,51	6.175,53	-	6.175,53	201.360,98	2,98		
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								6.175,53	6.175,53	-	6.175,53	-	6.175,53	-	100,00
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.316,97	1.316,97		1.316,97	0,00	1,68	2.212,51	2.212,51	-	2.212,51	-	2.212,51	-	100,00
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.357,49	1.357,49		1.357,49	0,00	1,36	1.846,19	1.846,19	-	1.846,19	-	1.846,19	-	100,00
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	424,21	424,21		424,21	0,00	1,12	475,12	475,12	-	475,12	-	475,12	-	100,00
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1.272,64	1.272,64		1.272,64	0,00	1,29	1.641,71	1.641,71	-	1.641,71	-	1.641,71	-	100,00
03.002	PAVIMENTAÇÃO								190.426,46	-	-	-	190.426,46	-		
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.235,94				1.235,94	125,68	155.332,94	-	-	-	155.332,94	-		

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R. T. Eng. Civil CREA/SE
RN 2714133398

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE		DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05				CONTRATO Nº 032/2024						
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA		VIGÊNCIA 07/12/2024		Período: 01/09/2024 a 30/09/2024				CONTRATO DE REPASSE						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO 11/09/2024		Data de medição: 01/10/2024										
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
03.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	270,10			0,00	270,10	54,87	14.820,39	-	-	-	14.820,39	-
03.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	270,10			0,00	270,10	4,39	1.185,74	-	-	-	1.185,74	-
03.002.004	Colchão de areia	m3	86,52			0,00	86,52	156,22	13.516,15	-	-	-	13.516,15	-
03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.206,15			0,00	2.206,15	1,29	2.845,93	-	-	-	2.845,93	-
3.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	270,10			0,00	270,10	10,09	2.725,31	-	-	-	2.725,31	-
03.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								10.183,85	-	-	-	10.183,85	-
03.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	81,03			0,00	81,03	125,68	10.183,85	-	-	-	10.183,85	-
03.004	LIMPEZA GERAL								750,67	-	-	-	750,67	-
03.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.316,97			0,00	1.316,97	0,57	750,67	-	-	-	750,67	-
04	RUA ALVARO FONSECA DE OLIVEIRA								333.510,13	-	-	-	333.510,13	-
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								9.976,41	-	-	-	9.976,41	-
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.130,75			0,00	2.130,75	1,68	3.579,66	-	-	-	3.579,66	-
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	2.191,13			0,00	2.191,13	1,36	2.979,94	-	-	-	2.979,94	-
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	684,73			0,00	684,73	1,12	766,90	-	-	-	766,90	-
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.054,19			0,00	2.054,19	1,29	2.649,91	-	-	-	2.649,91	-
04.002	PAVIMENTAÇÃO								307.140,82	-	-	-	307.140,82	-
04.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.009,99			0,00	2.009,99	125,68	252.615,54	-	-	-	252.615,54	-
04.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	402,55			0,00	402,55	54,87	22.087,92	-	-	-	22.087,92	-
04.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	402,55			0,00	402,55	4,39	1.767,19	-	-	-	1.767,19	-
04.002.004	Colchão de areia	m3	140,70			0,00	140,70	156,22	21.980,15	-	-	-	21.980,15	-
04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.587,82			0,00	3.587,82	1,29	4.628,29	-	-	-	4.628,29	-
4.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	402,55			0,00	402,55	10,09	4.061,73	-	-	-	4.061,73	-
04.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								15.178,37	-	-	-	15.178,37	-
04.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	120,77			0,00	120,77	125,68	15.178,37	-	-	-	15.178,37	-
04.004	LIMPEZA GERAL								1.214,53	-	-	-	1.214,53	-
04.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.130,75			0,00	2.130,75	0,57	1.214,53	-	-	-	1.214,53	-
05	RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS								227.753,48	166.585,89	-	166.585,89	61.167,59	73,14
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								64.217,73	4.899,97	-	4.899,97	59.317,76	7,63
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.038,07	1.038,07		1.038,07	0,00	1,68	1.743,96	1.743,96	-	-	1.743,96	100,00
05.001.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	1.081,06			0,00	1.081,06	54,87	59.317,76	-	-	-	59.317,76	-
05.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	337,83	337,83		337,83	0,00	1,12	378,37	378,37	-	-	378,37	100,00

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Soares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE				DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 05				CONTRATO Nº 032/2024			
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA				VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024			Período: 01/09/2024 a 30/09/2024				CONTRATO DE REPASSE			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: 01/10/2024										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.013,49	1.013,49		1.013,49	0,00	1,29	1.307,40	1.307,40	-	1.307,40	-	100,00
05.001.005	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.081,06	1.081,06		1.081,06	0,00	1,36	1.470,24	1.470,24	-	1.470,24	-	100,00
05.002	PAVIMENTAÇÃO								152.138,08	150.879,95	-	150.879,95	1.258,13	99,17
05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	952,09	952,09		952,09	0,00	125,68	119.658,67	119.658,67	-	119.658,67	-	100,00
05.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	286,59	286,59		286,59	0,00	54,87	15.725,19	15.725,19	-	15.725,19	-	100,00
05.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	286,59			0,00	286,59	4,39	1.258,13	-	-	-	1.258,13	-
05.002.004	Colchão de areia	m3	66,65	66,65		66,65	0,00	156,22	10.412,06	10.412,06	-	10.412,06	-	100,00
05.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.699,49	1.699,49		1.699,49	0,00	1,29	2.192,34	2.192,34	-	2.192,34	-	100,00
05.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	286,59	286,59		286,59	0,00	10,09	2.891,69	2.891,69	-	2.891,69	-	100,00
05.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								10.805,97	10.805,97	-	10.805,97	-	100,00
05.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	85,98	85,98		85,98	0,00	125,68	10.805,97	10.805,97	-	10.805,97	-	100,00
05.004	LIMPEZA GERAL								591,70	-	-	-	591,70	-
05.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.038,07			0,00	1.038,07	0,57	591,70	-	-	-	591,70	-
06	RUA ALLAN KARDEC								129.727,16	108.362,48	-	108.362,48	21.364,68	83,53
06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.762,57	3.762,57	-	3.762,57	-	100,00
06.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	796,40	796,40		796,40	0,00	1,68	1.337,95	1.337,95	-	1.337,95	-	100,00
06.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	830,53	830,53		830,53	0,00	1,36	1.129,52	1.129,52	-	1.129,52	-	100,00
06.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	259,54	259,54		259,54	0,00	1,12	290,68	290,68	-	290,68	-	100,00
06.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	778,62	778,62		778,62	0,00	1,29	1.004,42	1.004,42	-	1.004,42	-	100,00
06.002	PAVIMENTAÇÃO								116.931,72	97.393,42	-	97.393,42	19.538,30	83,29
06.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	728,14	611,71		611,71	116,43	125,68	91.512,64	76.879,72	-	76.879,72	14.632,92	84,01
06.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	227,54	191,13		191,13	36,41	54,87	12.485,12	10.487,30	-	10.487,30	1.997,82	84,00
06.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	227,54			0,00	227,54	4,39	998,90	-	-	-	998,90	-
06.002.004	Colchão de areia	m3	50,97	42,82		42,82	8,15	156,22	7.962,53	6.689,34	-	6.689,34	1.273,19	84,01
06.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.299,73	1.091,91		1.091,91	207,82	1,29	1.676,65	1.408,56	-	1.408,56	268,09	84,01
06.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	227,54	191,13		191,13	36,41	10,09	2.295,88	1.928,50	-	1.928,50	367,38	84,00
06.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								8.578,92	7.206,49	-	7.206,49	1.372,43	84,00
06.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	68,26	57,34		57,34	10,92	125,68	8.578,92	7.206,49	-	7.206,49	1.372,43	84,00
06.004	LIMPEZA GERAL								453,95	-	-	-	453,95	-

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Torres Santos
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

Página 3 de 7

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Eng.º Civil CREA/SE
RN 2714133398

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE			DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 05				CONTRATO Nº 032/2024			
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA			VIGÊNCIA 07/12/2024				Período: 01/09/2024 a 30/09/2024				CONTRATO DE REPASSE			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			EXECUÇÃO 11/09/2024				Data de medição: 01/10/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
06.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	796,40			0,00	796,40	0,57	453,95	-	-	-	453,95	-
07	RUA ARGENTINA								262.828,20	259.832,89	-	259.832,89	2.995,31	98,88
07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								7.602,12	7.602,12	-	7.602,12	-	100,00
07.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.607,77	1.607,77		1.607,77	0,00	1,68	2.701,05	2.701,05	-	2.701,05	-	100,00
07.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	1.678,80	1.678,80		1.678,80	0,00	1,36	2.283,17	2.283,17	-	2.283,17	-	100,00
07.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	524,63	524,63		524,63	0,00	1,12	587,59	587,59	-	587,59	-	100,00
07.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.573,88	1.573,88		1.573,88	0,00	1,29	2.030,31	2.030,31	-	2.030,31	-	100,00
07.002	PAVIMENTAÇÃO								236.454,29	234.375,41	-	234.375,41	2.078,88	99,12
07.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.465,71	1.465,71		1.465,71	0,00	125,68	184.210,43	184.210,43	-	184.210,43	-	100,00
07.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	473,55	473,55		473,55	0,00	54,87	25.983,69	25.983,69	-	25.983,69	-	100,00
07.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	473,55			0,00	473,55	4,39	2.078,88	-	-	-	2.078,88	-
07.002.004	Colchão de areia	m3	102,60	102,60		102,60	0,00	156,22	16.028,17	16.028,17	-	16.028,17	-	100,00
07.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.616,28	2.616,28		2.616,28	0,00	1,29	3.375,00	3.375,00	-	3.375,00	-	100,00
07.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	473,55	473,55		473,55	0,00	10,09	4.778,12	4.778,12	-	4.778,12	-	100,00
07.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								17.855,36	17.855,36	-	17.855,36	-	100,00
07.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	142,07	142,07		142,07	0,00	125,68	17.855,36	17.855,36	-	17.855,36	-	100,00
07.004	LIMPEZA GERAL								916,43	-	-	-	916,43	-
07.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.607,77			0,00	1.607,77	0,57	916,43	-	-	-	916,43	-
08	TRAVESSA IVAN ANDRADE								281.750,13	-	-	-	281.750,13	-
08.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								8.201,23	-	-	-	8.201,23	-
08.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.737,75			0,00	1.737,75	1,68	2.919,42	-	-	-	2.919,42	-
08.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	1.809,23			0,00	1.809,23	1,36	2.460,55	-	-	-	2.460,55	-
08.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	565,38			0,00	565,38	1,12	633,23	-	-	-	633,23	-
08.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.696,15			0,00	1.696,15	1,29	2.188,03	-	-	-	2.188,03	-
08.002	PAVIMENTAÇÃO								254.592,42	-	-	-	254.592,42	-
08.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.594,80			0,00	1.594,80	125,68	200.434,46	-	-	-	200.434,46	-
08.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	476,50			0,00	476,50	54,87	26.145,56	-	-	-	26.145,56	-
08.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	476,50			0,00	476,50	4,39	2.091,84	-	-	-	2.091,84	-
08.002.004	Colchão de areia	m3	111,64			0,00	111,64	156,22	17.440,40	-	-	-	17.440,40	-
08.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.846,72			0,00	2.846,72	1,29	3.672,27	-	-	-	3.672,27	-
08.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	476,50			0,00	476,50	10,09	4.807,89	-	-	-	4.807,89	-
08.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								17.965,96	-	-	-	17.965,96	-

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

Página 4 de 7

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Engº CIVIL CREA/SE
RN 2714133398

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE							DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05				CONTRATO Nº 032/2024	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA							VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024		Período: 01/09/2024 a 30/09/2024				CONTRATO DE REPASSE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									Data de medição: 01/10/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
08.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	142,95			0,00	142,95	125,68	17.965,96	-	-	-	17.965,96	-
08.004	LIMPEZA GERAL								990,52	-	-	-	990,52	-
08.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.737,75			0,00	1.737,75	0,57	990,52	-	-	-	990,52	-
09	RUA EGILDO SANTOS								46.643,84	45.816,17	-	45.816,17	827,67	98,23
09.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.229,90	1.229,90	-	1.229,90	-	100,00
09.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	252,58	252,58		252,58	0,00	1,68	424,33	424,33	-	424,33	-	100,00
09.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	275,94	275,94		275,94	0,00	1,36	375,28	375,28	-	375,28	-	100,00
09.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	86,23	86,23		86,23	0,00	1,12	96,58	96,58	-	96,58	-	100,00
09.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	258,69	258,69		258,69	0,00	1,29	333,71	333,71	-	333,71	-	100,00
09.002	PAVIMENTAÇÃO								39.398,20	38.714,50	-	38.714,50	683,70	98,26
09.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	205,86	205,86		205,86	0,00	125,68	25.872,48	25.872,48	-	25.872,48	-	100,00
09.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	155,74	155,74		155,74	0,00	54,87	8.545,45	8.545,45	-	8.545,45	-	100,00
09.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	155,74			0,00	155,74	4,39	683,70	-	-	-	683,70	-
09.002.004	Colchão de areia	m3	14,41	14,41		14,41	0,00	156,22	2.251,13	2.251,13	-	2.251,13	-	100,00
09.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	367,46	367,46		367,46	0,00	1,29	474,02	474,02	-	474,02	-	100,00
09.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	155,74	155,74		155,74	0,00	10,09	1.571,42	1.571,42	-	1.571,42	-	100,00
09.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								5.871,77	5.871,77	-	5.871,77	-	100,00
09.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	46,72	46,72		46,72	0,00	125,68	5.871,77	5.871,77	-	5.871,77	-	100,00
09.004	LIMPEZA GERAL								143,97	-	-	-	143,97	-
09.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	252,58			0,00	252,58	0,57	143,97	-	-	-	143,97	-
10	RUA PROJETADA								128.552,72	82.916,02	44.248,13	127.164,15	1.388,57	98,92
10.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.749,15	3.749,15	-	3.749,15	-	100,00
10.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	794,85	794,85		794,85	0,00	1,68	1.335,35	1.335,35	-	1.335,35	-	100,00
10.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	826,82	826,82		826,82	0,00	1,36	1.124,48	1.124,48	-	1.124,48	-	100,00
10.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	258,38	258,38		258,38	0,00	1,12	289,39	289,39	-	289,39	-	100,00
10.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	775,14	775,14		775,14	0,00	1,29	999,93	999,93	-	999,93	-	100,00
10.002	PAVIMENTAÇÃO								116.315,79	74.059,23	41.321,05	115.380,28	935,51	99,20
10.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	730,92	433,47	297,45	730,92	0,00	125,68	91.862,03	54.478,51	37.383,52	91.862,03	-	100,00
10.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	213,10	213,10		213,10	0,00	54,87	11.692,80	11.692,80	-	11.692,80	-	100,00
10.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	213,10			0,00	213,10	4,39	935,51	-	-	-	935,51	-
10.002.004	Colchão de areia	m3	51,16	30,34	20,82	51,16	0,00	156,22	7.992,22	4.739,71	3.252,51	7.992,22	-	100,00

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Torres Santana
Eng. Civil - CREA: 715638353
Coordenador de Núcleo

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE			DATA DE TÉRMINO:					BOLETIM DE MEDIÇÃO 05					CONTRATO Nº 032/2024	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA			VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024					Período: 01/09/2024 a 30/09/2024					CONTRATO DE REPASSE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			Quantidades					Valores (R\$)						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
10.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.304,69	773,67	531,02	1.304,69	0,00	1,29	1.683,05	998,03	685,02	1.683,05	-	100,00
10.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	213,10	213,10		213,10	0,00	10,09	2.150,18	2.150,18	-	2.150,18	-	100,00
10.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								8.034,72	5.107,64	2.927,08	8.034,72	-	100,00
10.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	63,93	40,64	23,29	63,93	0,00	125,68	8.034,72	5.107,64	2.927,08	8.034,72	-	100,00
10.004	LIMPEZA GERAL								453,06	-	-	-	453,06	-
10.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	794,85				0,00	0,57	453,06	-	-	-	453,06	-
11	DRENAGEM PROFUNDA								1.483.248,23	326.500,19	359.757,13	686.257,32	796.990,91	46,27
11.001	LOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO E INTERLIGAÇÕES								638.357,78	134.458,81	180.002,35	314.461,16	323.896,62	49,26
11.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	2.910,10	497,21	1.068,87	1.566,08	1.344,02	13,04	37.947,70	6.483,62	13.938,06	20.421,68	17.526,02	53,82
11.001.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	1.163,35			0,00	1.163,35	19,59	22.790,03	-	-	-	22.790,03	-
11.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	3.637,63	397,24	1.336,09	1.733,33	1.904,30	1,12	4.074,14	444,91	1.496,42	1.941,33	2.132,81	47,65
11.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	10.912,86	1.191,72	4.008,27	5.199,99	5.712,87	1,29	14.077,59	1.537,32	5.170,67	6.707,99	7.369,60	47,65
11.001.005	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	1.454,19			0,00	1.454,19	3,33	4.842,45	-	-	-	4.842,45	-
11.001.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.362,57			0,00	4.362,57	1,29	5.627,72	-	-	-	5.627,72	-
11.001.007	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	2.461,38	397,24	849,19	1.246,43	1.214,95	154,81	381.046,24	61.496,72	131.463,10	192.959,82	188.086,42	50,64
11.001.008	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	62.765,19	10.129,62	21.654,34	31.783,96	30.981,23	1,29	80.967,10	13.067,21	27.934,10	41.001,31	39.965,79	50,64
11.001.009	Escoramento metálico p/ valas, h<=2,50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	m2	1.336,75	1.306,30		1.306,30	30,45	39,37	52.627,85	51.429,03	-	51.429,03	1.198,82	97,72
11.001.010	Locação de rede de drenagem	m	1.588,04				1.588,04	1,96	3.112,56	-	-	-	3.112,56	-
11.001.011	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	440,00				440,00	71,01	31.244,40	-	-	-	31.244,40	-
11.002	TUBOS CENTRAIS E INTERLIGAÇÕES								840.190,45	192.041,38	179.754,78	371.796,16	468.394,29	44,25
11.002.001	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	335,00	175,50		175,50	159,50	86,53	28.987,55	15.186,02	-	15.186,02	13.801,53	52,39
11.002.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	250,97			0,00	250,97	305,94	76.781,76	-	-	-	76.781,76	-
11.002.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	565,82	565,82		565,82	0,00	180,49	102.124,85	102.124,85	-	102.124,85	-	100,00
11.002.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	111,25			0,00	111,25	503,98	56.067,78	-	-	-	56.067,78	-
11.002.005	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,20 m	m	325,00		194,34	194,34	130,66	924,95	300.608,75	-	179.754,78	179.754,78	120.853,97	59,80
11.002.006	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,51 e 2,00m - R1	un	63,00	13,00		13,00	50,00	2.921,04	184.025,52	37.973,52	-	37.973,52	146.052,00	20,63
11.002.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,60m	un	9,00	1,00		1,00	8,00	2.337,92	21.041,28	2.337,92	-	2.337,92	18.703,36	11,11
11.002.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,80m	un	9,00			0,00	9,00	3.212,90	28.916,10	-	-	-	28.916,10	-
11.002.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,40 x 1,40 x 1,80m	un	7,00	7,00		7,00	0,00	4.917,01	34.419,07	34.419,07	-	34.419,07	-	100,00

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

Página 6 de 7

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
Jose Armelinda Andrade
Sócio Administrador
R T Engº CIVIL CREA/SE
RN 2714133398

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05			CONTRATO Nº 032/2024	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024		Período: 01/09/2024 a 30/09/2024			CONTRATO DE REPASSE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA										Data de medição: 01/10/2024				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
11.002.010	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m	un	1,00			0,00	1,00	7.217,79	7.217,79	-	-	-	7.217,79	-
11.003	SINALIZAÇÕES								4.700,00	-	-	-	4.700,00	-
11.003.001	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	500,00			0,00	500,00	3,69	1.845,00	-	-	-	1.845,00	-
11.003.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	500,00			0,00	500,00	5,71	2.855,00	-	-	-	2.855,00	-
12	SERVIÇOS DIVERSOS								49.454,62	-	-	-	49.454,62	-
12.001	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	18,00			0,00	18,00	801,09	14.419,62	-	-	-	14.419,62	-
12.002	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	50,00			0,00	50,00	700,70	35.035,00	-	-	-	35.035,00	-
13	EQUIPE DIRIGENTE								123.127,40	51.381,20	11.789,83	63.171,03	59.956,37	51,31
13.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	220,00	91,81	21,06	112,87	107,13	134,71	29.636,20	12.367,73	2.836,99	15.204,72	14.431,48	51,30
13.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	880,00	367,22	84,27	451,49	428,51	70,53	62.066,40	25.900,03	5.943,56	31.843,59	30.222,81	51,31
13.003	Topógrafo com encargos complementares	h	880,00	367,22	84,27	451,49	428,51	23,72	20.873,60	8.710,46	1.998,88	10.709,34	10.164,26	51,31
13.004	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	880,00	367,22	84,27	451,49	428,51	11,99	10.551,20	4.402,98	1.010,40	5.413,38	5.137,82	51,31
14	ESGOTO								441.910,85	436.033,97	-	436.033,97	5.876,88	98,67
14.001	Locação de rede de água ou esgoto. af 10/2018	m	2.101,06	2.101,06		2.101,06	0,00	6,34	13.320,72	13.320,72	-	13.320,72	-	100,00
14.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	504,25	504,25		504,25	0,00	13,04	6.575,48	6.575,48	-	6.575,48	-	100,00
14.003	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af 01/2021	m	2.101,06	2.101,06		2.101,06	0,00	108,88	228.343,20	228.343,20	-	228.343,20	-	100,00
14.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	630,32	630,32		630,32	0,00	1,12	705,96	705,96	-	705,96	-	100,00
14.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1.890,95	1.890,95		1.890,95	0,00	1,29	2.439,33	2.439,33	-	2.439,33	-	100,00
14.006	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	467,12	467,12		467,12	0,00	154,81	72.314,85	72.314,85	-	72.314,85	-	100,00
14.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	11.911,56	11.911,56		11.911,56	0,00	1,29	15.365,91	15.365,91	-	15.365,91	-	100,00
14.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	und	140,00	132,00		132,00	8,00	603,92	84.548,80	79.717,44	-	79.717,44	4.831,36	94,29
14.009	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m	und	140,00	132,00		132,00	8,00	130,69	18.296,60	17.251,08	-	17.251,08	1.045,52	94,29
TOTAL:									4.343.831,50	1.812.813,34	415.795,09	2.228.608,43	2.115.223,07	51,31
PERCENTUAL										41,73	9,57	51,31	48,69	

Eng. Civil José Almeida Andrade
CREA RN 2714133398





Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/___





Aprovado para pagamento





Data: ___/___/___





José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Teófilo Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo


DIÁRIO DE OBRA		
		
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA		
FISCAL DA OBRA	DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO	01/09/2024	175
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS		
TEMPO: MANHÃ:	TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  José Robson Santos da Paixão Eng. Civil CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana </div> <div style="text-align: center;">  Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA: 2715638353 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana </div> </div>		
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:		
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA		
DOMINGO, NÃO HOUE ATIVIDADES		
<div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398 </div> </div>		
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:		


DIÁRIO DE OBRA		
		
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA		
FISCAL DA OBRA	DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO	02/09/2024	176
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS		
TEMPO: MANHÃ:	TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana </div> <div style="text-align: center;">  Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA: 2715638353 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana </div> </div>		
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:		
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA		
FOI DADO SEGUIMENTO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA		
<div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398 </div> </div>		
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:		


DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		03/09/2024	177
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		Prefeitura Municipal de Itabaiana Van Henrique Alves Santana Eng. Civil - CREA: 1715638353 Coordenador de Núcleo	
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
FOI DADO SEGUIMENTO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:			
		Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		04/09/2024	178
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		Prefeitura Municipal de Itabaiana Van Henrique Alves Santana Eng. Civil - CREA: 1715638353 Coordenador de Núcleo	
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
FOI DADO SEGUIMENTO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:			
		Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		05/09/2024	179
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo</p> </div> </div>			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
FOI DADO SEGUIMENTO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398</p> </div> </div>			





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		06/09/2024	180
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo</p> </div> </div>			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
FOI DADO SEGUIMENTO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398</p> </div> </div>			





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO N°: 032/2024 MUNICIPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA N°
ENG° CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		07/09/2024	181
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Torres Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo</p> </div> </div>			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
SABADO, NÃO HOUE ATIVIDADES			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: <i>[Assinatura]</i> Eng° Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398			





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO N°: 032/2024 MUNICIPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA N°
ENG° CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		08/09/2024	182
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Torres Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo</p> </div> </div>			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
DOMINGO, NÃO HOUE ATIVIDADES			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: <i>[Assinatura]</i> Eng° Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398			





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		09/09/2024	183
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana			
Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA			
			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398			





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		10/09/2024	184
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana			
Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
INICIO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO PARA DRENAGEM PROFUNDA			
			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398			





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		11/09/2024	185
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo	
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
PROSEGUIMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO PARA A DRENAGEM PROFUNDA			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: 			
		Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		12/09/2024	186
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA: 2715638353 Coordenador de Núcleo	
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
PROSEGUIMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO PARA A DRENAGEM PROFUNDA			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: 			
		Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE			
CONTRATO Nº: 032/2024		MUNICÍPIO: ITABAIANA	
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		13/09/2024	187
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:	TARDE:		
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana </div> <div style="text-align: center;">  Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Soares Santana Eng. Civil - CREA: 2715638353 Coordenador de Núcleo </div> </div>			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
PROSEGUIMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO PARA A DRENAGEM PROFUNDA			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:		 Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	


DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE			
CONTRATO Nº: 032/2024		MUNICÍPIO: ITABAIANA	
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		14/09/2024	188
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:	TARDE:		
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana </div> <div style="text-align: center;">  Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Soares Santana Eng. Civil - CREA: 2715638353 Coordenador de Núcleo </div> </div>			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
SABADO, NÃO HOUE ATIVIDADES			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:		 Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	


DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICIPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		15/09/2024	189
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
DOMINGO, NÃO HOUVE ATIVIDADES			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: 			
Eng. Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398			





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICIPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		16/09/2024	190
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
INICIO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E ATERRO PARA A DRENAGEM PROFUNDA			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: 			
Eng. Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398			





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		17/09/2024	191
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E ATERRO NA DRENAGEM PROFUNDA			
			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Eng. Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398			





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		18/09/2024	192
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E ATERRO NA DRENAGEM PROFUNDA			
			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Eng. Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398			





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		19/09/2024	193
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>José Robson Santos da Paixão</i> José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>Yan Henrique Torres Santana</i> Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Torres Santana Eng. Civil - CREA: 2715638353 Coordenador de Núcleo</p> </div> </div>			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E ATERRO NA DRENAGEM PROFUNDA			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:		Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		20/09/2024	194
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>José Robson Santos da Paixão</i> José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>Yan Henrique Torres Santana</i> Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Torres Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo</p> </div> </div>			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E ATERRO NA DRENAGEM PROFUNDA			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:		Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		21/09/2024	195
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  José Robson Santos da Paixão Eng. Civil CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana </div> <div style="text-align: center;">  Prefeitura Municipal de Itabaiana Van Henrique Soares Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo </div> </div>			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
SABADO, NÃO HOUE ATIVIDADES			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:		 Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		22/09/2024	196
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  José Robson Santos da Paixão Eng. Civil CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana </div> <div style="text-align: center;">  Prefeitura Municipal de Itabaiana Van Henrique Soares Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo </div> </div>			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
DOMINGO, NÃO HOUE ATIVIDADES			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:		 Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		23/09/2024	197
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
José Robson Santos da Paixão Eng. Civil CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Torres Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo	
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E ATERRO NA DRENAGEM PROFUNDA			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: 			
		Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		24/09/2024	198
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
José Robson Santos da Paixão Eng. Civil CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Torres Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo	
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E ATERRO NA DRENAGEM PROFUNDA			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: 			
		Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	





DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		25/09/2024	199
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA: 2715638353 Coordenador de Núcleo	
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E ATERRO NA DRENAGEM PROFUNDA			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: 			
		Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	

DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		26/09/2024	200
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
 			
José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA: 2715638353 Coordenador de Núcleo	
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E ATERRO NA DRENAGEM PROFUNDA			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: 			
		Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398	

DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		27/09/2024	201
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana </div> <div style="width: 45%;">  Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Soares Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo </div> </div>			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E ATERRO NA DRENAGEM PROFUNDA			
<div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> <div style="width: 30%;">  Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398 </div> </div>			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:			

DIÁRIO DE OBRA			
			
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA			
FISCAL DA OBRA		DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO		28/09/2024	202
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
TEMPO: MANHÃ:		TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana </div> <div style="width: 45%;">  Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Soares Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo </div> </div>			
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:			
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
SABADO, NÃO HOUE ATIVIDADES			
<div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> <div style="width: 30%;">  Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398 </div> </div>			
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:			

DIÁRIO DE OBRA		
		
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA		
FISCAL DA OBRA	DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO	29/09/2024	203
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS		
TEMPO: [MANHÃ:	[TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>  José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>  Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Soares Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo </p> </div> </div>		
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:		
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA		
DOMINGO, NÃO HOVE ATIVIDADES		
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:		
 Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398		

DIÁRIO DE OBRA		
		
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATO Nº: 032/2024 MUNICÍPIO: ITABAIANA		
FISCAL DA OBRA	DATA	FOLHA Nº
ENGº CIVIL: JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO	30/09/2024	204
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS		
TEMPO: [MANHÃ:	[TARDE:	
ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>  José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>  Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Soares Santana Eng. Civil - CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo </p> </div> </div>		
ASSINATURA DO FISCAL DA OBRA:		
OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA		
CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E ATERRO NA DRENAGEM PROFUNDA		
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:		
 Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398		

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 05

CONTRATO 032/2024

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 11/03/2024




PLACA DA OBRA



COLCHÃO DE AREIA - RUA PROJETADA




PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL - RUA PROJETADA

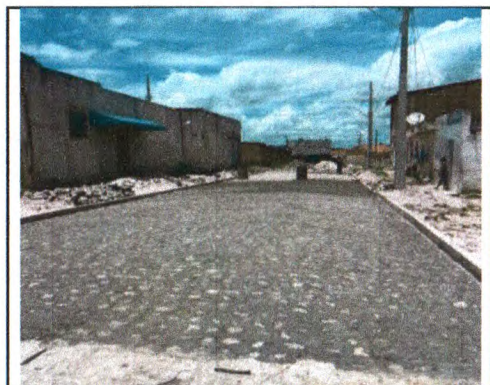

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL - RUA PROJETADA



DRENAGEM PROFUNDA - TUBULAÇÃO CENTRAL

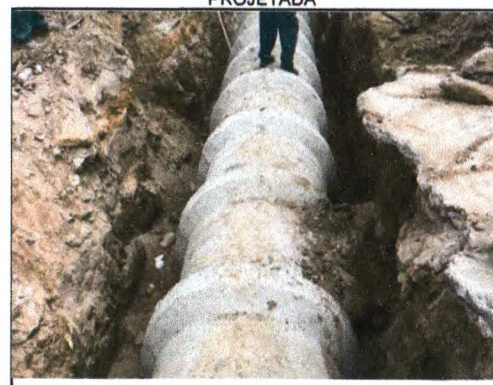

DRENAGEM PROFUNDA - TUBULAÇÃO CENTRAL

ELABORADO POR:

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Alberto Andrade
Sócio Administrador
R.T. Eng.º Civil CREA/SE
RM 2714133398

FOLHA 1 de 2

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Torres Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 05

CONTRATO 032/2024




ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 11/03/2024



DRENAGEM PROFUNDA - TUBULAÇÃO CENTRAL E ATERRO COM AREIA



DRENAGEM PROFUNDA - TUBULAÇÃO CENTRAL E ATERRO COM AREIA



ELABORADO POR:

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008
92714590

Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2024.09.30 09:39:40 -03'00'

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
Eng. Civil CREA/SE
RN 2714133398

FOLHA 2 de 2

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2725638353
Coordenador de Núcleo
