





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 66/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 06/09/2024 a 12/09/2024				DATA: 12/09/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2.877.783,26</b>	<b>2.465.824,81</b>	<b>49.801,70</b>	<b>2.515.626,51</b>		
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	54.220,31	1.097,48	55.317,79	44,52	2.809.212,00	2.413.888,22	48.859,81	2.462.748,03	346.463,97	87,67
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00		9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	54,30	1,00	55,30	941,89	59.433,26	51.144,63	941,89	52.086,52	7.346,74	87,64
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>119.220,00</b>	<b>115.072,85</b>	<b>315,00</b>	<b>116.387,85</b>	<b>3.832,15</b>	<b>96,79</b>
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	482,07	1,00	483,07	123,60	61.800,00	59.583,85	123,60	59.707,45	2.092,55	96,61
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.159,64	4,00	1.163,64	47,85	57.420,00	55.489,00	191,40	55.680,40	1.739,60	96,97
<b>Total geral</b>								<b>2.997.003,26</b>	<b>2.580.897,66</b>	<b>50.116,70</b>	<b>2.631.014,36</b>	<b>365.988,90</b>	<b>87,79</b>
<p>Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603</p>			<p>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____</p>				<p>Aprovado para pagamento Data: __/__/____</p>						


  
 Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 8720298354  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
 DOUGLAS  
 SANTOS  
 SANTANA:06641  
 211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:0664121152  
 5  
 Dados: 2024.09.12 16:20:11 -03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 66/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 06/09/2024 a 12/09/2024	DATA: 12/09/2024			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	06/09/2024	RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	8,00	53,40	<b>427,20</b>
2	09/09/2024	RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	3,30	5,30	<b>17,49</b>
3	09/09/2024	RUA ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	8,90	12,00	<b>106,80</b>
4	10/09/2024	RUA ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	10,00	10,90	<b>109,00</b>
5	10/09/2024	RUA PROJETADA D	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	3,10	16,30	<b>50,53</b>
6	11/09/2024	RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	SÃO CRISTÓVÃO	9,00	5,90	<b>53,10</b>
7	11/09/2024	RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	SÃO CRISTÓVÃO	7,80	6,60	<b>51,48</b>
8	11/09/2024	RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	SÃO CRISTÓVÃO	3,30	3,00	<b>9,90</b>
9	11/09/2024	RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	SÃO CRISTÓVÃO	1,60	1,00	<b>1,60</b>
10	11/09/2024	RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	SÃO CRISTÓVÃO	2,00	1,40	<b>2,80</b>
11	11/09/2024	RUA ANA SOUZA DE SANTANA	MAMEDES PAES MENDONÇA	2,50	9,00	<b>22,50</b>
12	11/09/2024	RUA MARINHO JOSÉ DA SILVA	MAMEDES PAES MENDONÇA	15,10	3,80	<b>57,38</b>
13	12/09/2024	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	MARCELA	4,40	3,90	<b>17,16</b>
14	12/09/2024	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	MARCELA	2,20	4,40	<b>9,68</b>
15	12/09/2024	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	MARCELA	4,70	7,40	<b>34,78</b>
16	12/09/2024	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	MARCELA	4,40	3,40	<b>14,96</b>
17	12/09/2024	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	MARCELA	4,40	4,50	<b>19,80</b>
18	12/09/2024	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	MARCELA	2,90	17,20	<b>49,88</b>
19	12/09/2024	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	MARCELA	11,20	3,70	<b>41,44</b>
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==&gt;</b>						<b>1.097,48</b>

  
 Ivan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil CREA 2115638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 1720296954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
 DOUGLAS  
 SANTOS  
 SANTANA:066415  
 211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:0664121152  
 5  
 Dados: 2024.09.12 16:20:59 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 66/2024**



RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES



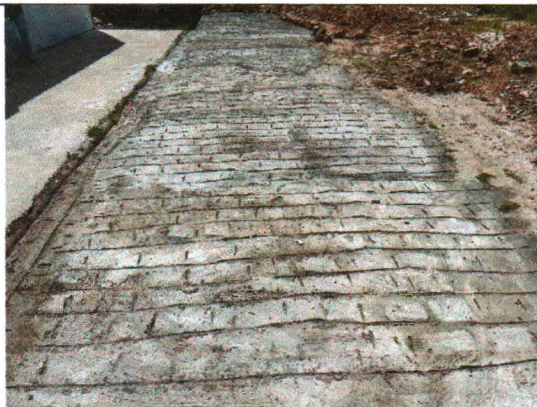
RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES



RUA ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO



RUA ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO



RUA PROJETADA D



RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

Jose Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121  
1525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.09.12  
16:15:19 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA: 2715638353  
Coordenador de Núcleo



RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS



RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS



RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS



RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS



RUA ANA SOUZA DE SANTANA



RUA MARINHO JOSÉ DA SILVA

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0664  
1211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:066412115  
25  
Dados: 2024.09.12  
16:15:40 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng. Civil - CREA: 2715638353  
Coordenador de Núcleo



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121  
1525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.09.12  
16:16:01 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng. Civil - CREA: 2715638353  
Coordenador de Núcleo



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS

*[Handwritten Signature]*  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA: 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*[Handwritten Signature]*  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng. Civil - CREA: 2715638353  
Coordenador de Núcleo
