


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 67/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 13/09/2024 a 19/09/2024				DATA: 19/09/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2.877.783,26</b>	<b>2.515.626,51</b>	<b>41.580,64</b>	<b>2.557.207,15</b>	<b>320.576,11</b>	<b>88,86</b>
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	55.317,79	912,82	56.230,61	44,52	2.809.212,00	2.462.748,03	40.638,75	2.503.386,78	305.825,22	89,11
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00		9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	55,30	1,00	56,30	941,89	59.433,26	52.086,52	941,89	53.028,41	6.404,85	89,22
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>119.220,00</b>	<b>115.387,85</b>	<b>315,00</b>	<b>115.702,85</b>	<b>3.517,15</b>	<b>97,05</b>
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	483,07	1,00	484,07	123,60	61.800,00	59.707,45	123,60	59.631,05	1.968,95	96,81
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.163,64	4,00	1.167,64	47,85	57.420,00	55.680,40	191,40	55.671,80	1.548,20	97,30
<b>Total geral</b>								<b>2.997.003,26</b>	<b>2.631.014,36</b>	<b>41.895,64</b>	<b>2.672.910,00</b>	<b>324.093,26</b>	<b>89,19</b>
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2024.09.19 14:21:06 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						

~~Robson Santos da Paixão~~  
 Eng. Civil - CREA/RN 2720298954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

~~Yan Henrique Tavares Santana~~  
 Engº Civil CREA 2715688353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÉDRO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OERA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 67/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 13/09/2024 a 19/09/2024	DATA: 19/09/2024			
						
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	13/09/2024	RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	19,30	8,00	154,40
2	13/09/2024	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	13,40	10,00	134,00
3	16/09/2024	RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	29,10	8,00	232,80
4	17/09/2024	RUA P	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	6,90	18,00	124,20
5	18/09/2024	RUA P	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	5,40	12,60	68,04
6	18/09/2024	RUA P	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	6,90	6,20	42,78
7	18/09/2024	RUA O	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	3,70	5,00	18,50
8	19/09/2024	RUA CONSTRUTOR JOSÉ OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	15,00	3,50	52,50
9	19/09/2024	RUA CONSTRUTOR JOSÉ OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	5,00	5,00	25,00
10	19/09/2024	RUA CONSTRUTOR JOSÉ OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	6,00	10,10	60,60
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==&gt;</b>						<b>912,82</b>

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:066  
41211525

Assinado de forma digital por MAYKON DCUGLAS SANTOS SANTANA:0664121525  
Dados: 2024.09.19 14:20:11 -03'00'

*Robson Santos da Paixão*  
Eng. Civil - CREA/SE 2720296954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Yan Henrique Torres Santana*  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 67/2024**



RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES




RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO  
SOBRINHO



RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES



RUA P

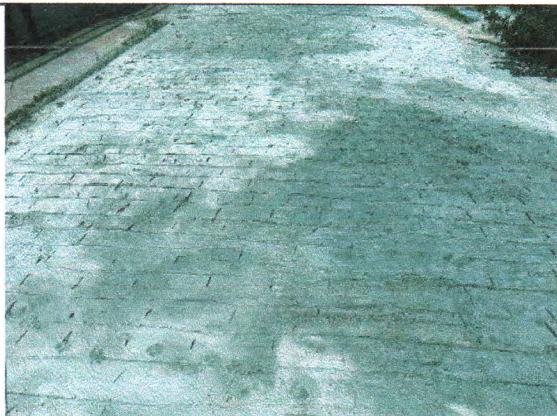

RUA P



RUA P

*José Robson Santos da Paixão*  
Eng. Civil - CREA/SE 2720290954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabiana

*Yan Henrique Tavares Santana*  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabiana



RUA O



RUA CONSTRUTOR JOSÉ OLIVEIRA



RUA CONSTRUTOR JOSÉ OLIVEIRA



RUA CONSTRUTOR JOSÉ OLIVEIRA

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06641  
211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121152  
5  
Dados: 2024.09.19  
14:20:40 -03'00'

**José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana
