

REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 186/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 06 / 2024				ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO				PERÍODO: 27/04/2024 a 10/05/2024				DATA: 13/05/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							16.664,26	16.664,26	0,00	16.664,26	0,00	100,00
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00		6,00	317,53	1.905,18	1.905,18	0,00	1.905,18	0,00	100,00
01.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00	4,00		4,00	705,32	2.821,28	2.821,28	0,00	2.821,28	0,00	100,00
01.003	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	383,02	383,02		383,02	25,57	9.793,82	9.793,82	0,00	9.793,82	0,00	100,00
01.004	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	3.403,15	3.403,15		3.403,15	0,63	2.143,98	2.143,98	0,00	2.143,98	0,00	100,00
02	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES							57.154,35	57.154,34	0,00	57.154,35	0,00	100,00
02.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	955,92	955,92		955,92	7,99	7.637,80	7.637,80	0,00	7.637,80	0,00	100,00
02.002	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	13,98	13,98		13,98	30,96	432,82	432,82	0,00	432,82	0,00	100,00
02.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	587,01	587,01		587,01	20,91	12.274,38	12.274,38	0,00	12.274,38	0,00	100,00
02.004	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	587,00	587,00		587,00	9,59	5.629,33	5.629,33	0,00	5.629,33	0,00	100,00
02.005	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	12,00	12,00		12,00	32,44	389,28	389,28	0,00	389,28	0,00	100,00
02.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	510,47	510,47		510,47	42,49	21.689,87	21.689,87	0,00	21.689,87	0,00	100,00
02.007	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	781,19	781,19		781,19	8,47	6.616,68	6.616,68	0,00	6.616,68	0,00	100,00
02.008	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.343,57	2.343,57		2.343,57	1,06	2.484,19	2.484,18	0,00	2.484,19	0,00	100,00
03	PAVIMENTAÇÃO							276.826,45	276.826,45	0,00	276.826,45	0,00	100,00
03.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	755,68	755,68		755,68	39,04	29.501,75	29.501,75	0,00	29.501,75	0,00	100,00
03.002	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	837,83	837,83		837,83	81,76	68.500,98	68.500,98	0,00	68.500,98	0,00	100,00
03.003	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	1.005,40	1.005,40		1.005,40	8,47	8.515,74	8.515,74	0,00	8.515,74	0,00	100,00
03.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	22.621,50	22.621,50		22.621,50	1,06	23.978,79	23.978,79	0,00	23.978,79	0,00	100,00
03.005	Lona plástica preta	m2	826,93	826,93		826,93	4,87	4.027,15	4.027,15	0,00	4.027,15	0,00	100,00
03.006	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	826,93	826,93		826,93	45,67	37.765,89	37.765,89	0,00	37.765,89	0,00	100,00
03.007	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022	m2	633,79	633,79		633,79	79,55	50.417,99	50.417,99	0,00	50.417,99	0,00	100,00
03.008	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	874,66	874,66		874,66	60,34	52.776,98	52.776,98	0,00	52.776,98	0,00	100,00
03.009	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	83,20	83,20		83,20	16,12	1.341,18	1.341,18	0,00	1.341,18	0,00	100,00


Yan Henrique ~~Teles~~ Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Página 1 de 6


Lázaro ~~Marcelo~~ ~~Alfonso~~ Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE: 210090522

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720290954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 186/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 06 / 2024					ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO			PERÍODO: 27/04/2024 a 10/05/2024					DATA: 13/05/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
03.010	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	1,00	1,00		1,00	166,05	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	100,00	
03.011	Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	1,00	1,00		1,00	448,86	448,86	448,86	0,00	448,86	0,00	100,00	
04	QUADRA							151.625,32	144.628,04	204,92	144.832,96	6.792,36	95,52	
04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	16,50	16,50		16,50	42,49	701,09	701,09	0,00	701,09	0,00	100,00	
04.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	19,80	19,80		19,80	8,47	167,71	167,71	0,00	167,71	0,00	100,00	
04.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	59,40	59,40		59,40	1,06	62,96	62,96	0,00	62,96	0,00	100,00	
04.004	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af. 05/2021	m3	1,65	1,65		1,65	413,08	681,58	681,58	0,00	681,58	0,00	100,00	
04.005	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padrolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	21,95	21,95		21,95	429,66	9.431,04	9.431,04	0,00	9.431,04	0,00	100,00	
04.006	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,62	2,62		2,62	2760,82	7.233,35	7.233,35	0,00	7.233,35	0,00	100,00	
04.007	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. af. 03/2016	m	66,00	0,00		0,00	34,35	2.267,10	0,00	0,00	2.267,10	0,00	0,00	
04.008	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	26,40	26,40		26,40	38,24	1.009,54	1.009,54	0,00	1.009,54	0,00	100,00	
04.009	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	151,80	151,80		151,80	16,27	2.469,79	2.469,79	0,00	2.469,79	0,00	100,00	
04.010	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	151,80	151,80		151,80	30,23	4.588,91	4.588,91	0,00	4.588,91	0,00	100,00	
04.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	151,80	151,80		151,80	40,72	6.181,30	6.181,30	0,00	6.181,30	0,00	100,00	
04.012	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	335,80	335,80		335,80	277,14	93.063,61	93.063,61	0,00	93.063,61	0,00	100,00	
04.013	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	242,00	0,00		0,00	17,44	4.220,48	0,00	0,00	4.220,48	0,00	0,00	
04.014	Fornecimento de cabo de aço 9,5mm, média resistência	kg	27,14	0,00		0,00	11,23	304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	0,00	
04.015	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	4,20	4,20		4,20	631,56	2.652,55	2.652,55	0,00	2.652,55	0,00	100,00	


Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Luiz Mario Neri Alfano Junior
 Engenheiro Civil
 CREAISE: 21.0009552


José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720290954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 186/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 06 / 2024					ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO			PERÍODO: 27/04/2024 a 10/05/2024					DATA: 13/05/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
04.016	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	121,00	121,00		121,00	111,56	13.498,76	13.498,76	0,00	13.498,76	0,00	100,00
04.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.722,50	2.722,50		2.722,50	1,06	2.885,85	2.885,85	0,00	2.885,85	0,00	100,00
04.018	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	0,00	1,00	1,00	204,92	204,92	0,00	204,92	204,92	0,00	100,00
05	ELEVAÇÕES (PALCOS)							23.675,32	23.518,40	0,00	23.518,40	156,92	99,34
05.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,67	12,89		12,89	42,49	665,82	547,70	0,00	547,70	118,12	82,26
05.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	18,80	15,47		15,47	8,47	159,24	131,03	0,00	131,03	28,21	82,28
05.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	56,40	46,41		46,41	1,06	59,78	49,19	0,00	49,19	10,59	82,29
05.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pacotelas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	11,94	11,94		11,94	429,66	5.130,14	5.130,14	0,00	5.130,14	0,00	100,00
05.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	51,60	51,60		51,60	38,24	1.973,18	1.973,18	0,00	1.973,18	0,00	100,00
05.006	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	51,60	51,60		51,60	16,27	839,53	839,53	0,00	839,53	0,00	100,00
05.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	51,60	51,60		51,60	30,23	1.559,87	1.559,87	0,00	1.559,87	0,00	100,00
05.008	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	72,74	72,74		72,74	91,30	6.641,16	6.641,16	0,00	6.641,16	0,00	100,00
05.009	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	87,29	87,29		87,29	8,47	739,35	739,35	0,00	739,35	0,00	100,00
05.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.964,03	1.964,03		1.964,03	1,06	2.081,87	2.081,87	0,00	2.081,87	0,00	100,00
05.011	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	45,85	45,85		45,85	45,67	2.093,97	2.093,97	0,00	2.093,97	0,00	100,00
05.012	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	42,52	42,52		42,52	40,72	1.731,41	1.731,41	0,00	1.731,41	0,00	100,00
06	PAISAGISMO							27.504,77	27.504,77	-	27.504,77	-	100,00
06.001	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio	un	141,00	141,00		141,00	19,16	2.701,56	2.701,56	0,00	2.701,56	0,00	100,00
06.002	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	3,00		3,00	481,15	1.443,45	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	100,00
06.003	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	83,00	83,00		83,00	39,81	3.304,23	3.304,23	0,00	3.304,23	0,00	100,00
06.004	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	48,00	48,00		48,00	33,67	1.616,16	1.616,16	0,00	1.616,16	0,00	100,00

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 3715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Luiz Mário Neri Alfano Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE: 216090522

Jose Roberto Santos de Paiva
Eng. Civil - CREA/SE 2720296954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 186/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 06 / 2024					ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO			PERÍODO: 27/04/2024 a 10/05/2024					DATA: 13/05/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
06.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	4,00		4,00	68,45	273,80	273,80	0,00	273,80	0,00	100,00	
06.006	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	10,00	10,00		10,00	74,91	749,10	749,10	0,00	749,10	0,00	100,00	
06.007	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	12,00	12,00		12,00	74,91	898,92	898,92	0,00	898,92	0,00	100,00	
06.008	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	2,00	2,00		2,00	710,29	1.420,58	1.420,58	0,00	1.420,58	0,00	100,00	
06.009	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	638,08	638,08		638,08	23,66	15.096,97	15.096,97	0,00	15.096,97	0,00	100,00	
07	DIVERSOS							29.873,47	4.234,78	12.801,99	17.036,77	12.836,70	57,03	
07.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	9,00	9,00		9,00	377,52	3.397,68	3.397,68	0,00	3.397,68	0,00	100,00	
07.002	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	153,00	0,00		0,00	83,90	12.836,70	0,00	0,00	0,00	12.836,70	0,00	
07.003	Limpeza geral	m2	3.403,15	0,00	3.403,15	3.403,15	1,96	6.670,17	0,00	6.670,17	6.670,17	0,00	100,00	
07.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1778,37	1.778,37	0,00	1.778,37	1.778,37	0,00	100,00	
07.005	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00	1,00		1,00	837,10	837,10	837,10	0,00	837,10	0,00	100,00	
07.006	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	15,00	0,00	15,00	15,00	290,23	4.353,45	0,00	4.353,45	4.353,45	0,00	100,00	
08	ACADEMIA A CÉU ABERTO							25.239,86	25.239,86	-	25.239,86	-	100,00	
08.001	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2,00		2,00	2537,34	5.074,68	5.074,68	0,00	5.074,68	0,00	100,00	
08.002	Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2,00		2,00	1617,95	3.235,90	3.235,90	0,00	3.235,90	0,00	100,00	
08.003	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	2,00	2,00		2,00	2683,81	5.367,62	5.367,62	0,00	5.367,62	0,00	100,00	
08.004	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	804,71	804,71	804,71	0,00	804,71	0,00	100,00	
08.005	Instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - atli, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00	1,00		1,00	2334,93	2.334,93	2.334,93	0,00	2.334,93	0,00	100,00	
08.006	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00		1,00	3548,52	3.548,52	3.548,52	0,00	3.548,52	0,00	100,00	
08.007	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2,00		2,00	2436,75	4.873,50	4.873,50	0,00	4.873,50	0,00	100,00	
09	PARQUE							16.869,10	16.869,10	-	16.869,10	-	100,00	
09.001	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	1,00		1,00	3722,27	3.722,27	3.722,27	0,00	3.722,27	0,00	100,00	
09.002	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	2,00	2,00		2,00	3831,20	7.662,40	7.662,40	0,00	7.662,40	0,00	100,00	

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Luz Márcio Neri Alfano Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE 21.000552

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2726290954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 186/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 06 / 2024					ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO			PERÍODO: 27/04/2024 a 10/05/2024					DATA: 13/05/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a % Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
09.003	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	1,00		1,00	2486,97	2.486,97	2.486,97	0,00	2.486,97	0,00	100,00
09.004	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00	2,00		2,00	1498,73	2.997,46	2.997,46	0,00	2.997,46	0,00	100,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							10.980,66	10.980,66	-	10.980,66	-	100,00
10.001	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	4,00	4,00		4,00	1702,91	6.811,64	6.811,64	0,00	6.811,64	0,00	100,00
10.002	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	12,00		12,00	119,89	1.438,68	1.438,68	0,00	1.438,68	0,00	100,00
10.003	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	1,00		1,00	45,83	45,83	45,83	0,00	45,83	0,00	100,00
10.004	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	1,00		1,00	34,92	34,92	34,92	0,00	34,92	0,00	100,00
10.005	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	2,00		2,00	15,28	30,56	30,56	0,00	30,56	0,00	100,00
10.006	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	4,00	4,00		4,00	15,70	62,80	62,80	0,00	62,80	0,00	100,00
10.007	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	4,00	4,00		4,00	151,10	604,40	604,40	0,00	604,40	0,00	100,00
10.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	2,00	2,00		2,00	128,56	257,12	257,12	0,00	257,12	0,00	100,00
10.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	92,00	92,00		92,00	10,81	994,52	994,52	0,00	994,52	0,00	100,00
10.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	31,00	31,00		31,00	1,85	57,35	57,35	0,00	57,35	0,00	100,00
10.011	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	132,00	132,00		132,00	4,87	642,84	642,84	0,00	642,84	0,00	100,00
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							26.461,00	25.137,95	1.323,05	26.461,00	-	100,00
11.001	Mestre de obras com encargos complementares	h	200,00	190,00	10,00	200,00	66,90	13.380,00	12.711,00	669,00	13.380,00	0,00	100,00
11.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	100,00	95,00	5,00	100,00	130,81	13.081,00	12.426,95	654,05	13.081,00	0,00	100,00
12	ADITIVO (ROTATÓRIA)							18.763,11	18.763,11	-	18.763,11	-	100,00
12.001	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	132,73	132,73		132,73	16,51	2.191,37	2.191,37	0,00	2.191,37	0,00	100,00
12.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	95,66	95,66		95,66	39,04	3.734,57	3.734,57	0,00	3.734,57	0,00	100,00
12.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	78,23	78,23		78,23	23,66	1.850,92	1.850,92	0,00	1.850,92	0,00	100,00
12.004	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	17,00	17,00		17,00	33,67	572,39	572,39	0,00	572,39	0,00	100,00
12.005	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	3,00	3,00		3,00	710,29	2.130,87	2.130,87	0,00	2.130,87	0,00	100,00
12.006	Planta - Moreia (Diets bicolor), fornecimento e plantio	un	9,00	9,00		9,00	39,81	358,29	358,29	0,00	358,29	0,00	100,00
12.007	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	un	1,00	1,00		1,00	1963,50	1.963,50	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00	100,00


Yon Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2115638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Luiz Antonio Neri Alfano Junior
Engenheiro Civil
CREAISE 211095502

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREAISE 2726298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 186/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 06 / 2024				ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO			PERÍODO: 27/04/2024 a 10/05/2024				DATA: 13/05/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
12.008	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	328,00	328,00		328,00	4,87	1.597,36	1.597,36	0,00	1.597,36	0,00	100,00	
12.009	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	13,00	13,00		13,00	175,07	2.275,91	2.275,91	0,00	2.275,91	0,00	100,00	
10.010	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m	un	13,00	13,00		13,00	160,61	2.087,93	2.087,93	0,00	2.087,93	0,00	100,00	
Total geral								681.637,67	647.521,74	14.329,96	661.851,70	19.785,97	97,10	
<p>Engº Civil Luiz Mario Neri Alfano Junior CREA RN 2706905522</p>			<p>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____</p>				<p>Aprovado para pagamento Data: __/__/____</p>							



 Engº Civil Neri Alfano Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 2706905522



 Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2728290954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 186/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 06 / 2024	ORDEM DE SERVIÇOS = 06/09/2023
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO				PERÍODO: 27/04/2024 a 10/05/2024	DATA: 13/05/2024
ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO	
04	QUADRA				
04.018	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	> 1 und	
07	DIVERSOS				
07.003	Limpeza geral	m2	3403,15	> Área total do calçadão = 3.403,15m²	
07.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	> 1 und	
07.006	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	15,00	> 15 und	
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
11.001	Mestre de obras com encargos complementares	h	10,00	-> 200 x 100,00% = 200,00 - 190,00 (acumulado anterior) = 10,00h	
11.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	5,00	-> 100 x 100,00% = 100,00 - 95,00 (acumulado anterior) = 5,00h	
<p>_____</p> <p>Engº Civil Luiz Mario Neri Alfano Junior CREA RN 2706905522</p>		<p>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___</p>		<p>Aprovado para pagamento Data: ___/___/___</p>	


Luiz Mario Neri Alfano Junior
Engenheiro Civil
CREA/RN 2706905522


Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720290954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



MARCO INAUGURAL, PINTURA, GRAMA E PLANTAS



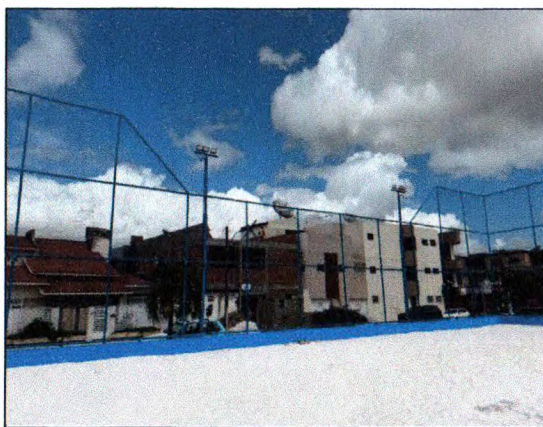
PINTURA, GRAMA E PLANTAS



PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS





REFLETORES E PINTURA



PINTURA, GRAMA E PLANTAS


Luiz Mauro Nepi Alfano Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE: 21430532


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 7720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2115638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



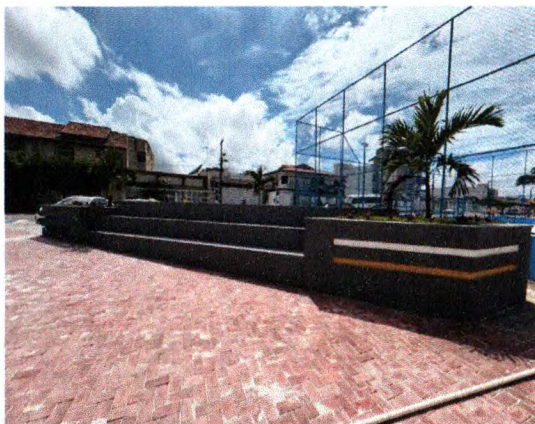
PINTURA, GRAMA E PLANTAS



REFLETORES E PINTURA



PINTURA E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA



PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA




PINTURA E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA

ELABORADO POR:


Luiz Mario Neri Alfano Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE: 217030322


Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana.


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PINTURA, GRAMA E PLANTAS



BRINQUEDOS, PINTURA, GRAMA E PLANTAS



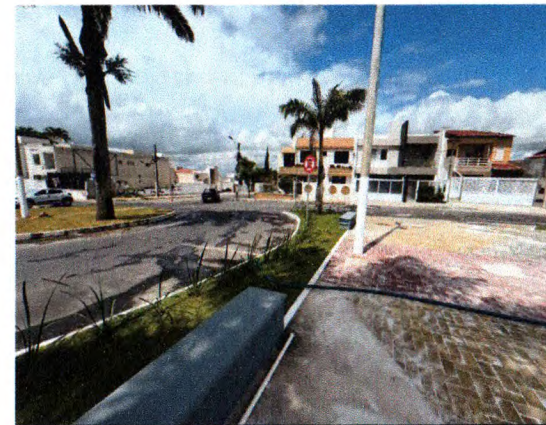
BRINQUEDOS, PINTURA, GRAMA E PLANTAS



BRINQUEDOS, PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS

ELABORADO POR:


Luiz Mario Neri Alfaro Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE: 21.0630552


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 27.15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PINTURA, GRAMA E PLANTAS



PINTURA, GRAMA E PLANTAS



PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS




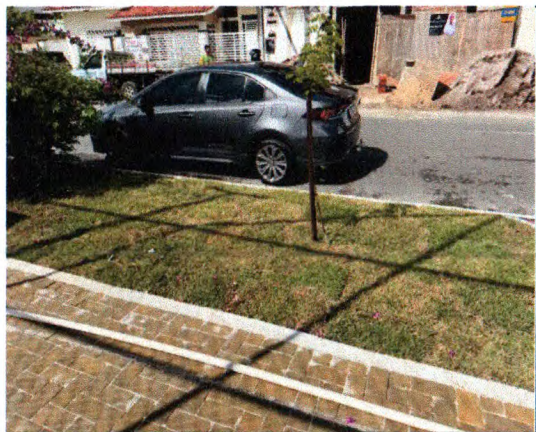
GRAMA E PLANTAS


Luiz Mario Neri Alfano Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE: 2163905522

ELABORADO POR:


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



GRAMA E PLANTAS



PINTURA, GRAMA E PLANTAS



GRAMA E PLANTAS



GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS

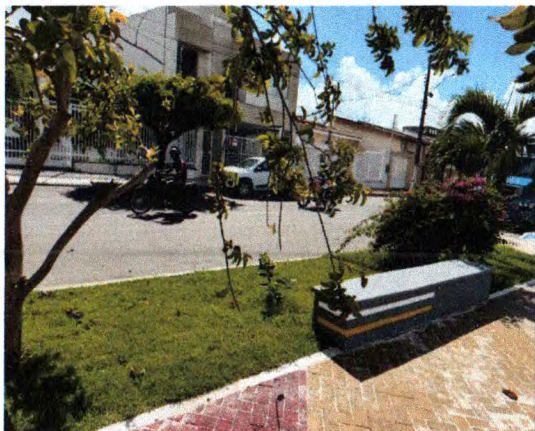

Luiz Mario Neri Affonso Junior
Engenheiro Civil
CREA: 27.0005622

ELABORADO POR:

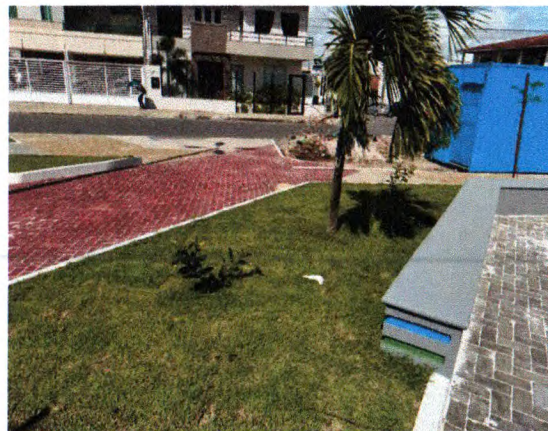

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 0715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 5 de 6



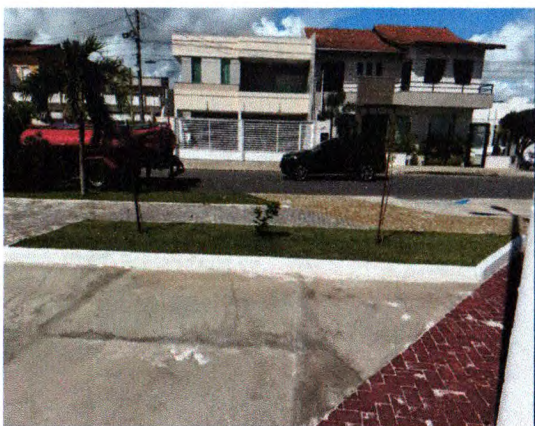
PINTURA, GRAMA E PLANTAS



PINTURA, GRAMA E PLANTAS



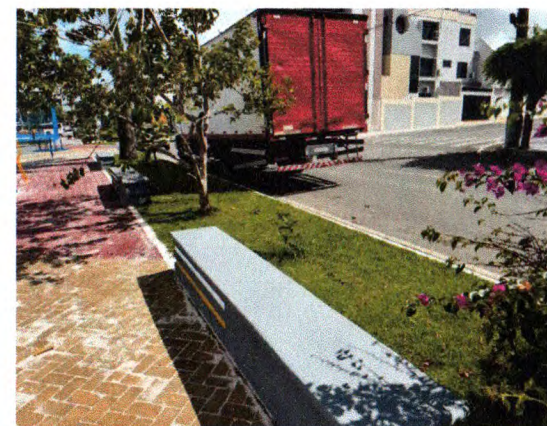
PINTURA, GRAMA E PLANTAS



GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS




PINTURA, GRAMA E PLANTAS

ELABORADO POR:


Luiz Otávio Neri Alfino Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE: 270530532


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293964
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Soares Santana
Eng.º Civil CREA 275638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
