

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01							CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023							Data da medição: 14/08/2023					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO												
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	Edificação principal do Pro Infância 2							R\$ 2.902.372,94	R\$ 1.041.346,38	R\$ 331.582,94	R\$ 1.372.929,19	R\$ 1.529.443,74		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 100.032,63	R\$ 100.032,63	R\$ -	R\$ 100.032,63	R\$ -		
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	400,52	R\$ 4.005,20	R\$ 4.005,20	R\$ -	R\$ 4.005,20	R\$ -	100,00
1.1.2	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	267,19	R\$ 26.451,81	R\$ 26.451,81	R\$ -	R\$ 26.451,81	R\$ -	100,00
1.1.3	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2.780,66	R\$ 2.780,66	R\$ 2.780,66	R\$ -	R\$ 2.780,66	R\$ -	100,00
1.1.4	Ligação Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	643,69	R\$ 643,69	R\$ 643,69	R\$ -	R\$ 643,69	R\$ -	100,00
1.1.5	EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	m²	2,52	2,52	0,00	2,52	0,00	1.089,88	R\$ 2.746,49	R\$ 2.746,49	R\$ -	R\$ 2.746,49	R\$ -	100,00
1.1.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1.176,39	R\$ 23.527,80	R\$ 23.527,80	R\$ -	R\$ 23.527,80	R\$ -	100,00
1.1.7	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m²	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	972,42	R\$ 19.448,40	R\$ 19.448,40	R\$ -	R\$ 19.448,40	R\$ -	100,00
Inserido	Sondagem a percussão	m	25,35	25,35	0,00	25,35	0,00	163,84	R\$ 4.153,46	R\$ 4.153,46	R\$ -	R\$ 4.153,46	R\$ -	100,00
Inserido	Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado acima de 500m²	m²	858,06	858,06	0,00	858,06	0,00	2,67	R\$ 2.293,77	R\$ 2.293,77	R\$ -	R\$ 2.293,77	R\$ -	100,00
1.1.8	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	891,68	891,68	0,00	891,68	0,00	7,59	R\$ 6.767,85	R\$ 6.767,85	R\$ -	R\$ 6.767,85	R\$ -	100,00
1.1.9	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	4,58	R\$ 7.213,50	R\$ 7.213,50	R\$ -	R\$ 7.213,50	R\$ -	100,00
1.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACÕES							R\$ 119.336,77	R\$ 103.381,86	R\$ -	R\$ 103.381,86	R\$ 15.954,91		
1.2.1	EDIFICACAO							R\$ 117.927,02	R\$ 103.381,86	R\$ -	R\$ 103.381,86	R\$ 14.545,16		
1.2.1.1	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	158,44	158,44	0,00	158,44	0,00	201,62	R\$ 31.944,67	R\$ 31.944,67	R\$ -	R\$ 31.944,67	R\$ -	100,00
1.2.1.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	349,66	349,66	0,00	349,66	0,00	55,22	R\$ 19.308,22	R\$ 19.308,22	R\$ -	R\$ 19.308,22	R\$ -	100,00
Inserido	Coleta e carga manuais de entulho	m³	419,59	419,59	0,00	419,59	0,00	16,49	R\$ 6.920,13	R\$ 6.920,13	R\$ -	R\$ 6.920,13	R\$ -	100,00
Inserido	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	313,65	221,66	0,00	221,66	91,99	123,78	R\$ 38.823,96	R\$ 27.437,07	R\$ -	R\$ 27.437,07	R\$ 11.386,89	70,67
Inserido	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xKm	4.704,75	3.324,90	0,00	3.324,90	1379,85	2,29	R\$ 10.772,28	R\$ 7.614,02	R\$ -	R\$ 7.614,02	R\$ 3.158,26	70,67
Inserido	Transporte horizontal de material dentro do canteiro. Areia p/ reaterro	m³	313,65	313,65	0,00	313,65	0,00	16,49	R\$ 5.172,88	R\$ 5.172,88	R\$ -	R\$ 5.172,88	R\$ -	100,00
1.2.1.3	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	107,09	107,09	0,00	107,09	0,00	6,02	R\$ 644,68	R\$ 644,68	R\$ -	R\$ 644,68	R\$ -	100,00
1.2.1.4	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m²	235,88	235,88	0,00	235,88	0,00	18,40	R\$ 4.340,19	R\$ 4.340,19	R\$ -	R\$ 4.340,19	R\$ -	100,00
1.2.2	MURETA E ABRIGO DE GÁS							R\$ 1.156,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.156,44	
1.2.2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	15,68	0,00	0,00	0,00	15,68	55,22	R\$ 865,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 865,84	0,00
1.2.2.2	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	13,37	0,00	0,00	0,00	13,37	6,02	R\$ 80,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,48	0,00
1.2.2.3	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m²	11,42	0,00	0,00	0,00	11,42	18,40	R\$ 210,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,12	0,00
1.2.3	CASTELO D'ÁGUA							R\$ 253,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,31	
1.2.3.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	55,22	R\$ 201,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,55	0,00
1.2.3.2	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84	6,02	R\$ 29,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,13	0,00
1.2.3.3	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m²	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	18,40	R\$ 22,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,63	0,00
1.3	FUNDACÕES							R\$ 268.827,42	R\$ 251.556,10	R\$ -	R\$ 251.556,10	R\$ 17.271,32		
1.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACÕES - SAPATAS							R\$ 66.217,87	R\$ 66.217,87	R\$ -	R\$ 66.217,87	R\$ -		
1.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	32,18	R\$ 5.631,50	R\$ 5.631,50	R\$ -	R\$ 5.631,50	R\$ -	100,00
1.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	131,71	131,71	0,00	131,71	0,00	151,21	R\$ 19.915,86	R\$ 19.915,86	R\$ -	R\$ 19.915,86	R\$ -	100,00
1.3.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patricia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 271739199-1
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01							CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023							Data da medição: 14/08/2023					
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO														
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.3.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	678,25	678,25	0,00	678,25	0,00	20,01	R\$ 13.571,78	R\$ 13.571,78	R\$ -	R\$ 13.571,78	R\$ -	100,00
1.3.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	403,63	403,63	0,00	403,63	0,00	18,12	R\$ 7.313,85	R\$ 7.313,85	R\$ -	R\$ 7.313,85	R\$ -	100,00
1.3.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	14,35	R\$ 3.551,63	R\$ 3.551,63	R\$ -	R\$ 3.551,63	R\$ -	100,00
1.3.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	147,82	147,82	0,00	147,82	0,00	21,37	R\$ 3.158,87	R\$ 3.158,87	R\$ -	R\$ 3.158,87	R\$ -	100,00
1.3.1.8	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	27,04	27,04	0,00	27,04	0,00	483,52	R\$ 13.074,38	R\$ 13.074,38	R\$ -	R\$ 13.074,38	R\$ -	100,00
1.3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES								R\$ 71.843,38	R\$ 71.843,38	R\$ -	R\$ 71.843,38	R\$ -	
1.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	213,01	213,01	0,00	213,01	0,00	31,04	R\$ 6.611,83	R\$ 6.611,83	R\$ -	R\$ 6.611,83	R\$ -	100,00
1.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.3.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	349,55	349,55	0,00	349,55	0,00	79,93	R\$ 27.939,53	R\$ 27.939,53	R\$ -	R\$ 27.939,53	R\$ -	100,00
1.3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	726,11	726,11	0,00	726,11	0,00	20,01	R\$ 14.529,46	R\$ 14.529,46	R\$ -	R\$ 14.529,46	R\$ -	100,00
1.3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	124,96	124,96	0,00	124,96	0,00	18,12	R\$ 2.264,28	R\$ 2.264,28	R\$ -	R\$ 2.264,28	R\$ -	100,00
1.3.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,05	29,05	0,00	29,05	0,00	14,35	R\$ 416,88	R\$ 416,88	R\$ -	R\$ 416,88	R\$ -	100,00
1.3.2.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	392,60	392,60	0,00	392,60	0,00	21,37	R\$ 8.389,88	R\$ 8.389,88	R\$ -	R\$ 8.389,88	R\$ -	100,00
1.3.2.9	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	24,18	24,18	0,00	24,18	0,00	483,52	R\$ 11.691,51	R\$ 11.691,51	R\$ -	R\$ 11.691,51	R\$ -	100,00
1.3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA								R\$ 7.334,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.334,44	
1.3.3.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	48,82	R\$ 1.708,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.708,70	0,00
1.3.3.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15,56	R\$ 77,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,80	0,00
1.3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84	31,04	R\$ 150,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,23	0,00
1.3.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	91,95	R\$ 404,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,58	0,00

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabairana

Thaísia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaísia Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabairana


Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01			CONTRATO Nº: 063/2022			
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP									B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023			Data da medição: 14/08/2023			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE															
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
1.3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61	0,00	0,00	0,00	116,61	18,12	R\$ 2.112,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,97	0,00
1.3.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,78	0,00	0,00	0,00	83,78	14,35	R\$ 1.202,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202,24	0,00
1.3.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,87	0,00	0,00	0,00	13,87	16,46	R\$ 228,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,30	0,00
1.3.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,08	0,00	0,00	0,00	13,08	21,37	R\$ 279,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,52	0,00
1.3.3.9	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e aderado na infraestrutura	m³	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42	483,52	R\$ 1.170,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.170,11	0,00
1.3.4	ABRIGO DE GÁS- BLOCOS								R\$ 2.309,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.309,52	
1.3.4.1	Estaca broca (d=250mm x 1600mm) concreto fck=13,5 Mpa bombeável sem armação	m	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	72,39	R\$ 1.266,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,82	0,00
1.3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	31,04	R\$ 38,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,80	0,00
1.3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	91,95	R\$ 459,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 459,75	0,00
1.3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,21	0,00	0,00	0,00	11,21	21,37	R\$ 239,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,54	0,00
1.3.4.5	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e aderado na infraestrutura	m³	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	483,52	R\$ 304,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,61	0,00
1.3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME								R\$ 7.627,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.627,34	
1.3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12,12	0,00	0,00	0,00	12,12	31,04	R\$ 376,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,20	0,00
1.3.5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	31,04	R\$ 35,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,07	0,00
1.3.5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	42,70	R\$ 48,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,25	0,00
1.3.5.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	44,47	0,00	0,00	0,00	44,47	79,93	R\$ 3.554,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.554,48	0,00
1.3.5.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92,62	0,00	0,00	0,00	92,62	20,01	R\$ 1.853,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.853,33	0,00
1.3.5.6	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e aderado na infraestrutura	m³	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	483,52	R\$ 1.760,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.760,01	0,00
1.3.6	PISO ARMADO								R\$ 113.494,85	R\$ 113.494,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.494,85	
Inserido	Lona plástica preta	m2	858,06	858,06	0,00	858,06	0,00	5,71	R\$ 4.896,71	R\$ 4.896,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.896,71	100,00
Inserido	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	kg	1.425,37	1.425,37	0,00	1.425,37	0,00	35,73	R\$ 50.925,56	R\$ 50.925,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.925,56	100,00
Inserido	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	40,67	40,67	0,00	40,67	0,00	120,49	R\$ 4.900,41	R\$ 4.900,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.900,41	100,00
Inserido	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	m³	102,97	102,97	0,00	102,97	0,00	512,50	R\$ 52.772,17	R\$ 52.772,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.772,17	100,00
1.4	SUPERESTRUTURA								R\$ 149.773,52	R\$ 149.900,23	R\$ 2.696,70	R\$ 143.596,93	R\$ -	R\$ 6.176,59	


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Patrícia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA Nº 270093245-5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01							CONTRATO Nº: 063/2022						
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023							Data da medição: 14/08/2023						
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
1.4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES														
1.4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	333,34	333,34	0,00	333,34	0,00	55,16	R\$ 18.387,03	R\$ 18.387,02	R\$ -	R\$ 18.387,03	R\$ -	100,00	
1.4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	923,26	923,26	0,00	923,26	0,00	18,70	R\$ 17.265,02	R\$ 17.265,02	R\$ -	R\$ 17.265,02	R\$ -	100,00	
1.4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	344,17	344,17	0,00	344,17	0,00	10,30	R\$ 3.544,93	R\$ 3.544,93	R\$ -	R\$ 3.544,93	R\$ -	100,00	
1.4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	495,24	495,24	0,00	495,24	0,00	22,73	R\$ 11.256,85	R\$ 11.256,85	R\$ -	R\$ 11.256,85	R\$ -	100,00	
1.4.1.5	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adersado na infraestrutura	m³	18,25	18,25	0,00	18,25	0,00	483,52	R\$ 8.824,24	R\$ 8.824,24	R\$ -	R\$ 8.824,24	R\$ -	100,00	
1.4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS														
1.4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	344,10	344,10	0,00	344,10	0,00	102,19	R\$ 35.163,57	R\$ 35.163,57	R\$ -	R\$ 35.163,57	R\$ -	100,00	
1.4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	743,50	743,50	0,00	743,50	0,00	20,79	R\$ 15.457,39	R\$ 15.457,39	R\$ -	R\$ 15.457,39	R\$ -	100,00	
1.4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	10,60	10,60	0,00	10,60	0,00	18,70	R\$ 198,29	R\$ 198,29	R\$ -	R\$ 198,29	R\$ -	100,00	
1.4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	401,84	401,84	0,00	401,84	0,00	22,73	R\$ 9.133,85	R\$ 9.133,85	R\$ -	R\$ 9.133,85	R\$ -	100,00	
1.4.2.5	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adersado na infraestrutura	m³	24,55	24,55	0,00	24,55	0,00	483,52	R\$ 11.870,42	R\$ 11.870,42	R\$ -	R\$ 11.870,42	R\$ -	100,00	
1.4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS														
1.4.3.1	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	239,88	188,11	51,77	239,88	0,00	52,09	R\$ 12.495,35	R\$ 9.798,65	R\$ 2.696,70	R\$ 12.495,35	R\$ -	100,00	
1.4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES														
1.4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	55,16	R\$ 992,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 992,88	0,00	
1.4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	15,03	0,00	0,00	0,00	15,03	22,73	R\$ 341,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,54	0,00	
1.4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	48,31	0,00	0,00	0,00	48,31	20,79	R\$ 1.004,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.004,41	0,00	
1.4.4.4	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adersado na infraestrutura	m³	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	483,52	R\$ 367,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,48	0,00	
1.4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJES														
1.4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	19,24	0,00	0,00	0,00	19,24	55,16	R\$ 1.061,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.061,27	0,00	



Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Patricia Dutra de Melo Chagas
 Engª Civil
 CREA/SE nº 270093245-5


Thais Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01					CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada:		JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP							B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023					Data da medição: 14/08/2023		
Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE							BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido		
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
1.4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	16,79	0,00	0,00	0,00	16,79	21,85	R\$ 366,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 366,77	0,00	
1.4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	21,40	0,00	0,00	0,00	21,40	20,79	R\$ 444,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,80	0,00	
1.4.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	30,81	0,00	0,00	0,00	30,81	18,70	R\$ 576,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 576,17	0,00	
1.4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77	22,73	R\$ 426,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,55	0,00	
1.4.5.6	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	483,52	R\$ 594,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 594,72	0,00	
1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								R\$ 84.544,29	R\$ 65.171,08	R\$ 3.835,62	R\$ 69.006,70	R\$ 15.837,59			
1.5.1	ELEMENTOS VAZADOS								R\$ 1.357,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.357,86			
1.5.1.1	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m²	6,10	0,00	0,00	0,00	6,10	222,60	R\$ 1.357,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.357,86	0,00		
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								R\$ 79.114,20	R\$ 65.171,08	R\$ 3.835,62	R\$ 69.006,70	R\$ 10.107,50			
1.5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	m²	572,77	572,77	0,00	572,77	0,00	47,85	R\$ 27.407,04	R\$ 27.407,04	R\$ -	R\$ 27.407,04	R\$ -	100,00		
1.5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	m²	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	76,58	R\$ 794,90	R\$ -	R\$ 794,90	R\$ 794,90	R\$ -	100,00		
1.5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	m²	564,11	544,21	19,90	564,11	0,00	64,69	R\$ 36.492,27	R\$ 35.204,94	R\$ 1.287,33	R\$ 36.492,27	R\$ -	100,00		
1.5.2.4	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	m²	9,72	0,00	9,72	9,72	0,00	180,39	R\$ 1.753,39	R\$ -	R\$ 1.753,39	R\$ 1.753,39	R\$ -	100,00		
1.5.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO AF 03/2016	M	311,80	111,80	0,00	111,80	200,00	22,89	R\$ 7.137,10	R\$ 2.559,10	R\$ -	R\$ 2.559,10	R\$ 4.578,00	35,86		
1.5.2.6	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	595,74	R\$ 4.801,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.801,66	0,00		
1.5.2.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017 P	m²	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	202,18	R\$ 727,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 727,84	0,00		
1.5.3	ALVENARIA DA MURETA								R\$ 4.072,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.072,23			
1.5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	m²	62,95	0,00	0,00	0,00	62,95	64,69	R\$ 4.072,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.072,23	0,00		
1.6	ESQUADRIAS								R\$ 250.127,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.127,50			
1.6.1	PORTAS DE MADEIRA								R\$ 28.938,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.938,15			
1.6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	977,18	R\$ 5.863,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.863,08	0,00		


Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabairana


Patricia Dutra de Melo Chagas
 Engª Civil
 CREA/SE nº 270093245-5


Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabairana

Obra:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2					BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01					CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada:		JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP					B.M.Nº 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023					Data da medição: 14/08/2023		
Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE					BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.292,26	R\$ 3.876,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.876,78	0,00
1.6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.022,62	R\$ 6.135,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.135,72	0,00
1.6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.022,62	R\$ 3.067,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.067,86	0,00
1.6.1.5	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens	un	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.152,19	R\$ 5.760,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.760,95	0,00
1.6.1.6	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1.60 a 1.80m), revestida e/ou fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.058,44	R\$ 4.233,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.233,76	0,00
1.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS								R\$ 4.175,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.175,09	
1.6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	138,17	R\$ 552,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 552,68	0,00
1.6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	286,69	R\$ 2.293,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.293,52	0,00
1.6.2.3	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m	m²	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	103,82	R\$ 1.328,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.328,89	0,00
1.6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO								R\$ 42.322,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.322,22	
1.6.3.1	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusiva vidro	m²	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	350,59	R\$ 736,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 736,23	0,00
1.6.3.2	Visor em alumínio com vidro temperado 6mm	m²	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	274,93	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67	0,00
1.6.3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	600,13	R\$ 1.008,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.008,21	0,00
1.6.3.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36	600,13	R\$ 2.016,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.016,43	0,00
1.6.3.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	83,48	0,00	0,00	0,00	83,48	443,80	R\$ 37.048,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.048,42	0,00
1.6.3.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	600,13	R\$ 1.224,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,26	0,00
1.6.4	PORTA DE VIDRO - PV								R\$ 4.647,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.647,36	
1.6.4.1	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	un	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	4.384,31	R\$ 4.647,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.647,36	0,00
1.6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA								R\$ 35.279,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.279,35	
1.6.5.1	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusiva vidro	m²	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	327,68	R\$ 288,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,35	0,00
1.6.5.2	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01 10/2021	m²	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	324,57	R\$ 285,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,62	0,00
1.6.5.3	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusiva vidro	m²	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15	327,68	R\$ 704,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 704,51	0,00
1.6.5.4	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01 10/2021	m²	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15	324,57	R\$ 697,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 697,82	0,00
1.6.5.5	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	511,23	R\$ 823,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 823,08	0,00
1.6.5.6	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusiva vidro	m²	2,73	0,00	0,00	0,00	2,73	327,68	R\$ 894,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 894,56	0,00

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patricia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01							CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023							Data da medição: 14/08/2023					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO												
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.6.5.7	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m²	2,73	0,00	0,00	0,00	2,73	324,57	R\$ 886,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 886,07	0,00
1.6.5.8	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	511,23	R\$ 1.104,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.104,25	0,00
1.6.5.9	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	493,50	R\$ 518,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,17	0,00
1.6.5.10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	493,50	R\$ 6.218,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.218,10	0,00
1.6.5.11	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	493,50	R\$ 4.145,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.145,40	0,00
1.6.5.12	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	493,50	R\$ 3.109,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.109,05	0,00
1.6.5.13	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	493,50	R\$ 518,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,17	0,00
1.6.5.14	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	493,50	R\$ 2.590,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.590,87	0,00
1.6.5.15	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	493,50	R\$ 2.072,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.072,70	0,00
1.6.5.16	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	493,50	R\$ 8.290,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.290,80	0,00
1.6.5.17	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	511,23	R\$ 1.390,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.390,54	0,00
1.6.5.18	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	m²	10,28	0,00	0,00	0,00	10,28	72,11	R\$ 741,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 741,29	0,00
1.6.6	VIDROS							R\$ 11.480,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.480,90	
1.6.6.1	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m²	13,33	0,00	0,00	0,00	13,33	324,57	R\$ 4.326,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.326,51	0,00
1.6.6.2	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev 02_10/2021	m²	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	309,52	R\$ 2.228,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.228,54	0,00
1.6.6.4	Espelho plano 4mm	m²	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	656,78	R\$ 4.925,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.925,85	0,00
1.6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO							R\$ 123.284,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.284,43	
1.6.7.1	Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, revestido em em pvc, malha 2 1/2", fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 1,00 m, exceto mureta	m²	71,89	0,00	0,00	0,00	71,89	426,06	R\$ 30.629,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.629,45	0,00
1.6.7.2	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho (ABRIR)	m²	5,27	0,00	0,00	0,00	5,27	999,51	R\$ 5.267,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.267,41	0,00
1.6.7.3	Fechamento de esquadria ferro com chapa de aço e=3mm (CHAPA DE AÇO PERFURADA)	m²	126,88	0,00	0,00	0,00	126,88	533,93	R\$ 67.745,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.745,03	0,00
1.6.7.4	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	m²	17,12	0,00	0,00	0,00	17,12	931,87	R\$ 15.953,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.953,61	0,00
1.6.7.5	Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm	m	217,38	0,00	0,00	0,00	217,38	16,97	R\$ 3.688,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.688,93	0,00
1.7	SISTEMA DE COBERTURA							R\$ 495.638,45	R\$ 129.675,32	R\$ 276.673,94	R\$ 406.349,24	R\$ 89.289,21		

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabairana

Patrícia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabairana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01							CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023							Data da medição: 14/08/2023					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO												
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.7.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura e Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada	m²	881,21	572,79	308,42	881,21	0,00	211,64	R\$ 186.499,28	R\$ 121.225,28	R\$ 65.274,01	R\$ 186.499,28	R\$ -	100,00
1.7.2	Telhamento com telha em aço galvanizado, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, FSUP.=não pintada, Flnf.=Filme Alum. Boq, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou simila	m²	850,66	0,00	675,15	675,15	175,51	292,87	R\$ 249.132,79	R\$ -	R\$ 197.731,18	R\$ 197.731,18	R\$ 51.401,61	79,37
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.7.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	140,90	0,00	0,00	0,00	140,90	73,56	R\$ 10.364,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.364,60	0,00
1.7.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	233,60	131,60	102,00	233,60	0,00	64,21	R\$ 14.999,45	R\$ 8.450,04	R\$ 6.549,42	R\$ 14.999,45	R\$ -	100,00
1.7.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 75CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	45,03	0,00	0,00	0,00	45,03	141,78	R\$ 6.384,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.384,35	0,00
1.7.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 41CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	8,51	0,00	0,00	0,00	8,51	131,88	R\$ 1.122,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.122,29	0,00
1.7.10	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 47CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	70,76	0,00	0,00	0,00	70,76	133,68	R\$ 9.459,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.459,19	0,00
1.7.11	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CORTE 35CM	m2	7,45	0,00	0,00	0,00	7,45	130,16	R\$ 969,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 969,69	0,00
1.7.12	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CORTE 53CM	m2	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	135,37	R\$ 458,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 458,90	0,00
1.7.13	Cumeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	13,18	0,00	0,00	0,00	13,18	111,90	R\$ 1.474,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.474,84	0,00
1.7.14	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	75,74	0,00	36,50	36,50	39,24	195,05	R\$ 14.773,09	R\$ -	R\$ 7.119,33	R\$ 7.119,33	R\$ 7.653,76	48,19
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 16.580,97	R\$ 10.660,52	R\$ -	R\$ 10.660,52	R\$ 5.920,45	
1.8.1	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	409,39	409,39	0,00	409,39	0,00	26,04	R\$ 10.660,52	R\$ 10.660,52	R\$ -	R\$ 10.660,52	R\$ -	100,00
1.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	125,46	0,00	0,00	0,00	125,46	47,19	R\$ 5.920,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.920,45	0,00
1.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO								R\$ 251.590,88	R\$ 92.962,09	R\$ 36.693,79	R\$ 129.555,87	R\$ 122.035,01	
1.9.1	EDIFICAÇÃO								R\$ 247.430,63	R\$ 92.962,09	R\$ 36.693,79	R\$ 129.555,87	R\$ 117.874,76	
1.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2.569,60	2.474,10	0,00	2.474,10	95,50	4,64	R\$ 11.922,94	R\$ 11.479,82	R\$ -	R\$ 11.479,82	R\$ 443,12	96,28
1.9.1.1	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	1.589,78	1.312,61	31,74	1.344,35	245,43	31,74	R\$ 50.459,61	R\$ 41.662,24	R\$ 1.007,43	R\$ 42.669,67	R\$ 7.789,94	84,56
1.9.1.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	979,82	522,28	430,00	952,28	27,54	37,79	R\$ 37.027,39	R\$ 19.736,96	R\$ 16.249,70	R\$ 35.986,66	R\$ 1.040,73	97,19
1.9.1.3	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	1.024,77	747,31	277,46	1.024,77	0,00	26,74	R\$ 27.402,34	R\$ 19.983,07	R\$ 7.419,28	R\$ 27.402,34	R\$ -	100,00

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patricia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245.5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01							CONTRATO Nº: 063/2022										
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023							Data da medição: 14/08/2023										
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
1.9.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	456,39	0,00	0,00	0,00	456,39	66,09	R\$	30.162,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30.162,81	0,00
1.9.1.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	60,73	R\$	279,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	279,35	0,00
1.9.1.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92	60,73	R\$	298,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	298,79	0,00
1.9.1.7	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	9,71	0,00	0,00	0,00	9,71	60,73	R\$	589,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	589,68	0,00
1.9.1.8	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	60,73	R\$	5.708,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.708,62	0,00
1.9.1.9	Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm (RODA-MEIO)	m	127,20	0,00	0,00	0,00	127,20	31,60	R\$	4.019,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.019,52	0,00
1.9.1.10	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m²	463,50	0,00	0,00	0,00	463,50	84,36	R\$	39.100,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	39.100,86	0,00
1.9.1.11	Forro acústico em placas de fibra mineral o'perfil "T" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado	m²	259,43	0,00	0,00	0,00	259,43	103,09	R\$	26.744,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	26.744,63	0,00
1.9.1.12	Arestamento de vãos	m	953,03	0,00	835,12	835,12	117,91	14,39	R\$	13.714,10	R\$	-	R\$	12.017,38	R\$	12.017,38	R\$	1.696,72	87,63
1.9.2	MURETA								R\$	4.160,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.160,25	
1.9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	98,05	0,00	0,00	0,00	98,05	4,64	R\$	454,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	454,95	0,00
1.9.2.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	98,05	0,00	0,00	0,00	98,05	37,79	R\$	3.705,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.705,30	0,00
1.10	SISTEMA DE PISOS								R\$	198.966,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	198.966,66	
1.10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA								R\$	145.817,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	145.817,60	
1.10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	333,95	0,00	0,00	0,00	333,95	40,13	R\$	13.401,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13.401,41	0,00
1.10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	578,82	0,00	0,00	0,00	578,82	31,44	R\$	18.198,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	18.198,10	0,00
1.10.1.3	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 (RAMPA)	m²	381,29	0,00	0,00	0,00	381,29	36,22	R\$	13.810,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13.810,32	0,00
1.10.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	37,42	0,00	0,00	0,00	37,42	58,48	R\$	2.188,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.188,32	0,00
1.10.1.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m²	148,95	0,00	0,00	0,00	148,95	50,15	R\$	7.469,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.469,84	0,00
1.10.1.6	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m²	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90	89,99	R\$	3.860,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.860,57	0,00
1.10.1.7	Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso	m²	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53	355,60	R\$	76.998,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	76.998,06	0,00
1.10.1.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	16,27	R\$	1.106,36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.106,36	0,00
1.10.1.9	Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado o' cola, sobre emboço	m	127,20	0,00	0,00	0,00	127,20	33,97	R\$	4.320,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.320,98	0,00
1.10.1.10	Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2 cm	m	53,45	0,00	0,00	0,00	53,45	73,92	R\$	3.951,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.951,02	0,00

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patricia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2						BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01					CONTRATO Nº: 063/2022			
Contratada:		JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP						B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023					Data da medição: 14/08/2023			
Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE						BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido		
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
1.10.1.1	Soleira de granito branco polar, l = 30cm, e = 2cm	m	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	292,93	R\$ 512,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	512,62	0,00	
1.10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								R\$ 53.149,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.149,06		
1.10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	254,80	0,00	0,00	0,00	254,80	161,14	R\$ 41.058,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	41.058,47	0,00	
1.10.2.2	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 (RAMPA)	m²	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38	36,22	R\$ 629,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	629,50	0,00	
1.10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	27,74	0,00	0,00	0,00	27,74	71,07	R\$ 1.971,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.971,48	0,00	
1.10.2.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	107,17	R\$ 803,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	803,77	0,00	
1.10.2.5	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	107,17	R\$ 522,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	522,98	0,00	
1.10.2.6	Coleção de areia	m³	21,96	0,00	0,00	0,00	21,96	155,05	R\$ 3.404,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.404,89	0,00	
1.10.2.7	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	m²	344,81	0,00	0,00	0,00	344,81	13,07	R\$ 4.506,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.506,66	0,00	
1.10.2.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	31,18	R\$ 251,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	251,31	0,00	
1.11	PINTURAS E ACABAMENTOS								R\$ 109.448,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.448,94		
1.11.1	EDIFICAÇÃO								R\$ 109.448,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.448,94		
1.11.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	2.004,59	0,00	0,00	0,00	2.004,59	2,60	R\$ 5.211,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.211,93	0,00	
1.11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	2.004,59	0,00	0,00	0,00	2.004,59	16,76	R\$ 33.596,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	33.596,92	0,00	
1.11.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	2.004,59	0,00	0,00	0,00	2.004,59	13,49	R\$ 27.041,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	27.041,91	0,00	
1.11.1.4	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 (FORRO)	m²	442,55	0,00	0,00	0,00	442,55	17,39	R\$ 7.695,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.695,94	0,00	
1.11.1.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²	442,55	0,00	0,00	0,00	442,55	16,13	R\$ 7.138,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.138,33	0,00	
1.11.1.6	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	123,61	0,00	0,00	0,00	123,61	20,32	R\$ 2.511,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.511,75	0,00	
1.11.1.7	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72	20,32	R\$ 258,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	258,47	0,00	
1.11.1.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	421,23	0,00	0,00	0,00	421,23	20,77	R\$ 8.748,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8.748,94	0,00	
1.11.1.9	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	101,63	0,00	0,00	0,00	101,63	58,48	R\$ 5.943,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.943,32	0,00	
1.11.1.10	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	172,13	0,00	0,00	0,00	172,13	20,77	R\$ 3.575,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.575,14	0,00	
1.11.1.11	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	m2	442,55	0,00	0,00	0,00	442,55	3,00	R\$ 1.327,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.327,65	0,00	
1.11.1.12	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m2	272,66	0,00	0,00	0,00	272,66	8,67	R\$ 2.363,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.363,96	0,00	
1.11.1.13	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	136,33	0,00	0,00	0,00	136,33	18,32	R\$ 2.497,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.497,56	0,00	
1.11.1.14	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	172,13	0,00	0,00	0,00	172,13	8,93	R\$ 1.537,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.537,12	0,00	
1.12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA (MURETA)								R\$ 46.023,08	R\$ 17.030,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.030,08	R\$ 28.993,00		
1.12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO								R\$ 37.494,74	R\$ 17.030,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.030,08	R\$ 20.464,66		
1.12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	20,38	14,72	0,00	14,72	5,66	8,72	R\$ 177,71	R\$ 128,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,36	R\$ 49,35	72,23	
1.12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	169,48	3,67	0,00	3,67	165,81	6,41	R\$ 1.086,37	R\$ 23,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,52	R\$ 1.062,85	2,17	

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patricia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE Nº 270093245-5

Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01							CONTRATO Nº: 063/2022							
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023							Data da medição: 14/08/2023							
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO														
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido		
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
1.12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	73,83	0,00	0,00	0,00	73,83	22,78	R\$ 1.681,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.681,85	0,00		
1.12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,27	0,00	0,00	0,00	5,27	37,79	R\$ 199,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199,15	0,00		
1.12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	157,40	97,20	0,00	97,20	60,20	62,67	R\$ 9.864,26	R\$ 6.091,52	R\$ -	R\$ 6.091,52	R\$ 3.772,74	61,75		
1.12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,62	52,94	0,00	52,94	7,68	78,06	R\$ 4.732,00	R\$ 4.132,50	R\$ -	R\$ 4.132,50	R\$ 599,50	87,33		
Inserido	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	13,24	R\$ 26,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,48	0,00		
Inserido	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	UN	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	16,46	R\$ 32,92	R\$ 32,92	R\$ -	R\$ 32,92	R\$ -	100,00		
1.12.1.7	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	18,20	R\$ 54,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,60	0,00		
1.12.1.8	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 2 1/2"	un	6,00	4,00	0,00	4,00	2,00	265,90	R\$ 1.595,40	R\$ 1.063,60	R\$ -	R\$ 1.063,60	R\$ 531,80	66,67		
1.12.1.9	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 85mm x 3"	un	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	367,43	R\$ 734,86	R\$ 734,86	R\$ -	R\$ 734,86	R\$ -	100,00		
1.12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2;"INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,16	R\$ 16,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,64	0,00		
1.12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4;"INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	4,07	R\$ 293,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,04	0,00		
1.12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2;"INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12,39	R\$ 495,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,60	0,00		
1.12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2;"INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	36,49	R\$ 218,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218,94	0,00		
1.12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3;"INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	54,44	R\$ 108,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,88	0,00		
1.12.1.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	24,32	R\$ 121,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,60	0,00		
1.12.1.16	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	36,44	R\$ 72,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,88	0,00		
1.12.1.17	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 75mm	un	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	34,14	R\$ 102,42	R\$ 102,42	R\$ -	R\$ 102,42	R\$ -	100,00		
1.12.1.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	13,03	R\$ 429,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 429,99	0,00		
1.12.1.19	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	27,87	R\$ 55,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,74	0,00		
1.12.1.20	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	43,04	R\$ 387,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,36	0,00		
Inserido	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	48,23	R\$ 48,23	R\$ 48,23	R\$ -	R\$ 48,23	R\$ -	100,00		
Inserido	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4,00	2,00	0,00	2,00	2,00	11,75	R\$ 47,00	R\$ 23,50	R\$ -	R\$ 23,50	R\$ 23,50	50,00		
Inserido	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação af_06/2022	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,27	R\$ 5,27	R\$ 5,27	R\$ -	R\$ 5,27	R\$ -	100,00		
1.12.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	6,00	0,00	6,00	3,00	5,84	R\$ 52,56	R\$ 35,04	R\$ -	R\$ 35,04	R\$ 17,52	66,67		


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Patricia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01					CONTRATO Nº: 063/2022											
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP			B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023					Data da medição: 14/08/2023											
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
1.121.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	18,28	R\$	73,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73,12	0,00
Inserido	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação af_06/2022	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	51,35	R\$	102,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	102,70	0,00
1.121.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	6,00	0,00	6,00	2,00	109,18	R\$	873,44	R\$	655,08	R\$	-	R\$	655,08	R\$	218,36	75,00
1.121.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	173,15	R\$	346,30	R\$	346,30	R\$	-	R\$	346,30	R\$	-	100,00
1.121.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,11	R\$	14,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14,22	0,00
1.121.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	77,00	8,00	0,00	8,00	69,00	7,70	R\$	592,90	R\$	61,60	R\$	-	R\$	61,60	R\$	531,30	10,39
1.121.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	15,70	R\$	628,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	628,00	0,00
1.121.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	46,68	R\$	233,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	233,40	0,00
1.121.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	12,00	0,00	12,00	18,00	146,75	R\$	4.402,50	R\$	1.761,00	R\$	-	R\$	1.761,00	R\$	2.641,50	40,00
1.121.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	173,15	R\$	1.385,20	R\$	1.385,20	R\$	-	R\$	1.385,20	R\$	-	100,00
1.121.31	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	16,56	R\$	546,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	546,48	0,00
1.121.32	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	18,20	R\$	527,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	527,80	0,00
1.121.33	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10,30	R\$	154,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	154,50	0,00
1.121.34	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	28,90	R\$	549,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	549,10	0,00
1.121.35	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	109,83	R\$	878,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	878,64	0,00
1.121.36	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	167,01	R\$	167,01	R\$	167,01	R\$	-	R\$	167,01	R\$	-	100,00
1.121.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	23,47	R\$	281,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	281,64	0,00
1.121.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	91,29	R\$	1.004,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.004,19	0,00
1.121.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	91,29	R\$	1.004,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.004,19	0,00
1.121.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
Inserido	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	158,65	R\$	475,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	475,95	0,00
Inserido	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85 x 60mm	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	140,33	R\$	140,33	R\$	140,33	R\$	-	R\$	140,33	R\$	-	100,00
Inserido	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85 x 75mm	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	91,82	R\$	91,82	R\$	91,82	R\$	-	R\$	91,82	R\$	-	100,00
1.121.41	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2"INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	17,92	R\$	35,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	35,84	0,00


Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Patricia Dutra de Melo Chagas
 Engª Civil
 CREA/SE nº 270093245-5


Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01							CONTRATO Nº: 063/2022										
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023							Data da medição: 14/08/2023										
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
1.121.42	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,44	R\$	343,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	343,72	0,00
1.12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS (MURETA)								R\$	8.528,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.528,34	
1.12.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.12.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	98,05	0,00	0,00	0,00	98,05	16,76	R\$	1.643,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.643,31	0,00
Inserido	Registro de gaveta bruto, latão, rosável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af 08/2021	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	295,19	R\$	885,58	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	885,58	0,00
Inserido	Registro de gaveta bruto, latão, rosável, 3" - fornecimento e instalação. af 08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	358,15	R\$	358,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	358,15	0,00
1.12.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	98,05	0,00	0,00	0,00	98,05	13,49	R\$	1.322,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.322,69	0,00
1.12.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	83,15	R\$	83,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	83,15	0,00
1.12.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	167,33	R\$	1.338,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.338,64	0,00
1.12.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	94,45	R\$	566,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	566,70	0,00
1.12.2.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	89,62	R\$	2.330,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.330,12	0,00
1.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								R\$	16.040,03	R\$	11.776,77	R\$	1.623,91	R\$	13.400,68	R\$	2.639,35	
1.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC								R\$	10.777,03	R\$	9.153,12	R\$	1.623,91	R\$	10.777,03	R\$	-	
1.13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	258,41	228,21	30,20	258,41	0,00	34,46	R\$	8.904,81	R\$	7.864,12	R\$	1.040,69	R\$	8.904,81	R\$	-	100,00
1.13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	70,75	R\$	212,25	R\$	212,25	R\$	-	R\$	212,25	R\$	-	100,00
1.13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	26,43	R\$	449,31	R\$	449,31	R\$	-	R\$	449,31	R\$	-	100,00
1.13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	35,00	13,00	22,00	35,00	0,00	26,51	R\$	927,85	R\$	344,63	R\$	583,22	R\$	927,85	R\$	-	100,00
1.13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	94,27	R\$	282,81	R\$	282,81	R\$	-	R\$	282,81	R\$	-	100,00
1.13.1.6	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.13.2	ACESSÓRIOS								R\$	5.263,00	R\$	2.623,65	R\$	-	R\$	2.623,65	R\$	2.639,35	
1.13.2.1	Ralo hemisférico em P, tipo abacaxi Ø 100mm	un	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	49,13	R\$	540,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	540,43	0,00
1.13.2.2	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	un	9,00	5,00	4,00	9,00	4,00	524,73	R\$	4.722,57	R\$	2.623,65	R\$	-	R\$	2.623,65	R\$	2.098,92	55,56
1.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA								R\$	67.416,86	R\$	32.439,65	R\$	3.483,50	R\$	35.923,05	R\$	31.493,51	
1.14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	162,42	129,42	0,00	129,42	33,00	59,36	R\$	9.641,25	R\$	7.682,37	R\$	-	R\$	7.682,37	R\$	1.958,88	79,68
Inserido	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 12/2014	M	8,46	8,46	0,00	8,46	0,00	70,40	R\$	595,57	R\$	595,58	R\$	-	R\$	595,57	R\$	-	100,00

Elaine da Silva Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patrícia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01					CONTRATO Nº: 063/2022						
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP			B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023					Data da medição: 14/08/2023						
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO											
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	119,56	111,77	7,79	119,56	0,00	16,06	R\$ 1.920,13	R\$ 1.795,03	R\$ 125,11	R\$ 1.920,13	R\$ -	100,00
1.14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	198,23	141,62	56,61	198,23	0,00	30,92	R\$ 6.129,27	R\$ 4.378,89	R\$ 1.750,38	R\$ 6.129,27	R\$ -	100,00
Inserido	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	M	80,45	26,20	54,25	80,45	0,00	24,02	R\$ 1.932,73	R\$ 629,32	R\$ 1.303,09	R\$ 1.932,41	R\$ 0,32	100,00
1.14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.14.5	BÚCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
Inserido	Bucha de redução longa em pvc rígido e/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	UN	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	10,83	R\$ 194,98	R\$ 194,94	R\$ -	R\$ 194,94	R\$ 0,04	100,00
1.14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	26,43	R\$ 211,44	R\$ 211,44	R\$ -	R\$ 211,44	R\$ -	100,00
1.14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	21,70	R\$ 43,40	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ 43,40	R\$ -	100,00
1.14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00	30,00	0,00	30,00	8,00	12,27	R\$ 466,26	R\$ 368,10	R\$ -	R\$ 368,10	R\$ 98,16	78,95
1.14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	7,47	R\$ 866,52	R\$ 866,52	R\$ -	R\$ 866,52	R\$ -	100,00
1.14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	26,51	R\$ 318,12	R\$ 318,12	R\$ -	R\$ 318,12	R\$ -	100,00
1.14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
Inserido	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_06/2022	UN	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	20,12	R\$ 563,33	R\$ 563,36	R\$ -	R\$ 563,33	R\$ -	100,00
1.14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	11,47	R\$ 321,16	R\$ 321,16	R\$ -	R\$ 321,16	R\$ -	100,00
1.14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	78,00	50,00	28,00	78,00	0,00	10,89	R\$ 849,42	R\$ 544,50	R\$ 304,92	R\$ 849,42	R\$ -	100,00
1.14.14	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	50,67	R\$ 810,72	R\$ 810,72	R\$ -	R\$ 810,72	R\$ -	100,00
1.14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	51,78	R\$ 414,24	R\$ 414,24	R\$ -	R\$ 414,24	R\$ -	100,00
1.14.16	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	39,58	R\$ 39,58	R\$ 39,58	R\$ -	R\$ 39,58	R\$ -	100,00
1.14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	19,29	R\$ 212,19	R\$ 212,19	R\$ -	R\$ 212,19	R\$ -	100,00

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabairana

Márcia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabairana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01										CONTRATO Nº: 063/2022						
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP			B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023										Data da medição: 14/08/2023						
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
Inserido	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	12,66	R\$	101,26	R\$	101,26	R\$	-	R\$	101,26	R\$	-	100,00
1.14.18	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	24,59	R\$	24,59	R\$	24,59	R\$	-	R\$	24,59	R\$	-	100,00
1.14.19	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	52,85	R\$	52,85	R\$	52,85	R\$	-	R\$	52,85	R\$	-	100,00
1.14.20	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	53,75	R\$	645,00	R\$	645,00	R\$	-	R\$	645,00	R\$	-	100,00
Inserido	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm	UN	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	41,96	R\$	83,92	R\$	83,92	R\$	-	R\$	83,92	R\$	-	100,00
1.14.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	21,75	R\$	304,50	R\$	304,50	R\$	-	R\$	304,50	R\$	-	100,00
1.14.22	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	51,18	R\$	51,18	R\$	51,18	R\$	-	R\$	51,18	R\$	-	100,00
1.14.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
Inserido	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	24,24	R\$	242,45	R\$	242,45	R\$	-	R\$	242,40	R\$	0,05	100,00
Inserido	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	29,51	R\$	118,04	R\$	118,04	R\$	-	R\$	118,04	R\$	-	100,00
Inserido	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	UN	11,00	8,00	0,00	8,00	3,00	41,36	R\$	455,01	R\$	330,88	R\$	-	R\$	330,88	R\$	124,13	72,73
Inserido	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	92,00	80,00	0,00	80,00	12,00	12,40	R\$	1.140,93	R\$	992,00	R\$	-	R\$	992,00	R\$	148,93	86,96
Inserido	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	18,92	R\$	643,34	R\$	643,34	R\$	-	R\$	643,34	R\$	-	100,00
Inserido	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	UN	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	23,70	R\$	2.440,95	R\$	2.440,95	R\$	-	R\$	2.440,95	R\$	-	100,00
Inserido	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	11,00	8,00	0,00	8,00	3,00	39,04	R\$	429,45	R\$	312,32	R\$	-	R\$	312,32	R\$	117,13	72,73
1.14.24	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	19,00	15,00	0,00	15,00	4,00	54,54	R\$	1.036,26	R\$	818,10	R\$	-	R\$	818,10	R\$	218,16	78,95
1.14.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	171,42	R\$	685,68	R\$	685,68	R\$	-	R\$	685,68	R\$	-	100,00
1.14.26	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	12,00	7,00	0,00	7,00	5,00	655,72	R\$	7.868,64	R\$	4.590,04	R\$	-	R\$	4.590,04	R\$	3.278,60	58,33
1.14.27	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	13,09	R\$	26,18	R\$	13,09	R\$	-	R\$	13,09	R\$	13,09	50,00
1.14.28	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	98,49	R\$	295,47	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	295,47	0,00
1.14.29	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,87	R\$	76,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	76,09	0,00
1.14.30	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	22,38	R\$	246,18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	246,18	0,00
1.14.31	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7.537,73	R\$	7.537,73	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.537,73	0,00
1.14.32	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17.380,55	R\$	17.380,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17.380,55	0,00
1.15	LOUÇAS E METAIS								R\$	49.206,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	49.206,62	
1.15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	280,16	R\$	1.120,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.120,64	0,00
1.15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	501,63	R\$	4.514,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.514,67	0,00
1.15.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019 P	M	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	89,72	R\$	870,28	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	870,28	0,00

Elaine da Costa Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patricia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01							CONTRATO Nº: 063/2022										
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023							Data da medição: 14/08/2023										
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
1.15.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	316,04	R\$	4.108,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.108,52	0,00
1.15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	138,58	R\$	1.801,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.801,54	0,00
1.15.6	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	560,80	R\$	3.364,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.364,80	0,00
1.15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	481,95	R\$	2.409,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.409,75	0,00
1.15.8	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref el 680), torneira cromada (deca linha e40 ref1159) e engate de plástico ou similares Rev.02	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.465,61	R\$	1.465,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.465,61	0,00
1.15.9	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77X75X20cm, Barigotto ou equivalente	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	96,81	R\$	193,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	193,62	0,00
1.15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	134,25	R\$	402,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	402,75	0,00
1.15.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	134,25	R\$	402,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	402,75	0,00
1.15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	816,03	R\$	4.080,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.080,15	0,00
1.15.13	Chaveiro elétrico de plástico (Lorenzetti ou similar)	un	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	101,93	R\$	815,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	815,44	0,00
1.15.14	Paneleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	174,08	R\$	1.566,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.566,72	0,00
1.15.15	Dispenser para toalha interfolhada	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	51,36	R\$	154,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	154,08	0,00
1.15.16	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	287,13	R\$	2.871,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.871,30	0,00
1.15.17	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	142,84	R\$	285,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	285,68	0,00
1.15.18	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	142,84	R\$	285,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	285,68	0,00
1.15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	110,46	R\$	994,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	994,14	0,00
1.15.20	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	63,42	R\$	443,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	443,94	0,00
1.15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	63,59	R\$	1.017,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.017,44	0,00
1.15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	63,59	R\$	190,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	190,77	0,00
1.15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	80,04	R\$	1.120,56	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.120,56	0,00
1.15.24	Dispenser para toalha interfolhada	un	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	51,36	R\$	719,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	719,04	0,00
1.15.25	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	37,02	R\$	3.961,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.961,14	0,00
1.15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	316,11	R\$	2.212,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.212,77	0,00
1.15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	304,36	R\$	1.521,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.521,80	0,00
1.15.28	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	252,18	R\$	2.269,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.269,62	0,00
1.15.29	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.181,38	R\$	1.181,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.181,38	0,00
1.15.30	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	35,25	R\$	951,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	951,75	0,00

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patrícia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREAISE nº 270093245-5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01			CONTRATO Nº: 063/2022			
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023										Data da medição: 14/08/2023			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
1.15.31	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e curho completo) ou similar	un	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,10	R\$ 362,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 362,90	0,00
1.15.32	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	9,93	R\$ 248,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248,25	0,00
1.15.33	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	149,57	R\$ 299,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,14	0,00
1.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								R\$ 5.206,68	R\$ 2.735,70	R\$ -	R\$ 2.735,70	R\$ 2.470,98		
1.16.1	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 (ENVELOPE)	m³	2,44	2,44	0,00	2,44	0,00	485,88	R\$ 1.185,54	R\$ 1.185,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.185,54	R\$ -	100,00
1.16.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	600,13	R\$ 144,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,03	R\$ -	0,00
1.16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	45,80	25,15	0,00	25,15	20,65	49,29	R\$ 2.257,48	R\$ 1.239,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.239,64	R\$ 1.017,84	54,91
Inserido	Joelho 90 graus, rosca fêmea terminal, para instalações em pex, dn 20mm x 3/4", conexão por crimpagem ? fornecimento e instalação. af_06/2015	un	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	41,34	R\$ 124,03	R\$ 124,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,03	R\$ -	100,00
Inserido	Tê, para instalações em pex, dn 20 mm, conexão por crimpagem ? fornecimento e instalação. af_06/2015	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	42,09	R\$ 42,09	R\$ 42,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,09	R\$ -	100,00
1.16.4	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 (ENVELOPE)	m³	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	485,88	R\$ 87,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,45	0,00
1.16.5	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	12,00	10,00	0,00	10,00	2,00	14,44	R\$ 173,28	R\$ 144,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,40	R\$ 28,88	83,33
1.16.6	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	257,92	R\$ 257,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,92	0,00
1.16.7	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	435,86	R\$ 871,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 871,72	0,00
1.16.8	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	31,57	R\$ 31,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,57	0,00
1.16.9	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	31,57	R\$ 31,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,57	0,00
1.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								R\$ 32.627,65	R\$ 10.399,76	R\$ -	R\$ 10.399,76	R\$ 22.227,89		
1.17.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	185,12	R\$ 1.110,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.110,72	0,00
1.17.2	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	551,70	R\$ 1.103,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.103,40	0,00
Inserido	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	96,85	R\$ 484,26	R\$ 484,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,25	R\$ 0,01	100,00
1.17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	139,31	R\$ 975,17	R\$ 975,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 975,17	R\$ -	100,00
1.17.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	149,63	R\$ 149,63	R\$ 149,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,63	R\$ -	100,00
1.17.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	87,68	R\$ 175,36	R\$ 175,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,36	R\$ -	100,00
1.17.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	193,85	R\$ 775,40	R\$ 775,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,40	R\$ -	100,00
1.17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63,00	51,45	0,00	51,45	11,55	152,38	R\$ 9.599,94	R\$ 7.839,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.839,95	R\$ 1.759,99	81,67

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01						CONTRATO Nº: 063/2022						
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023						Data da medição: 14/08/2023						
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO												
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.17.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.351,08	R\$ 2.702,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.702,16	0,00
1.17.9	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	67,94	R\$ 67,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,94	0,00
1.17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	292,65	R\$ 1.463,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,25	0,00
1.17.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	204,63	R\$ 613,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 613,89	0,00
1.17.12	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	205,36	R\$ 821,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 821,44	0,00
1.17.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	28,76	R\$ 1.035,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.035,36	0,00
1.17.14	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	58,48	R\$ 584,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 584,80	0,00
1.17.15	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrífuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4.480,98	R\$ 8.961,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.961,96	0,00
1.17.16	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	425,57	R\$ 425,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 425,57	0,00
1.17.17	Sirene áudiovisual endereçável, 120db, para alarme de incendio	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	206,62	R\$ 413,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 413,24	0,00
1.17.18	Placa de sinalização de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,24	R\$ 1.164,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.164,16	0,00
1.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V							R\$ 216.634,27	R\$ 1.762,32	R\$ 6.575,48	R\$ 8.337,80	R\$ 208.296,47		
1.18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO							R\$ 8.052,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.052,60		
1.18.1.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	986,41	R\$ 986,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 986,41	0,00
1.18.1.2	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.073,56	R\$ 1.073,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.073,56	0,00
1.18.1.3	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.18.1.4	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.18.1.5	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.18.1.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.293,74	R\$ 1.293,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.293,74	1,00
1.18.1.7	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	547,07	R\$ 1.641,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.641,21	2,00
1.18.1.8	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo 1000x600x250cm, exclusive disjuntores	und	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.057,68	R\$ 3.057,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.057,68	3,00
1.18.2	DISJUNTORES							R\$ 10.950,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.950,61		
1.18.2.1	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar	un	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,72	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,48	0,00
1.18.2.2	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5kA	un	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	52,32	R\$ 418,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,64	0,00
1.18.2.3	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	64,30	R\$ 643,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,00	0,00
1.18.2.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.18.2.5	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patricia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01			CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP									B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023			Data da medição: 14/08/2023					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido			
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir				
1.18.2.6	Disjuntor termomagnético monopolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.2.7	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.2.8	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.2.9	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.2.10	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10kA	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.2.11	Disjuntor termomagnético tripolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5kA	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.2.12	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10kA	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.2.13	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 65 kA	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.2.14	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.2.15	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	116,11	R\$	3.251,08	R\$	-	R\$	-	R\$	3.251,08	0,00
1.18.2.16	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	um	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	661,35	R\$	1.322,70	R\$	-	R\$	-	R\$	1.322,70	0,00
1.18.2.17	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10kA	um	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	597,88	R\$	2.391,52	R\$	-	R\$	-	R\$	2.391,52	0,00
1.18.2.18	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5kA	um	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	168,17	R\$	336,34	R\$	-	R\$	-	R\$	336,34	0,00
1.18.2.19	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	um	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	134,68	R\$	269,36	R\$	-	R\$	-	R\$	269,36	0,00
1.18.2.20	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 10/2020	um	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	102,90	R\$	411,60	R\$	-	R\$	-	R\$	411,60	0,00
1.18.2.21	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	um	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	14,42	R\$	605,64	R\$	-	R\$	-	R\$	605,64	0,00
1.18.2.22	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 100A, 30mA, fornecimento e instalação	um	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	404,99	R\$	404,99	R\$	-	R\$	-	R\$	404,99	0,00
1.18.2.23	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 80A, 30mA, fornecimento e instalação	um	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	230,65	R\$	230,65	R\$	-	R\$	-	R\$	230,65	0,00
1.18.2.24	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 63A, 30mA, fornecimento e instalação	um	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	189,97	R\$	189,97	R\$	-	R\$	-	R\$	189,97	0,00
1.18.2.25	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 40A, 30mA, fornecimento e instalação	um	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	172,54	R\$	172,54	R\$	-	R\$	-	R\$	172,54	0,00
1.18.2.26	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	um	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	67,05	R\$	134,10	R\$	-	R\$	-	R\$	134,10	0,00
1.18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							R\$	16.892,13	R\$	1.762,32	R\$	6.575,48	R\$	8.337,80	R\$	8.554,33
1.18.3.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	113,27	0,00	113,27	113,27	0,00	7,94	R\$	899,36	R\$	-	R\$	899,36	R\$	899,36	100,00
1.18.3.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	269,85	0,00	269,85	269,85	0,00	7,83	R\$	2.112,92	R\$	-	R\$	2.112,92	R\$	2.112,92	100,00
1.18.3.3	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	12,02	R\$	2.253,75	R\$	-	R\$	2.253,75	R\$	2.253,75	100,00
1.18.3.4	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	37,08	0,00	13,70	13,70	23,38	13,70	R\$	507,99	R\$	-	R\$	187,69	R\$	187,69	36,95
1.18.3.5	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2") - fornecimento e instalação. af 04/2016	M	247,81	0,00	0,00	0,00	247,81	9,78	R\$	2.423,58	R\$	-	R\$	-	R\$	2.423,58	0,00
1.18.3.6	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	m	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	14,61	R\$	357,94	R\$	-	R\$	-	R\$	357,94	0,00
1.18.3.7	Eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	44,41	R\$	928,16	R\$	-	R\$	-	R\$	928,16	0,00
1.18.3.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	47,00	23,20	0,00	23,20	23,80	69,60	R\$	3.271,20	R\$	1.614,72	R\$	-	R\$	1.614,72	49,36
1.18.3.9	Caixa passagem de sobrepre em aço 100x100x80mm	un	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	15,50	R\$	248,00	R\$	-	R\$	-	R\$	248,00	0,00
1.18.3.10	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	161,00	10,00	76,00	86,00	75,00	14,76	R\$	2.376,36	R\$	1.171,60	R\$	1.121,76	R\$	1.269,36	53,42

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patricia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01					CONTRATO Nº: 063/2022	
Contratada:		JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP							B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023					Data da medição: 14/08/2023	
Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE													
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO															
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
1.18.3.11	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	11,29	R\$ 1.512,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.512,86	0,00
1.18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)								R\$ 66.415,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.415,66	
1.18.4.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	3.090,02	0,00	0,00	0,00	3090,02	2,98	R\$ 9.208,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.208,25	0,00
1.18.4.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4.463,80	0,00	0,00	0,00	4463,80	4,42	R\$ 19.729,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.729,99	0,00
1.18.4.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	962,99	0,00	0,00	0,00	962,99	7,30	R\$ 7.029,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.029,82	0,00
1.18.4.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	431,97	0,00	0,00	0,00	431,97	10,00	R\$ 4.319,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.319,70	0,00
1.18.4.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	11,73	R\$ 31,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,08	0,00
1.18.4.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	170,77	0,00	0,00	0,00	170,77	25,37	R\$ 4.332,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.332,43	0,00
1.18.4.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50	30,52	R\$ 5.447,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.447,82	0,00
1.18.4.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.18.4.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30	108,56	R\$ 16.316,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.316,56	0,00
1.18.4.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.18.5	ELETROCALHAS								R\$ 15.318,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.318,37	
1.18.5.1	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	109,02	R\$ 5.341,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.341,98	0,00
1.18.5.2	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	144,01	R\$ 8.352,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.352,58	0,00
1.18.5.3	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	134,84	R\$ 134,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,84	0,00
1.18.5.4	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,35	R\$ 184,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,20	0,00
1.18.5.5	Emenda interna 100 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15,72	R\$ 314,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,40	0,00
1.18.5.6	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	14,77	R\$ 310,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,17	0,00
1.18.5.7	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	14,20	R\$ 468,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 468,60	0,00
1.18.5.8	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	5,29	R\$ 211,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,60	0,00
1.18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS								R\$ 25.528,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.528,02	
1.18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	29,06	R\$ 494,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,02	0,00
1.18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	31,24	R\$ 937,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 937,20	0,00
1.18.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	43,32	R\$ 823,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 823,08	0,00
1.18.6.4	Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, sistema "X", ref. 675063 da Pial Legrand ou similar	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patricia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01			CONTRATO Nº: 063/2022						
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP								B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023			Data da medição: 14/08/2023						
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)			Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido			
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período						
1.18.6.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.6.6	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. TBS020D21 6RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.6.7	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020D232RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.6.8	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232C100 da Philips, completa	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.6.9	Luminária com proteção em vidro, incl. lâmpada vapor metálico 400w e reator, tecnolux, ref. lm-250v/5 (ou similar)	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.6.10	Projektor Lumini, ref PL-2124/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor metálico HOI-TS 150W e reator	Un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1581,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.6.11	Luminária tipo arandela foco duplo em alumínio esovado, cor branco, ref.40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena refletora E-27 60w/127v	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.18.6.12	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	25,09	R\$	326,17	R\$	-	R\$	-	R\$	326,17	0,00
1.18.6.13	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	38,20	R\$	2.330,20	R\$	-	R\$	-	R\$	2.330,20	0,00
1.18.6.14	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	46,39	R\$	92,78	R\$	-	R\$	-	R\$	92,78	0,00
1.18.6.15	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	47,53	R\$	617,89	R\$	-	R\$	-	R\$	617,89	0,00
1.18.6.16	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	55,80	R\$	111,60	R\$	-	R\$	-	R\$	111,60	0,00
1.18.6.17	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	51,41	R\$	51,41	R\$	-	R\$	-	R\$	51,41	0,00
1.18.6.18	Luminária Linear de Sobrepot LED Slim 36w Branco Frio Bivolt, fornecimento e instalação	un	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	82,72	R\$	15.634,08	R\$	-	R\$	-	R\$	15.634,08	0,00
1.18.6.19	Luminária Linear de Sobrepot LED Slim 18w Branco Frio Bivolt, fornecimento e instalação	un	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	46,69	R\$	513,59	R\$	-	R\$	-	R\$	513,59	0,00
1.18.6.20	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	203,14	R\$	2.843,96	R\$	-	R\$	-	R\$	2.843,96	0,00
1.18.6.21	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	83,56	R\$	752,04	R\$	-	R\$	-	R\$	752,04	0,00
1.18.7	PADRAO DE ENTRADA								R\$	52.827,61	R\$	-	R\$	-	R\$	52.827,61	
1.18.7.1	Transformador de distribuição, 75 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af 12/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14090,22	R\$	14.090,22	R\$	-	R\$	-	R\$	14.090,22	0,00
1.18.7.2	Suporte para transformador em poste de concreto duplo 1 - fornecimento e instalação. af 12/2020	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	234,23	R\$	468,46	R\$	-	R\$	-	R\$	468,46	0,00
1.18.7.3	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1266,14	R\$	1.266,14	R\$	-	R\$	-	R\$	1.266,14	0,00
1.18.7.4	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1073,83	R\$	1.073,83	R\$	-	R\$	-	R\$	1.073,83	0,00
1.18.7.5	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	351,93	R\$	351,93	R\$	-	R\$	-	R\$	351,93	0,00
1.18.7.6	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio 2mm	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1014,03	R\$	1.014,03	R\$	-	R\$	-	R\$	1.014,03	0,00
1.18.7.7	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	730,55	R\$	1.461,11	R\$	-	R\$	-	R\$	1.461,11	0,00
1.18.7.8	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev.01	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	92,23	R\$	184,46	R\$	-	R\$	-	R\$	184,46	0,00
1.18.7.9	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	29,48	R\$	117,92	R\$	-	R\$	-	R\$	117,92	0,00
1.18.7.10	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	261,40	R\$	261,40	R\$	-	R\$	-	R\$	261,40	0,00
1.18.7.11	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	475,66	R\$	76,10	R\$	-	R\$	-	R\$	76,10	0,00
1.18.7.12	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	27,29	R\$	81,87	R\$	-	R\$	-	R\$	81,87	0,00

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patricia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO					BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01				CONTRATO Nº: 063/2022							
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP			B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023									Data da medição: 14/08/2023							
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido						
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir					
1.18.7.13	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	511,11	R\$	511,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	511,11	0,00
1.18.7.14	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 95mm², 1kv / 90° C	m	179,34	0,00	0,00	0,00	179,34	146,13	R\$	26.206,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	26.206,95	0,00
1.18.7.15	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90° C	m	59,78	0,00	0,00	0,00	59,78	75,30	R\$	4.501,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.501,43	0,00
1.18.7.16	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	148,77	R\$	297,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	297,54	0,00
1.18.7.17	Fornecimento e instalação de isolador de pino de vidro multi-corpo p/ 15 kv	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	73,35	R\$	220,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	220,05	0,00
1.18.7.18	Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	175,89	R\$	527,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	527,67	0,00
1.18.7.19	Fornecimento de conector curvado p/c 6 e/ 2 awg al	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	24,34	R\$	24,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24,34	0,00
1.18.7.20	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,32	R\$	45,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45,96	0,00
1.18.7.21	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,03	R\$	45,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45,09	0,00
1.18.8	QDGB								R\$	592,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	592,98	
1.18.8.1	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	27,29	R\$	81,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	81,87	0,00
1.18.8.2	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	511,11	R\$	511,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	511,11	0,00
1.18.9	QD1								R\$	7.806,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.806,83	
1.18.9.1	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	m	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	40,03	R\$	6.685,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.685,01	0,00
1.18.9.2	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	41,75	0,00	0,00	0,00	41,75	26,87	R\$	1.121,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.121,82	0,00
1.18.10	QD2								R\$	4.836,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.836,60	
1.18.10.1	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	26,87	R\$	4.836,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.836,60	0,00
1.18.11	QD3								R\$	2.337,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.337,37	
1.18.11.1	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	m	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	40,03	R\$	2.001,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.001,50	0,00
1.18.11.2	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	26,87	R\$	335,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	335,87	0,00
1.18.12	QD4								R\$	926,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	926,90	
1.18.12.1	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	20,15	R\$	926,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	926,90	0,00
1.18.13	QD5								R\$	1.629,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.629,80	
1.18.13.1	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	11,24	R\$	1.629,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.629,80	0,00
1.18.14	QD6								R\$	2.517,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.517,14	
1.18.14.1	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	11,24	R\$	2.349,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.349,16	0,00
1.18.14.2	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	27,29	R\$	27,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	27,29	0,00
1.18.14.3	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	140,69	R\$	140,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	140,69	0,00
1.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO								R\$	2.726,63	R\$	1.988,69	R\$	-	R\$	1.988,69	R\$	737,94	
1.19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	95,00	44,51	0,00	44,51	50,49	14,00	R\$	1.330,00	R\$	623,14	R\$	-	R\$	623,14	R\$	706,86	46,85
1.19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	5,84	R\$	105,12	R\$	105,12	R\$	-	R\$	105,12	R\$	-	100,00
1.19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	22,00	16,00	0,00	16,00	6,00	5,18	R\$	113,96	R\$	82,88	R\$	-	R\$	82,88	R\$	31,08	72,73
1.19.4	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	un	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	235,51	R\$	1.177,55	R\$	1.177,55	R\$	-	R\$	1.177,55	R\$	-	100,00
1.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA								R\$	27.202,32	R\$	1.561,20	R\$	-	R\$	1.561,20	R\$	25.641,12	
1.20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS								R\$	6.082,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.082,10	
1.20.1.1	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat 6 - Rev 01	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	456,77	R\$	1.370,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.370,31	0,00
1.20.1.2	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.958,75	R\$	3.958,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.958,75	0,00
1.20.1.3	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar	m	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	62,91	R\$	125,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	125,82	0,00
1.20.1.4	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar	m	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	62,91	R\$	62,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	62,91	0,00
1.20.1.5	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar	m	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	62,91	R\$	125,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	125,82	0,00
1.20.1.5	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar	m	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	62,91	R\$	62,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	62,91	0,00
1.20.1.6	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	187,79	R\$	375,58	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	375,58	0,00
1.20.2	CABOS EM PAR TRANCADOS								R\$	8.597,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.597,68	
1.20.2.1	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	12,67	R\$	7.335,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.335,93	0,00
1.20.2.2	Cabo coaxial	m	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	6,31	R\$	713,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	713,03	0,00

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patricia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaísia Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01				CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023											Data da medição: 14/08/2023		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE															
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)				% Medido		
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir	
1.20.2.3	Cabo de conexões - patch cord categoria 6 - 2.5m	un	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	28,88	R\$ 548,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,72	0,00	
1.20.3	TOMADAS								R\$ 946,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 946,07		
1.20.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	44,95	R\$ 854,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 854,05	0,00	
1.20.3.2	Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm (apenas modulo)	un	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10,84	R\$ 86,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,72	0,00	
1.20.3.3	Conector emenda para cabo coaxial	un	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,53	R\$ 5,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,30	0,00	
1.20.4	CAIXA E ACESSÓRIOS								R\$ 1.671,37	R\$ 326,38	R\$ -	R\$ 326,38	R\$ 1.344,99		
1.20.4.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	1,00	0,00	1,00	3,00	326,38	R\$ 1.305,52	R\$ 326,38	R\$ -	R\$ 326,38	R\$ 979,14	25,00	
1.20.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	13,55	R\$ 365,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365,85	0,00	
1.20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								R\$ 9.905,10	R\$ 1.234,82	R\$ -	R\$ 1.234,82	R\$ 8.670,28		
1.20.5.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	9,87	R\$ 150,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,02	0,00	
1.20.5.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	112,05	0,00	0,00	0,00	112,05	8,90	R\$ 997,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 997,24	0,00	
1.20.5.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	17,69	R\$ 84,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,91	0,00	
1.20.5.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	55,20	55,20	0,00	55,20	0,00	22,37	R\$ 1.234,82	R\$ 1.234,82	R\$ -	R\$ 1.234,82	R\$ -	100,00	
1.20.5.5	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 mm (ref. mora ou similar)	un	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	144,01	R\$ 7.438,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.438,11	0,00	
1.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA								R\$ 6.585,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.585,72		
1.21.1	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg. = 1700 x Prof. = 1300 x alt. = 450mm	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.602,90	R\$ 4.602,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.602,90	0,00	
1.21.2	Exaustor ACI-200, da dietell ou similar - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.982,82	R\$ 1.982,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.982,82	0,00	
1.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								R\$ 43.648,78	R\$ 2.537,34	R\$ -	R\$ 2.537,34	R\$ 41.111,44		
1.22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	107,93	R\$ 107,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,93	0,00	
1.22.2	Aço ca-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhão	kg	67,01	67,01	0,00	67,01	0,00	13,25	R\$ 887,88	R\$ 887,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 887,88	100,00	
1.22.3	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	un	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	28,17	R\$ 309,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,87	0,00	
1.22.4	Abraçadeira guia reforçado 1 descida para mastro 2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-350	un	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,06	R\$ 64,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,24	0,00	
1.22.5	Clips 5/8", p/haste de aterramento galvanizada, ref.TEL-5238	un	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	8,69	R\$ 286,77	R\$ 286,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 286,77	100,00	
1.22.6	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrep p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	344,99	R\$ 344,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344,99	0,00	
1.22.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	26,18	0,00	0,00	0,00	26,18	81,90	R\$ 2.144,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.144,14	0,00	
1.22.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	26,18	0,00	0,00	0,00	26,18	30,47	R\$ 797,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 797,70	0,00	
1.22.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	108,04	R\$ 1.188,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.188,44	0,00	
1.22.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	34,86	R\$ 906,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 906,36	0,00	
1.22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	261,00	21,00	0,00	21,00	240,00	64,89	R\$ 16.936,29	R\$ 1.362,69	R\$ -	R\$ 1.362,69	R\$ 15.573,60	8,05	
1.22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50	85,04	R\$ 14.839,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.839,48	0,00	

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patrícia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01				CONTRATO Nº: 063/2022	
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP									B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023				Data da medição: 14/08/2023	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE														
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)				% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
1.22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	53,27	R\$ 585,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,97	0,00
1.22.14	Conector de pressão para cabo nu de 35mm ² - fornecimento e instalação	un	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	14,92	R\$ 3.744,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.744,92	0,00
1.22.15	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica	un	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,90	R\$ 503,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,80	0,00
1.23	SERVÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 137.752,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.752,81	
1.23.1	GERAIS								R\$ 75.350,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.350,28	
1.23.1.1	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.442,86	R\$ 3.442,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.442,86	0,00
1.23.1.2	Tampo/bancada em granito branco siena, esp=2cm	m ²	42,96	0,00	0,00	0,00	42,96	489,76	R\$ 21.040,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.040,08	0,00
1.23.1.3	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m ²	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89	510,78	R\$ 13.734,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.734,87	0,00
1.23.1.4	Prateleira em compensado, revestida com laminado	m ²	30,15	0,00	0,00	0,00	30,15	487,73	R\$ 14.705,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.705,05	0,00
1.23.1.5	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	208,54	R\$ 6.464,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.464,74	0,00
1.23.1.6	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	79,65	0,00	0,00	0,00	79,65	101,14	R\$ 8.055,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.055,80	0,00
1.23.1.7	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	41,41	R\$ 6.128,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.128,68	0,00
1.23.1.8	Fita antiderrapante safety-walk "3m" - h=5cm ou similar	m	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,99	R\$ 32,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,97	0,00
1.23.1.9	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")	m	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	423,60	R\$ 1.745,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.745,23	0,00
1.23.2	CAIXA D'ÁGUA 15.000L								R\$ 62.402,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.402,53	
1.23.2.1	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamicida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado	un	0,00		0,00	0,00	0,00	20.516,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.23.2.2	Escada Marinheiro em aço CA-50 d=16mm (5/8"), exceto pintura - Rev 01	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.23.2.3	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1", inclusive curva de aço carbono	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.23.2.4	Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, com granalha	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.23.2.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.23.2.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.23.2.7	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.23.2.8	Reveratório metálico em chapa de aço, cap. 15.000l	un	1,00	0,00		0,00	1,00	62.402,53	R\$ 62.402,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.402,53	0,00
1.24	IMPLANTACAO								R\$ 203.553,80	R\$ 64.875,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.875,04	R\$ 138.678,76
1.24.1	SERVÇOS PRELIMINARES								R\$ 12.113,66	R\$ 12.113,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.113,66	R\$ -
1.24.1.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1km	m ²	501,75	501,75	0,00	501,75	0,00	2,19	R\$ 1.098,83	R\$ 1.098,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.098,83	100,00
1.24.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator de esteira com lâmina, dnt até 50m	m ³	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	1,58	R\$ 60,04	R\$ 60,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,04	100,00
1.24.1.3	Tapume em chapa galvanizada r30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusiva pintura	m	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	267,19	R\$ 10.954,79	R\$ 10.954,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.954,79	100,00
1.24.2	MURO								R\$ 116.184,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.184,96	
1.24.2.1	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saço cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m ³	34,46	0,00	0,00	0,00	34,46	494,32	R\$ 17.034,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.034,26	0,00
1.24.2.2	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedacit	m ²	77,35	0,00	0,00	0,00	77,35	38,37	R\$ 2.967,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.967,91	0,00
1.24.2.3	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	216,60	0,00	0,00	0,00	216,60	1,27	R\$ 275,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,08	0,00


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Patricia Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2		BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01				CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023											Data da medição: 14/08/2023		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE															
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
1.24.2.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	50,87	0,00	0,00	0,00	50,87	55,22	R\$ 2.809,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.809,04	0,00	
1.24.2.5	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	337,15	0,00	0,00	0,00	337,15	217,75	R\$ 73.414,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.414,41	0,00	
1.24.2.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	630,30	0,00	0,00	0,00	630,30	2,64	R\$ 1.663,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.663,99	0,00	
1.24.2.7	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	630,30	0,00	0,00	0,00	630,30	15,10	R\$ 9.517,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.517,53	0,00	
1.24.2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	630,30	0,00	0,00	0,00	630,30	13,49	R\$ 8.502,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.502,74	0,00	
1.24.3 DEMOLIÇÃO									R\$ 52.761,39	R\$ 52.761,39	R\$ -	R\$ 52.761,39	R\$ -		
1.24.3.1	Demolição de concreto com martete e compressor	m³	103,86	103,86	0,00	103,86	0,00	481,43	R\$ 50.001,31	R\$ 50.001,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.001,31	100,00	
1.24.3.2	Coleta e carga manuais de entulho	m³	103,86	103,86	0,00	103,86	0,00	18,40	R\$ 1.911,02	R\$ 1.911,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.911,02	100,00	
1.24.3.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade= 1,5t/m³	tkm	778,95	778,95	0,00	778,95	0,00	1,09	R\$ 849,05	R\$ 849,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 849,05	100,00	
1.24.4 PAVIMENTAÇÃO									R\$ 22.493,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.493,79		
1.24.4.1	Lastro de brita 2	m³	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70	170,79	R\$ 8.488,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.488,26	0,00	
1.24.4.2	Colchão de areia	m³	12,71	0,00	0,00	0,00	12,71	155,05	R\$ 1.970,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.970,68	0,00	
1.24.4.3	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	105,88	0,00	0,00	0,00	105,88	48,14	R\$ 5.097,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.097,06	0,00	
1.24.4.4	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	105,88	0,00	0,00	0,00	105,88	39,82	R\$ 4.216,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.216,14	0,00	
1.24.4.5	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	70,59	0,00	0,00	0,00	70,59	27,69	R\$ 1.954,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.954,63	0,00	
1.24.4.6	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	383,51	R\$ 767,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 767,02	0,00	
1.25 SERVIÇOS FINAIS									R\$ 3.879,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.879,96		
1.25.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	m²	891,68	0,00	0,00	0,00	891,68	2,00	R\$ 1.783,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783,36	0,00	
1.25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.096,60	R\$ 2.096,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.096,60	0,00	
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 117.897,50	R\$ 40.587,75	R\$ 12.968,73	R\$ 53.556,48	R\$ 64.341,02		
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	650,00	223,77	71,50	295,27	354,73	129,40	R\$ 84.110,00	R\$ 28.955,84	R\$ 9.252,10	R\$ 38.207,94	R\$ 45.902,06	45,43	
2.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00	258,20	82,50	340,70	409,30	45,05	R\$ 33.787,50	R\$ 11.631,91	R\$ 3.716,63	R\$ 15.348,54	R\$ 18.438,96	45,43	
TOTAL									R\$ 3.020.270,43	R\$ 1.081.930,79	R\$ 344.551,67	R\$ 1.426.482,46	R\$ 1.593.787,97	47,23%	
PORCENTAGEM									100,00%	35,82%	11,41%	47,23%	52,77%	47,23%	
JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP Patricia Dutra de Melo Chagas CPF:00250632519 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.						APROVADO PARA PAGAMENTO						
DATA:			DATA:						DATA:						

Patricia Dutra de Melo Chagas
 Engº Civil
 CREA/SE Nº 27099245-5



 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiara


 Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiara


Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023	Data da medição: 14/08/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1	Edificação principal do Pro infância 2				0,00
1.4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				0,00
1.4.3.1	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	239,88	$[(0,80m + 0,20m + 0,20m) \times 4und] + [(0,9m + 0,20m + 0,20m) \times 4und] + [(1,0m + 0,20m + 0,20m) \times 8und] + [(2,0m + 0,20m + 0,20m) \times 4und] + [(1,8m + 0,20 + 0,20m) \times 4und] + [(1,46m + 0,20 + 0,20m) \times 6und]$	51,77
1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				0,00
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				0,00
1.5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,38	1,6m²+1,3m²+1,27m²+6,21m²	10,38
1.5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	564,11	5,6m²+1,3m²+2,4m²+5,08m²+5,52m²	19,90
1.5.2.4	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	9,72	2,8m²+3,4m²+3,52m²	9,72
1.7	SISTEMA DE COBERTURA				0,00
1.7.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	881,21	Conforme Projeto	308,42
1.7.2	Telhamento com telha em aço galvanume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan - Isoeste ou simila	m²	850,66	Conforme Projeto	675,15
1.7.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	233,60	(18m + 15m + 9,0m + 20m+25m+15m)	102,00
1.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				0,00
1.9.1	EDIFICAÇÃO				0,00
1.9.1.1	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	1.589,78	(26,5+5,24)m	31,74
1.9.1.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	979,82	(31,9+33,3+43+47,3+24,5+26,6+37,6+24,1+34,6+20,1+25+18+13,9+13,7+25,6+10,8)m	430,00
1.9.1.3	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	1.024,77	(85,4+25,6+5,6+1,3+2,4+5,08+1,6+1,3+1,27+6,21+2,8+3,4+3,52+31,6+43+28,5+28,88)m	277,46



Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana





Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana




Luiza Dutra de Melo Chagas
Engª Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023	Data da medição: 14/08/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.9.1.12	Arestamento de vãos	m	953,03	(7,4+2,7+3,1+4,4+6,7+55,84+50,94264+10,2+18,8+8,6+4,34+4,04+11,4+11,48+7,2+15,62+1,42+9,3+1,42+9,3+0,42+9,88+12+12+12+12+26,4+19,72+19,72+18,8+39,44+19,72+26,4+12,4+9,6+4+1,4+14,4+14,4+10,46+16,44+9,2+33+98,67+39,76+35,92+52,77)	835,12
1.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				0,00
1.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				0,00
1.13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	258,41	(10,2+5,3+8,4+6,3)	30,20
1.13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	35,00	22 um	22,00
1.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				0,00
1.14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	119,56	7,79	7,79
1.14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	198,23	(13,3+8,3+4,9+5,6+11+6,01+7,50)	56,61
Inserido	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	M	80,45	(14+5,8+7,6+4,3+8,1+6,1+6,15+2,2)	54,25


Tháisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Patrícia Dutra de Melo Chagas
 Engª Civil
 CREA/SE nº 270093245-5

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2	MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	B.M.Nº: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023	Data da medição: 14/08/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	78,00	28	28,00
1.18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				0,00
1.18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	113,27	(8,59+2,43+3,55+0,7+15,12+2,21+0,53+2,95+3,51+13,53+1,06+6,36+5,17+5,08+1,56+2,86+7,73+2,03+2,03+5,65+4,19+1,5+2,5+12,43)	113,27
1.18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	269,85	(11,76+7,88+6,23+4,85+35,14+3,39+3,32+13,84+3,25+8,43+9,18+2,66+5,49+2,02+2,7+10,33+11,61+26,567+26,14+10,46+12,07+7,6+11,61+5,28+5,33+6,08+3,68+4,6+8,35)	269,85
1.18.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	187,50	(12,75+10,77+20,9+2,13+1,79+0,75+1,92+5,81+16,38+1,49+5,32+1,39+0,5+5,11+6,51+14+10,35+12,61+10,04+12,89+12,32+3,59+5,6+8,7+3,88)	187,50
1.18.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	37,08	(12,75+10,77+20,9+2,13+1,79+0,75+1,92+5,81+16,38+1,49+5,32+1,39+0,5+5,11+6,51+14+10,35+12,61+10,04+12,89+12,32+3,59+5,6+8,7+3,88)	13,70
1.18.3.10	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	161,00	Conforme projeto	76,00



Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Patricia Dutra de Melo Chagas
 Engª Civil
 CREA/SE nº 270093245-5

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO N°: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP				B.M.N°: 06 - Período contrato: 01/07/2023 até 14/08/2023
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				0,00
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	650,00	(650,00 x 11,00%)	71,50
2.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00	(750,00 x 11,00%)	82,50
<p style="text-align: center;">JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP Patrícia Dutra de Melo Chagas CPF:00250632519</p> <p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA</p>		<p>ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:</p>		<p style="text-align: center;">APROVADO PARA PAGAMENTO</p> <p>DATA:</p>	


Tháisa Lima Santos
 Eng° Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Elaine da Cunha Menezes
 Eng° Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Patrícia Dutra de Melo Chagas
 Eng° Civil
 CREA/SE N° 270093245-5



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 06

Itabaiana, 14 de Agosto de 2023


Ref.:


Contrato PME nº 063/2022


Objeto: Execução da obra de construção de Creche Pró-Infância tipo II na Rua Florêncio dos Santos, s/nº, Bairro Queimadas, Itabaiana/SE

A JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 05.108.674/0001-28; vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 01/07/2023 até 14/08/2023**, conforme **Boletim de Medição nº 06**.




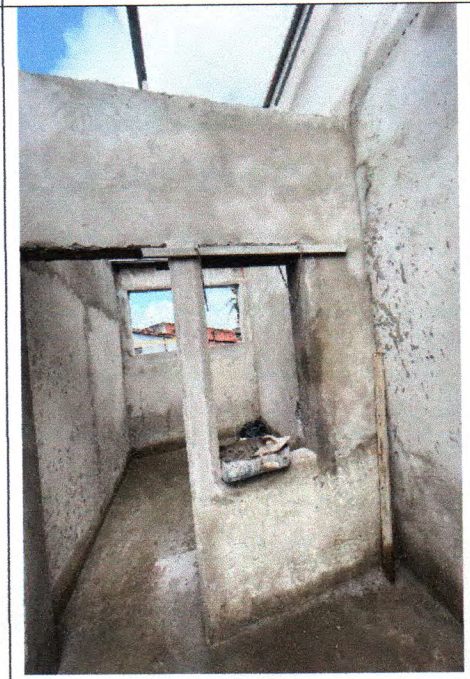
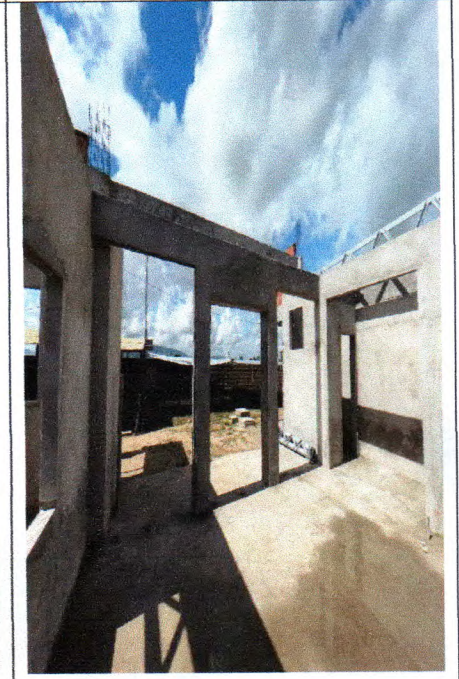

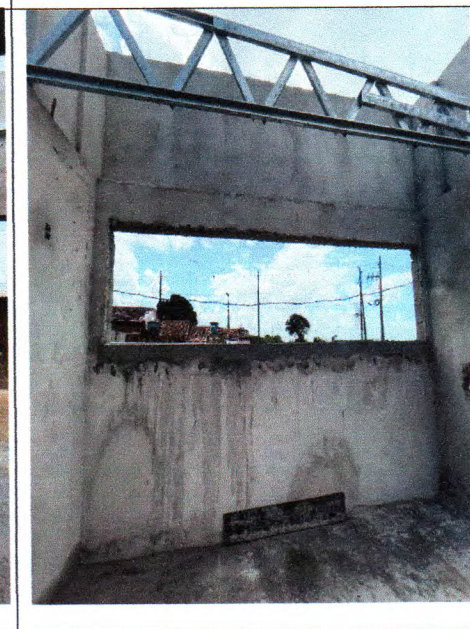


Elaine da Cunha Menezes
Engº Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Tháisa Lima Santos
Engº Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jiricia Dutra de Melo Chagas
Engº Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Avenida Gonçalo Prado Rollemberg, 43 – Bairro São José/ CEP: 49015-230 Tel: (79) 3086-1983

CNPJ: 05.108.674/0001-28, E-mail: administrativo@jpcconstrucoes.com.br

<p><i>Figura 01: Alvenaria de Vedação</i></p>	<p><i>Figura 02: Emboço, para recebimento de cerâmica</i></p>	<p><i>Figura 03: Reboco ou emboço externo e interno, de parede</i></p>
		
<p><i>Figura 04: Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto</i></p>	<p><i>Figura 05: Cintas e Vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm</i></p>	<p><i>Figura 06: Estrutura Metálica p/Cobertura c/ Vigas - Treliça</i></p>
		

Avenida Gonçalo Prado Rollemberg, 43 – Bairro São José/ CEP: 49015-230 Tel: (79) 21086-1988 Itabaiana

CNPJ: 05.108.674/0001-28, E-mail: administrativo@jpcconstrucoes.com.br

Patricia Dura de Melo
Eng^o Civil
CREA/SE nº 270083245-5



Tháisa Lima Santos
Eng^o Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha
Elaine da Cunha
Eng^o Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Figura 07: Arestamento de vãos



Figura 08: Chapim em concreto pré moldado



Figura 09: Telhamento com telha em aço galvanizado, dupla trapezoidal



Figura 10: Tubulação e conexões - Esgoto predial



Figura 11: Eletroduto Flexível corrugado, PVC, para circuitos terminais



Figura 12: Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 80 cm, incluso transporte vertical.



Avenida Gonçalo Prado Rollemberg, 43 – Bairro São José/ CEP: 49015-230 Tel: (79) 2086-1000

Thaísa Lima Santos
Eng^o Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CNPJ: 05.108.674/0001-28, E-mail: administrativo@jpcconstrucoes.com.br

Elaine da Cunha Menezes
Eng^o Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Patrícia Dutra de Melo Chagas
Eng^o Civil
CREA/SE nº 270083245-5

Figura 13: Tubulação e conexões de Pvc – Drenagem de águas Pluviais



Figura 14: Telhamento com telha em aço galvanizado, dupla trapezoidal, na etapa C



Figura 15: Telhamento com telha em aço galvanizado, dupla trapezoidal, nas etapas A e C



Figura 16: Telhamento com telha em aço galvanizado, dupla trapezoidal, na etapa B

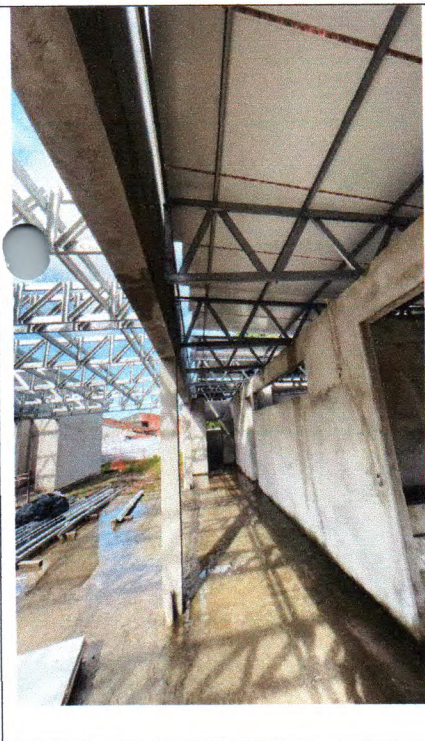


Figura 17: Telhamento com telha em aço galvanizado, dupla trapezoidal, na etapa B




Figura 18: Telhamento com telha em aço galvanizado nas etapas A e C




Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Avenida Gonçalo Prado Rollemberg, 43 – Bairro São José/ CEP: 49015-230 Tel: (79) 3086-1083

CNPJ: 05.108.674/0001-25 E-mail: administrativo@jpcconstrucoes.com.br


Elaine da Cunha
Eng^a Civil - CREA 14610492
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Patrícia Dutra de Melo Chagas
Eng^a Civil
CREA/SE nº 270093245-5

Figura 19: Telhamento com telha em aço galvalume, dupla trapezoidal, na etapa B



Pat

JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

Patricia Dutra de Melo Chagas

Engenheira Civil

CREA: 270093245-5

Patricia Dutra de Melo Chagas
Eng.º Civil
CREA Nº 270093245-5

Thaísa Lima Santos
Eng.º Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Eng.º Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Avenida Gonçalo Prado Rollemberg, 43 – Bairro São José/ CEP: 49015-230 Tel: (79) 3086-1983

CNPJ. 05.108.674/0001-28, E-mail: administrativo@jpcconstrucoes.com.br

Patricia Dutra de Melo Chagas
Eng.º Civil
CREA Nº 270093245-5
