

		OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP						DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 07			CONTRATO: Nº 258/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA		25/08/2026	Período: 01/05/2026 a 31/05/2026		RECURSO:			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO		25/08/2026	Data da Medição: 16/07/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medido		
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
1	Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)									877.486,76	646.492,41	56.412,52	702.904,93	174.581,83	80%	
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									31.250,40	22.812,79	1.875,02	24.687,81	6.562,59	78,99	
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE									31.250,40	22.812,79	1.875,02	24.687,81	6.562,59	78,99	
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00	87,60	7,20	94,80	25,20	145,00		17.400,00	12.702,00	1.044,00	13.746,00	3.654,00	79,00	
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00	175,20	14,40	189,60	50,40	57,71		13.850,40	10.110,79	831,02	10.941,81	2.908,59	78,99	
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES									29.673,42	27.801,21	722,57	28.323,78	1.349,64	95,45	
01.02.001	PLACA DE OBRA									1.553,09	1.553,09	-	1.553,09	-	100,00	
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	4,50	4,50		4,50	-	345,13		1.553,09	1.553,09	-	1.553,09	-	-	
01.02.002	CANTEIRO DE OBRAS									23.091,14	21.018,93	722,57	21.741,50	1.349,64	94,15	
01.02.002.001	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisoria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	1,00	-		-	1,00	627,07		627,07	-	-	-	627,07	-	
01.02.002.002	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	-	1.824,78		1.824,78	1.824,78	-	1.824,78	-	100,00	
01.02.002.003	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	8,00	6,00	1,00	7,00	1,00	722,57		5.780,56	4.335,42	722,57	5.057,99	722,57	87,50	
01.02.002.004	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	2.788,76	2.788,76		2.788,76	-	1,70		4.740,89	4.740,89	-	4.740,89	-	100,00	
01.02.002.005	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	66,67	66,67		66,67	-	151,76		10.117,84	10.117,84	-	10.117,84	-	100,00	
01.02.003	LOCAÇÃO									5.029,19	5.029,19	-	5.029,19	-	100,00	
01.02.003.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	752,64	752,64		752,64	-	5,63		4.237,36	4.237,36	-	4.237,36	-	100,00	
01.02.003.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.115,25	1.115,25		1.115,25	-	0,71		791,83	791,83	-	791,83	-	100,00	
01.03	GALPÃO PRÉ MOLDADO									325.081,76	325.081,76	-	325.081,76	-	100,00	
01.03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									227,28	227,28	-	227,28	-	100,00	
01.03.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria ate 1,50m de profundidade	m3	12,00	12,00		12,00	-	12,49		149,88	149,88	-	149,88	-	100,00	
01.03.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00	18,00		18,00	-	1,21		21,78	21,78	-	21,78	-	100,00	
01.03.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00	54,00		54,00	-	1,03		55,62	55,62	-	55,62	-	100,00	
01.03.002	ESTRUTURAS									225.528,58	225.528,58	-	225.528,58	-	100,00	
01.03.002.001	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC, sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atrantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1	m2	752,64	752,64		752,64	-	299,65		225.528,58	225.528,58	-	225.528,58	-	100,00	
01.03.003	COBERTURA									99.325,90	99.325,90	-	99.325,90	-	100,00	
01.03.003.001	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar - Rev 02 10/2022	m2	752,64	752,64		752,64	-	131,97		99.325,90	99.325,90	-	99.325,90	-	100,00	
01.04	QUADRA POLIESPORTIVA									76.503,07	74.229,81	-	74.229,81	2.333,26	96,95	
01.04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									9.062,19	9.062,19	-	9.062,19	-	100,00	
01.04.001.001	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	125,98	125,98		125,98	-	16,17		2.037,10	2.037,10	-	2.037,10	-	100,00	
01.04.001.002	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	125,98	125,98		125,98	-	18,22		2.295,36	2.295,36	-	2.295,36	-	100,00	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP		DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 07			CONTRATO: Nº 258/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		25/08/2026		Período: 01/05/2026 a 31/05/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		25/08/2026		Data da Medição: 16/07/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.04.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.591,97	4.591,97		4.591,97	-	1,03	4.729,73	4.729,73	-	4.729,73	-	100,00
01.04.002	PISO QUADRA								65.167,62	65.167,62	-	65.167,62	-	100,00
01.04.002.001	Lona plástica preta	m2	503,93	503,93		503,93	-	5,44	2.741,38	2.741,38	-	2.741,38	-	100,00
01.04.002.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61 malha 15x15cm, ferro 3,4mm (0,97 kg/m2), painel 2,45x8,0m, Telcon ou similar	m2	503,93	503,93		503,93	-	16,55	8.340,04	8.340,04	-	8.340,04	-	100,00
01.04.002.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	503,93	503,93		503,93	-	33,32	16.790,95	16.790,95	-	16.790,95	-	100,00
01.04.002.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	503,93	503,93		503,93	-	36,45	18.368,25	18.368,25	-	18.368,25	-	100,00
01.04.002.005	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	503,93	503,93		503,93	-	32,21	16.231,59	16.231,59	-	16.231,59	-	100,00
01.04.002.006	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2.0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	55,37	55,37		55,37	-	48,66	2.695,41	2.695,41	-	2.695,41	-	100,00
01.04.003	PINTURA DE DEMARCAÇÃO								2.333,26		-		2.333,26	-
01.04.003.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual, af. 05/2021	m	282,82	-		-	282,82	8,25	2.333,26	-	-	-	2.333,26	-
01.05	ALAMBRADO E MURETA								120.517,62	73.210,10	5.717,56	78.927,66	41.589,96	65,49
01.05.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								819,93	819,93	-		-	100,00
01.05.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,52	11,52		11,52	-	55,70	641,66	641,66	-	641,66	-	100,00
01.05.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	13,82	13,82		13,82	-	9,81	135,57	135,57	-	135,57	-	100,00
01.05.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	41,46	41,46		41,46	-	1,03	42,70	42,70	-	42,70	-	100,00
01.05.002	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)								5.308,76	5.308,76	-	5.308,76	-	100,00
01.05.002.001	Alvenaria pedra calcêrea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1-5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	11,52	11,52		11,52	-	460,83	5.308,76	5.308,76	-	5.308,76	-	100,00
01.05.003	ALVENARIA								2.607,27	2.607,27	-	2.607,27	-	100,00
01.05.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	56,52	56,52		56,52	-	46,13	2.607,27	2.607,27	-	2.607,27	-	100,00
01.05.004	REVESTIMENTO DE PAREDES								4.916,39	4.916,39	-	4.916,39	-	100,00
01.05.004.001	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af. 10/2022	m2	127,17	127,17		127,17	-	4,38	557,00	557,00	-	557,00	-	100,00
01.05.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	127,17	127,17		127,17	-	34,28	4.359,39	4.359,39	-	4.359,39	-	100,00
01.05.005	ALAMBRADO								98.590,27	59.557,75	-	59.557,75	39.032,52	60,40
01.05.005.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,97	1,97		1,97	-	491,46	968,18	968,18	-	968,18	-	100,00
01.05.005.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	337,92	202,80		202,80	135,12	280,54	94.800,08	56.893,51	-	56.893,51	37.906,57	60,01
01.05.005.003	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	3,96	2,38		2,38	1,58	712,63	2.822,01	1.696,06	-	1.696,06	1.125,95	60,10
01.05.006	PINTURA								5.717,56	-	5.717,56	5.717,56	-	100,00
01.05.006.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022.	m2	127,17	-	127,17	127,17	-	44,96	5.717,56	-	5.717,56	5.717,56	-	100,00
01.05.007	DIVERSOS								2.557,44	-	-	-	2.557,44	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 07			CONTRATO: Nº 258/2025							
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		25/08/2026		Período: 01/05/2026 a 31/05/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		25/08/2026		Data da Medição: 16/07/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.05.007.001	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	144,00	-		-	144,00	17,76	2.557,44	-	-	-	2.557,44	-
01.06	ARQUIBANCADA								20.543,89	13.607,35	5.783,59	19.390,94	1.152,95	94,38
01.06.001	MOVIMENTO DE TERRA								3.297,13	3.297,13	-	3.297,13	-	100,00
01.06.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,12	6,12		6,12	-	55,70	340,88	340,88	-	340,88	-	100,00
01.06.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	7,34	7,34		7,34	-	9,81	72,01	72,01	-	72,01	-	100,00
01.06.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade= 1,5t/m³	tkm	22,02	22,02		22,02	-	1,03	22,68	22,68	-	22,68	-	100,00
01.06.001.004	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	17,23	17,23		17,23	-	156,03	2.688,40	2.688,40	-	2.688,40	-	100,00
01.06.001.005	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	17,23	17,23		17,23	-	10,05	173,16	173,16	-	173,16	-	100,00
01.06.002	ESTRUTURA								4.096,13	4.096,13	-	4.096,13	-	100,00
01.06.002.001	Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	6,12	6,12		6,12	-	460,83	2.820,28	2.820,28	-	2.820,28	-	100,00
01.06.002.002	Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em tábua (05 usos)	m3	0,56	0,56		0,56	-	2.278,31	1.275,85	1.275,85	-	1.275,85	-	100,00
01.06.003	ALVENARIA								3.049,39	2.443,86	-	2.443,86	605,53	80,14
01.06.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	64,51	51,70		51,70	12,81	47,27	3.049,39	2.443,86	-	2.443,86	605,53	80,14
01.06.004	REVESTIMENTO DE PAREDES								2.739,45	2.192,03	-	2.192,03	547,42	80,01
01.06.004.001	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af 10/2022	m2	70,86	56,70		56,70	14,16	4,38	310,37	248,35	-	248,35	62,02	80,01
01.06.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	70,86	56,70		56,70	14,16	34,28	2.429,08	1.943,68	-	1.943,68	485,40	80,01
01.06.005	PAVIMENTAÇÃO								1.578,20	1.578,20	-	1.578,20	-	100,00
01.06.005.001	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	35,04	35,04		35,04	-	45,04	1.578,20	1.578,20	-	1.578,20	-	100,00
01.06.006	PINTURA								2.990,29	-	2.990,29	2.990,29	-	100,00
01.06.006.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	70,86	-	70,86	70,86	-	42,20	2.990,29	-	2.990,29	2.990,29	-	100,00
01.06.007	DIVERSOS								2.793,30	-	2.793,30	2.793,30	-	100,00
01.06.007.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,00	-	15,00	15,00	-	186,22	2.793,30	-	2.793,30	2.793,30	-	100,00
01.07	ÁREA EXTERNA								69.791,64	29.802,02	20.176,55	49.978,57	19.813,07	71,61
01.07.001	MEIO-FIO								13.341,97	9.922,16	1.163,58	11.085,74	2.256,23	83,08
01.07.001.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af 01/2024	m	330,82	281,40	33,00	314,40	16,42	35,26	11.664,71	9.922,16	1.163,58	11.085,74	578,97	95,03
01.07.001.002	Pintura de meio fio (caliação)	m	330,82	-	-	-	330,82	5,07	1.677,26	-	-	-	1.677,26	-

		OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP						DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 07			CONTRATO: Nº 258/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA		25/08/2026	Período: 01/05/2026 a 31/05/2026		RECURSO:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO		25/08/2026	Data da Medição: 16/07/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
01.07.002	PAVIMENTAÇÃO								37.029,63	19.879,86	13.075,56	32.955,42	4.074,21	88,99	
01.07.002.001	Lona plastica preta	m2	479,83	239,92	167,95	407,87	71,96	5,44	2.610,28	1.305,16	913,64	2.218,80	391,48	85,00	
01.07.002.002	Colchão de areia	m3	23,99	19,20	1,20	20,40	3,59	116,08	2.784,76	2.228,74	139,29	2.368,03	416,73	85,03	
01.07.002.003	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	23,99	19,20	1,20	20,40	3,59	10,05	241,10	192,96	12,06	205,02	36,08	85,03	
01.07.002.004	Lastro de brita 1	m3	5,88	-	5,88	5,88	-	176,42	1.037,35	-	1.037,35	1.037,35	-	100,00	
01.07.002.005	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af. 10/2022	m2	117,51	-	117,51	117,51	-	75,05	8.819,13	-	8.819,13	8.819,13	-	100,00	
01.07.002.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	442,42	331,82	44,25	376,07	66,35	48,68	21.537,01	16.153,00	2.154,09	18.307,09	3.229,92	85,00	
01.07.003	ACESSIBILIDADE								7.568,62	-	5.937,01	5.937,41	1.631,21	78,44	
01.07.003.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4	m³	1,50	-	1,50	1,50	-	999,93	1.454,89	-	1.454,89	1.454,89	-	100,00	
01.07.003.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	37,41	-	31,80	31,80	5,61	140,96	5.273,31	-	4.482,52	4.482,52	790,79	85,00	
01.07.003.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio publico em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	-	-	-	2,00	352,66	705,32	-	-	-	705,32	-	
01.07.003.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	6,24	-	-	-	6,24	21,65	135,10	-	-	-	135,10	-	
01.07.004	PAISAGISMO								11.851,42	-	-	-	11.851,42	-	
01.07.004.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	360,10	-	-	-	360,10	20,83	7.500,88	-	-	-	7.500,88	-	
01.07.004.002	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	2,00	-	-	-	2,00	98,87	197,74	-	-	-	197,74	-	
01.07.004.003	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	4,00	-	-	-	4,00	86,62	346,48	-	-	-	346,48	-	
01.07.004.004	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	6,00	-	-	-	6,00	107,77	646,62	-	-	-	646,62	-	
01.07.004.005	Planta - Pau Ferro (Libidibia ferrea), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	6,00	-	-	-	6,00	86,62	519,72	-	-	-	519,72	-	
01.07.004.006	Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	2,00	-	-	-	2,00	98,87	197,74	-	-	-	197,74	-	
01.07.004.007	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	15,00	-	-	-	15,00	59,01	885,15	-	-	-	885,15	-	
01.07.004.008	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	73,00	-	-	-	73,00	21,33	1.557,09	-	-	-	1.557,09	-	
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								55.130,90	14.223,68	14.072,65	28.296,33	26.834,57	51,32	
01.08.001	PADRAO DE ENTRADA								8.763,42	-	3.333,95	3.333,95	5.429,47	38,04	
01.08.001.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	-	1,00	1,00	-	559,57	559,57	-	559,57	559,57	-	100,00	
01.08.001.002	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00	-	-	-	1,00	161,77	161,77	-	-	-	161,77	-	
01.08.001.003	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	-	1,00	1,00	-	486,25	486,25	-	486,25	486,25	-	100,00	
01.08.001.004	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	3,00	-	3,00	3,00	-	17,70	53,10	-	53,10	53,10	-	100,00	
01.08.001.005	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00	-	3,00	3,00	-	21,38	64,14	-	64,14	64,14	-	100,00	

		OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP					DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 07				CONTRATO: Nº 258/2025	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA							VIGÊNCIA		25/08/2026	Período: 01/05/2026 a 31/05/2026		RECURSO:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							EXECUÇÃO		25/08/2026	Data da Medição: 16/07/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.08.001.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3.00m com conector	un	3,00	-	3,00	3,00	-	143,40	430,20	-	430,20	430,20	-	100,00
01.08.001.007	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2	m	50,00	-	-	-	50,00	12,25	612,50	-	-	-	612,50	-
01.08.001.008	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90º C	m	230,00	-	-	-	230,00	20,24	4.655,20	-	-	-	4.655,20	-
01.08.001.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	80,00	-	80,00	80,00	-	19,17	1.533,60	-	1.533,60	1.533,60	-	100,00
01.08.001.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	27,00	-	27,00	27,00	-	7,67	207,09	-	207,09	207,09	-	100,00
01.08.002	QUADRO DE COMANDO - GDEL								1.965,96	-	-	-	1.965,96	-
01.08.002.001	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	-	-	-	1,00	510,04	510,04	-	-	-	510,04	-
01.08.002.002	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00	-	-	-	1,00	161,77	161,77	-	-	-	161,77	-
01.08.002.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	-	-	-	1,00	21,38	21,38	-	-	-	21,38	-
01.08.002.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3.00m com conector	un	1,00	-	-	-	1,00	143,40	143,40	-	-	-	143,40	-
01.08.002.005	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	4,00	-	-	-	4,00	59,09	236,36	-	-	-	236,36	-
01.08.002.006	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1,00	-	-	-	1,00	101,52	101,52	-	-	-	101,52	-
01.08.002.007	Contator tripolar nominal 38a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00	-	-	-	2,00	333,73	667,46	-	-	-	667,46	-
01.08.002.008	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	4,00	-	-	-	4,00	21,58	86,32	-	-	-	86,32	-
01.08.002.009	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af. 02/2025	un	1,00	-	-	-	1,00	37,71	37,71	-	-	-	37,71	-
01.08.003	ILUMINAÇÃO QUADRA								44.401,52	14.223,88	10.738,70	24.962,38	19.436,14	56,21
01.08.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	210,00	-	210,00	210,00	-	17,24	3.620,40	-	3.620,40	3.620,40	-	100,00
01.08.003.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	70,00	-	70,00	70,00	-	5,82	407,40	-	407,40	407,40	-	100,00

		OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP						DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 07			CONTRATO: Nº 258/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA		25/08/2026	Período: 01/05/2026 a 31/05/2026		RECURSO:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO		25/08/2026	Data da Medição: 16/07/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
01.08.003.003	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	750,00	-		-	750,00	14,92	11.190,00	-	-	-	11.190,00	-	
01.08.003.004	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	4,00	4,00		4,00	-	2.034,73	8.138,92	8.138,92	-	8.138,92	-	100,00	
01.08.003.005	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 petalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm	un	4,00	-		-	4,00	187,45	749,80	-	-	-	749,80	-	
01.08.003.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m	un	3,00	-		3,00	3,00	388,95	1.166,85	-	1.166,85	1.166,85	-	100,00	
01.08.003.007	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	3,00	-		3,00	3,00	38,49	115,47	-	115,47	115,47	-	100,00	
01.08.003.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,40m, com tampa em tela de proteção metálica com dobradiça e porta cadeado	un	8,00	-		8,00	8,00	511,46	4.091,68	-	4.091,68	4.091,68	-	100,00	
01.08.003.009	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	8,00	-		-	8,00	143,40	1.147,20	-	-	-	1.147,20	-	
01.08.003.010	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w 24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	8,00	4,00		4,00	4,00	1.521,19	12.169,52	6.084,76	-	6.084,76	6.084,76	50,00	
01.08.003.011	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	-		10,00	10,00	133,69	1.604,28	-	1.336,90	1.336,90	267,38	83,33	
01.09	DRENAGEM PLUVIAL								15.945,62	4.720,67	2.889,16	7.609,83	8.335,79	47,72	
01.09.001	TUBULAÇÃO PVC								5.861,00	3.504,59	1.977,10	5.481,69	379,31	93,52	
01.09.001.001	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 100mm	m	96,31	62,70		24,00	86,70	39,47	3.801,36	2.474,77	947,28	3.422,05	379,31	90,02	
01.09.001.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af. 06/2022	m	53,40	26,70		26,70	53,40	27,73	1.480,78	740,39	740,39	1.480,78	-	100,00	
01.09.001.003	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em parede, af. 09/2023 ps	m	53,40	26,70		26,70	53,40	10,84	578,86	289,43	289,43	578,86	-	100,00	
01.09.002	CAIXAS DE PASSAGEM								2.128,14	1.216,08	912,06	2.128,14	-	100,00	
01.09.002.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	7,00	4,00		3,00	7,00	304,02	2.128,14	1.216,08	912,06	2.128,14	-	100,00	
01.09.003	CALHAS								7.956,48	-	-	-	7.956,48	-	
01.09.003.001	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	67,20	-		-	67,20	118,40	7.956,48	-	-	-	7.956,48	-	
01.10	DIVERSOS								24.000,97	6.003,96	4.469,28	10.473,24	13.527,73	43,63	
01.10.001	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS								10.853,77	6.003,96	-	6.003,96	4.849,81	55,31	
01.10.001.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv. 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	-		-	1,00	3.502,64	3.502,64	-	-	-	3.502,64	-	
01.10.001.002	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2,00	2,00		2,00	-	3.001,98	6.003,96	6.003,96	-	6.003,96	-	100,00	
01.10.001.003	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	-		-	1,00	1.102,23	1.102,23	-	-	-	1.102,23	-	
01.10.001.004	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	-		-	1,00	244,94	244,94	-	-	-	244,94	-	

		OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP					DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 07				CONTRATO: Nº 258/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA							VIGÊNCIA		25/08/2026		Período: 01/05/2026 a 31/05/2026		RECURSO:			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							EXECUÇÃO		25/08/2026		Data da Medição: 16/07/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medido		
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
01.10.002	MOBILIÁRIO URBANO								13.147,20	-	4.469,28	4.469,28	8.677,92	33,99		
01.10.002.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	24,00	-	24,00	24,00	-	186,22	4.469,28	-	4.469,28	4.469,28	-	100,00		
01.10.002.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	-	-	-	4,00	367,13	1.468,52	-	-	-	1.468,52	-		
01.10.002.003	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2. 1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	2,00	-	-	-	2,00	3.604,70	7.209,40	-	-	-	7.209,40	-		
01.11	MURO DE FECHAMENTO								71.637,65	55.199,09	706,10	55.905,19	15.732,46	78,03		
01.11.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								55.199,09	55.199,09	-	55.199,09	-	100,00		
01.11.001.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	229,91	229,91	229,91	-	240,09	55.199,09	55.199,09	-	55.199,09	-	-	100,00		
01.11.002	PINTURA								15.438,56	-	706,10	706,10	15.732,46	4,29		
01.11.002.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão, af_04/2023	m2	459,82	-	230,00	230,00	229,82	3,07	1.411,65	-	706,10	706,10	705,55	50,01		
01.11.002.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	459,82	-	-	-	459,82	17,42	8.010,06	-	-	-	8.010,06	-		
01.11.002.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	459,82	-	-	-	459,82	15,26	7.016,85	-	-	-	7.016,85	-		
01.12	ESTACIONAMENTO								29.950,32	-	-	-	29.950,32	-		
01.12.001	PAVIMENTAÇÃO								29.950,32	-	-	-	29.950,32	-		
01.12.001.001	Lastro de brita 1	m3	28,27	-	-	-	28,27	176,42	4.987,39	-	-	-	4.987,39	-		
01.12.001.002	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm, af_10/2022	m2	262,74	-	-	-	262,74	95,01	24.962,93	-	-	-	24.962,93	-		
01.13	SERVIÇOS FINAIS								7.399,50	-	-	-	7.399,50	-		
01.13.001	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA								3.829,17	-	-	-	3.829,17	-		
01.13.001.001	Limpeza geral	m2	1.867,89	-	-	-	1.867,89	2,05	3.829,17	-	-	-	3.829,17	-		
01.13.002	DIVERSOS								3.570,33	-	-	-	3.570,33	-		
01.13.002.001	Marco Inaugural - Padrão Município	un	1,00	-	-	-	1,00	1.363,45	1.363,45	-	-	-	1.363,45	-		
01.13.002.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	-	-	-	1,00	2.206,88	2.206,88	-	-	-	2.206,88	-		
TOTAL:									877.486,76	646.492,41	56.412,52	702.904,93	174.581,83	80,09%		
PERCENTUAL										73,67%	6,42%	80,09%	19,91%			
 KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563 0563 ASSINATURA DA EMPRESA							Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563 Dados: 2026.07.30 14:47:06 -03'00'									
							FISCAL DO CONTRATO				ENGº. JOÃO VITOR REIS DOS SANTOS - CREA 2723359220					

Documento assinado digitalmente
gov.br **DIEGO OLIVEIRA BARROS**
 Data: 03/08/2026 11:24:45-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **JOAO VITOR REIS DOS SANTOS**
 Data: 03/08/2026 11:27:41-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP				MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 07 Período 01/05/2026 a 31/05/2026
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: 16/07/2026
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	OBSERVAÇÃO
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE			
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	7,20	120 horas x 0,06 = 7,20 horas
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	14,40	240 horas x 0,06 = 14,40 horas
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.02.002	CANTEIRO DE OBRAS			
01.02.002.003	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1,00	Referente a 1 mês de obra
01.05	ALAMBRADO E MURETA			
01.05.001	PINTURA			
01.05.006.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	127,17	$(16,50 + 16,50 + 31,23 + 26,60) \times 0,70 \times 2 = 127,17 \text{ m}^2$
01.06	ARQUIBANCADA			
01.06.006	PINTURA			
01.06.006.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	70,86	$(3,0 \times 12,20) + (3,57 \times 9,60) = 70,86 \text{ m}^2$
01.06.007	DIVERSOS			
01.06.007.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,00	$2,50 \times 6 = 15,00 \text{ m}$
01.07	ÁREA EXTERNA			
01.07.001	MEIO-FIO			
01.07.001.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	33,00	$10,50 + 6,00 + 8,50 + 8,00 = 33,00 \text{ m}$
01.07.002	PAVIMENTAÇÃO			
01.07.002.001	Lona plástica preta	m2	167,95	$83,97 \times 2,00 = 167,95 \text{ m}^2$
01.07.002.002	Colchão de areia	m3	1,20	$4,00 \times 0,15 \times 2,00 = 1,20 \text{ m}^3$
01.07.002.003	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	1,20	$4,00 \times 0,15 \times 2,00 = 1,20 \text{ m}^3$
01.07.002.004	Lastro de brita 1	m3	5,88	$117,51 \times 0,05 = 5,88 \text{ m}^3$
01.07.002.005	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	117,51	$19,10 \times 2,00 + 22,26 \times 3,00 + 6,27 \times 2,00 = 117,51 \text{ m}^2$
01.07.002.006	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	44,25	$22,13 \times 2,00 = 44,25 \text{ m}^2$
01.07.003	ACESSIBILIDADE			
01.07.003.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m³	1,50	$100,00 \times 0,30 \times 0,05 = 1,50 \text{ m}^3$
01.07.003.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	31,80	$106,00 \times 0,30 = 31,80 \text{ m}^2$
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
01.08.001	PADRÃO DE ENTRADA			
01.08.001.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	1,00 unidade
01.08.001.003	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	1,00 unidade
01.08.001.004	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	3,00	3,00 unidades
01.08.001.005	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00	3,00 unidades
01.08.001.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00	3,00 unidades
01.08.001.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	80,00	$10,20 + 7,50 + 11,80 + 6,40 + 9,10 + 8,70 + 11,10 + 6,90 + 8,30 = 80,00 \text{ m}$
01.08.001.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	27,00	27,00 unidades

Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	OBSERVAÇÃO
01.08.003	ILUMINAÇÃO QUADRA			
01.08.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	210,00	11,25 + 8,40 + 6,15 + 10,50 + 9,80 + 7,10 + 11,65 + 8,90 + 9,60 + 11,90 + 7,30 + 10,25 + 8,65 + 11,10 + 6,40 + 9,40 + 8,15 + 10,75 + 6,80 + 11,40 + 7,95 + 9,35 + 8,25 = 210,00 m
01.08.003.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	70,00	70,00 unidades
01.08.003.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m	un	3,00	3,00 unidades
01.08.003.007	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	3,00	3,00 unidades
01.08.003.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,40m, com tampa em tela de proteção metálica com dobradiça e porta cadeado	un	8,00	8,00 unidades
01.08.003.011	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	10,00	10,00 unidades
01.09	DRENAGEM PLUVIAL			
01.09.001	TUBULAÇÃO PVC			
01.09.001.001	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 100mm	m	24,00	6,00 + 5,00 + 7,00 + 6,00 = 24,00 m
01.09.001.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	26,70	8,70 + 8,50 + 9,50 = 26,70 m
01.09.001.003	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps	m	26,70	8,70 + 8,50 + 9,50 = 26,70 m
01.09.002	CAIXAS DE PASSAGEM			
01.09.002.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	3,00	3,00 unidades
01.10	DIVERSOS			
01.10.002	MOBILIÁRIO URBANO			
01.10.002.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	24,00	6,00 x 4,00 = 24,00 m
01.11	MURO DE FECHAMENTO			
01.11.002	PINTURA			
01.11.002.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	230,00	92,00 x 2,50 = 230,00 m²
		Atestamos que os serviços constantes na NF foram recebidos por nós em perfeita ordem.		
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		Data: __/__/__		

KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:7904588
0563

Assinado de forma digital
por KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.07.28 15:47:24
-03'00'



Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 28/07/2026 12:56:23-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 28/07/2026 13:05:52-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Nº Instrumento Transferegov
965393/2024

Conveniente / Recebedor
MUNICIPIO DE ITABAIANA

UF
SE

Objeto

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF
258/2025

Empresa executora
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS

Data de assinatura
25/08/2025

Valor vigente
R\$ 1.055.885,58

Descrição da meta / submeta

Construção de Quadra Poliesportiva- Fundação da arquibancada/Cobertura

Localidade / Endereço da obra

RODOVIA DO VAQUEIRO, S/N- POVOADO TERRA DURA

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição
07

Data de fechamento
16/07/2026

Data da vistoria
16/07/2026

Valor medido no período
R\$ 56.412,52

Valor medido acumulado
R\$ 702.904,94

% Acum.
80,00%

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PINTURA DAS MURETAS



PINTURA DA ARQUIBANCADA



BANCO DE CONCRETO



BANCO DE CONCRETO




ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO



EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO




EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO

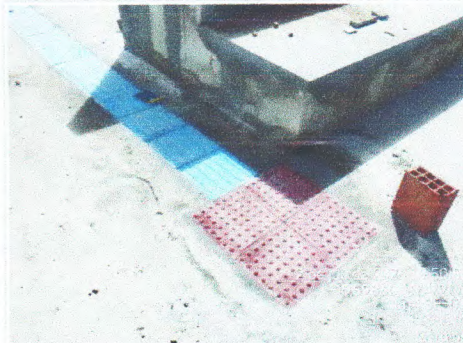

EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL



PADRÃO DE ENTRADA

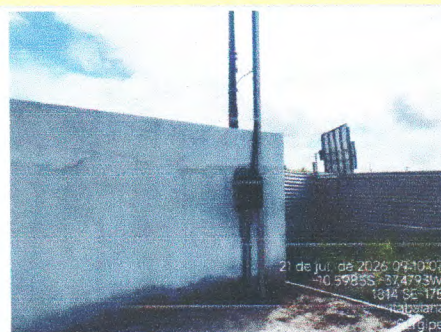

PADRÃO DE ENTRADA



ILUMINAÇÃO DA QUADRA



ILUMINAÇÃO DA QUADRA



DRENAGEM PLUVIAL



SELADOR ACRÍLICO NO MURO

5 DATA E ASSINATURA

Observações

ITABAIANA/SE - 16/07/2026

Local e data

Profissional responsável pela fiscalização
Nome: João Vitor Reis dos Santos CREA -

KLEBER DE
SOUZA
OLIVEIRA:790
45880563

Assinado de forma
digital por KLEBER DE
SOUZA
OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.07.28
15:49:16 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 28/07/2026 12:56:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 28/07/2026 13:05:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
