



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 07/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 28/06/2023 A 05/07/2023				DATA: 05/07/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2.282.232,50</b>	<b>324.116,18</b>	<b>41.237,19</b>	<b>365.353,37</b>		<b>1.916.879,13</b>	<b>16,01</b>
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	7.121,14	902,99	8.024,13	44,52	2.226.000,00	317.033,17	40.201,11	357.234,28		1.868.765,72	16,05
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	7,52	1,10	8,62	30,46	941,89	47.094,50	7.083,01	1.036,08	8.119,09	38.975,41	17,24
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>119.220,00</b>	<b>16.927,79</b>	<b>2.161,92</b>	<b>19.089,71</b>	<b>100.130,29</b>	<b>16,01</b>
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	70,98	11,10	82,08	123,60	61.800,00	8.773,14	1.371,96	10.145,10		51.654,90	16,42
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	170,42	16,51	186,93	47,85	57.420,00	8.154,65	789,96	8.944,61		48.475,39	15,58
<b>Total geral</b>								<b>2.401.452,50</b>	<b>341.043,97</b>	<b>43.399,11</b>	<b>384.443,08</b>		<b>2.017.009,42</b>	<b>16,01</b>
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2023.07.06 08:47:46 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___			

José Roberto Santos da Paiva  
 Eng. Civil - CREA 27202939-4  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Honório Torres Santana  
 Eng. Civil - CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 07/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 28/06/2023 A 05/07/2023	DATA: 05/07/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	28/06/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	38,20	7,30	278,86
2	29/06/2023	RUA VICENTE FERREIRA SOUZA	SÃO CRISTÓVÃO	10,00	2,70	27,00
3	29/06/2023	RUA VICENTE FERREIRA SOUZA	SÃO CRISTÓVÃO	4,90	1,80	8,82
4	29/06/2023	RUA VICENTE FERREIRA SOUZA	SÃO CRISTÓVÃO	6,00	2,80	16,80
5	29/06/2023	RUA VICENTE FERREIRA SOUZA	SÃO CRISTÓVÃO	22,30	5,80	129,34
6	30/06/2023	RUA VICENTE FERREIRA SOUZA	SÃO CRISTÓVÃO	14,50	5,80	84,10
7	30/06/2023	RUA JOSÉ FILADÉLFIO ARAÚJO	SERRANO	6,20	2,70	16,74
8	30/06/2023	RUA JOSÉ FILADÉLFIO ARAÚJO	SERRANO	7,40	2,40	17,76
9	30/06/2023	RUA JOSÉ FILADÉLFIO ARAÚJO	SERRANO	6,50	2,50	16,25
10	03/07/2023	RUA JOSÉ FILADÉLFIO ARAÚJO	SERRANO	6,20	4,60	28,52
11	03/07/2023	RUA JOSÉ FILADÉLFIO ARAÚJO	SERRANO	5,60	2,60	14,56
12	03/07/2023	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	17,60	2,90	51,04
13	03/07/2023	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	5,40	4,20	22,68
14	04/07/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	14,80	6,80	100,64
15	05/07/2023	RUA VICENTE FERREIRA SOUZA	SÃO CRISTÓVÃO	14,10	5,80	81,78
16	05/07/2023	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	3,00	2,70	8,10
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===&gt;</b>						<b>902,99</b>

MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121  
1525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211525  
Dados: 2023.07.06  
08:48:09 -03'00'

José Roberto Santos de Paiva  
Eng. Civil - CREA 27202839-4  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Honogue Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA 27156303-3  
Coordenador de Núcleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07/2023**



RUA O



RUA VICENTE FERREIRO SOUZA



RUA VICENTE FERREIRO SOUZA



RUA VICENTE FERREIRO SOUZA



RUA VICENTE FERREIRO SOUZA



RUA VICENTE FERREIRO SOUZA

Prefeitura Municipal de Itabalana  
Yan Hon'que Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/RS 2715638353  
Coordenador de Nucleo

José Robson Santos da Paiva  
Eng. Civil - CREA 27202939-4  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabalana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2023.07.06 08:48:35 -03'00'




RUA JOSÉ FILADÉLFIO ARAÚJO



RUA JOSÉ FILADÉLFIO ARAÚJO



RUA JOSÉ FILADÉLFIO ARAÚJO

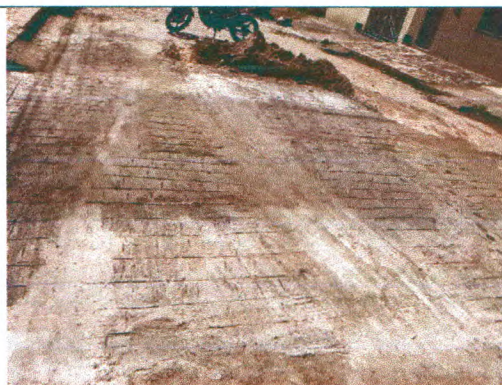

RUA JOSÉ FILADÉLFIO ARAÚJO



RUA JOSÉ FILADÉLFIO ARAÚJO



RUA HELENO LUIZ DA SILVA

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Van Hon'que Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paiva  
Eng. Civil - CREA 27202939-4  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma  
digital por  
MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:066412  
11525  
Dados: 2023.07.06  
08:48:55 -03'00'



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA O



RUA VICENTE FERREIRA SOUZA



RUA JOSÉ FERREIRA LIMA

Prefeitura Municipal de Itabalana  
Yan Hon Aguiar Santos  
Eng. Civil - CREA/RS 2715638353  
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paiva  
Eng. Civil - CREA/RS 202939.4  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabalana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211  
525  
Dados: 2023.07.06  
08:49:10 -03'00'
