


Obra:		Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabalana/SE						BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 391/2025		
Contratada:		D&C CONSTRUTORA LTDA												
CNPJ:		04.460.699/0001-23						B.M.Nº: 07				Data da medição: 09/07/2026		
								Período: 19/06/2026 à 09/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO								9.080,34	9.080,34	0,00	9.080,34	0,00	100,00%
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								9.080,34	9.080,34	0,00	9.080,34	0,00	
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	366,63	4.399,56	4.399,56	0,00	4.399,56	0,00	100,00%
01.001.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	6,00		6,00	0,00	780,13	4.680,78	4.680,78	0,00	4.680,78	0,00	100,00%
02	TRECHO 1								986.940,05	0,00	0,00	0,00	986.940,05	0,00%
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								46.631,49	0,00	0,00	0,00	46.631,49	
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6.246,67			0,00	6.246,67	1,64	10.244,54	0,00	0,00	0,00	10.244,54	0,00%
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	6.246,67			0,00	6.246,67	2,41	15.054,47	0,00	0,00	0,00	15.054,47	0,00%
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	624,67			0,00	624,67	1,21	755,85	0,00	0,00	0,00	755,85	
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	16.866,09			0,00	16.866,09	1,22	20.576,63	0,00	0,00	0,00	20.576,63	0,00%
02.002	PAVIMENTAÇÃO								936.685,49	0,00	0,00	0,00	936.685,49	0,00%
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.246,67			0,00	6.246,67	106,01	662.209,49	0,00	0,00	0,00	662.209,49	0,00%
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.180,24			0,00	2.180,24	42,14	91.875,31	0,00	0,00	0,00	91.875,31	0,00%
02.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	59,39			0,00	59,39	42,14	2.502,69	0,00	0,00	0,00	2.502,69	0,00%
02.002.004	Pintura de meio fio (caliação)	m	2.239,63			0,00	2.239,63	4,81	10.772,62	0,00	0,00	0,00	10.772,62	0,00%
02.002.005	Colchão de areia	m3	1.061,93			0,00	1.061,93	126,51	134.345,27	0,00	0,00	0,00	134.345,27	0,00%
02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	28.672,22			0,00	28.672,22	1,22	34.980,11	0,00	0,00	0,00	34.980,11	0,00%
02.003	LIMPEZA								3.623,07	0,00	0,00	0,00	3.623,07	0,00%
02.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.246,67			0,00	6.246,67	0,58	3.623,07	0,00	0,00	0,00	3.623,07	0,00%
03	TRECHO 2								1.973.376,93	1.330.796,53	0,00	1.330.796,53	642.580,34	67,44%
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								93.137,03	62.622,95	0,00	62.622,95	30.514,08	67,24%
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	12.476,49	8.326,00		8.326,00	4.150,49	1,64	20.461,44	13.654,64	0,00	13.654,64	6.806,80	66,73%
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	12.476,49	8.329,00		8.329,00	4.147,49	2,41	30.068,34	20.072,89	0,00	20.072,89	9.995,45	66,76%
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.247,65	832,25		832,25	415,40	1,21	1.509,66	1.007,02	0,00	1.007,02	502,64	66,71%
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	33.686,55	22.859,35		22.859,35	10.827,20	1,22	41.097,59	27.888,40	0,00	27.888,40	13.209,19	67,86%
03.002	PAVIMENTAÇÃO								1.873.003,54	1.263.344,56	0,00	1.263.344,56	609.658,98	67,45%
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	12.476,49	8.326,00		8.326,00	4.150,49	106,01	1.322.632,70	882.639,26	0,00	882.639,26	439.993,44	66,73%
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	4.444,26	2.913,77		2.913,77	1.530,49	42,14	187.281,12	122.786,26	0,00	122.786,26	64.494,86	65,56%
03.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	74,95	78,45		78,45	-3,50	42,14	3.158,39	3.305,88	0,00	3.305,88	-147,49	104,67%
03.002.004	Pintura de meio fio (caliação)	m	4.519,21	2.937,27		2.937,27	1.581,94	4,81	21.737,40	14.128,26	0,00	14.128,26	7.609,14	65,00%
03.002.005	Colchão de areia	m3	2.121,00	1.530,38		1.530,38	590,62	126,51	268.328,09	193.608,37	0,00	193.608,37	74.719,72	72,15%
03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	57.267,08	38.423,39		38.423,39	18.843,69	1,22	69.865,84	46.876,53	0,00	46.876,53	22.989,31	67,10%
03.003	LIMPEZA								7.236,36	4.829,08	0,00	4.829,08	2.407,28	66,73%
03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	12.476,49	8.326,00		8.326,00	4.150,49	0,58	7.236,36	4.829,08	0,00	4.829,08	2.407,28	66,73%
04	TRECHO 3								285.991,69	285.991,67	0,00	285.991,67	0,02	100,00%
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								13.287,70	13.287,70	0,00	13.287,70	0,00	100,00%

Obra:		Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabalana/SE						BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO N°: 391/2025		
Contratada:		D&C CONSTRUTORA LTDA												
CNPJ:		04.460.699/0001-23						B.M.N°: 07				Data da medição: 09/07/2026		
								Período: 19/06/2026 à 09/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	1,64	2.919,20	2.919,20	0,00	2.919,20	0,00	100,00%
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af 09/2024	m2	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	2,41	4.289,80	4.289,80	0,00	4.289,80	0,00	100,00%
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	178,00	178,00		178,00	0,00	1,21	215,38	215,38	0,00	215,38	0,00	100,00%
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.806,00	4.806,00		4.806,00	0,00	1,22	5.863,32	5.863,32	0,00	5.863,32	0,00	100,00%
04.002	PAVIMENTAÇÃO								271.671,59	271.671,57	0,00	271.671,57	0,02	100,00%
04.002.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	734,60	734,60		734,60	0,00	42,14	30.956,04	30.956,04	0,00	30.956,04	0,00	100,00%
04.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	5,00	5,00		5,00	0,00	42,14	210,70	210,70	0,00	210,70	0,00	100,00%
04.002.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	106,01	188.697,80	188.697,80	0,00	188.697,80	0,00	100,00%
04.002.004	Pintura de meio fio (caliação)	m	739,60	739,60		739,60	0,00	4,81	3.557,48	3.557,47	0,00	3.557,47	0,01	100,00%
04.002.005	Colchão de areia	m3	302,60	302,60		302,60	0,00	126,51	38.281,93	38.281,92	0,00	38.281,92	0,01	100,00%
04.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	8.170,20	8.170,20		8.170,20	0,00	1,22	9.967,64	9.967,64	0,00	9.967,64	0,00	100,00%
04.003	LIMPEZA								1.032,40	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	100,00%
04.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	0,58	1.032,40	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	100,00%
05	TRECHO 4								1.058.059,05	699.241,18	358.817,70	1.058.058,88	0,07	100,00%
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								50.831,59	33.593,40	17.238,12	50.831,52	0,07	100,00%
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6.809,34	4.500,00	2.309,34	6.809,34	0,00	1,64	11.167,32	7.379,99	3.787,31	11.167,30	0,02	100,00%
05.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af 09/2024	m2	6.809,34	4.500,00	2.309,34	6.809,34	0,00	2,41	16.410,51	10.844,99	5.565,50	16.410,49	0,02	100,00%
05.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	680,93	450,05	230,88	680,93	0,00	1,21	823,93	544,55	279,36	823,91	0,02	100,00%
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	18.385,11	12.150,72	6.234,39	18.385,11	0,00	1,22	22.429,83	14.823,87	7.605,95	22.429,82	0,01	100,00%
05.002	PAVIMENTAÇÃO								1.003.278,04	663.037,79	340.240,17	1.003.277,96	0,00	100,00%
05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.809,34	4.500,00	2.309,34	6.809,34	0,00	106,01	721.858,13	477.044,99	244.813,13	721.858,12	0,00	100,00%
05.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.050,70	1.355,31	695,39	2.050,70	0,00	42,14	86.416,50	57.112,75	29.303,73	86.416,48	0,00	100,00%
05.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	12,00	8,00	4,00	12,00	0,00	42,14	505,68	337,12	168,56	505,68	0,00	100,00%
05.002.004	Pintura de meio fio (caliação)	m	2.062,70	1.363,24	699,46	2.062,70	0,00	4,81	9.921,59	6.557,18	3.364,40	9.921,58	0,00	100,00%
05.002.005	Colchão de areia	m3	1.157,58	765,04	392,54	1.157,58	0,00	126,51	146.445,45	96.785,20	49.660,23	146.445,43	0,00	100,00%
05.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	31.254,66	20.656,20	10.598,46	31.254,66	0,00	1,22	38.130,69	25.200,55	12.930,12	38.130,67	0,00	100,00%
05.003	LIMPEZA								3.949,42	2.609,99	1.339,41	3.949,40	0,00	100,00%
05.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.809,34	4.500,00	2.309,34	6.809,34	0,00	0,58	3.949,42	2.609,99	1.339,41	3.949,40	0,00	100,00%
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								101.372,04	54.739,87	8.109,75	62.849,62	38.522,42	62,00%
06.001	EQUIPE DIRIGENTE								101.372,04	54.739,87	8.109,75	62.849,62	38.522,42	62,00%
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	378,00	204,12	30,24	234,36	143,64	131,94	49.873,32	26.930,75	3.989,86	30.920,61	18.952,71	62,00%
06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	756,00	408,24	60,48	468,72	287,28	68,12	51.498,72	27.809,12	4.119,89	31.929,01	19.569,71	62,00%
									4.414.820,10	2.379.849,59	366.927,45	2.746.777,04	1.668.043,06	62,22%
PERCENTUAL									100,00%	53,91%	8,31%	62,22%	37,78%	
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA														

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA

Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE						BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº: 391/2025				
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA						B.M.Nº: 07			Data da medição: 09/07/2026				
CNPJ:	04.460.699/0001-23						Período: 19/06/2026 à 09/07/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
 Documento assinado digitalmente LEANDRO DE ASSIS FERREIRA Data: 09/07/2026 16:00:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			DATA: ____ / ____ / ____						VALOR DA MEDIÇÃO:					
									R\$ 366.927,45					

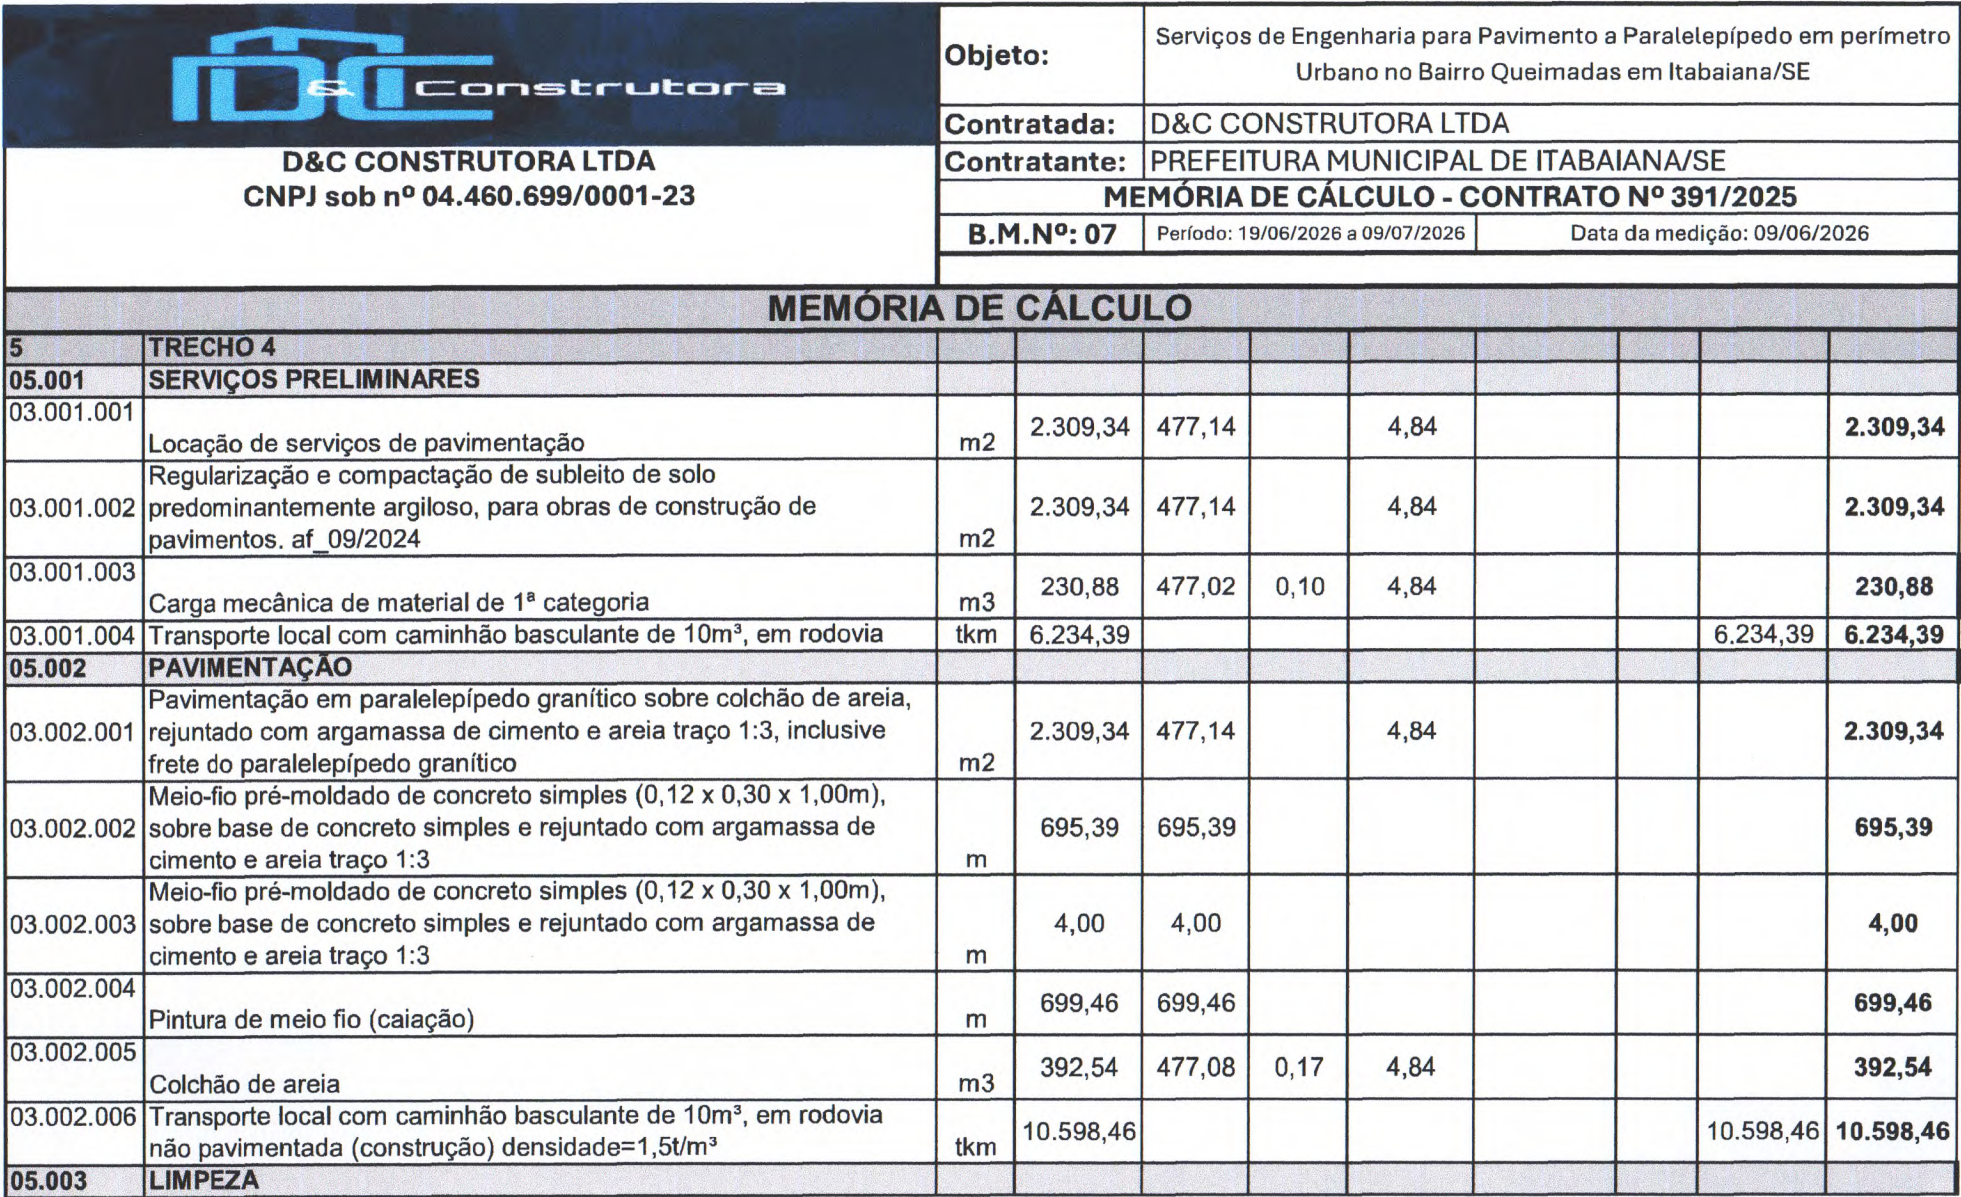

03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.309,34	477,14		4,84				2.309,34
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
06.001	EQUIPE DIRIGENTE									
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	30,24						30,24	30,24
06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	60,48						60,48	60,48

gov.br

Documento assinado digitalmente

LEANDRO DE ASSIS FERREIRA

Data: 09/07/2026 16:06:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL DE CÁLCULO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM Nº 07

Ref.: Contrato 391/2025

Objeto: Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE.

A Empresa D&C Construtora LTDA, empresa privada, com CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23, localizada na Travessa José Mecnas Filho, nº 46-A – Centro, São Domingos/SE, CEP: 49525-000, neste ato representada pelo senhor Evaldir da Silva Ramos R.G. nº: 40.642.163-8 – SSP/SP e CPF nº: 324.302.278-94, vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico do Boletim de medição nº 07 da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 19/06/2026 até 09/07/2026**, conforme **Boletim de Medição nº 07**.



Travessa José Mecnas Filho
Nº46A – Centro São Domingos – se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@deconstrutora
deconstrucoesltada@gmail.com

Acesse o nosso
site através
do QR CODE





Travessa José Mecnas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@deconstrutora
deconstrucoesltada@gmail.com

Use o nosso
através
do QR CODE





Itabaiana/SE, em 09 de julho de 2026.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 09/07/2026 16:15:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leandro de Assis Ferreira

Engenheiro Civil CREA/SE nº 270963955-6

📍 Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

📞 79 9 9154-1021
📧 @deconstrutora
✉ deconstrucoesltida@gmail.com

Acesse o nosso
site através
do QR CODE

