

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, EM ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO: 041/2024					
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			B.M.º 08						ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			Período: 06/01/2025 a 28/02/2025						DATA: 06/05/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
01.004.004	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m2	182,00	0,00		0,00	182,00	32,57	5.927,74	-	-	-	5.927,74	-
01.004.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	91,00	0,00		0,00	91,00	44,76	4.073,16	-	-	-	4.073,16	-
01.004.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2,00	0,00		0,00	2,00	422,90	845,80	-	-	-	845,80	-
01.005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								484.407,00	167.555,90	14.630,07	182.185,97	302.221,03	37,61
01.005.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	1.980,00	684,88	59,80	744,68	1.235,32	143,78	284.684,40	98.472,03	8.598,04	107.070,07	177.614,33	37,61
01.005.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.980,00	684,88	59,80	744,68	1.235,32	69,82	138.243,60	47.818,33	4.175,24	51.993,57	86.250,03	37,61
01.005.003	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.980,00	684,88	59,80	744,68	1.235,32	31,05	61.479,00	21.265,54	1.856,79	23.122,33	38.356,67	37,61
02	SERVIÇOS PRELIMINARES								138.823,91	138.823,91	-	138.823,91	-	100,00
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	10,00	10,00		10,00	-	452,13	4.521,30	4.521,30	-	4.521,30	-	100,00
02.002	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	176,00	176,00		176,00	-	247,99	43.646,24	43.646,24	-	43.646,24	-	100,00
02.003	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	-	2.001,37	2.001,37	2.001,37	-	2.001,37	-	100,00
02.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	1,00		1,00	-	669,85	669,85	669,85	-	669,85	-	100,00
02.005	Ligação Predial de Esgoto Tipo III em piso de cimentado	un	1,00	1,00		1,00	-	1.342,68	1.342,68	1.342,68	-	1.342,68	-	100,00
02.006	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016	m2	2,52	2,52		2,52	-	1.153,88	2.907,27	2.907,27	-	2.907,27	-	100,00
02.007	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	m2	20,00	20,00		20,00	-	1.248,00	24.920,00	24.920,00	-	24.920,00	-	100,00
02.008	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016	m2	20,00	20,00		20,00	-	967,66	19.353,20	19.353,20	-	19.353,20	-	100,00
02.009	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	2.928,38	2.928,38		2.928,38	-	7,39	21.640,73	21.640,73	-	21.640,73	-	100,00
02.010	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	10.011,95	10.011,95		10.011,95	-	1,78	17.821,27	17.821,27	-	17.821,27	-	100,00
03	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES								115.024,49	63.837,92	22.089,35	85.927,27	29.097,22	74,70
03.001	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	412,26	266,75	73,63	340,38	71,88	205,31	84.641,10	54.766,45	15.116,98	69.883,43	14.757,67	82,56
03.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	270,81	125,38	50,50	175,88	94,93	57,27	15.509,29	7.180,51	2.892,14	10.072,65	5.436,64	64,95
03.003	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	434,63	210,00	224,63	434,63	-	6,29	2.733,82	1.320,90	1.412,92	2.733,82	-	100,00
03.004	Reatero manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	637,62	29,94	140,09	170,03	467,59	19,04	12.140,28	570,06	2.667,31	3.237,37	8.902,91	26,67
04	FUNDAÇÕES								414.619,21	221.692,16	85.970,46	307.662,62	106.956,59	74,20
04.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES								230.499,51	151.178,28	41.839,15	193.017,43	37.482,08	83,74
04.001.001	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado manualmente (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020	m	686,00	686,00		686,00	-	100,65	69.045,90	69.045,90	-	69.045,90	-	100,00
04.001.002	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	m2	134,00	134,00		134,00	-	37,73	5.055,82	5.055,82	-	5.055,82	-	100,00
04.001.003	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m2	429,20	189,80	114,22	304,02	125,18	189,18	81.196,06	35.906,36	21.608,14	57.514,50	23.681,56	70,83
04.001.004	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	44,55	11,97	9,03	21,00	23,55	20,26	902,58	242,51	182,95	425,46	477,12	47,14
04.001.005	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	85,82	85,82		85,82	-	15,47	1.327,64	1.327,64	-	1.327,64	-	100,00
04.001.006	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	576,45	414,79	85,21	500,00	76,45	13,23	7.626,43	5.487,67	1.127,33	6.615,00	1.011,43	86,74

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Assinatura digitalizada por DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
RFB: 0108 - CNPJ: 08.043.888/0001-00 - CNPJ: 08.043.888/0001-00
RFB: 001175 - CNPJ: 01.000.000/0001-00 - CNPJ: 01.000.000/0001-00
CNPJ: 08.043.888/0001-00 - CNPJ: 08.043.888/0001-00
SANTOS:98986546515
RFB: 0108 - CNPJ: 08.043.888/0001-00 - CNPJ: 08.043.888/0001-00
RFB: 001175 - CNPJ: 01.000.000/0001-00 - CNPJ: 01.000.000/0001-00
CNPJ: 08.043.888/0001-00 - CNPJ: 08.043.888/0001-00
SANTOS:98986546515

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

2/21

Jevânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAUSE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, EM ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO							CONTRATO: 041/2024				
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			B.M.Nº 08							ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			Período: 06/01/2025 a 28/02/2025							DATA: 06/05/2025				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
05.001.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	103,36	0,00	26,00	26,00	77,36	13,71	1.417,07	-	356,46	356,46	1.060,61	25,15
05.001.006	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	89,09	0,00		0,00	89,09	12,32	1.097,59	-	-	-	1.097,59	-
05.001.007	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	848,55	159,00	133,52	292,52	556,03	16,55	14.043,50	2.631,45	2.209,76	4.841,21	9.202,29	34,47
05.001.008	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	55,99	9,58		9,58	46,41	615,40	34.456,25	5.895,53	-	5.895,53	28.560,72	17,11
05.002	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES								143.850,12	46.230,82	27.736,84	73.967,66	69.882,46	51,42
05.002.001	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. af_09/2020	m2	768,78	158,62	137,51	296,13	472,65	61,68	47.418,35	9.783,69	8.481,62	18.265,31	29.153,04	38,52
05.002.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	1.522,64	1.000,40	193,10	1.193,50	329,14	12,12	18.454,40	12.124,84	2.340,37	14.465,21	3.989,19	78,38
05.002.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	2.515,91	880,80	676,00	1.556,80	959,11	13,71	34.493,13	12.075,77	9.267,96	21.343,73	13.149,40	61,88
05.002.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	34,91	0,00		0,00	34,91	12,32	430,09	-	-	-	430,09	-
05.002.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	1.023,73	433,20	176,10	609,30	414,43	16,55	16.942,73	7.169,47	2.914,46	10.083,93	6.858,80	59,52
05.002.006	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	42,43	8,25	7,69	15,94	26,49	615,40	26.111,42	5.077,05	4.732,43	9.809,48	16.301,94	37,57
05.003	CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO								207.568,36	56.690,80	-	56.690,80	150.877,56	27,31
05.003.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	1.210,17	330,52		330,52	879,65	171,52	207.568,36	56.690,80	-	56.690,80	150.877,56	27,31
05.004	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS								31.164,51	3.631,46	1.562,79	5.194,25	25.970,26	16,67
05.004.001	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	614,20	71,57	30,80	102,37	511,83	50,74	31.164,51	3.631,46	1.562,79	5.194,25	25.970,26	16,67
06	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								154.890,72	21.947,98	16.545,99	38.493,97	116.396,75	24,85
06.001	ELEMENTOS VAZADOS								5.517,75	-	-	-	5.517,75	-
06.001.001	Cobogó cimento tipo árabe, dim. 39 x 39 x 7cm	m2	24,72	0,00		0,00	24,72	223,21	5.517,75	-	-	-	5.517,75	-
06.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								149.372,97	21.947,98	16.545,99	38.493,97	110.879,00	25,77
06.002.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	2.088,81	462,16	348,41	810,57	1.278,24	47,49	99.197,59	21.947,98	16.545,99	38.493,97	60.703,62	38,81
06.002.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	13,62	0,00		0,00	13,62	92,16	1.255,22	-	-	-	1.255,22	-
06.002.003	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016	m	676,70	0,00		0,00	676,70	26,57	17.979,92	-	-	-	17.979,92	-
06.002.004	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	47,41	0,00		0,00	47,41	652,61	30.940,24	-	-	-	30.940,24	-
07	ESQUADRIAS								277.570,12	-	-	-	277.570,12	-
07.001	PORTAS DE MADEIRA								57.564,00	-	-	-	57.564,00	-
07.001.001	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens	un	18,00	0,00		0,00	18,00	966,02	17.388,36	-	-	-	17.388,36	-
07.001.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3.5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	7,00	0,00		0,00	7,00	1.227,28	8.590,96	-	-	-	8.590,96	-
07.001.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3.5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	8,00	0,00		0,00	8,00	1.227,28	9.818,24	-	-	-	9.818,24	-

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Atestado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
MDF-CREB: 01/CP/00001-01/CP/Secretaria de Receita Federal do Brasil -
RFB, CDA/INTE =CP/ A1-CP/SEM GRUPO/CP, 01/02/2025 09:09:11.
DanyelsonLeite@sefaz.sp.gov.br
DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Razão: 01/01/2025 - 01/01/2025
Localização:
Data: 2025.05.06 09:23:00:00
Pasta: PDF Recebto Versão: 2025.1.0

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

4/21

Jecvânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAUISE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, EM ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO							CONTRATO: 041/2024					
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		B.M.Nº 08							ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		Período: 06/01/2025 a 28/02/2025							DATA: 06/05/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
12.006	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	m2	21,60	0,00		0,00	21,60	56,45	1.219,32	-	-	-	1.219,32	-
12.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	229,68	0,00		0,00	229,68	22,08	5.071,33	-	-	-	5.071,33	-
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								120.633,36	-	-	-	120.633,36	-
13.001	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	150,00	0,00		0,00	150,00	6,34	951,00	-	-	-	951,00	-
13.002	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	135,30	0,00		0,00	135,30	13,02	1.761,61	-	-	-	1.761,61	-
13.003	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	29,00	0,00		0,00	29,00	21,09	611,61	-	-	-	611,61	-
13.004	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	98,00	0,00		0,00	98,00	22,74	2.228,52	-	-	-	2.228,52	-
13.005	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	80,35	0,00		0,00	80,35	37,33	2.999,47	-	-	-	2.999,47	-
13.006	Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	91,30	0,00		0,00	91,30	44,19	4.034,55	-	-	-	4.034,55	-
13.007	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	63,00	0,00		0,00	63,00	7,45	469,35	-	-	-	469,35	-
13.008	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	39,00	0,00		0,00	39,00	12,37	482,43	-	-	-	482,43	-
13.009	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	58,00	0,00		0,00	58,00	10,54	611,32	-	-	-	611,32	-
13.010	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	7,00	0,00		0,00	7,00	14,00	98,00	-	-	-	98,00	-
13.011	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	8,00	0,00		0,00	8,00	15,62	124,96	-	-	-	124,96	-
13.012	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	23,00	0,00		0,00	23,00	16,72	384,56	-	-	-	384,56	-
13.013	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	0,00		0,00	1,00	51,22	51,22	-	-	-	51,22	-
13.014	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00	0,00		0,00	4,00	132,84	531,36	-	-	-	531,36	-
13.015	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	8,00	0,00		0,00	8,00	23,70	189,60	-	-	-	189,60	-
13.016	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	3,00	0,00		0,00	3,00	21,38	64,14	-	-	-	64,14	-
13.017	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	3,00	0,00		0,00	3,00	21,38	64,14	-	-	-	64,14	-
13.018	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	5,00	0,00		0,00	5,00	24,49	122,45	-	-	-	122,45	-
13.019	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	0,00		0,00	1,00	75,95	75,95	-	-	-	75,95	-
13.020	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	9,00	0,00		0,00	9,00	75,95	683,55	-	-	-	683,55	-
13.021	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	32,00	0,00		0,00	32,00	14,80	473,60	-	-	-	473,60	-
13.022	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	0,00		0,00	1,00	23,49	23,49	-	-	-	23,49	-
13.023	Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	5,00	0,00		0,00	5,00	26,92	134,60	-	-	-	134,60	-
13.024	Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	0,00		0,00	2,00	101,30	202,60	-	-	-	202,60	-

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Assinatura digitalizada por DANYELSON LEITE DOS
BANF0598986546515
300-CRIB, OCP/CP/BRAS, C/Instituto de Registro Federal do Brasil -
RFB, GUARITUBA - CPF A1, C/INTEM BRANCO/01, C/INTEM/2278009111,
C/INTEM/BRANCO, C/INTEM/LEITE DOS
BANF0598986546515
Nota: Este é o melhor modo de documento
Localização:
Data: 2025.05.06 09:23:50:02:00
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

EL
Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

8/21

J
Jecvânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAUISE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, EM ITABAIANA/SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 041/2024					
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M.Nº 08					ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 06/01/2025 a 28/02/2025					DATA: 06/05/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
13.025	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	34,00	0,00		0,00	34,00	101,97	3.466,98	-	-	-	3.466,98	-
13.026	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	9,00	0,00		0,00	9,00	106,70	960,30	-	-	-	960,30	-
13.027	Caixa d'água metálica completa de 15.000l, conforme projeto FNDE	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	51.886,80	51.886,80	-	-	-	51.886,80	-
13.028	Caixa d'água enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto FNDE	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	46.945,20	46.945,20	-	-	-	46.945,20	-
14	INSTAÇÕES SANITÁRIAS								345.493,41	-	-	-	345.493,41	-
14.001	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	119,40	0,00		0,00	119,40	25,59	3.055,45	-	-	-	3.055,45	-
14.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	90,00	0,00		0,00	90,00	32,84	2.955,60	-	-	-	2.955,60	-
14.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	112,50	0,00		0,00	112,50	41,41	4.658,63	-	-	-	4.658,63	-
14.004	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	358,60	0,00		0,00	358,60	38,21	13.702,11	-	-	-	13.702,11	-
14.005	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	m	53,00	0,00		0,00	53,00	70,22	3.721,66	-	-	-	3.721,66	-
14.006	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm	m	45,00	0,00		0,00	45,00	119,20	5.364,00	-	-	-	5.364,00	-
14.007	Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	m	33,00	0,00		0,00	33,00	173,41	5.722,53	-	-	-	5.722,53	-
14.008	Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 300 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	m	60,00	0,00		0,00	60,00	292,25	17.535,00	-	-	-	17.535,00	-
14.009	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	26,00	0,00		0,00	26,00	11,87	308,62	-	-	-	308,62	-
14.010	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	14,00	0,00		0,00	14,00	19,43	272,02	-	-	-	272,02	-
14.011	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	2,00	0,00		0,00	2,00	29,20	58,40	-	-	-	58,40	-
14.012	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	70,00	0,00		0,00	70,00	11,87	830,90	-	-	-	830,90	-
14.013	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	36,00	0,00		0,00	36,00	12,17	438,12	-	-	-	438,12	-
14.014	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	4,00	0,00		0,00	4,00	27,97	111,88	-	-	-	111,88	-
14.015	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	15,00	0,00		0,00	15,00	33,27	499,05	-	-	-	499,05	-
14.016	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	3,00	0,00		0,00	3,00	17,58	52,74	-	-	-	52,74	-
14.017	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	19,00	0,00		0,00	19,00	32,74	622,06	-	-	-	622,06	-
14.018	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	4,00	0,00		0,00	4,00	52,07	208,28	-	-	-	208,28	-
14.019	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	2,00	0,00		0,00	2,00	32,74	65,48	-	-	-	65,48	-

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
MID: 0108, CNPJ: 08.042.888/0001-00, UF: BA, Endereço: Rua Manoel Fátima de Brasil
Avenida, 100 - Jd. Santa Helena, Itabaiana (BRASIL), CEP: 42.282-270
CNPJ: 08.042.888/0001-00, CNPJ: 08.042.888/0001-00
DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Data: 2025.05.06 09:23:30-03'00"
File: PDF Render/Verde: 2025.5.0

Etaíne da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

9/21

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAUISE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, EM ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO: 041/2024			
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA								B.M.Nº 08				ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Período: 06/01/2025 a 28/02/2025				DATA: 06/05/2025			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
14.034.011	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	65,60	0,00		0,00	65,60	29,43	1.930,61	-	-	-	1.930,61	-	
14.034.012	Lastro de brita 3	m3	19,20	0,00		0,00	19,20	202,21	3.882,43	-	-	-	3.882,43	-	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS								48.528,70	-	-	-	48.528,70	-	
15.001	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	8,00	0,00		0,00	8,00	347,12	2.776,96	-	-	-	2.776,96	-	
15.002	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016	un	11,00	0,00		0,00	11,00	350,16	3.851,76	-	-	-	3.851,76	-	
15.003	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	11,00	0,00		0,00	11,00	300,91	3.310,01	-	-	-	3.310,01	-	
15.004	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	8,00	0,00		0,00	8,00	476,27	3.810,16	-	-	-	3.810,16	-	
15.005	Mictório sifonado louça branca ? padrão médio ? fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6,00	0,00		0,00	6,00	745,03	4.470,18	-	-	-	4.470,18	-	
15.006	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	0,00		0,00	2,00	160,43	320,86	-	-	-	320,86	-	
15.007	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	22,00	0,00		0,00	22,00	176,75	3.888,50	-	-	-	3.888,50	-	
15.008	Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	26,00	0,00		0,00	26,00	76,85	1.998,10	-	-	-	1.998,10	-	
15.009	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020	un	3,00	0,00		0,00	3,00	44,88	134,64	-	-	-	134,64	-	
15.010	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	18,00	0,00		0,00	18,00	275,48	4.958,64	-	-	-	4.958,64	-	
15.011	Barra de apoio em "I", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	0,00		0,00	2,00	670,20	1.340,40	-	-	-	1.340,40	-	
15.012	Dispenser para toalha interfolhada	un	16,00	0,00		0,00	16,00	55,90	894,40	-	-	-	894,40	-	
15.013	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	un	20,00	0,00		0,00	20,00	107,89	2.157,80	-	-	-	2.157,80	-	
15.014	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	0,00		0,00	1,00	1.007,17	1.007,17	-	-	-	1.007,17	-	
15.015	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	8,00	0,00		0,00	8,00	564,89	4.519,12	-	-	-	4.519,12	-	
15.016	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	10,00	0,00		0,00	10,00	134,03	1.340,30	-	-	-	1.340,30	-	
15.017	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00	0,00		0,00	5,00	564,89	2.824,45	-	-	-	2.824,45	-	
15.018	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2,00	0,00		0,00	2,00	157,80	315,60	-	-	-	315,60	-	
15.019	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	9,00	0,00		0,00	9,00	133,87	1.204,83	-	-	-	1.204,83	-	
15.020	Torneira plástica 3/4? para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6,00	0,00		0,00	6,00	24,79	148,74	-	-	-	148,74	-	
15.021	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	0,00		0,00	2,00	160,43	320,86	-	-	-	320,86	-	
15.022	Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	0,00		0,00	2,00	1.108,57	2.217,14	-	-	-	2.217,14	-	
15.023	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020	un	16,00	0,00		0,00	16,00	44,88	718,08	-	-	-	718,08	-	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								6.142,29	-	-	-	6.142,29	-	
16.001	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	0,16	0,00		0,00	0,16	539,68	86,35	-	-	-	86,35	-	

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
NF: 0288 - CHCP: 0288 - CUF: Secretaria de Receita Federal do Brasil -
RFB, CUF/RFB e-CPF A1: CLAYTON BRANCO, CUF: 0288227859111.
CPF: 0288227859111 - DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.05.06 09:33:30-0300
Reviz PDF: Versão: 2025.1.0


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

11/21

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CRIUSE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, EM ITABAIANA/SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 041/2024					
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M.º 08					ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 06/01/2025 a 28/02/2025					DATA: 06/05/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
18.009	QDLF-BLOCO F								9.143,91	-	-	-	9.143,91	-
18.009.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00		0,00	1,00	904,76	904,76	-	-	-	904,76	-
18.009.002	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00		0,00	1,00	136,71	136,71	-	-	-	136,71	-
18.009.003	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90º C	m	418,00	0,00		0,00	418,00	16,99	7.101,82	-	-	-	7.101,82	-
18.009.004	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00		0,00	1,00	21,09	21,09	-	-	-	21,09	-
18.009.005	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 63A, 30mA, fornecimento e instalação	und	1,00	0,00		0,00	1,00	201,06	201,06	-	-	-	201,06	-
18.009.006	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00		0,00	3,00	105,40	316,20	-	-	-	316,20	-
18.009.007	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	0,00		0,00	1,00	139,77	139,77	-	-	-	139,77	-
18.009.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	2,00	0,00		0,00	2,00	14,31	28,62	-	-	-	28,62	-
18.009.009	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	4,00	0,00		0,00	4,00	15,07	60,28	-	-	-	60,28	-
18.009.010	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	4,00	0,00		0,00	4,00	58,40	233,60	-	-	-	233,60	-
18.010	QDLF-VESTIÁRIO								11.562,81	-	-	-	11.562,81	-
18.010.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00		0,00	1,00	904,76	904,76	-	-	-	904,76	-
18.010.002	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00		0,00	1,00	136,71	136,71	-	-	-	136,71	-
18.010.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00		0,00	1,00	21,09	21,09	-	-	-	21,09	-
18.010.004	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C	m	237,00	0,00		0,00	237,00	30,75	7.287,75	-	-	-	7.287,75	-
18.010.005	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	0,00		0,00	1,00	644,83	644,83	-	-	-	644,83	-
18.010.006	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90º C	m	81,00	0,00		0,00	81,00	16,99	1.376,19	-	-	-	1.376,19	-
18.010.007	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 100A, 30mA, fornecimento e instalação	und	1,00	0,00		0,00	1,00	428,37	428,37	-	-	-	428,37	-
18.010.008	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00		0,00	3,00	105,40	316,20	-	-	-	316,20	-
18.010.009	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	3,00	0,00		0,00	3,00	14,31	42,93	-	-	-	42,93	-
18.010.010	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	6,00	0,00		0,00	6,00	67,33	403,98	-	-	-	403,98	-
18.011	QDLF-ILUM. EXTERNA								14.489,48	-	-	-	14.489,48	-
18.011.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00		0,00	1,00	293,25	293,25	-	-	-	293,25	-
18.011.002	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	20,00	0,00		0,00	20,00	136,71	2.734,20	-	-	-	2.734,20	-
18.011.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	20,00	0,00		0,00	20,00	21,09	421,80	-	-	-	421,80	-
18.011.004	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af. 03/2023	m	24,00	0,00		0,00	24,00	10,75	258,00	-	-	-	258,00	-
18.011.005	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	1,00	0,00		0,00	1,00	58,40	58,40	-	-	-	58,40	-
18.011.006	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	10,19	10.190,00	-	-	-	10.190,00	-
18.011.007	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1,00	0,00		0,00	1,00	188,71	188,71	-	-	-	188,71	-
18.011.008	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	2,00	0,00		0,00	2,00	67,16	134,32	-	-	-	134,32	-
18.011.009	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	2,00	0,00		0,00	2,00	105,40	210,80	-	-	-	210,80	-
18.012	PONTOS DIVERSOS								129.416,67	9.055,22	-	9.055,22	120.361,45	7,00

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Atribuição sigilada por DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
CPF: 041927412-0
RFB, CUNHA MENEZES, CLÁUDIA BRUNO DA TRINDADE, PAULINA
RFB, CUNHA MENEZES, CLÁUDIA BRUNO DA TRINDADE, PAULINA
CUNHA MENEZES, CLÁUDIA BRUNO DA TRINDADE, PAULINA
SANTOS:98986546515
Assinatura: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.05.06 09:23:05-07:07
Folha 107 de 107 Versão: 2025.1.0

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

16/21

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, EM ITABAIANA/SE									BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO: 041/2024		
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA									B.M. Nº 08				ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									Período: 06/01/2025 a 28/02/2025				DATA: 06/05/2025		
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido	
25.001.001	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. af_09/2020	m2	91,17	0,00		0,00	91,17	61,68	5.623,37	-	-	-	5.623,37	-	
25.001.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	405,64	0,00		0,00	405,64	13,71	5.561,32	-	-	-	5.561,32	-	
25.001.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	118,55	0,00		0,00	118,55	16,55	1.962,00	-	-	-	1.962,00	-	
25.001.004	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	7,39	0,00		0,00	7,39	615,40	4.547,81	-	-	-	4.547,81	-	
25.002	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO								98.827,98	-	-	-	98.827,98	-	
25.002.001	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020	m2	12,60	0,00		0,00	12,60	51,74	651,92	-	-	-	651,92	-	
25.002.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	m2	44,58	0,00		0,00	44,58	36,25	1.616,03	-	-	-	1.616,03	-	
25.002.003	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	m2	891,64	0,00		0,00	891,64	3,79	3.379,32	-	-	-	3.379,32	-	
25.002.004	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021	kg	891,64	0,00		0,00	891,64	17,80	15.871,19	-	-	-	15.871,19	-	
25.002.005	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020	m2	816,19	0,00		0,00	816,19	94,72	77.309,52	-	-	-	77.309,52	-	
26	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								71.458,27	-	-	-	71.458,27	-	
26.001	PAREDES								47.160,93	-	-	-	47.160,93	-	
26.001.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	331,76	0,00		0,00	331,76	47,49	15.755,28	-	-	-	15.755,28	-	
26.001.002	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m2	140,70	0,00		0,00	140,70	223,21	31.405,65	-	-	-	31.405,65	-	
26.002	ARQUIBANCADA								24.297,34	-	-	-	24.297,34	-	
26.002.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	109,04	0,00		0,00	109,04	47,49	5.178,31	-	-	-	5.178,31	-	
26.002.002	Laje pré-moldada unidirecional, biapoada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020	m2	83,42	0,00		0,00	83,42	229,19	19.119,03	-	-	-	19.119,03	-	
27	SISTEMAS DE COBERTURA								546.361,14	-	-	-	546.361,14	-	
27.001	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada e = 0,5 mm - Rev_03	m2	995,55	0,00		0,00	995,55	177,37	176.580,70	-	-	-	176.580,70	-	
27.002	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada e = 0,5 mm - Rev_03	m2	119,13	0,00		0,00	119,13	177,37	21.130,09	-	-	-	21.130,09	-	
27.003	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada e = 0,5 mm - Rev_03	m2	296,02	0,00		0,00	296,02	177,37	52.505,07	-	-	-	52.505,07	-	
27.004	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar	m2	28,56	0,00		0,00	28,56	94,10	2.687,50	-	-	-	2.687,50	-	
27.005	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 25cm	m	75,28	0,00		0,00	75,28	74,61	5.616,64	-	-	-	5.616,64	-	
27.006	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	1.024,11	0,00		0,00	1.024,11	216,04	223.296,94	-	-	-	223.296,94	-	
27.007	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	296,02	0,00		0,00	296,02	218,04	64.544,20	-	-	-	64.544,20	-	
28	IMPERMEABILIZAÇÃO								3.641,10	-	-	-	3.641,10	-	
28.001	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	137,40	0,00		0,00	137,40	26,50	3.641,10	-	-	-	3.641,10	-	
29	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS								49.705,66	-	-	-	49.705,66	-	
29.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	670,52	0,00		0,00	670,52	74,15	49.705,66	-	-	-	49.705,66	-	

João Vânia de Almeida
 Arq e Urb - CAU/SE A126362-6
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

DANYELSON LEITE
 DOS
 SANTOS:98986546515

Análise e assinatura por DANYELSON LEITE DOS
 SANTOS:98986546515
 CPF: 042.018.110-01 - Rua: Rua da Indústria, s/nº - Centro - Itabaiana/SE - CEP: 55.000-000
 INSC. ESTADUAL: 000.000.000-00 - INSC. MUNIC. 000.000.000-00
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 - DANYELSON LEITE DOS
 SANTOS:98986546515
 Rastreie: Em sites e autor deste documento
 em: Localizações
 Data: 2025-05-06 08:23:30-02:00
 Para PDF: https://www.veicula.com.br/

Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, EM ITABAIANA/SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 041/2024					
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M. Nº 08					ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 06/01/2025 a 28/02/2025					DATA: 06/05/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
32.002	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	m	122,00	0,00		0,00	122,00	110,56	13.488,32	-	-	-	13.488,32	-
32.003	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	m	158,00	0,00		0,00	158,00	84,61	13.368,38	-	-	-	13.368,38	-
32.004	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	6,00	0,00		0,00	6,00	55,52	333,12	-	-	-	333,12	-
32.005	Suporte isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalação. af_12/2017	un	6,00	0,00		0,00	6,00	26,75	160,50	-	-	-	160,50	-
33	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								28.836,37	-	-	-	28.836,37	-
33.001	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com arco e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	par	1,00	0,00		0,00	1,00	7.813,91	7.813,91	-	-	-	7.813,91	-
33.002	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	0,00		0,00	1,00	4.323,90	4.323,90	-	-	-	4.323,90	-
33.003	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	0,00		0,00	1,00	1.183,51	1.183,51	-	-	-	1.183,51	-
33.004	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	26,37	0,00		0,00	26,37	588,36	15.515,05	-	-	-	15.515,05	-
34	SERVIÇOS FINAIS								2.297,78	-	-	-	2.297,78	-
34.001	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af_04/2019	m2	986,17	0,00		0,00	986,17	2,33	2.297,78	-	-	-	2.297,78	-
TOTAL:									8.999.766,36	3.112.875,46	271.694,55	3.384.570,01	5.615.196,35	37,61
PERCENTUAL			MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					APROVADO PARA PAGAMENTO ____/____/____			PROTOCOLO			
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº _____ FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PERFEITA ORDEM EM ____/____/____			ASSINATURA DA EMPRESA											


Jeovânio Oliveira da Trindade
 Arq e Urb - CAUSE A126362-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Assinatura digitalizada por DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
 ID: C15B1-042D-8888-CU@Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CUNHIFE =CPF A1, QUINEM BRANCO, CU=22M0277000111, CU=100000000000, CN=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
 Emitido em São Paulo em 06/05/2025 às 09:25:30-0370
 Data: 2025.05.06 09:25:30-0370
 Font: PDF Standard, Versão: 2.0.0.1.0


Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
04.001.007	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 06/2022	kg	169,52
> 169,52 kg (Conforme Projeto)			
04.001.008	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	8,70
> 8,70 kg (Conforme Projeto)			
04.001.009	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	239,77
> 239,77 kg (Conforme Projeto)			
04.001.010	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	18,96
> (3,97 m³) + (9,26 m³) + (3,97 m³) = 18,96 m³			
04.002	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
04.002.001	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017	m2	234,08
> 234,08 m² (Conforme projeto)			
04.002.003	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	386,30
> 386,30 kg (Conforme projeto)			
04.002.004	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	6,96
> 6,96 kg (Conforme projeto)			
04.002.005	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 06/2022	kg	11,15
> 11,15 kg (Conforme projeto)			
04.002.006	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	194,38
> 194,38 kg (Conforme projeto)			
04.002.007	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	17,68
> 17,68 m³ (Conforme projeto)			

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
MEX: C=BR, O=CPF Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, CN=CPF BR/AR, OU=CPM BRANCO, CN=28027800111, OU=Subcoordenadora, CN=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
Módulo: Eu sou o autor deste documento
Data: 2023.05.06 10:54:02 CTR02
Fórmula PDF Render: Versão: 2020.1.0

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CREA/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Página 2 de 5

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
05.004.001	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	30,80
> 30,80 m			
06	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
06.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
06.002.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	348,41
> (2,70 x (33,95 x 2 + 7,37 x 7 + 4,65 + 2,45 x 2)) = 348,41 m ²			
08	SISTEMAS DE COBERTURA		
08.001	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	244,52
> (5,62 + 7,47) x 23,35 = 305,65 m ² x 80,00 % = 244,52 m ²			
09	IMPERMEABILIZAÇÃO		
09.001	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	522,68
> (86,34 m ² + 186,48 m ²) + (174,31 m ² + 75,55 m ²) = 522,68 m ²			
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
10.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 10/2022	m2	163,00
> (81,50) x 2 = 163,00 m ²			
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
19.002	Aco ca-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhao	kg	9,87
> (4 x 3,00 m x 2 un x 0,617 kg/m) = 14,81 kg ∴ Valor medido = 9,87 kg			
19.007	Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af 12/2017	m	12,00
> (3,00 x 4 un) = 12,00 m			
22	SERVIÇOS PRELIMINARES(QUADRA)		
22.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	986,17
> 986,17 m ² (Conforme Projeto)			
24	FUNDAÇÕES		
24.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		

Jevânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAUISE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Eng^o Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
24.001.001	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado manualmente (exclusive mobilização e desmobilização). af 01/2020	m	71,50
> (13 un x 5,50 m) = 71,50 m			
24.001.007	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af 11/2016	m3	1,57
> (13 un x 5,50 m x 0,022 m³/m) = 1,57 m³			

Jeovânio Oliveira da Trindade
 Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

DANYELSON LEITE
 DOS
 SANTOS:98986546515

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS
 SANTOS:98986546515
 NO: CN=LEITE DOS SANTOS, OU=Secretaria de Recursos Humanos, CN=Prefeitura Municipal de Itabaiana, OU=SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CN=LEITE DOS SANTOS:98986546515
 Fecha: 2025.05.06 10:54:02-03'00"
 Fonte: PDF Renderer Versão: 2025.1.8

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 08

CONTRATO: 041/2024

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 11/03/2024



PLACA DA OBRA;



ESTACA; ESCAVAÇÃO E CONCRETO MAGRO DO BLOCO



CONCRETO MAGRO: MONTAGEM DA FERRAGEM - BLOCOS; ARRANQUE DE PILARES; VIGAS BALDRAME



FORMAS; MONTAGEM DA FERRAGEM - BLOCOS; ARRANQUE DE PILARES; VIGAS BALDRAME



CONCRETO - BLOCOS E VIGAS BALDRAME



IMPERMEABILIZAÇÃO - BLOCOS E VIGAS BALDRAME; ATERRO COMPACTADO; CAMADA IMPERMEABILIZADORA

Jevânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAUSE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:98986546
515

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS SANTOS:9898654615
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22852276000111, OU=videoconferencia, CN=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:9898654615
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.09 10:05:35-03'00"
Font PDF Reader: Versão: 2025.1.0

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

FOLHA 1

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 08

CONTRATO: 041/2024

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 11/03/2024



IMPERMEABILIZAÇÃO - BLOCOS E VIGAS BALDRAME;
FORMA DE MADEIRA




IMPERMEABILIZAÇÃO - BLOCOS E VIGAS BALDRAME;
ATERRO COMPACTADO



ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO



ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO; FERRAGEM,
FORMA E CONCRETO DOS PILARES

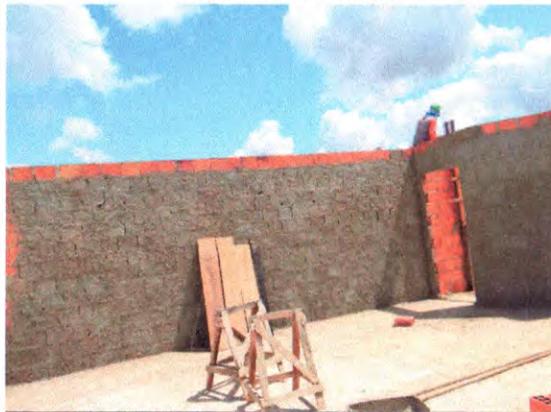

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E CHAPISCO



ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E CHAPISCO

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

**DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:98986546
515**

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=22862276000111, OU=
videoconferencia, CN=DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.09 10:05:35-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 2

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, EM ITABAIANA/SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 08

CONTRATO: 041/2024

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 11/03/2024



LOCAÇÃO EM GABARITO DE MADEIRA - QUADRA



FERRAGEM ESTACA - QUADRA




EXECUÇÃO DE ESTACA - QUADRA _ ESCAVAÇÃO,
CONCRETO E FERRAGEM



COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA



COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA

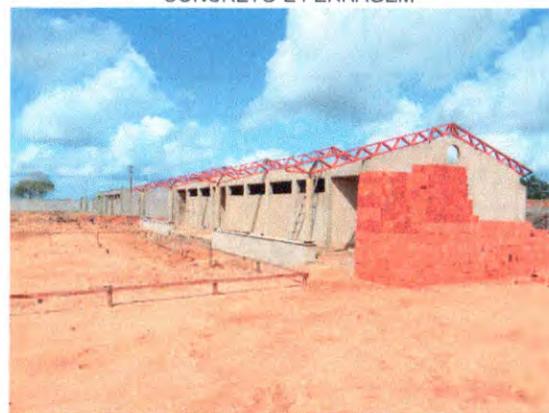

COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA

Jeovânio Oliveira de Oliveira
Arq e Urb - CAUSE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:98986540
515

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986540515
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=22862276000111, OU=
videoconferencia, CN=DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986540515
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.09 10:05:35-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

FOLHA 3
