




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO N° 069/2023								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.N°. 09/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023								
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 12/07/2023 A 19/07/2023				DATA: 19/07/2023								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	411.246,98	40.604,39	451.851,37		1.830.381,13	19,80
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	9.024,73	901,47	9.926,20	44,52	2.226.000,00	401.780,99	40.133,44	441.914,43		1.784.085,57	19,85
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00				0,00	9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	10,05	0,50	10,55	941,89	47.094,50	9.465,99	470,95	9.936,94		37.157,56	21,10
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	21.480,52	2.126,82	23.607,34		95.612,66	19,80
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	90,08	9,00	99,08	123,60	61.800,00	11.133,90	1.112,40	12.246,30		49.553,70	19,82
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	216,23	21,20	237,43	47,85	57.420,00	10.346,62	1.014,42	11.361,04		46.058,96	19,79
Total geral								2.401.452,50	432.727,50	42.731,21	475.458,71		1.925.993,79	19,80
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2023.07.19 14:25:14 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___			



Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil / CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO N° 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.N°. 09/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 12/07/2023 A 19/07/2023	DATA: 19/07/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	12/07/2023	RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,90	2,10	6,09
2	12/07/2023	RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,80	2,40	6,72
3	12/07/2023	RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,50	1,00	1,50
4	12/07/2023	RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,60	1,90	4,94
5	12/07/2023	RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	12,00	5,30	63,60
6	12/07/2023	RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	11,10	3,50	38,85
7	12/07/2023	RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	7,40	4,10	30,34
8	13/07/2023	RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	10,80	1,30	14,04
9	13/07/2023	RUA ANTÔNIO TEIXEIRA LOBO	ROTARY CLUB	17,20	1,80	30,96
10	13/07/2023	RUA ANTÔNIO TEIXEIRA LOBO	ROTARY CLUB	11,50	2,10	24,15
11	13/07/2023	RUA JOÃO ANDRADE	ROTARY CLUB	13,20	2,20	29,04
12	13/07/2023	RUA P	SÃO CRISTÓVÃO	2,70	2,20	5,94
13	13/07/2023	RUA P	SÃO CRISTÓVÃO	2,30	2,10	4,83
14	13/07/2023	RUA P	SÃO CRISTÓVÃO	3,70	1,50	5,55
15	13/07/2023	RUA P	SÃO CRISTÓVÃO	6,60	4,20	27,72
16	14/07/2023	RUA P	SÃO CRISTÓVÃO	4,00	1,80	7,20
17	14/07/2023	RUA P	SÃO CRISTÓVÃO	5,40	3,30	17,82
18	14/07/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	16,30	7,50	122,25
19	17/07/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	15,10	12,50	188,75
20	18/07/2023	RUA A	CONJ. FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	15,90	3,70	58,83
21	18/07/2023	RUA A	CONJ. FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	32,40	3,10	100,44
22	19/07/2023	RUA A	CONJ. FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	36,10	3,10	111,91
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)=>						901,47

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma digital
por MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.07.19
14:25:38 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09/2023



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO




RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO

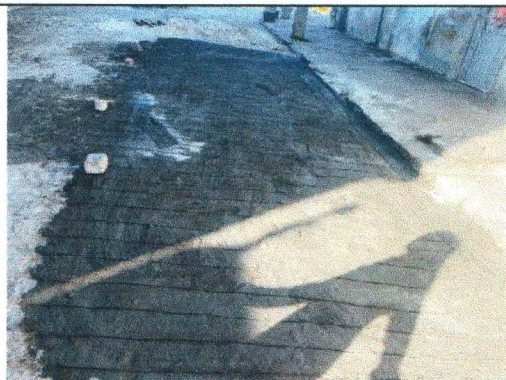

RUA SÃO PEDRO

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng.º Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.07.19
14:26:06 -03'00'




RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA ANTÔNIO TEIXEIRA LOBO

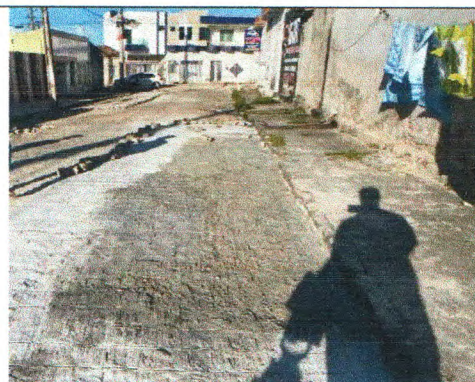


RUA ANTÔNIO TEIXEIRA LOBO



RUA JOÃO ANDRADE



RUA P


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.07.19
14:26:20 -03'00'


Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana




RUA P



RUA P



RUA P

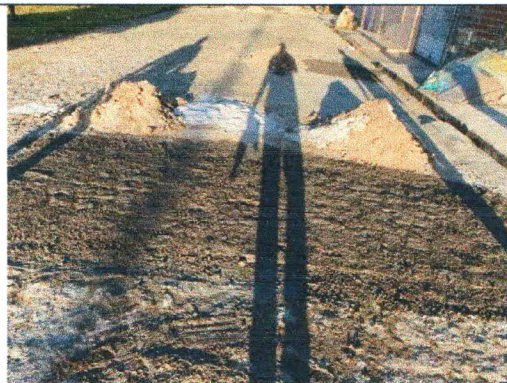

RUA P



RUA P



RUA O

José Robson Santos da Paixão
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2023.07.19
14:26:35 -03'00'

Yan Henrique Tavares Santana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana




RUA O




RUA A



RUA A

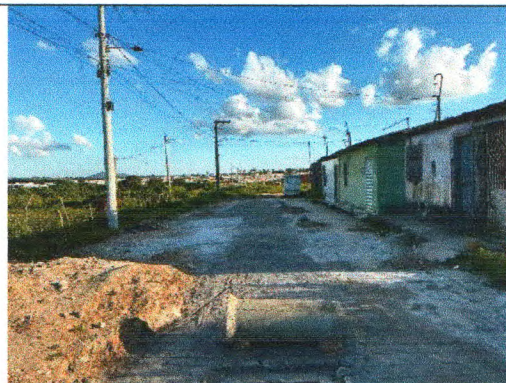

RUA A


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2023.07.19
14:26:50 -03'00'


Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
