

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VERA CÂNDIDA COSTA SANTANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 220/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº. 09					ORDEM DE SERVIÇO: 05/12/2023					
			PERÍODO: 20/09/2024 a 20/10/2024					DATA: 21/10/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	PROJETO CIVIL - AMPLIAÇÃO							384.471,62	324.342,83	18.983,38	343.326,21	41.145,41	89,30
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							20.243,20	6.988,40	0,00	6.988,40	13.254,81	34,52
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	347,84	2.087,04	2.087,04	0,00	2.087,04	0,00	100,00
01.01.002	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af 05/2018	m2	370,68	370,68	0,00	370,68	3,01	1.115,75	1.115,75	0,00	1.115,75	0,00	100,00
01.01.003	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	10,00	0,00	0,00	0,00	249,23	2.492,30	0,00	0,00	0,00	2.492,30	0,00
01.01.004	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	50,00	0,00	0,00	0,00	181,76	9.088,00	0,00	0,00	0,00	9.088,00	0,00
01.01.005	Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à área construída acrescida da área de cobertura (para compensar a fundação).	m2	370,68	257,00	0,00	257,00	8,65	3.206,38	2.223,05	0,00	2.223,05	983,33	69,33
01.01.006	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	370,68	257,00	0,00	257,00	6,08	2.253,73	1.562,56	0,00	1.562,56	691,17	69,33
01.02	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES							61.509,14	58.503,61	0,00	58.503,61	3.005,53	95,11
01.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	50,10	50,10	0,00	50,10	44,13	2.210,91	2.210,91	0,00	2.210,91	0,00	100,00
01.02.002	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af 05/2021	m3	1,85	0,14	0,00	0,14	479,95	887,91	69,11	0,00	69,11	818,79	7,78
01.02.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	14,76	14,76	0,00	14,76	2.161,37	31.901,82	31.901,82	0,00	31.901,82	0,00	100,00
01.02.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	16,81	11,52	0,00	11,52	405,61	6.818,30	4.672,63	0,00	4.672,63	2.145,68	68,53
01.02.005	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	98,05	96,42	0,00	96,42	25,19	2.469,88	2.428,82	0,00	2.428,82	41,06	98,34
01.02.006	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água Reatero manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	79,63	79,63	0,00	79,63	152,29	12.126,85	12.126,85	0,00	12.126,85	0,00	100,00
01.02.007	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	18,53	18,53	0,00	18,53	27,36	506,98	506,98	0,00	506,98	0,00	100,00
01.02.008	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	3.002,53	3.002,53	0,00	3.002,53	1,40	4.203,54	4.203,54	0,00	4.203,54	0,00	100,00
01.03	SUPERESTRUTURA							24.276,50	24.276,50	0,00	24.276,50	0,00	100,00
01.03.001	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS							19.236,19	19.236,19	0,00	19.236,19	0,00	100,00
01.03.001.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	8,90	8,90	0,00	8,90	2.161,37	19.236,19	19.236,19	0,00	19.236,19	0,00	100,00
01.03.002	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS							5.040,30	5.040,30	0,00	5.040,30	0,00	100,00
01.03.002.001	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af 03/2016	m	4,80	4,80	0,00	4,80	36,67	176,02	176,02	0,00	176,02	0,00	100,00
01.03.002.002	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af 03/2016	m	41,60	41,60	0,00	41,60	59,78	2.486,85	2.486,85	0,00	2.486,85	0,00	100,00
01.03.002.003	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af 03/2016	m	41,60	41,60	0,00	41,60	57,15	2.377,44	2.377,44	0,00	2.377,44	0,00	100,00
01.04	ESQUADRIAS							18.432,78	5.407,48	13.025,30	18.432,78	0,00	100,00
01.04.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	4,00	0,00	4,00	1.351,87	5.407,48	5.407,48	0,00	5.407,48	0,00	100,00
01.04.002	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01 10/2021	m2	16,90	0,00	16,90	16,90	265,61	4.488,81	0,00	4.488,81	4.488,81	0,00	100,00
01.04.003	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	21,12	0,00	21,12	21,12	404,19	8.536,49	0,00	8.536,49	8.536,49	0,00	100,00
01.05	COBERTURA							103.790,87	76.874,94	0,00	76.874,94	26.915,93	74,07
01.05.001	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af 07/2019	un	8,00	0,00	0,00	0,00	1.967,49	15.739,92	0,00	0,00	0,00	15.739,92	0,00
01.05.002	Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af 07/2019	m2	370,68	364,05	0,00	364,05	68,94	25.554,68	25.097,61	0,00	25.097,61	457,07	98,21

CAL CONSTRUÇÕES LTDA

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 1270606578-8

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VERA CÂNDIDA COSTA SANTANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 220/2023						
			B.M.Nº. 09				ORDEM DE SERVIÇO: 05/12/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			PERÍODO: 20/09/2024 a 20/10/2024				DATA: 21/10/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
01.05.003	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	370,68	364,05	0,00	364,05	32,10	11.898,83	11.686,01	0,00	11.686,01	212,82	98,21
01.05.004	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	117,85	117,85	0,00	117,85	8,38	987,58	987,58	0,00	987,58	0,00	100,00
01.05.005	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	46,00	46,00	0,00	46,00	28,30	1.301,80	1.301,80	0,00	1.301,80	0,00	100,00
01.05.006	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps	m2	192,00	0,00	0,00	0,00	32,45	6.230,40	0,00	0,00	0,00	6.230,40	0,00
01.05.007	Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm	m2	55,00	0,00	0,00	0,00	70,92	3.900,60	0,00	0,00	0,00	3.900,60	0,00
01.05.008	Impermeabilização com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m2	192,00	192,00	0,00	192,00	10,53	2.021,76	2.021,76	0,00	2.021,76	0,00	100,00
01.05.009	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	205,35	205,35	0,00	205,35	174,24	35.780,18	35.780,18	0,00	35.780,18	0,00	100,00
01.05.010	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	12,00	0,00	0,00	0,00	31,26	375,12	0,00	0,00	0,00	375,12	0,00
01.06	ELEVAÇÃO							44.086,65	44.086,65	0,00	44.086,65	0,00	100,00
01.06.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	347,87	347,87	0,00	347,87	36,99	12.867,71	12.867,71	0,00	12.867,71	0,00	100,00
01.06.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	695,74	695,74	0,00	695,74	6,08	4.230,10	4.230,10	0,00	4.230,10	0,00	100,00
01.06.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	347,87	347,87	0,00	347,87	25,15	8.748,93	8.748,93	0,00	8.748,93	0,00	100,00
01.06.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	347,87	347,87	0,00	347,87	28,38	9.872,55	9.872,55	0,00	9.872,55	0,00	100,00
01.06.005	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	192,00	192,00	0,00	192,00	11,63	2.232,28	2.232,28	0,00	2.232,96	0,00	100,00
01.06.006	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	192,00	192,00	0,00	192,00	31,95	6.134,68	6.134,68	0,00	6.134,68	0,00	100,00
01.07	REVESTIMENTO							15.011,64	15.011,64	0,00	15.011,64	0,00	100,00
01.07.001	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	289,80	289,80	0,00	289,80	51,80	15.011,64	15.011,64	0,00	15.011,64	0,00	100,00
01.08	PINTURA							25.992,33	25.992,33	0,00	25.992,33	0,00	100,00
01.08.001	PAREDE							25.656,73	25.656,73	0,00	25.656,73	0,00	100,00
01.08.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	528,96	528,96	0,00	528,96	34,37	18.180,36	18.180,36	0,00	18.180,36	0,00	100,00
01.08.001.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	184,83	184,83	0,00	184,83	40,45	7.476,37	7.476,37	0,00	7.476,37	0,00	100,00
01.08.002	ESQUADRIA							335,60	335,60	0,00	335,60	0,00	100,00
01.08.002.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	18,18	18,18	0,00	18,18	18,46	335,60	335,60	0,00	335,60	0,00	100,00
01.09	PAVIMENTAÇÃO							39.855,10	39.855,10	0,00	39.855,10	0,00	100,00
01.09.001	INTERNO							23.224,32	23.224,32	0,00	23.224,32	0,00	100,00
01.09.001.001	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	192,00	192,00	0,00	192,00	23,05	4.425,60	4.425,60	0,00	4.425,60	0,00	100,00
01.09.001.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	192,00	192,00	0,00	192,00	20,31	3.899,52	3.899,52	0,00	3.899,52	0,00	100,00
01.09.001.003	Lona plástica preta	m2	192,00	192,00	0,00	192,00	5,40	1.036,80	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00	100,00
01.09.001.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	192,00	192,00	0,00	192,00	29,38	5.640,96	5.640,96	0,00	5.640,96	0,00	100,00
01.09.001.005	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m2	192,00	192,00	0,00	192,00	42,82	8.221,44	8.221,44	0,00	8.221,44	0,00	100,00
01.09.002	EXTERNO							16.630,78	16.630,78	0,00	16.630,78	0,00	100,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 170606578-8

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VERA CÂNDIDA COSTA SANTANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 220/2023					
			B.M.Nº. 09					ORDEM DE SERVIÇO: 05/12/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			PERÍODO: 20/09/2024 a 20/10/2024					DATA: 21/10/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
01.09.002.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	126,08	126,08	0,00	126,08	20,31	2.560,68	2.560,68	0,00	2.560,68	0,00	100,00
01.09.002.002	Lona plástica preta	m2	126,08	126,08	0,00	126,08	5,40	680,83	680,83	0,00	680,83	0,00	100,00
01.09.002.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	126,08	126,08	0,00	126,08	29,38	3.704,23	3.704,23	0,00	3.704,23	0,00	100,00
01.09.002.004	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af. 06/2014	m2	126,08	126,08	0,00	126,08	42,82	5.398,75	5.398,75	0,00	5.398,75	0,00	100,00
01.09.002.005	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	88,45	88,45	0,00	88,45	48,46	4.286,29	4.286,29	0,00	4.286,29	0,00	100,00
01.10	DIVERSOS							11.582,93	3.061,67	5.879,12	8.940,79	2.642,14	77,19
01.10.001	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m2	19,20	0,00	16,64	16,64	296,73	5.697,21	0,00	4.937,59	4.937,59	759,62	86,67
01.10.002	Limpeza geral	m2	370,68	0,00	370,68	370,68	2,54	941,53	0,00	941,53	941,53	0,00	100,00
01.10.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.882,51	1.882,51	0,00	0,00	0,00	1.882,51	0,00
01.10.004	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	m	13,86	13,86	0,00	13,86	220,90	3.061,67	3.061,67	0,00	3.061,67	0,00	100,00
01.11	ELÉTRICO							19.690,85	19.611,89	78,96	19.690,85	0,00	100,00
01.11.001	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	4,00	0,00	4,00	4,00	19,74	78,96	0,00	78,96	78,96	0,00	100,00
01.11.002	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	39,00	39,00	0,00	39,00	222,94	8.694,66	8.694,66	0,00	8.694,66	0,00	100,00
01.11.003	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	32,00	32,00	0,00	32,00	179,75	5.752,00	5.752,00	0,00	5.752,00	0,00	100,00
01.11.004	Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	6,00	6,00	0,00	6,00	69,15	414,90	414,90	0,00	414,90	0,00	100,00
01.11.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	28,00	28,00	0,00	28,00	100,73	2.820,44	2.820,44	0,00	2.820,44	0,00	100,00
01.11.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	5,00	5,00	0,00	5,00	94,05	470,25	470,25	0,00	470,25	0,00	100,00
01.11.007	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	1,00	1,00	0,00	1,00	207,08	207,08	207,08	0,00	207,08	0,00	100,00
01.11.008	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	6,00	6,00	0,00	6,00	208,76	1.252,56	1.252,56	0,00	1.252,56	0,00	100,00
2	PROJETO CIVIL - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO							776.506,15	580.948,02	56.295,06	637.243,08	139.263,07	82,07
02.01	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO							138.648,97	117.031,70	7.819,40	124.851,10	13.797,87	90,05
02.01.001	Demolição de reboco	m2	228,46	44,25	61,02	105,27	10,09	2.305,16	446,48	615,69	1.062,17	1.242,99	46,08
02.01.002	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	41,04	41,04	0,00	41,04	18,14	744,47	744,47	0,00	744,47	0,00	100,00
02.01.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	1.982,55	1.982,55	0,00	1.982,55	16,84	33.386,14	33.386,14	0,00	33.386,14	0,00	100,00
02.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	901,50	901,50	0,00	901,50	21,68	19.544,52	19.544,52	0,00	19.544,52	0,00	100,00
02.01.005	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	14,00	14,00	0,00	14,00	22,66	317,24	317,24	0,00	317,24	0,00	100,00
02.01.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	1.072,82	793,27	101,92	895,19	70,68	75.826,92	56.068,32	7.203,71	63.272,03	12.554,89	83,44
02.01.007	Remoção de vaso sanitário	un	8,00	8,00	0,00	8,00	14,66	117,28	117,28	0,00	117,28	0,00	100,00
02.01.008	Coleta e carga manuais de entulho	m3	81,26	81,26	0,00	81,26	20,26	1.646,33	1.646,33	0,00	1.646,33	0,00	100,00
02.01.009	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	2.193,97	2.193,97	0,00	2.193,97	2,17	4.760,91	4.760,91	0,00	4.760,91	0,00	100,00
02.02	PAVIMENTAÇÃO							150.037,16	132.885,00	32,32	132.917,32	17.119,84	88,59
02.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	98,13	55,74	0,00	55,74	44,13	4.330,48	2.459,81	0,00	2.459,81	1.870,67	56,80
02.02.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	98,13	55,74	0,00	55,74	20,26	1.988,11	1.129,29	0,00	1.129,29	858,82	56,80
02.02.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	2.649,51	1.443,15	0,00	1.443,15	1,40	3.709,31	2.020,41	0,00	2.020,41	1.688,90	54,47

CAL CONSTRUÇÕES LTDA

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270606578-8

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VERA CÂNDIDA COSTA SANTANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 220/2023						
			B.M.Nº. 09				ORDEM DE SERVIÇO: 05/12/2023						
			PERÍODO: 20/09/2024 a 20/10/2024				DATA: 21/10/2024						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
02.02.004	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	130,36	130,36	0,00	130,36	152,29	19.852,52	19.852,52	0,00	19.852,52	0,00	100,00
02.02.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	3.519,72	3.519,72	0,00	3.519,72	1,40	4.927,61	4.927,61	0,00	4.927,61	0,00	100,00
02.02.006	Impermeabilização de alicerces e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	150,57	150,57	0,00	150,57	25,19	3.792,86	3.792,86	0,00	3.792,86	0,00	100,00
02.02.007	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	817,69	817,69	0,00	817,69	20,31	16.607,28	16.607,28	0,00	16.607,28	0,00	100,00
02.02.008	Lona plástica preta	m2	817,69	817,69	0,00	817,69	5,40	4.415,53	4.415,53	0,00	4.415,53	0,00	100,00
02.02.009	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	639,44	639,44	0,00	639,44	23,05	14.739,09	14.739,09	0,00	14.739,09	0,00	100,00
02.02.010	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	817,69	816,59	1,10	817,69	29,38	24.023,73	23.991,41	32,32	24.023,73	0,00	100,00
02.02.011	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	185,00	92,50	0,00	92,50	40,22	7.440,70	3.720,35	0,00	3.720,35	3.720,35	50,00
02.02.012	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	256,24	6,00	0,00	6,00	35,89	9.196,45	215,34	0,00	215,34	8.981,11	2,34
02.02.013	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af. 06/2014	m2	817,69	817,69	0,00	817,69	42,82	35.013,49	35.013,49	0,00	35.013,49	0,00	100,00
02.03	PAREDES							101.124,15	70.769,87	2.521,96	73.291,83	27.832,32	72,48
02.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	173,23	44,25	61,02	105,27	12,95	2.243,33	573,04	790,21	1.363,25	880,08	60,77
02.03.002	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	122,38	122,38	0,00	122,38	3,03	370,81	370,81	0,00	370,81	0,00	100,00
02.03.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	678,83	44,25	0,00	44,25	25,15	17.072,57	1.112,89	0,00	1.112,89	15.959,69	6,52
02.03.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	486,59	243,30	61,02	304,32	28,38	13.809,42	6.904,85	1.731,75	8.636,60	5.172,82	62,54
02.03.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	1.305,56	1.193,21	0,00	1.193,21	51,80	67.628,01	61.808,28	0,00	61.808,28	5.819,73	91,39
02.04	COBERTURA							27.355,77	26.311,99	0,00	26.311,99	1.043,78	96,18
02.04.001	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	1.018,80	1.018,77	0,00	1.018,77	14,28	14.548,46	14.548,04	0,00	14.548,04	0,43	100,00
02.04.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 06/2022	m	15,00	0,00	0,00	0,00	31,26	468,90	0,00	0,00	0,00	468,90	0,00
02.04.003	Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm	m2	8,10	0,00	0,00	0,00	70,92	574,45	0,00	0,00	0,00	574,45	0,00
02.04.004	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	27,00	27,00	0,00	27,00	40,08	1.082,16	1.082,16	0,00	1.082,16	0,00	100,00
02.04.005	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	278,93	278,93	0,00	278,93	8,38	2.337,43	2.337,43	0,00	2.337,43	0,00	100,00
02.04.006	Cumeleira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	151,86	151,86	0,00	151,86	23,21	3.524,67	3.524,67	0,00	3.524,67	0,00	100,00
02.04.007	Impermeabilização com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m2	457,71	457,71	0,00	457,71	10,53	4.819,69	4.819,69	0,00	4.819,69	0,00	100,00
02.05	ESQUADRIAS							40.892,04	27.644,08	10.779,63	38.423,71	2.468,33	93,96
02.05.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	5,00	0,00	5,00	1.351,87	6.759,35	6.759,35	0,00	6.759,35	0,00	100,00
02.05.002	Revisão de esquadria de ferro	m2	36,96	0,00	36,96	36,96	144,34	5.334,81	0,00	5.334,81	5.334,81	0,00	100,00
02.05.003	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01 10/2021	m2	10,00	0,00	10,00	10,00	265,61	2.656,10	0,00	2.656,10	2.656,10	0,00	100,00
02.05.004	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m2	5,40	0,00	5,40	5,40	516,43	2.788,72	0,00	2.788,72	2.788,72	0,00	100,00
02.05.005	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	10,00	9,00	0,00	9,00	1.537,18	15.371,80	13.834,62	0,00	13.834,62	1.537,18	90,00
02.05.006	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	und	6,00	5,30	0,00	5,30	1.330,21	7.981,26	7.050,11	0,00	7.050,11	931,15	88,33
02.06	HIDROSSANITÁRIO							4.651,74	4.359,44	0,00	4.359,44	292,30	93,72

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VERA CÂNDIDA COSTA SANTANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 220/2023					
			B.M.Nº. 09					ORDEM DE SERVIÇO: 05/12/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			PERÍODO: 20/09/2024 a 20/10/2024					DATA: 21/10/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
02.06.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	16,00	16,00	0,00	16,00	122,48	1.959,69	1.959,69	0,00	1.959,69	0,00	100,00
02.06.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	20,00	20,00	0,00	20,00	80,68	1.613,60	1.321,30	0,00	1.321,30	292,30	81,89
02.06.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00	5,00	0,00	5,00	113,94	569,70	569,70	0,00	569,70	0,00	100,00
02.06.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	und	1,00	1,00	0,00	1,00	508,75	508,75	508,75	0,00	508,75	0,00	100,00
02.07 METAIS E LOUÇAS								4.866,26	4.546,18	320,08	4.866,24	0,00	100,00
02.07.001	Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga - Rev 04	un	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.002	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.003	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	9,00	9,00	0,00	9,00	35,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	100,00
02.07.004	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	und	7,00	7,00	0,00	7,00	425,83	2.980,81	2.980,81	0,00	2.980,81	0,00	100,00
02.07.005	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	und	1,00	1,00	0,00	1,00	593,03	593,03	593,03	0,00	593,03	0,00	100,00
02.07.006	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	6,00	6,00	0,00	6,00	109,56	657,36	657,36	0,00	657,36	0,00	100,00
02.07.007	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	und	2,00	0,00	2,00	2,00	160,04	320,08	0,00	320,08	320,08	0,00	100,00
02.08 PINTURAS								120.971,32	120.971,32	0,00	120.971,32	0,00	100,00
02.08.001 INTERNO								40.441,80	40.441,80	0,00	40.441,80	0,00	100,00
02.08.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	1.176,66	1.176,66	0,00	1.176,66	34,37	40.441,80	40.441,80	0,00	40.441,80	0,00	100,00
02.08.002 EXTERNO								72.104,15	72.104,15	0,00	72.104,15	0,00	100,00
02.08.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1.782,55	1.782,55	0,00	1.782,55	40,45	72.104,15	72.104,15	0,00	72.104,15	0,00	100,00
02.08.003 ESQUADRIAS								8.425,37	8.425,37	0,00	8.425,37	0,00	100,00
02.08.003.001	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	93,16	93,16	0,00	93,16	54,58	5.084,67	5.084,67	0,00	5.084,67	0,00	100,00
02.08.003.002	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	117,30	117,30	0,00	117,30	28,48	3.340,70	3.340,70	0,00	3.340,70	0,00	100,00
02.09 DIVERSOS								17.448,95	0,00	13.002,34	13.002,34	4.446,61	74,52
02.09.001	Limpeza geral	m2	1.240,25	0,00	1.240,25	1.240,25	2,54	3.150,24	0,00	3.150,24	3.150,24	0,00	100,00
02.09.002	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m2	38,40	0,00	24,96	24,96	296,73	11.394,43	0,00	7.406,38	7.406,38	3.988,05	65,00
02.09.003	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2")	m	2,00	0,00	2,00	2,00	305,74	611,48	0,00	611,48	611,48	0,00	100,00
02.09.004	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	10,00	0,00	8,00	8,00	229,28	2.292,80	0,00	1.834,24	1.834,24	458,56	80,00
02.10 CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO								92.667,25	72.230,07	5.080,97	77.311,04	15.356,21	83,43
02.10.001 SERVIÇOS PRELIMINARES								1.314,16	1.314,16	0,00	1.314,16	0,00	100,00
02.10.001.001	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af 05/2018	m2	54,94	54,94	0,00	54,94	3,01	165,37	165,37	0,00	165,37	0,00	100,00
02.10.001.002	Projeto de rede de esgoto sanitário com tratamento simples com área até 500m² (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado pela ADEMA.	m2	54,94	54,94	0,00	54,94	3,09	169,76	169,76	0,00	169,76	0,00	100,00
02.10.001.003	Projeto Hidráulico - Água fria com área até 500m². Observação Apresentar carta de viabilidade da DESO.	m2	54,94	54,94	0,00	54,94	3,09	169,76	169,76	0,00	169,76	0,00	100,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 170606578-8

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VERA CÂNDIDA COSTA SANTANA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 220/2023						
			B.M.Nº. 09				ORDEM DE SERVIÇO: 05/12/2023						
			PERÍODO: 20/09/2024 a 20/10/2024				DATA: 21/10/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
02.10.001.004	Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à área construída acrescida da área de cobertura (para compensar a fundação).	m2	54,94	54,94	0,00	54,94	8,65	475,23	475,23	0,00	475,23	0,00	100,00
02.10.001.005	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	54,94	54,94	0,00	54,94	6,08	334,04	334,04	0,00	334,04	0,00	100,00
02.10.002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							3.616,97	2.263,85	0,00	2.263,85	1.353,12	62,59
02.10.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,64	12,07	0,00	12,07	44,13	557,80	532,65	0,00	532,65	25,15	95,49
02.10.002.002	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	16,48	7,76	0,00	7,76	152,29	2.509,74	1.181,77	0,00	1.181,77	1.327,97	47,09
02.10.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	209,52	209,52	0,00	209,52	1,40	293,33	293,33	0,00	293,33	0,00	100,00
02.10.002.005	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	7,76	7,76	0,00	7,76	12,13	94,13	94,13	0,00	94,13	0,00	100,00
02.10.003	INFRAESTRUTURA							14.465,13	8.698,24	0,00	8.698,24	5.766,89	60,13
02.10.003.001	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af. 05/2021	m3	9,90	0,20	0,00	0,20	479,95	4.751,51	95,99	0,00	95,99	4.655,52	2,02
02.10.003.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	2,74	0,00	0,00	0,00	405,61	1.111,37	0,00	0,00	0,00	1.111,37	0,00
02.10.003.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,98	3,98	0,00	3,98	2.161,37	8.602,25	8.602,25	0,00	8.602,25	0,00	100,00
02.10.004	SUPERESTRUTURA							4.257,90	3.631,10	0,00	3.631,10	626,80	85,28
02.10.004.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,97	1,68	0,00	1,68	2.161,37	4.257,90	3.631,10	0,00	3.631,10	626,80	85,28
02.10.005	VERGA E CONTRAVERGAS							679,99	679,99	0,00	679,99	0,00	100,00
02.10.005.001	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af. 03/2016	m	2,60	2,60	0,00	2,60	36,67	95,34	95,34	0,00	95,34	0,00	100,00
02.10.005.002	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af. 03/2016	m	5,00	5,00	0,00	5,00	59,78	298,90	298,90	0,00	298,90	0,00	100,00
02.10.005.003	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af. 03/2016	m	5,00	5,00	0,00	5,00	57,15	285,75	285,75	0,00	285,75	0,00	100,00
02.10.006	ELEVAÇÃO							21.732,89	18.336,35	0,00	18.336,35	3.396,54	84,37
02.10.006.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	90,54	90,54	0,00	90,54	36,99	3.349,08	3.349,07	0,00	3.349,07	0,01	100,00
02.10.006.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	71,13	71,13	0,00	71,13	6,08	432,48	432,47	0,00	432,47	0,01	100,00
02.10.006.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	113,19	113,19	0,00	113,19	25,15	2.846,74	2.846,73	0,00	2.846,73	0,01	100,00
02.10.006.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	76,29	76,29	0,00	76,29	28,38	2.165,12	2.165,11	0,00	2.165,11	0,01	100,00
02.10.006.005	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	11,32	5,76	0,00	5,76	610,89	6.915,27	3.518,73	0,00	3.518,73	3.396,55	50,88
02.10.006.006	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisa 08/2015	m2	28,00	28,00	0,00	28,00	11,63	325,64	325,64	0,00	325,64	0,00	100,00
02.10.006.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m2	28,00	28,00	0,00	28,00	34,80	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00	100,00
02.10.006.008	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	91,20	91,20	0,00	91,20	51,80	4.724,16	4.724,16	0,00	4.724,16	0,00	100,00
02.10.007	COBERTURA							11.391,27	11.391,27	0,00	11.391,27	0,00	100,00
02.10.007.001	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af. 07/2019	un	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270606578-B

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VERA CÂNDIDA COSTA SANTANA				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 220/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				B.M.Nº. 09				ORDEM DE SERVIÇO: 05/12/2023					
				PERÍODO: 20/09/2024 a 20/10/2024				DATA: 21/10/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
02.10.007.002	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m2	54,95	54,95	0,00	54,95	68,94	3.788,25	3.788,25	0,00	3.788,25	0,00	100,00
02.10.007.003	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m2	54,95	54,95	0,00	54,95	32,10	1.763,90	1.763,90	0,00	1.763,90	0,00	100,00
02.10.007.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	22,17	22,17	0,00	22,17	8,38	185,78	185,78	0,00	185,78	0,00	100,00
02.10.007.005	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	14,00	14,00	0,00	14,00	23,21	324,94	324,94	0,00	324,94	0,00	100,00
02.10.007.006	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	28,00	28,00	0,00	28,00	190,30	5.328,40	5.328,40	0,00	5.328,40	0,00	100,00
02.10.007.007	Fôrro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017 ps	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.008	PAVIMENTAÇÃO							4.269,99	4.269,99	0,00	4.269,99	0,00	100,00
02.10.008.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	38,10	38,10	0,00	38,10	20,31	773,81	773,81	0,00	773,81	0,00	100,00
02.10.008.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	38,10	38,10	0,00	38,10	29,38	1.119,38	1.119,38	0,00	1.119,38	0,00	100,00
02.10.008.003	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af. 06/2014	m2	38,10	38,10	0,00	38,10	42,82	1.631,44	1.631,44	0,00	1.631,44	0,00	100,00
02.10.008.004	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	1,80	1,80	0,00	1,80	77,56	139,61	139,61	0,00	139,61	0,00	100,00
02.10.008.005	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	12,50	12,50	0,00	12,50	48,46	605,75	605,75	0,00	605,75	0,00	100,00
02.10.009	ESQUADRIAS							10.267,34	3.074,36	4.118,62	7.192,98	3.074,36	70,06
02.10.009.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	2,00	0,00	2,00	1.537,18	6.148,72	3.074,36	0,00	3.074,36	3.074,36	50,00
02.10.009.002	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m2	5,40	0,00	5,40	5,40	516,43	2.788,72	0,00	2.788,72	2.788,72	0,00	100,00
02.10.009.003	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01 10/2021	m2	1,72	0,00	1,72	1,72	265,61	456,85	0,00	456,85	456,85	0,00	100,00
02.10.009.004	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	2,16	0,00	2,16	2,16	404,19	873,05	0,00	873,05	873,05	0,00	100,00
02.10.010	PINTURA							4.248,03	3.285,68	962,35	4.248,03	0,00	100,00
02.10.010.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	56,00	28,00	28,00	56,00	34,37	1.924,72	962,36	962,35	1.924,72	0,00	100,00
02.10.010.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	49,14	49,14	0,00	49,14	40,45	1.987,71	1.987,71	0,00	1.987,71	0,00	100,00
02.10.010.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	18,18	18,18	0,00	18,18	18,46	335,60	335,60	0,00	335,60	0,00	100,00
02.10.011	METAIS E LOUÇAS							10.579,27	9.440,77	0,00	9.440,77	1.138,50	89,24
02.10.011.001	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,30x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00	2,00	0,00	2,00	2.637,05	5.274,10	5.274,10	0,00	5.274,10	0,00	100,00
02.10.011.002	Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga - Rev 04	un	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.10.011.003	Caixa de descarga de sobrepôr completa akros ou similar	un	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.10.011.004	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af. 01/2020	un	10,00	0,00	0,00	0,00	45,48	454,80	0,00	0,00	0,00	454,80	0,00
02.10.011.005	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af. 01/2020	un	12,00	0,00	0,00	0,00	41,67	500,04	0,00	0,00	0,00	500,04	0,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270606578-8

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VERA CÂNDIDA COSTA SANTANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 220/2023					
			B.M.Nº. 09					ORDEM DE SERVIÇO: 05/12/2023					
			PERÍODO: 20/09/2024 a 20/10/2024					DATA: 21/10/2024					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
02.10.011.006	Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. af. 01/2020	und	2,00	2,00	0,00	2,00	509,74	1.019,48	1.019,48	0,00	1.019,48	0,00	100,00
02.10.011.007	Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af. 01/2020	und	1,00	1,00	0,00	1,00	609,31	609,31	609,31	0,00	609,31	0,00	100,00
02.10.011.008	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	UND	3,00	3,00	0,00	3,00	425,83	1.277,49	1.277,49	0,00	1.277,49	0,00	100,00
02.10.011.009	Lavatório louça branca sem coluna "45,5 x 36 cm", inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	und	2,00	2,00	0,00	2,00	301,53	603,06	603,06	0,00	603,06	0,00	100,00
02.10.011.010	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	6,00	6,00	0,00	6,00	109,56	657,36	657,36	0,00	657,36	0,00	100,00
02.10.011.011	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af. 01/2020	und	2,00	0,00	0,00	0,00	91,82	183,64	0,00	0,00	0,00	183,64	0,00
02.10.012	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO							5.844,31	5.844,31	0,00	5.844,31	0,00	100,00
02.10.012.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	14,00	14,00	0,00	14,00	122,48	1.714,72	1.714,72	0,00	1.714,72	0,00	100,00
02.10.012.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	10,00	10,00	0,00	10,00	80,68	806,80	806,80	0,00	806,80	0,00	100,00
02.10.012.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	6,00	6,00	0,00	6,00	113,94	683,64	683,64	0,00	683,64	0,00	100,00
02.10.012.004	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	4,00	4,00	0,00	4,00	18,70	74,80	74,80	0,00	74,80	0,00	100,00
02.10.012.005	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af. 08/2022	m	35,00	35,00	0,00	35,00	29,66	1.038,10	1.038,10	0,00	1.038,10	0,00	100,00
02.10.012.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	3,00	3,00	0,00	3,00	508,75	1.526,25	1.526,25	0,00	1.526,25	0,00	100,00
02.11	ELÉTRICO							77.842,51	4.198,38	16.738,36	20.936,74	56.905,77	26,90
02.11.001	PADRÃO DE ENTRADA, QUADRO DE MEDIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO							6.153,83	4.198,38	1.533,99	5.732,37	421,46	93,15
02.11.001.001	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00	1,00	0,00	1,00	167,54	167,54	167,54	0,00	167,54	0,00	100,00
02.11.001.002	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2	m	60,00	0,00	60,00	60,00	17,30	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	100,00
02.11.001.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	25,00	25,00	0,00	25,00	28,28	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	100,00
02.11.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	9,00	9,00	0,00	9,00	8,20	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	100,00
02.11.001.005	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	125,00	125,00	0,00	125,00	24,66	3.082,50	3.082,50	0,00	3.082,50	0,00	100,00
02.11.001.006	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00	1,00	0,00	1,00	167,54	167,54	167,54	0,00	167,54	0,00	100,00
02.11.001.007	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	0,00	1,00	1,00	19,77	19,77	0,00	19,77	19,77	0,00	100,00
02.11.001.008	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	9,00	0,00	1,00	1,00	19,74	177,66	0,00	19,74	19,74	157,92	11,11
02.11.001.009	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	2,00	0,00	2,00	2,00	150,60	301,20	0,00	301,20	301,20	0,00	100,00
02.11.001.010	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3,00	0,00	3,00	3,00	51,76	155,28	0,00	155,28	155,28	0,00	100,00
02.11.001.011	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00	0,00	0,00	0,00	55,65	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30	0,00
02.11.001.012	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	0,00	0,00	0,00	57,94	57,94	0,00	0,00	0,00	57,94	0,00
02.11.001.013	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	94,30	94,30	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00
02.11.002	LUMINARIA,INTERRUPTORES, TOMADAS DE USO GERAL, TOMADAS DE USO ESPECÍFICO							71.688,68	0,00	15.204,37	15.204,37	56.484,31	21,21

CAL CONSTRUÇÕES LTDA

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270606578-8

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VERA CÂNDIDA COSTA SANTANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 220/2023				CAL CONSTRUÇÕES Construindo qualidade		
			B.M.Nº. 09					ORDEN DE SERVIÇO: 05/12/2023						
			PERÍODO: 20/09/2024 a 20/10/2024					DATA: 21/10/2024						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
Item	Discriminação dos Serviços	Contratada		Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período	Contratado		Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período			
02.11.002.001	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	101,00	0,00	43,00	43,00	179,75	18.154,75	0,00	7.729,25	7.729,25	10.425,50	42,57	
02.11.002.002	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	3,00	0,00	2,00	2,00	241,01	723,03	0,00	482,02	482,02	241,01	66,67	
02.11.002.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	145,00	0,00	12,00	12,00	222,94	32.326,30	0,00	2.675,28	2.675,28	29.651,02	8,28	
02.11.002.004	Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	41,00	0,00	12,00	12,00	69,15	2.835,15	0,00	829,80	829,80	2.005,35	29,27	
02.11.002.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	86,00	0,00	0,00	0,00	100,73	8.662,78	0,00	0,00	0,00	8.662,78	0,00	
02.11.002.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	18,00	0,00	2,00	2,00	94,05	1.692,90	0,00	188,10	188,10	1.504,80	11,11	
02.11.002.007	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	14,00	0,00	11,00	11,00	224,08	3.137,12	0,00	2.464,88	2.464,88	672,24	78,57	
02.11.002.008	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	15,00	0,00	4,00	4,00	208,76	3.131,40	0,00	835,04	835,04	2.296,36	26,67	
02.11.002.009	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	5,00	0,00	0,00	0,00	205,05	1.025,25	0,00	0,00	0,00	1.025,25	0,00	
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								74.907,15	58.254,26	16.652,89	74.907,15	0,00	100,00	
03.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								74.907,15	58.254,26	16.652,89	74.907,15	0,00	100,00	
03.01.001 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares			h	288,83	257,30	31,53	288,83	125,96	36.381,03	32.409,51	3.971,52	36.381,03	0,00	100,00
03.01.002 Mestre de obras com encargos complementares			h	635,43	426,27	209,16	635,43	60,63	38.526,12	25.844,75	12.681,37	38.526,12	0,00	100,00
								1.235.884,92	963.545,10	91.931,33	1.055.476,43	180.408,49	85,40	
CAL CONSTRUÇÕES LTDA Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA Nº 270606578-B			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____						Aprovado para pagamento Data: ____/____/____					

Documento assinado digitalmente
gov.br THAISA LIMA SANTOS
Data: 21/11/2024 09:29:46-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 21/11/2024 09:35:47-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 09

9



CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
220/2023	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VERA CANDIDA COSTA SANTANA
01.04	ESQUADRIAS
01.04.002	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 - 16,90 m2
01.04.003	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro - 21,12 m2
01.10	DIVERSOS
01.10.001	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm - 16,64 m2
01.10.002	Limpeza geral - 370,68 m2
01.11	ELÉTRICO
01.11.001	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA - 4,00 und
2	PROJETO CIVIL - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO
02.01	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
02.01.001	Demolição de reboco - 61,02 m2
02.01.006	Remoção, lavagem, carga e retelhação de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - 101,92 m2
02.02	PAVIMENTAÇÃO
02.02.010	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm - 1,10 m2
02.03	PAREDES
02.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015 - 61,02 m2
02.03.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm - 61,02 m2
02.05	ESQUADRIAS
02.05.002	Revisão de esquadria de ferro - 36,96 m2
02.05.003	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 - 10,00 m2
02.05.004	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista - 5,40 m2
02.07	METAIS E LOUÇAS
02.07.007	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar) - 2,00 und
02.09	DIVERSOS
02.09.001	Limpeza geral - 1.240,25 m2
02.09.002	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm - 24,96 m2
02.09.003	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2") - 2,00 m
02.09.004	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar - 8,00 und
02.10	CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO
02.10.009	ESQUADRIAS
02.10.009.002	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista - 5,40 m2
02.10.009.003	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 - 1,72 m2
02.10.009.004	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro - 2,16 m2
02.10.010	PINTURA
02.10.010.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 - 28,00 m2
02.11	ELÉTRICO
02.11.001	PADRÃO DE ENTRADA, QUADRO DE MEDIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
02.11.001.002	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2 - 60,00 m
02.11.001.007	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. - 1,00 und
02.11.001.008	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA - 1,00 und
02.11.001.009	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar - 2,00 und

CAL CONSTRUÇÕES LTDA

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270606578-8

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 09

9



CONTRATO Nº: DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:	
220/2023	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VERA CANDIDA COSTA SANTANA
02.11.001.010	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B - 3,00 und
02.11.002	LUMINÁRIA, INTERRUPTORES, TOMADAS DE USO GERAL, TOMADAS DE USO ESPECÍFICO
02.11.002.001	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento - 43,00 pt
02.11.002.002	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" - 2,00 un
02.11.002.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" - 12,00 um
02.11.002.004	Luminária para uma lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 - 12,00 und
02.11.002.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - 2,00 und
02.11.002.007	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" - 11,00 pt
02.11.002.008	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" - 4,00 pt
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
03.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
03.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 31,53 h
03.01.002	Mestre de obras com encargos complementares - 209,16 h

CAL CONSTRUÇÕES LTDA

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA n° 270606578-8

Documento assinado digitalmente

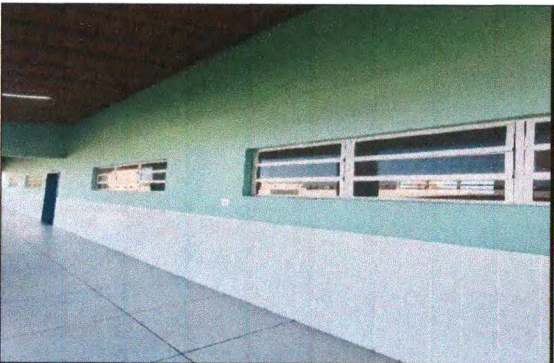
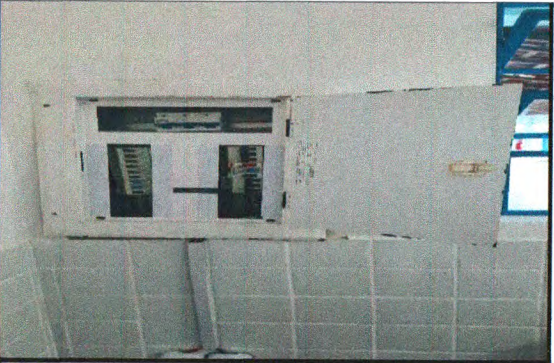
gov.br

THAISA LIMA SANTOS
Data: 21/11/2024 09:29:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 21/11/2024 09:35:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNIICPAL PROFª VERA CANDIDA COSTA SANTANA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 09	
CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA		CONTRATO Nº: 220/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 21/10/2024
 VIDRO	 BASCULANTE	 QUADRO ESCOLAR
 LIMPEZA GERAL	 DISJUNTOR	 DEMOLIÇÃO REBOCO
ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES LTDA Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 270606578-8		FISCALIZAÇÃO: _____ Observações:

OBRA:
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNIICPAL PROFª VERA CANDIDA
COSTA SANTANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 09



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO Nº: 220/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 21/10/2024



LAVAGEM DE TELHAS



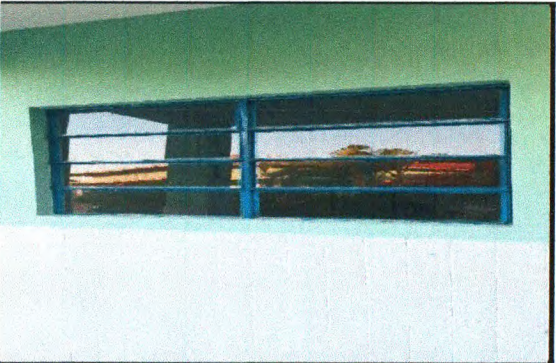
REGULARIZAÇÃO



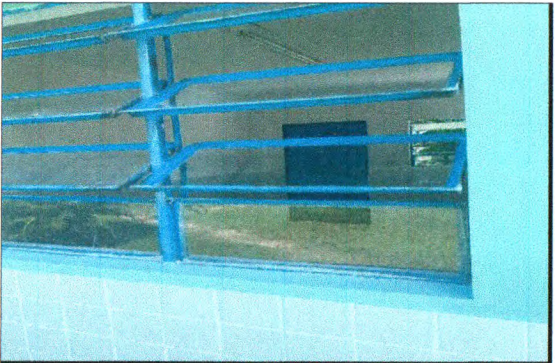
CHAPISCO



REBOCO



REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO

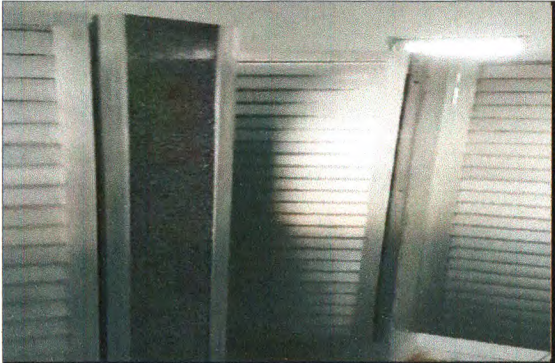
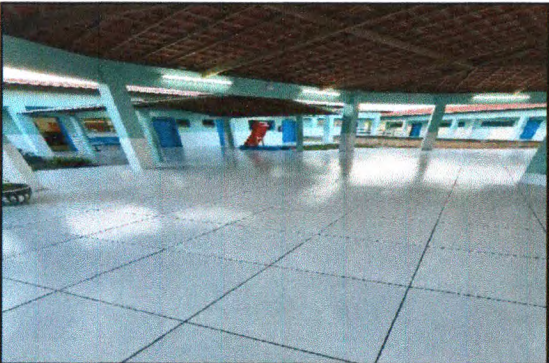


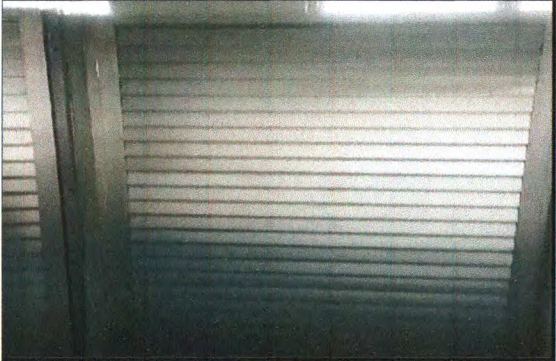
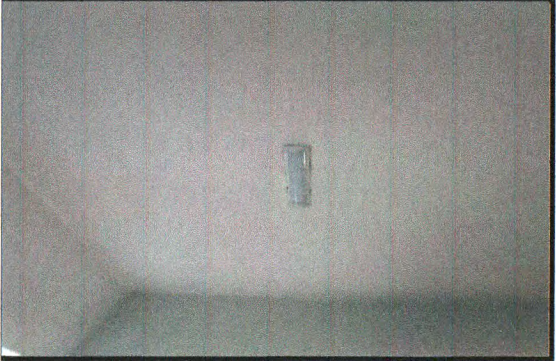
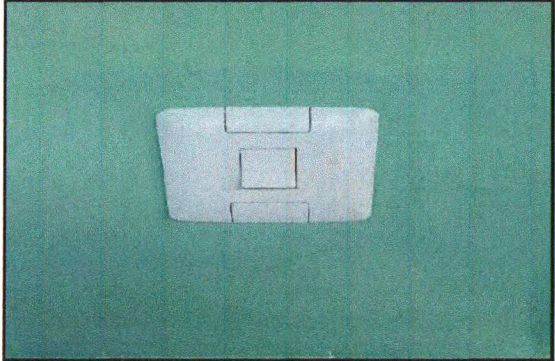
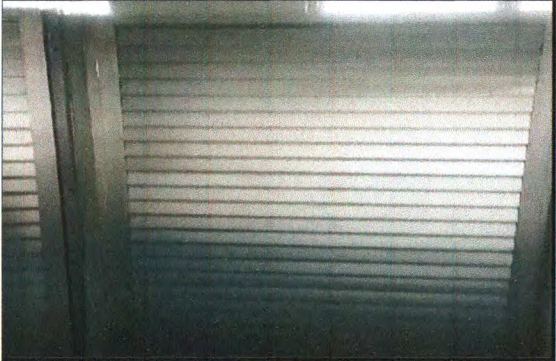
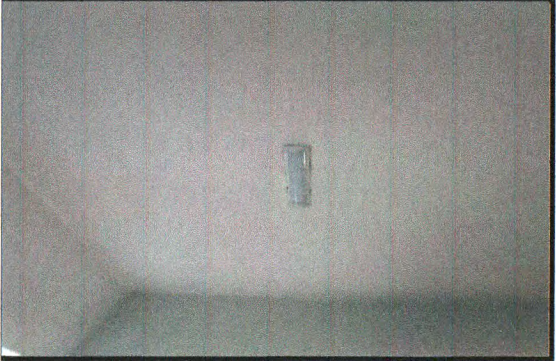
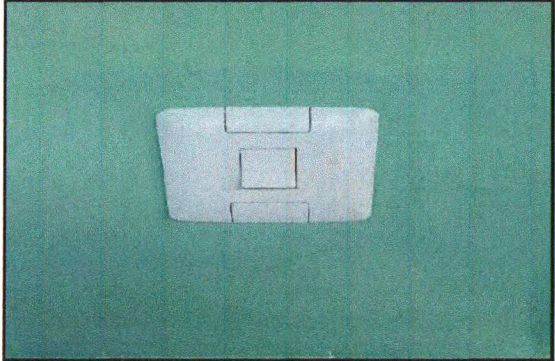
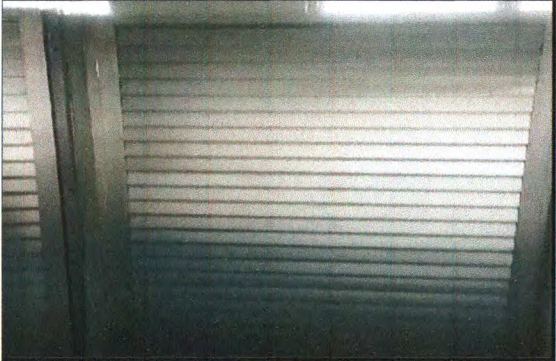
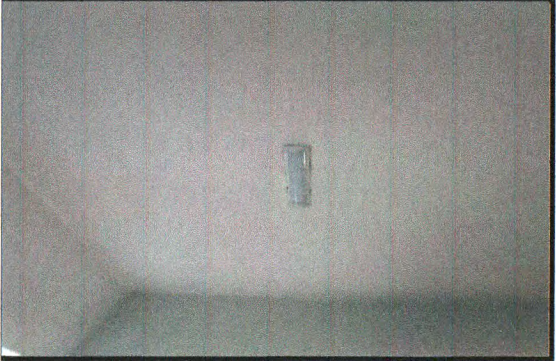
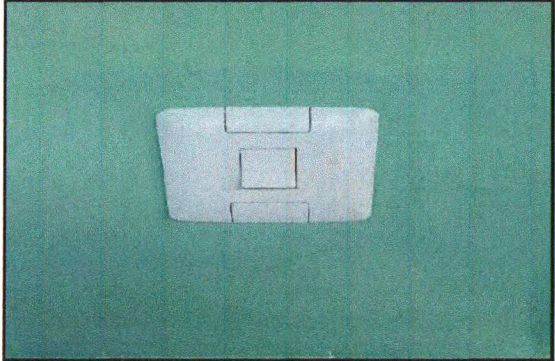
VIDRO LISO

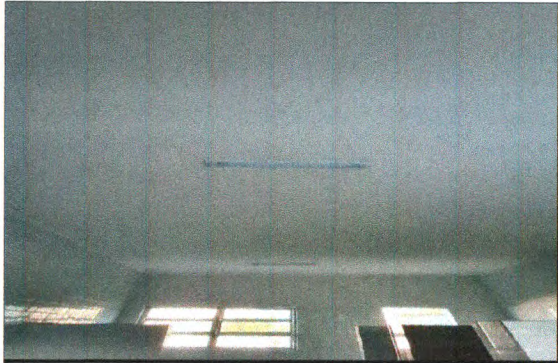
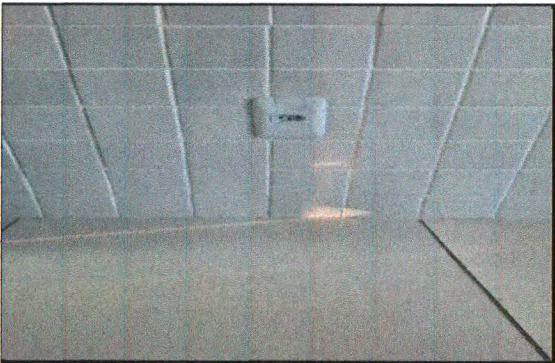



ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES LTDA
Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA Nº 370606579-8

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNIICPAL PROFª VERA CANDIDA COSTA SANTANA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 09	
CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO Nº: 220/2023	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	DATA: 21/10/2024	
 PORTA ALUMÍNIO  QUADRO ESCOLAR	 TORNEIRA  GUARDA CORPO	 LIMPEZA GERAL  BARRA DE APOIO
ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES LTDA Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 270606578-8	FISCALIZAÇÃO:	Observações:

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICPAL PROFª VERA CANDIDA COSTA SANTANA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 09													
CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA		CONTRATO Nº: 220/2023												
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		DATA: 21/10/2024												
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="286 384 840 746">  </td> <td data-bbox="862 384 1415 746">  </td> <td data-bbox="1438 384 1991 746">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 754 647 772"> PORTA DE ALUMÍNIO </td> <td data-bbox="1090 754 1187 772"> VIDRO LISO </td> <td data-bbox="1664 754 1771 772"> BASCULANTE </td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 783 840 1145">  </td> <td data-bbox="862 783 1415 1145">  </td> <td data-bbox="1438 783 1991 1145">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 1153 624 1171"> PINTURA TETO </td> <td data-bbox="1037 1153 1238 1171"> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS </td> <td data-bbox="1615 1153 1816 1171"> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS </td> </tr> </table>						PORTA DE ALUMÍNIO	VIDRO LISO	BASCULANTE				PINTURA TETO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
														
PORTA DE ALUMÍNIO	VIDRO LISO	BASCULANTE												
														
PINTURA TETO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES LTDA <i>Jefferson Rodrigues Nascimento</i> Engenheiro Civil CREA nº 270606578-8	FISCALIZAÇÃO:	Observações:												

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNIICPAL PROFª VERA CANDIDA COSTA SANTANA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 09	
CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA		CONTRATO Nº: 220/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		DATA: 21/10/2024
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
		
ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES LTDA <i>Jefferson Rodrigues Nascimento</i> Engenheiro Civil CREA nº 270606578-8	FISCALIZAÇÃO: 	Observações:
