


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº 096/2021							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 09/2022			ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021							
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 23/02/2022 a 03/03/2022			DATA: 04/03/2022							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada	Do Período	Acumulada		Contratada	Acumulada	Do Período	Acumulada até		
				Anterior		até o Período			Anterior		o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							1.188.016,40	465.874,33	43.489,26	509.363,59	678.652,81	42,88
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	12.174,16	1.122,96	13.297,12	36,21	1.158.720,00	440.826,33	40.662,38	481.488,72	677.231,28	41,55
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	24,74	3,50	28,24	807,68	24.230,40	19.982,00	2.826,88	22.808,88	1.421,52	94,13
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							48.081,24	18.852,65	1.764,58	20.617,23	27.464,00	42,88
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,39	0,0367	0,43	48.081,24	48.081,24	18.852,65	1.764,58	20.617,24	27.464,00	42,88
Total geral								1.236.097,64	484.727,00	45.253,84	529.980,84	706.116,80	42,88
 Eng. Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__						


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Ysa Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/RN 2715638353
Coordenador de Nível

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 09/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 23/02/2022 A 03/03/2022		DATA: 04/03/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	23/02/2022	RUA VALMIR TAVARES ✓	S/N	POVOADO MANGABEIRA	5,30	14,00	74,20	
2	23/02/2022	RUA VALMIR TAVARES ✓	S/N	POVOADO MANGABEIRA	3,45	7,20	24,84	
3	23/02/2022	RUA VALMIR TAVARES ✓	S/N	POVOADO MANGABEIRA	0,70	15,60	10,92	
4	23/02/2022	RUA VALMIR TAVARES ✓	S/N	POVOADO MANGABEIRA	1,30	13,50	17,55	
5	23/02/2022	RUA VALMIR TAVARES ✓	S/N	POVOADO MANGABEIRA	2,90	4,10	11,89	
6	23/02/2022	RUA VALMIR TAVARES ✓	S/N	POVOADO MANGABEIRA	1,20	12,20	14,64	
7	23/02/2022	RUA VALMIR TAVARES ✓	S/N	POVOADO MANGABEIRA	1,90	3,90	7,41	
8	24/02/2022	RUA VALMIR TAVARES ✓	S/N	POVOADO MANGABEIRA	3,20	16,20	51,84	
9	24/02/2022	RUA VALMIR TAVARES ✓	S/N	POVOADO MANGABEIRA	2,70	3,50	9,45	
10	24/02/2022	RUA VALMIR TAVARES ✓	S/N	POVOADO MANGABEIRA	2,40	2,30	5,52	
11	24/02/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2191	BAIRRO MIGUEL TELES	4,20	4,40	18,48	
12	24/02/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2177	BAIRRO MIGUEL TELES	2,20	7,00	15,40	
13	24/02/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2165	BAIRRO MIGUEL TELES	5,20	7,80	40,56	
14	24/02/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2165	BAIRRO MIGUEL TELES	1,70	5,00	8,50	
15	24/02/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2159	BAIRRO MIGUEL TELES	1,65	4,90	8,09	
16	24/02/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2151	BAIRRO MIGUEL TELES	2,70	4,00	10,80	
17	25/02/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2104	BAIRRO MIGUEL TELES	1,75	18,80	32,90	
18	25/02/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2104	BAIRRO MIGUEL TELES	2,00	24,90	49,80	
19	25/02/2022	RUA C ✓	S/N	EM FRENTE A HOLLYWOOD	1,90	48,20	91,58	
20	28/02/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES ✓	S/N	INVASÃO	2,15	86,20	185,33	
21	02/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES ✓	S/N	INVASÃO	2,15	90,20	193,93	
22	03/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES ✓	S/N	INVASÃO	2,15	22,50	48,38	
23	03/03/2022	RUA ALUISIO SANTANA ✓	50	LOTEAMENTO JARDIM MARCELA	1,70	55,50	94,35	
24	03/03/2022	RUA ALUISIO SANTANA ✓	S/N	LOTEAMENTO JARDIM MARCELA	3,10	10,70	33,17	
25	03/03/2022	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS ✓	608	LOTEAMENTO SÃO JOÃO	6,10	10,40	63,44	
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							1.122,96	


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/PE 2715030353
 Coordenador do Nucleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09/2022**



RUA VALMIR TAVARES



RUA VALMIR TAVARES



RUA VALMIR TAVARES



RUA VALMIR TAVARES



RUA VALMIR TAVARES



RUA VALMIR TAVARES



RUA VALMIR TAVARES



RUA VALMIR TAVARES



RUA VALMIR TAVARES



RUA VALMIR TAVARES



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO

2
CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

V
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Obras



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO




RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA C

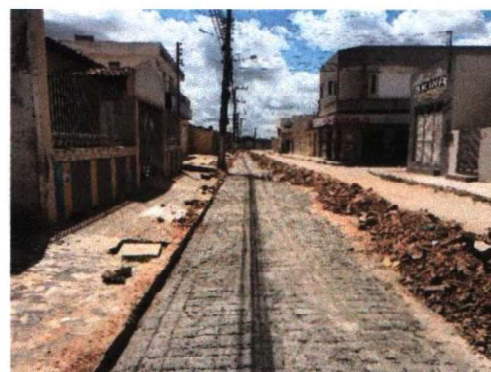

AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



RUA ALUISIO SANTANA



RUA ALUISIO SANTANA



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo
