

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 098/2020					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				B.M.Nº. 12/2021				ORDEM DE SERVIÇO: 27/07/2020					
				PERÍODO: 16/08/2021 A 30/09/2021				DATA: 25/10/2021					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS							1.695.246,19	476.978,14	72.982,60	549.960,74	1.145.285,45	32,44
01.01	EMASSAMENTO							116.813,06	17.359,78	-	17.359,78	99.453,28	14,86
01.01.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	6.000,00	-		-	6,86	41.183,05	-	-	-	41.183,05	0,00
01.01.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4.500,00	1.545,27		1.545,27	11,23	50.553,64	17.359,78	-	17.359,78	33.193,86	34,34
01.01.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	2.000,00	-		-	12,54	25.076,37	-	-	-	25.076,37	0,00
01.02	PINTURA SOBRE PAREDES							195.632,69	91.012,25	19.933,68	110.945,92	84.686,77	56,71
01.02.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m2	6.000,00	-	1.630,29	1.630,29	10,05	60.320,74	-	16.390,05	16.390,05	43.930,69	27,17
01.02.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético	m2	3.000,00	-		-	12,09	36.266,46	-	-	-	36.266,46	0,00
01.02.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	9.000,00	8.270,04	322,00	8.592,04	11,01	99.045,50	91.012,25	3.543,63	94.555,87	4.489,63	95,47
01.03	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS E SOBRE MADEIRA							32.371,94	19.037,53	-	19.037,53	13.334,41	58,81
01.03.001	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	1.200,00	637,46		637,46	6,51	7.813,68	4.150,76	-	4.150,76	3.662,92	53,12
01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.200,00	670,42		670,42	12,41	14.887,20	8.317,23	-	8.317,23	6.569,97	55,87
01.03.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético	m2	800,00	543,44		543,44	12,09	9.671,05	6.569,54	-	6.569,54	3.101,51	67,93
01.04	PINTURA SOBRE CANTEIROS							188.777,65	22.332,02	683,68	23.015,70	165.761,95	12,19
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	25.000,00	2.957,45	90,54	3.047,99	7,55	188.777,65	22.332,02	683,68	23.015,70	165.761,95	12,19
01.05	PINTURA SOBRE MEIO-FIO							200.628,57	74.115,67	634,41	74.750,08	125.878,49	37,26
01.05.001	Pintura de meio-fio (caiação)	m	90.000,00	33.247,56	284,59	33.532,15	2,23	200.628,57	74.115,67	634,41	74.750,08	125.878,49	37,26
01.06	INSTALAÇÕES PREDIAIS							39.261,35	2.227,88	1.577,04	3.804,93	35.456,42	9,69
01.06.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	200,00	5,00		5,00	14,38	2.875,94	71,90	-	71,90	2.804,04	2,50
01.06.002	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	200,00	20,00	26,00	46,00	60,66	12.131,11	1.213,11	1.577,04	2.790,16	9.340,95	23,00
01.06.003	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	150,00	2,00		2,00	65,22	9.782,96	130,44	-	130,44	9.652,52	1,33
01.06.004	Revisão de ponto de água tipo 2	und	150,00	9,00		9,00	59,25	8.886,87	533,21	-	533,21	8.353,66	6,00
01.06.005	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	und	100,00	5,00		5,00	55,84	5.584,47	279,22	-	279,22	5.305,25	5,00
01.07	COBERTURA							378.094,11	94.362,11	13.447,32	107.809,42	270.284,69	28,51
01.07.001	Revisão de cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	1.500,00	1.218,83		1.218,83	40,52	60.783,32	49.389,69	-	49.389,69	11.393,63	81,26

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638/957
 Coordenador de Medição

CONSTRUÇÕES EIRELI
 Anderson Rodrigues Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA/SE 2715638/957

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 12/2021

PERÍODO: 16/08/2021 A 30/09/2021

CONTRATO Nº 098/2020

ORDEM DE SERVIÇO: 27/07/2020

DATA: 25/10/2021



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.07.002	Revisão de cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m2	600,00	600,00		600,00	47,71	28.627,24	28.627,24	-	28.627,24	-	100,00
01.07.003	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	750,00	18,20		18,20	33,69	25.270,21	613,22	-	613,22	24.656,99	2,43
01.07.004	Revisão de cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m2	1.000,00	-		-	13,66	13.657,19	-	-	-	13.657,19	0,00
01.07.005	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,50mm	m2	500,00	-		-	44,82	22.411,01	-	-	-	22.411,01	0,00
01.07.006	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	3.000,00	-		-	22,80	68.409,32	-	-	-	68.409,32	0,00
01.07.007	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	1.500,00	111,64	237,39	349,03	56,65	84.969,77	6.324,02	13.447,32	19.771,33	65.198,44	23,27
01.07.008	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00	-		-	44,01	22.005,70	-	-	-	22.005,70	0,00
01.07.009	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	250,00	70,32		70,32	91,56	22.891,22	6.438,84	-	6.438,84	16.452,38	28,13
01.07.010	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	250,00	-		-	82,50	20.624,56	-	-	-	20.624,56	0,00
01.07.011	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	400,00	140,64		140,64	21,11	8.444,55	2.969,10	-	2.969,10	5.475,45	35,16
01.08	ESQUADRIAS							54.934,87	2.670,60	-	2.670,60	52.264,27	4,86
01.08.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	-		-	54,31	5.431,16	-	-	-	5.431,16	0,00
01.08.002	Revisão de esquadria de ferro	m2	100,00	-		-	61,38	6.137,81	-	-	-	6.137,81	0,00
01.08.003	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	und.	40,00	-		-	555,33	22.213,12	-	-	-	22.213,12	0,00
01.08.004	Porta em madeira mista, almofadada, 70 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	und.	20,00	-		-	523,52	10.470,40	-	-	-	10.470,40	0,00
01.08.005	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	und.	20,00	5,00		5,00	534,12	10.682,39	2.670,60	-	2.670,60	8.011,79	25,00
01.09	DIVERSOS							121.903,23	56.797,31	29.321,82	86.119,13	35.784,10	70,65
01.09.001	Reboço ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/cal/areia), espessura 1,5cm	m2	1.200,00	803,83		803,83	23,71	28.452,78	19.059,33	-	19.059,33	9.393,45	66,99
01.09.002	Reboço ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), espessura 2,0cm	m2	1.000,00	-	948,64	948,64	26,02	26.019,16	-	24.682,82	24.682,82	1.336,34	94,86
01.09.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015	m2	2.200,00	625,24	948,64	1.573,88	4,89	10.758,34	3.057,52	4.639,00	7.696,52	3.061,82	71,54
01.09.004	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 Mpa, e = 7 cm - não inclui formas para juntas de concretagem	m2	1.200,00	1.200,00		1.200,00	28,90	34.680,46	34.680,46	-	34.680,46	-	100,00
01.09.005	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	300,00				73,31	21.992,49	-	-	-	21.992,49	0,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Xavier Santos
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Nucleo

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,
ITABAIANA - SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 12/2021

PERÍODO: 16/08/2021 A 30/09/2021

CONTRATO Nº 098/2020

ORDEM DE SERVIÇO: 27/07/2020

DATA: 25/10/2021



PERÍODO: 16/08/2021 A 30/09/2021			DATA: 25/10/2021										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.10	LIMPEZA							264.392,25	68.364,94	3.097,97	71.462,91	192.929,34	27,03
01.10.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	50.000,00	20.131,78		20.131,78	2,56	128.201,39	51.618,44	-	51.618,44	76.582,95	40,26
01.10.002	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	500,00	500,00		500,00	2,11	1.057,33	1.057,33	-	1.057,33	-	100,00
01.10.003	Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos moles, materia orgânica ou entulhos	m3	7.000,00	796,38	245,53	1.041,91	12,62	88.322,39	10.048,31	3.097,97	13.146,28	75.176,11	14,88
01.10.004	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	und	600,00	300,00		300,00	18,80	11.281,72	5.640,86	-	5.640,86	5.640,86	50,00
01.10.005	Limpeza de reservatório	m3	100,00	-		-	10,91	1.090,81	-	-	-	1.090,81	0,00
01.10.006	Limpeza de fossa até 5m3	und	150,00	-		-	229,59	34.438,60	-	-	-	34.438,60	0,00
01.11	EQUIPE DIRIGENTE							102.436,48	28.698,01	4.286,68	32.984,69	69.451,79	32,20
01.11.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	430,00	119,60	17,84	137,44	92,39	39.729,04	11.050,22	1.648,29	12.698,51	27.030,53	31,96
01.11.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.475,00	415,11	62,06	477,17	42,51	62.707,44	17.647,79	2.638,39	20.286,18	42.421,26	32,35
Total geral								1.695.246,19	476.978,14	72.982,60	549.960,74	1.145.285,45	32,44
CAL CONSTRUÇÕES EIRELI			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.					Aprovado para pagamento					
Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 270606578-8			Data: __/__/____					Data: __/__/____					

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

Jefferson Rodrigues Nascimento

Eng. Civil - CREA nº 270606578-8

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.

Data: __/__/__

Aprovado para pagamento

Data: __/__/__

Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Lemos Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Nôcio

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 25/10/2021



CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
098/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
01.02	PINTURA SOBRE PAREDES
01.02.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc) CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE: $(114,40m \times 2,00m) = 228,80m^2$ BANCOS DA PRAÇA DO POVOADO PÉ DO VEADO: $(11,61m \times 0,40m) + 6,20m^2 + (13,20m \times 0,30m) + (11,61m \times 0,40m) + 6,20m^2 + (13,20m \times 0,30m) + (11,68m \times 0,40m) + 6,01m^2 + (12,47m \times 0,30m) + (11,68m \times 0,40m) + 6,01m^2 + (12,47m \times 0,30m) + (11,75m \times 0,40m) + 6,07m^2 + (12,54m \times 0,30m) + (11,62m \times 0,40m) + 6,00m^2 + (12,41m \times 0,30m) = 87,34m^2$ MURO FRONTAL DO CEMITÉRIO DO POVOADO PÉ DO VEADO: $(14 \times ((0,25m + 0,25m) \times 2) \times 2,20m) + (26 \times ((0,25m + 0,25m) \times 2) \times 2,20m) + (26 \times (3,00m \times 1,10m \times 2)) \times 2 \text{ lados} = 519,20m^2$ MURO DO CEMITÉRIO DO POVOADO SÃO JOSÉ: $(57,16m + 64,79m + 35,46m + 69,82m) \times 2,40m = 545,35m^2$ MURO FRONTAL DO CEMITÉRIO DO POVOADO TERRA DURA: $25,00m \times 2,00m = 50,00m^2$ MURO FRONTAL DO CEMITÉRIO DO POVOADO RIO DAS PEDRAS: $54,00m \times 2,40m = 129,60m^2$ MURO FRONTAL DO CEMITÉRIO DO POVOADO RIBEIRA: $35,00m \times 2,00m \times 2 \text{ lados} = 70,00m^2$ TOTAL: 1.630,29m²
01.02.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional CEMITÉRIO DO POVOADO TERRA DURA: $(68,00m + 68,00m + 25,00m) \times 2,00m = 322,00m^2$
01.04	PINTURA SOBRE CANTEIROS
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) PRAÇA DO CEMITÉRIO DO POVOADO PÉ DO VEADO: $17,39m + 5,09m + 12,70m + 6,53m + 0,33m + 8,58m + 8,25m + 8,58m + 8,25m + 8,58m + 5,13m + 9,22m + 8,25m + 0,27m + 8,62m + 9,74m + 4,54m + 4,55m + 6,47m + 10,92m + 0,80m + 6,92m + 12,02m + 4,56m + 4,55m + 9,82m + 8,62m + 0,27m + 11,12m + 9,30m + 1,14m + 1,14m + 9,77m + 1,15m + 12,14m + 23,58m + 7,93m + 3,22m = 280,04m \times 0,25m = 70,01m^2$ TREVO DO POVOADO PÉ DO VEADO: $22,06m + 16,34m + 15,26m + 28,46m = 82,12m \times 0,25m = 20,53m^2$ TOTAL: 90,54m²
01.05	PINTURA SOBRE MEIO-FIO
01.05.001	Pintura de meio-fio (caiação) PRAÇA DO CEMITÉRIO DO POVOADO PÉ DO VEADO: $62,76m + 15,15m + 8,76m + 0,15m + 15,28m + 15,36m + 14,85m + 0,61m + 27,66m = 160,58m$ TREVO DO POVOADO PÉ DO VEADO: $74,01m$ CEMITÉRIO DO POVOADO RIO DAS PEDRAS: $25,00m + 25,00m = 50,00m$ TOTAL: 284,59m
01.06	INSTALAÇÕES PREDIAIS
01.06.002	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede ESC. MUN. GABRIEL ANDRADE (POV. SOBRADO): 08 pontos ESC. MUN. HERMELINA DA COSTA LIMA (BAIRRO RIACHO DOCE): 18 pontos TOTAL: 26 pontos
01.07	COBERTURA
01.10.003	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado ESC. MUN. GABRIEL ANDRADE (POV. SOBRADO): $49,00m^2 + 45,67m^2 = 94,67m^2$ ESC. MUN. HERMELINA DA COSTA LIMA (BAIRRO RIACHO DOCE): $48,00m^2 + 48,00m^2 + 46,72m^2 = 142,72m^2$ TOTAL: 237,39m²
01.09	DIVERSOS
01.09.002	Reboço ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), espessura 2,0cm CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE: $(2,40m + 2,40m + 0,80m) \times 0,70m \times 242 \text{ und} = 948,64m^2$
01.09.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015 CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE: $(2,40m + 2,40m + 0,80m) \times 0,70m \times 242 \text{ und} = 948,64m^2$
01.10	LIMPEZA
01.10.003	Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos moles, matéria orgânica ou entulhos CANAL DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CHIARA: $(66,56m + 61,72m + 35,41m) \times 3,00m \times 0,50m = 245,53m^3$
01.11	EQUIPE DIRIGENTE
01.11.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares (Acumulado até o período x engenheiro)/(Valor total do orçamento – administração local) $(R\\$ 68.695,92 \times 430,00 \text{ h}) / (R\\$ 1.695.246,19 - R\\$ 39.729,04) = 17,84h$
01.11.002	Mestre de obras com encargos complementares (Acumulado até o período x mestre) / (Valor total do orçamento – administração local) $(R\\$ 68.695,92 \times 1.475,00 \text{ h}) / (R\\$ 1.695.246,19 - R\\$ 62.707,44) = 62,06h$

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 27066578-2

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Soares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Nucleo

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-12



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº: 098/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 25/10/2021



TREVO DO POVOADO PÉ DO VEADO



TREVO DO POVOADO PÉ DO VEADO



TREVO DO POVOADO PÉ DO VEADO



TREVO DO POVOADO PÉ DO VEADO



TREVO DO POVOADO PÉ DO VEADO



TREVO DO POVOADO PÉ DO VEADO

ELABORADO POR:

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA Nº 2.706.055/RS

FISCALIZAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Xavier Santana
Eng. CIVIL - CREA Nº 745630353
Coordenador de Núcleo

Observações:

OBRA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-12



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº: 098/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 25/10/2021 .



PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO PÉ DO VEADO



MURO EM FRENTE AO CEMITERIO PÉ DO VEADO



PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO PÉ DO VEADO



PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO PÉ DO VEADO



PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO PÉ DO VEADO



MURO E PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO PÉ DO VEADO

ELABORADO POR:

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270605572-9

FISCALIZAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715030353
Coordenador de Núcleo

Observações:

OBRA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-12



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONTRATO Nº: 098/2020

DATA: 25/10/2021



ESC. MUN. HERMELINA DA COSTA (B. RIACHO DOCE)



ESC. MUN. HERMELINA DA COSTA (B. RIACHO DOCE)




ESC. MUN. HERMELINA DA COSTA (B. RIACHO DOCE)



ESC. MUN. GABRIEL ANDRADE (POVOADO SOBRADO)



ESC. MUN. GABRIEL ANDRADE (POVOADO SOBRADO)

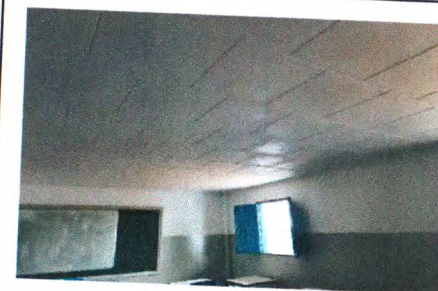

ESC. MUN. GABRIEL ANDRADE (POVOADO SOBRADO)

ELABORADO POR:

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

Jefferson Rodrigues Nascimento
Eng. Civil - CREA/SE 27060578-9

FISCALIZAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Nível

Observações:

OBRA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-12



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº: 098/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 25/10/2021



CEMITÉRIO DO POVOADO SÃO JOSÉ



CEMITÉRIO DO POVOADO SÃO JOSÉ




CEMITÉRIO DO POVOADO SÃO JOSÉ



CEMITÉRIO DO POVOADO SÃO JOSÉ



CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE

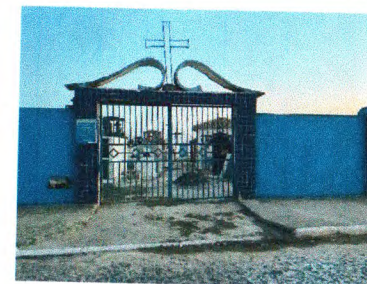

CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE

ELABORADO POR:

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

Jefferson Rodrigues Nascimento
Eng. Civil
CREA 270605578-0



FISCALIZAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Lacerdes Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715030053
Coordenador de Núcleo

Observações:

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-12	
CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO Nº: 098/2020	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	DATA: 25/10/2021	

 CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE	 CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE	 CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE
 CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE	 CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE	 CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE

ELABORADO POR:  CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Eng. Civil - CREA nº 70606578-0	FISCALIZAÇÃO:  Prefeitura Municipal de Itabalana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA nº 2715030353 Coordenador de Núcleo	Observações:
--	---	--------------

OBRA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-12



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº: 098/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 25/10/2021



CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE



CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE



CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE



CANAL DO LOT. RESIDENCIAL CHIARA



CANAL DO LOT. RESIDENCIAL CHIARA



CANAL DO LOT. RESIDENCIAL CHIARA

ELABORADO POR:

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA Nº 270606578-0

FISCALIZAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Cavaleiro Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715639353
Coordenador de Núcleo

Observações:

OBRA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-12



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº: 098/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 25/10/2021



CEMITÉRIO DO POVOADO RIO DAS PEDRAS



CEMITÉRIO DO POVOADO RIO DAS PEDRAS



CEMITÉRIO DO POVOADO RIO DAS PEDRAS



CEMITÉRIO DO POVOADO TERRA DURA



CEMITÉRIO DO POVOADO TERRA DURA



CEMITÉRIO DO POVOADO TERRA DURA

ELABORADO POR:

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA Nº 27060557-0

FISCALIZAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Nucleo

Observações:

OBRA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-12



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº: 098/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 25/10/2021






CEMITÉRIO DO POVOADO RIBEIRA



CEMITÉRIO DO POVOADO RIBEIRA



CEMITÉRIO DO POVOADO RIBEIRA

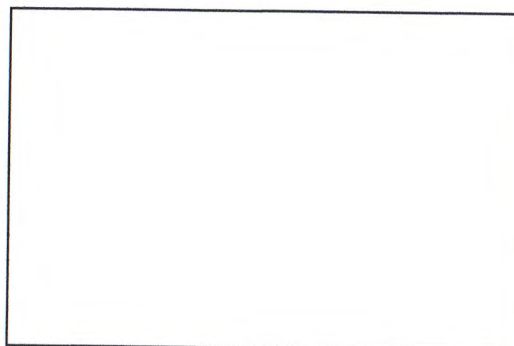

ELABORADO POR:

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

Jefferson Rodrigues Nascimento
Eng. Civil - CREA/SE 2715039353

FISCALIZAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715039353
Coordenador de Núcleo

Observações:
