

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO 01 -					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2025 a 22/04/2025										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			LOCAL: UBS - BAIRRO CORUJA										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do período	Acumulada até o período		
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE						R\$ 1.530.924,10	445.241,38	19.541,30	464.782,66	1.066.141,44	30,36	
01.01	ESQUADRIAS						R\$ 208.990,87	R\$ 32.402,84	R\$ 2.762,77	R\$ 35.165,61	R\$ 0,00	1.272,84	
01.01.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	und	50,00	14,00		14,00	R\$ 580,91	R\$ 29.045,50	8.132,74	-	8.132,74		
01.01.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	und	50,00	34,00		34,00	R\$ 611,75	R\$ 30.587,50	20.799,50	-	20.799,50		
01.01.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	und	25,00			-	R\$ 628,02	R\$ 15.700,50		-			
01.01.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	60,00	10,78		10,78	R\$ 123,47	R\$ 7.408,20	1.331,01	-	1.331,01		
01.01.005	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	300,00	6,11		6,11	R\$ 205,69	R\$ 61.707,00	1.256,77	-	1.256,77		
01.01.006	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	40,00			-	R\$ 795,21	R\$ 31.808,40		-			
01.01.007	Vidro liso incolor 6mm - Ver 01 10/2021	m2	100,00	1,02		1,02	R\$ 185,88	R\$ 18.588,00	189,60	-	189,60		
01.01.008	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	6,09		6,09	R\$ 113,83	R\$ 11.383,00	693,22	-	693,22		
01.01.009	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive calxinhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	7,52			7,52	R\$ 367,39	R\$ 2.762,77		2.762,77	2.762,77	R\$ 0,00 100,00	
01.02	COBERTURA						R\$ 439.629,50	R\$ 98.520,94	R\$ 627,70	R\$ 99.148,64	0,00	15.795,55	
01.02.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	1.000,00	253,36		253,36	R\$ 10,66	R\$ 10.660,00	2.700,82	-	2.700,82		
01.02.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	600,00	323,00		323,00	R\$ 73,87	R\$ 44.322,00	23.860,01	-	23.860,01		
01.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8m	un	20,00			-	R\$ 1.222,84	R\$ 24.456,80		-			
01.02.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	600,00	87,24		87,24	R\$ 82,22	R\$ 49.332,00	7.172,87	-	7.172,87		
01.02.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20cm com abertura de encaixes	m	200,00	158,43		158,43	R\$ 97,21	R\$ 19.442,00	15.400,98	-	15.400,98		
01.02.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	800,00	85,71		85,71	R\$ 43,93	R\$ 35.144,00	3.765,24	-	3.765,24		
01.02.007	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	1.000,00	463,63		463,63	R\$ 60,66	R\$ 60.660,00	28.123,80	-	28.123,80		
01.02.008	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	500,00			-	R\$ 33,94	R\$ 16.970,00		-			
01.02.009	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm, af 09/2023	m2	1.000,00	15,30		15,30	R\$ 109,62	R\$ 109.620,00	1.677,19	-	1.677,19		
01.02.010	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	500,00	138,13		138,13	R\$ 114,53	R\$ 57.265,00	15.820,03	-	15.820,03		
01.02.011	Emassamento de algeroz	m	1.000,00			-	R\$ 11,13	R\$ 11.130,00		-			
01.02.012	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3), af_11/2020_pa	m2	4,40			4,40	R\$ 142,66	R\$ 627,70		627,70	627,70	0,00 100,00	


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


André Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Luiz Roberto Neri Alfano Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/SE: 2706905522



Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA 2487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO 01 -				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2025 a 22/04/2025										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			LOCAL: UBS - BAIRRO CORUJA										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do período	Acumulada até o período		
01.03	PAREDES						R\$ 256.128,00	46.984,27	-	46.984,27	-		
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1.400,00	278,64		278,64	R\$ 40,68	R\$ 56.952,00	11.335,08	-	11.335,08		
01.03.002	Chapisco em parede argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015	m2	2.200,00	501,75		501,75	R\$ 6,63	R\$ 14.586,00	3.326,60	-	3.326,60		
01.03.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.200,00	161,55		161,55	R\$ 26,51	R\$ 58.322,00	4.282,69	-	4.282,69		
01.03.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2.200,00	340,20		340,20	R\$ 39,44	R\$ 86.768,00	13.417,49	-	13.417,49		
01.03.005	Demolição de reboco	m2	1.500,00	340,20		340,20	R\$ 10,02	R\$ 15.030,00	3.408,80	-	3.408,80		
01.03.006	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00	229,13		229,13	R\$ 48,94	R\$ 24.470,00	11.213,62	-	11.213,62		
01.04	PINTURA						R\$ 201.382,00	172.273,74	-	172.273,74	-		
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.000,00	303,13		303,13	R\$ 20,99	R\$ 20.990,00	6.362,70	-	6.362,70		
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	4.500,00	4.500,00		4.500,00	R\$ 15,17	R\$ 68.265,00	68.265,00	-	68.265,00		
01.04.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	400,00	191,86		191,86	R\$ 25,59	R\$ 10.236,00	4.909,70	-	4.909,70		
01.04.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	2.500,00	1.919,21		1.919,21	R\$ 12,19	R\$ 30.475,00	23.395,17	-	23.395,17		
01.04.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4.500,00	4.500,00		4.500,00	R\$ 12,63	R\$ 56.835,00	56.835,00	-	56.835,00		
01.04.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	500,00	61,35		61,35	R\$ 4,73	R\$ 2.365,00	290,19	-	290,19		
01.04.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	600,00	600,00		600,00	R\$ 20,36	R\$ 12.216,00	12.216,00	-	12.216,00		
01.05	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO						R\$ 49.476,50	588,46	1.978,70	2.567,16	-	100,00	
01.05.001	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	40,00	7,00		7,00	R\$ 25,96	R\$ 1.038,40	181,72	-	181,72		
01.05.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	40,00			-	R\$ 258,15	R\$ 10.326,00	-	-	-		
01.05.003	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	100,00			-	R\$ 67,37	R\$ 6.737,00	-	-	-		
01.05.004	Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto carga descarga - Rev 04	un	40,00			-	R\$ 349,11	R\$ 13.964,40	-	-	-		
01.05.005	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	40,00	6,00		6,00	R\$ 67,79	R\$ 2.711,60	406,74	-	406,74		
01.05.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	40,00			-	R\$ 87,57	R\$ 3.502,80	-	-	-		
01.05.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	40,00			-	R\$ 121,19	R\$ 4.847,60	-	-	-		
01.05.008	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40,00			-	R\$ 109,25	R\$ 4.370,00	-	-	-		
01.05.009	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	4,00		4,00	4,00	R\$ 62,80	R\$ 251,20	-	251,20	251,20	100,00	
01.05.010	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af. 06/2021	un	1,00		1,00	1,00	R\$ 1.261,81	R\$ 1.261,81	-	1.261,81	1.261,81	100,00	
01.05.011	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	19,00		19,00	19,00	R\$ 12,16	R\$ 231,04	-	231,04	231,04	100,00	
01.05.012	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	19,00		19,00	19,00	R\$ 12,35	R\$ 234,65	-	234,65	234,65	100,00	


Rizia Milene S. Rodrigues Aratijo
 Eng.ª CIVIL CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


André Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Lada Amanda Neri Aljuno Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/SE: 2706905522


Diego Oliveira Barros
 Eng. CREA 1487
 Coordenador de Núcleo
SEM EFEITO
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO 01 -					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2025 a 22/04/2025										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			LOCAL: UBS - BAIRRO CORUJA										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do período	Acumulada até o período		
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 60.572,33	5.266,43	14.172,13	19.438,56	1.749,60	100,00	
01.06.001	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	50,00	21,00		21,00	R\$ 139,69	R\$ 6.984,50	2.933,49	-	2.933,49		
01.06.002	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	50,00			-	R\$ 95,55	R\$ 4.777,50	-	-	-		
01.06.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	50,00	6,00		6,00	R\$ 303,20	R\$ 15.160,00	1.819,20	-	1.819,20		
01.06.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	50,00	2,00		2,00	R\$ 256,87	R\$ 12.843,50	513,74	-	513,74		
01.06.005	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	20,00			-	R\$ 65,66	R\$ 1.313,20	-	-	-		
01.06.006	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fics de arame farpado	m	100,00			-	R\$ 30,13	R\$ 3.013,00	-	-	-		
01.06.007	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	95,00	23,00		23,00	R\$ 24,30	R\$ 2.308,50	558,90	-	558,90	1.749,60	
01.06.008	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	31,00		31,00	31,00	R\$ 77,47	R\$ 2.401,57	-	2.401,57	2.401,57	100,00	
01.06.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00		1,00	1,00	R\$ 1.429,86	R\$ 1.429,86	-	1.429,86	1.429,86	100,00	
01.06.010	Luminaria autônoma de emergencia com lâmpada halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	un	5,00		5,00	5,00	R\$ 275,46	R\$ 1.377,30	-	1.377,30	1.377,30	100,00	
01.06.011	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	600,00		600,00	600,00	R\$ 5,81	R\$ 3.486,00	-	3.486,00	3.486,00	100,00	
01.06.012	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	400,00		400,00	400,00	R\$ 6,50	R\$ 2.600,00	-	2.600,00	2.600,00	100,00	
01.06.013	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	300,00		300,00	300,00	R\$ 7,77	R\$ 2.331,00	-	2.331,00	2.331,00	100,00	
01.06.014	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°C	m	40,00		40,00	40,00	R\$ 13,66	R\$ 546,40	-	546,40	546,40	100,00	
01.07	LIMPEZA						R\$ 17.475,50	244,70	-	244,70	-		
01.07.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reasentamento de tampa	un	50,00			-	R\$ 26,39	R\$ 1.319,50	-	-	-		
01.07.002	Limpeza da calha de zinco	m	200,00			-	R\$ 20,10	R\$ 4.020,00	-	-	-		
01.07.003	Limpeza de fossa acima de 5m3	m3	200,00	5,00		5,00	R\$ 48,94	R\$ 9.788,00	244,70	-	244,70		
01.07.004	Limpeza de reservatório	m3	200,00			-	R\$ 11,74	R\$ 2.348,00	-	-	-		
01.08	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 271.972,40	87.299,66	-	87.299,66	-		
01.08.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af. 08/2022	m2	500,00	177,21		177,21	R\$ 59,26	R\$ 29.630,00	10.501,46	-	10.501,46		
01.08.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	500,00	10,00		10,00	R\$ 15,89	R\$ 7.945,00	158,90	-	158,90		
01.08.003	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	500,00	261,71		261,71	R\$ 52,80	R\$ 26.400,00	13.818,29	-	13.818,29		



Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


André Agassi Rets Lapa
Arq Urb CAUISE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Laiza Afonso Nardi Aljuno Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE: 2706995522

Diego **SEM FEITO**
Eng. Civil CREA-272241149
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO 01 -				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2025 a 22/04/2025										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			LOCAL: UBS - BAIRRO CORUJA										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do período	Acumulada até o período		
01.08.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas na altura das paredes. af_02/2023 pe	m2	300,00	10,00		10,00	R\$ 57,02	R\$ 17.106,00	570,20	-	570,20		
01.08.005	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023 pe	m2	300,00	84,92		84,92	R\$ 54,15	R\$ 16.245,00	4.598,42	-	4.598,42		
01.08.006	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023 pe	m2	500,00			-	R\$ 39,71	R\$ 19.855,00	-	-	-		
01.08.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	20,00	1,00		1,00	R\$ 338,54	R\$ 6.770,80	338,54	-	338,54		
01.08.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	60,00	25,36		25,36	R\$ 2.260,01	R\$ 135.600,60	57.313,85	-	57.313,85		
01.08.009	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	300,00			-	R\$ 41,40	R\$ 12.420,00	-	-	-		
01.09	JARDINAGEM						R\$ 25.297,00	1.660,32	-	1.660,32	-		
01.09.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	300,00	37,64		37,64	R\$ 25,29	R\$ 7.587,00	951,92	-	951,92		
01.09.002	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais	un	500,00	20,00		20,00	R\$ 35,42	R\$ 17.710,00	708,40	-	708,40		
TOTAL DO ADITIVO							R\$ 1.530.924,10	R\$ 445.241,38	R\$ 19.541,30	R\$ 464.782,68	1.066.141,42	30,36	


André Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Mario Neri Alfano Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/SE: 2706995522

SEM EFEITO
Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA - 2715818424
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADITIVO 01 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UBS - BAIRRO CORUJA	CONTRATO: Nº 042/2024
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO: 005/2024
	14/04/2025 - 22/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
01.06.008	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar
Cálculo	15 na recepção e corredor + 16 (uma em cada sala) = 31 Unidades
01.06.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
Cálculo	1 Unidade
01.06.010	Luminaria autônoma de emergencia com lâmpada halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01
Cálculo	5 Unidades
01.06.011	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c
Cálculo	6 peças de 100m de fio 2,5mm²
01.06.012	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c
Cálculo	4 peças de 100m de fio 1,5mm²
01.06.013	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c
Cálculo	3 peças de 100m de fio 4,0mm²
01.06.014	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c
Cálculo	40 metros de cabo 10mm²


André Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana



Laudo Alberto Neri Alfano Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/SE: 2706905522

SEM EFEITO
Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil REA 2706905522-2487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADITIVO 01 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UBS - BAIRRO CORUJA	CONTRATO: Nº 042/2024
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO: 005/2024
	14/04/2025 - 22/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
01.01	ESQUADRIAS
01.01.009	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura
Cálculo	$(4 * (0,8 \times 2,10)) + (0,8 \times 1,00) = 7,52 \text{ m}^2$
01.02	COBERTURA
01.02.012	Laje pré-moldada unidirecional, biapojada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af_11/2020_pa
Cálculo	$2 * (1,30 \times 1,70) = 4,40 \text{ m}^2$
01.05	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO
01.05.009	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.
Cálculo	4 Unidades
01.05.010	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021
Cálculo	1 Unidade
01.05.011	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020
Cálculo	19 Unidades, uma para cada pia/lavatório
01.05.012	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020
Cálculo	19 Unidades, uma para cada pia/lavatório


André Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana



Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana


Edson Alberto Nery Alfano Junior
 Engenharia Civil
 CREA/SE: 2706905522

SEM EFEITO
 D. S. Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA 2482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO DO ADITIVO 01	
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UBS - BAIRRO CORUJA			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI	DATA DA MEDIÇÃO: 22/04/2025	PERÍODO: 14/04/2025 a 22/04/2025	

INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE 1,5mm² e 2,5mm²

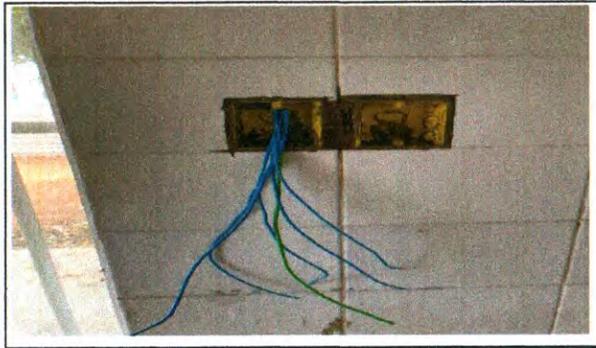


INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE 1,5mm² e 2,5mm²




INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE 1,5mm² e 2,5mm²



INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE 1,5mm² e 2,5mm²

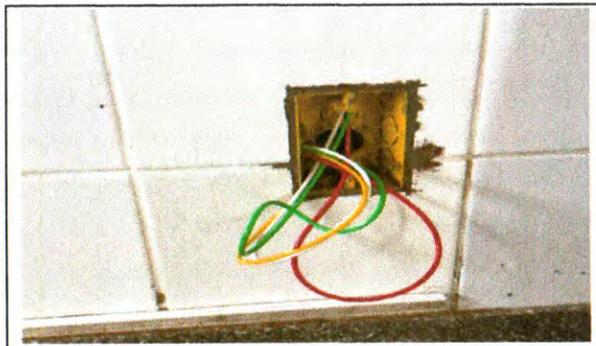

INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS DE COBRE

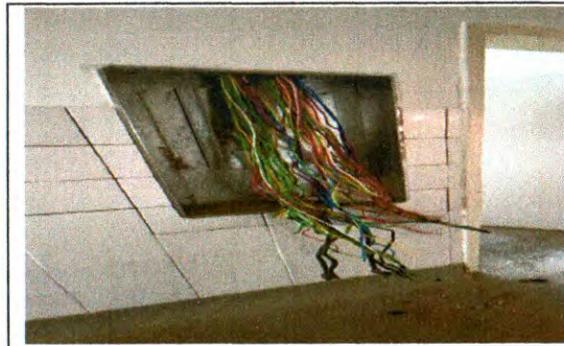

INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES



INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE 1,5mm², 2,5mm² E 4mm²



INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE 1,5mm², 2,5mm² E 4mm²



Rizzia Milene S. Rodrigues Araújo
Rizzia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

Luiz Mario Neri Alfano Junior
Luiz Mario Neri Alfano Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/SE: 2706905522

André Agosti Reis Lapa
André Agosti Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO DO ADITIVO 01


LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UBS - BAIRRO CORUJA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 22/04/2025

PERÍODO: 14/04/2025 a 22/04/2025

INSTALAÇÃO CAIXA d'ÁGUA 2000L

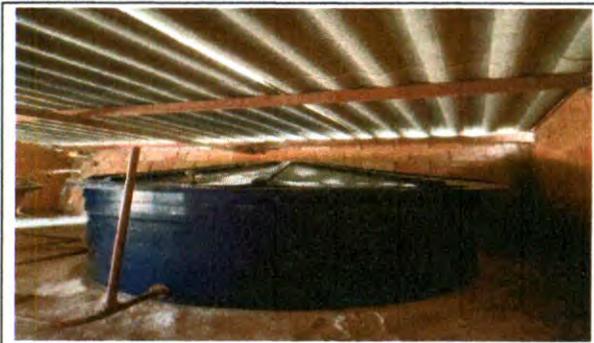

INSTALAÇÃO LÂMPADA DE EMERGÊNCIA




INSTALAÇÃO LÂMPADA DE EMERGÊNCIA



INSTALAÇÃO DAS LÂMPADA

INSTALAÇÃO DAS LÂMPADA


INSTALAÇÃO DA LÂMPADA

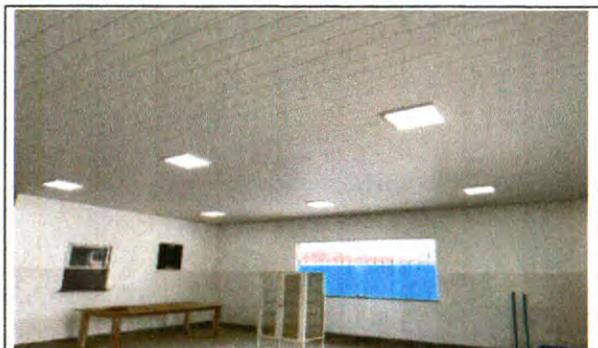


INSTALAÇÃO DA LÂMPADA

EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ MOLDADA

CONCRETAGEM DE LAJE PRÉ MOLDADA

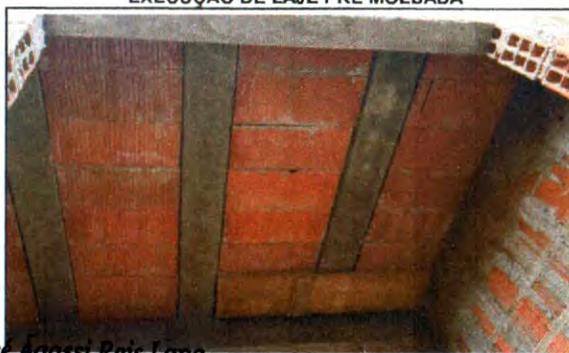


Rízia Malene S. Rodrigues Aratijo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


André Agassi Reis Lapa
Eng. Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


Leda Maria Nery Alfano Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE: 2706905522

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UBS - BAIRRO CORUJA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 22/04/2025

PERÍODO: 14/04/2025 a 22/04/2025


INSTALAÇÃO DA PORTA DE ALUMÍNIO E FECHADURA



INSTALAÇÃO DAS GRADE



INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE ALUMÍNIO E FECHADURAS

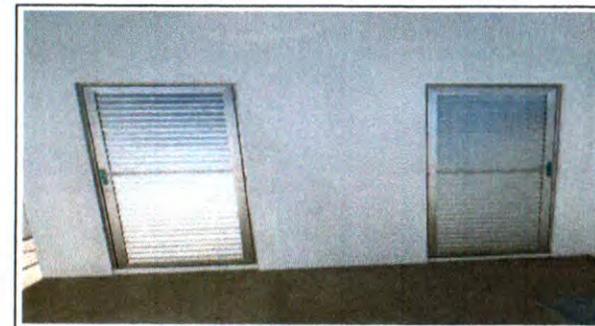

INSTALAÇÃO DE TORNEIRA



INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, MANGOTE E SIFÃO



INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, MANGOTE E SIFÃO



INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, MANGOTE E SIFÃO



INSTALAÇÃO DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO




Rízia Mílene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


Luiz Mario Neri Alfano Junior
Engenheiro Civil
CREAISE: 2706905522

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana
