



OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (Cemitério do Povoado Zangüê)			ARP Nº 041/2025 - PE Nº 18/2025 - CONTRATO Nº 123/2026										
CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			DATA DA MEDIÇÃO: 01/06/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			PERÍODO: 15/04/2026 a 22/05/2026										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS							R\$ 113.421,13	R\$ -	R\$ 113.421,13	R\$ 113.421,13	0,00	100,00
01.01	LIMPEZAS DIVERSAS							R\$ 5.422,76	R\$ -	R\$ 5.422,76	R\$ 5.422,76	-	100,00
01.01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1267,00		1.267,00	1.267,00	R\$ 4,28	R\$ 5.422,76	-	5.422,76	5.422,76	-	100,00
01.02	EMASSAMENTO							R\$ 12.472,61	R\$ -	R\$ 12.472,61	R\$ 12.472,61	R\$ 0,00	100,00
01.02.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	148,83		148,83	148,83	R\$ 10,42	R\$ 1.550,81	-	1.550,81	1.550,81	(0,00)	100,00
01.02.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - R3	m2	768,60		768,60	768,60	R\$ 14,21	R\$ 10.921,81	-	10.921,81	10.921,81	(0,00)	100,00
01.03	PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS							R\$ 17.628,00	R\$ -	R\$ 17.628,00	R\$ 17.628,00	-R\$ 0,00	100,00
01.03.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m2	103,95		103,95	103,95	R\$ 17,71	R\$ 1.840,95	-	1.840,95	1.840,95	0,00	100,00
01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	768,60		768,60	768,60	R\$ 17,41	R\$ 13.381,33	-	13.381,33	13.381,33	(0,00)	100,00
01.03.003	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	768,60		768,60	768,60	R\$ 3,13	R\$ 2.405,72	-	2.405,72	2.405,72	(0,00)	100,00
01.08	COBERTURA							R\$ 18.912,61	R\$ -	R\$ 18.912,61	R\$ 18.912,61	R\$ 0,00	100,00
01.08.001	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo	m2	63,00		63,00	63,00	R\$ 51,02	R\$ 3.214,26	-	3.214,26	3.214,26	-	100,00
01.08.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualidade, cor clara, itabaianinha ou similar	m2	12,60		12,60	12,60	R\$ 49,34	R\$ 621,68	-	621,68	621,68	0,00	100,00
01.08.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, com ripão e ripa	m2	63,00		63,00	63,00	R\$ 141,25	R\$ 8.898,75	-	8.898,75	8.898,75	-	100,00
01.08.005	Remoção e reassentimento de peça serrada em massaranduba ou madeira de lei para telhado	m	28,00		28,00	28,00	R\$ 31,37	R\$ 878,36	-	878,36	878,36	-	100,00
01.08.007	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	m2	63,00		63,00	63,00	R\$ 64,88	R\$ 4.087,44	-	4.087,44	4.087,44	-	100,00
01.08.010	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de pentox ou similar	m2	63,00		63,00	63,00	R\$ 19,24	R\$ 1.212,12	-	1.212,12	1.212,12	-	100,00
01.09	ESQUADRIAS							R\$ 2.003,97	R\$ -	R\$ 2.003,97	R\$ 2.003,97	R\$ -	100,00
01.09.004	Porta ou janela em alumínio, cor NPB tipo veneziana de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças	m2	6,70		6,70	6,70	R\$ 299,10	R\$ 2.003,97	-	2.003,97	2.003,97	-	100,00
01.10	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO							R\$ 31.432,68	R\$ -	R\$ 31.432,68	R\$ 31.432,68	R\$ 0,00	100,00
01.10.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1	m2	1067,70		1.067,70	1.067,70	R\$ 6,21	R\$ 6.630,42	-	6.630,42	6.630,42	(0,00)	100,00
01.10.002	Demolição de reboco	m2	229,95		229,95	229,95	R\$ 8,52	R\$ 1.959,47	-	1.959,47	1.959,47	0,00	100,00
01.10.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 espessura 1,5 cm	m2	768,60		768,60	768,60	R\$ 29,72	R\$ 22.842,79	-	22.842,79	22.842,79	0,00	100,00
01.11	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 20.732,30	R\$ -	R\$ 20.732,30	R\$ 20.732,30	R\$ 0,00	100,00
01.11.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - ver 01	m2	115,50		115,50	115,50	R\$ 24,97	R\$ 2.884,04	-	2.884,04	2.884,04	0,00	100,00
01.11.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 Mpa espessura 7 cm, com formas em quadros 2x2	m2	343,50		343,50	343,50	R\$ 51,96	R\$ 17.848,26	-	17.848,26	17.848,26	-	100,00
01.12	EQUIPE DIRIGENTE							R\$ 4.816,20	R\$ -	R\$ 4.816,20	R\$ 4.816,20	R\$ -	100,00
01.12.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	20,00		20,00	20,00	R\$ 118,67	R\$ 2.373,40	-	2.373,40	2.373,40	-	100,00
01.12.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	40,00		40,00	40,00	R\$ 61,07	R\$ 2.442,80	-	2.442,80	2.442,80	-	100,00
TOTAIS GERAIS								R\$ 113.421,13	R\$ -	R\$ 113.421,13	R\$ 113.421,13	R\$ 0,00	100,00



 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

LEONARDO JOSE
 LIMA
 SA:01377241521

Assinado de forma digital
 por LEONARDO JOSE LIMA
 SA:01377241521
 Dados: 2026.06.08 11:45:54
 -03'00'

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (Cemitério do Povoado Zangue)		ARP Nº 041/2025 - PE Nº 18/2025 - CONTRATO Nº 123/2026			
CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		DATA DA MEDIÇÃO: 01/06/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		PERÍODO: 15/04/2026 a 22/05/2026		MEMÓRIA DE CÁLCULO	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
01.01	LIMPEZAS DIVERSAS				
01.01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1267,00	Área total do terreno = 1.267,00 m²	
01.02	EMASSAMENTO				
01.02.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	148,83	31,50 x 3,30 x 1,35	
01.02.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - R3	m2	768,60	(144x2,1x2)+(31,50x4x1,3)	
01.03	PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS				
01.03.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m2	103,95	31,50 x 3,30	
01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	768,60	(144x2,1x2)+(31,50x4x1,3)	
01.03.003	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	768,60	(144x2,1x2)+(31,50x4x1,3)	
01.08	COBERTURA				
01.08.001	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo	m2	63,00	9,00x 7,00	
01.08.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualidade, cor clara, itabaianinha ou similar	m2	12,60	63,0x 0,20	
01.08.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, com ripão e ripa	m2	63,00	9,00x 7,00	
01.08.005	Remoção e reassentimento de peça serrada em massaranduba ou madeira de lei para telhado	m	28,00	4,0x 7,0	
01.08.007	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	m2	63,00	9,00x 7,00	


 Eng. Civil CREA - 272.894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Eng. Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (Cemitério do Povoado Zangüê)		ARP Nº 041/2025 - PE Nº 18/2025 - CONTRATO Nº 123/2026		
CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		DATA DA MEDIÇÃO: 01/06/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		PERÍODO: 15/04/2026 a 22/05/2026		MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01.08.010	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de pentox ou simular	m2	63,00	9,00x 7,00
01.09	ESQUADRIAS			
01.09.004	Porta ou janela em alumínio, cor NPB tipo veneziana de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças	m2	6,70	(2,5x2,5) + (2,0x2,10)
01.10	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO			
01.10.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1	m2	1067,70	532,35 x 2,0
01.10.002	Demolição de reboco	m2	229,95	126 + 103,95
01.10.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 espessura 1,5 cm	m2	768,60	(144x2,1x2)+(31,50x4x1,3)
01.11	PAVIMENTAÇÃO			
01.11.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - ver 01	m2	115,50	20,0+11,0+11,0+14,0+28,0+31,50
01.11.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 Mpa espessura 7 cm, com formas em quadros 2x2	m2	343,50	20,0+22,0+14,0+28,0+31,5+55,0+55,0+55,0+63,0
01.12	EQUIPE DIRIGENTE			
01.12.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	20,00	Referente a 5% do valor do contrato
01.12.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	40,00	


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

LEONARDO
 JOSE LIMA
 SA:013772415
 21

Assinado de forma
 digital por LEONARDO
 JOSE LIMA
 SA:01377241521
 Dados: 2026.06.08
 11:39:00 -03'00'


 Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (Cemitério do Povoado Zangüê)

ARP Nº 041/2025 - PE Nº 18/2025 -
CONTRATO Nº 123/2026

DATA DA MEDIÇÃO: 01/06/2026

RELATÓRIO
FOTOGRAFICO DA
MEDIÇÃO Nº 01



CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: 15/04/2026 a 22/05/2026

Limpeza do terreno e reboco



Limpeza de terreno e reboco



Chapisco, reboco, demolição de piso



Demolição de concreto da rampa e calçada



Revisão de cobertura completa



Forro de PVC e fundo selador



Chapisco de parede



Chapisco de parede e reboco



Aplicação de fundo selador



Leonardo Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

LEONARDO
JOSE LIMA
SA:01377241521

Assinado de forma digital
por LEONARDO JOSE LIMA
SA:01377241521
Dados: 2026.06.08
11:46:25 -03'00'

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (Cemitério do Povoado Zangüê)

ARP Nº 041/2025 - PE Nº 18/2025 -
CONTRATO Nº 123/2026

DATA DA MEDIÇÃO: 01/06/2026

RELATÓRIO
FOTOGRAFICO DA
MEDIÇÃO Nº 01

AMZ
PRESTADORA DE SERVIÇO

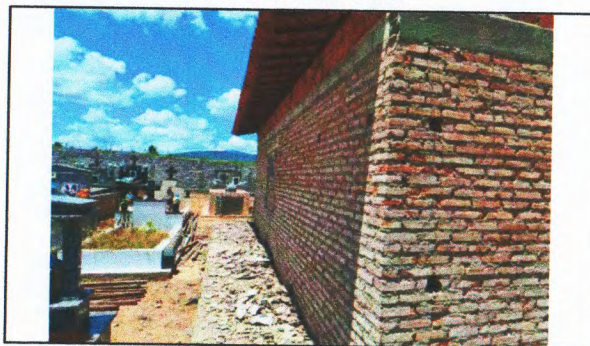
CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: 15/04/2026 a 22/05/2026

Porta em alumínio cor branca completa



Demolição de reboco



Reboco de paredes



Emassamento e pintura



Emassamento e pintura



Emassamento e pintura



Piso em concreto e pintura



Piso em concreto, pintura e porta em alumínio



Piso em concreto e pintura



Thon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**LEONARDO
JOSE LIMA**
SA:01377241521

Assinado de forma digital
por LEONARDO JOSE
LIMA SA:01377241521
Dados: 2026.06.08
11:46:36 -03'00'
