


OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 098/2020					
				B.M.Nº. 24/2022				TEMPO DE SERVIÇO: 27/07/2020					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022				DATA: 01/11/2022					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS							2.036.230,61	1.085.800,15	24.383,05	1.110.183,23	926.047,38	54,52
01.01	EMASSAMENTO							167.366,70	67.518,90	2.773,26	70.292,16	97.074,54	42,00
01.01.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	6.000,00	1.107,65		1.107,65	6,86	41.183,05	7.602,73	-	7.602,73	33.580,32	18,46
01.01.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	9.000,00	5.333,40	246,86	5.580,26	11,23	101.107,28	59.916,17	2.773,26	62.689,43	38.417,85	62,00
01.01.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	2.000,00	-		-	12,54	25.076,37	-	-	-	25.076,37	0,00
01.02	PINTURA SOBRE PAREDES							350.474,87	216.552,80	2.861,97	219.414,78	131.060,08	62,60
01.02.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m2	11.550,00	6.705,52		6.705,52	10,05	116.117,42	67.413,65	-	67.413,65	48.703,77	58,06
01.02.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético	m2	3.000,00	778,01		778,01	12,09	36.266,46	9.405,22	-	9.405,22	26.861,24	25,93
01.02.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	18.000,00	12.697,25	260,06	12.957,31	11,01	198.090,99	139.733,93	2.861,97	142.595,91	55.495,08	71,99
01.03	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS E SOBRE MADEIRA							57.859,77	40.965,09	3.479,88	44.444,97	13.414,80	76,81
01.03.001	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	2.100,00	1.200,00		1.200,00	6,51	13.673,94	7.813,68	-	7.813,68	5.860,26	57,14
01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	2.100,00	1.817,26	280,50	2.097,76	12,41	26.052,60	22.544,93	3.479,88	26.024,81	27,79	99,89
01.03.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético	m2	1.500,00	877,38		877,38	12,09	18.133,22	10.606,48	-	10.606,48	7.526,74	58,49
01.04	PINTURA SOBRE CANTEIROS							188.777,65	70.377,59	5.350,03	75.727,63	113.050,02	40,11
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	25.000,00	9.320,17	708,51	10.028,68	7,55	188.777,65	70.377,59	5.350,03	75.727,63	113.050,02	40,11
01.05	PINTURA SOBRE MEIO-FIO							200.628,57	197.902,32	-	197.902,32	2.726,25	98,64
01.05.001	Pintura de meio-fio (caiação)	m	90.000,00	88.777,03		88.777,03	2,23	200.628,57	197.902,32	-	197.902,32	2.726,25	98,64
01.06	INSTALAÇÕES PREDIAIS							39.261,35	3.804,93	-	3.804,93	35.456,42	9,69
01.06.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	200,00	5,00		5,00	14,38	2.875,94	71,90	-	71,90	2.804,04	2,50
01.06.002	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	200,00	46,00		46,00	60,66	12.131,11	2.790,16	-	2.790,16	9.340,95	23,00
01.06.003	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	150,00	2,00		2,00	65,22	9.782,96	130,44	-	130,44	9.652,52	1,33
01.06.004	Revisão de ponto de água tipo 2	und	150,00	9,00		9,00	59,25	8.886,87	533,21	-	533,21	8.353,66	6,00
01.06.005	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	und	100,00	5,00		5,00	55,84	5.584,47	279,22	-	279,22	5.305,25	5,00
01.07	COBERTURA							451.295,78	182.961,04	-	182.961,04	268.334,74	40,54
01.07.001	Revisão de cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	2.600,00	2.236,63		2.236,63	40,52	105.357,75	90.633,20	-	90.633,20	14.724,55	86,02
01.07.002	Revisão de cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m2	1.200,00	1.175,73		1.175,73	47,71	57.254,48	56.096,51	-	56.096,51	1.157,97	97,98

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 098/2020					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº. 24/2022					CÍVIL DE SERVIÇO: 27/07/2020					
			PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022					DATA: 01/11/2022					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.07.003	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	750,00	18,20		18,20	33,69	25.270,21	613,22	-	613,22	24.656,99	2,43
01.07.004	Revisão de cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m2	1.000,00	-		-	13,66	13.657,19	-	-	-	13.657,19	0,00
01.07.005	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,50mm	m2	500,00	-		-	44,82	22.411,01	-	-	-	22.411,01	0,00
01.07.006	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	3.000,00	-		-	22,80	68.409,32	-	-	-	68.409,32	0,00
01.07.007	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	1.500,00	349,03		349,03	56,65	84.969,77	19.771,33	-	19.771,33	65.198,44	23,27
01.07.008	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00	-		-	44,01	22.005,70	-	-	-	22.005,70	0,00
01.07.009	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	250,00	140,64		140,64	91,56	22.891,22	12.877,68	-	12.877,68	10.013,54	56,26
01.07.010	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	250,00	-		-	82,50	20.624,56	-	-	-	20.624,56	0,00
01.07.011	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	400,00	140,64		140,64	21,11	8.444,55	2.969,10	-	2.969,10	5.475,45	35,16
01.08	ESQUADRIAS							54.934,88	2.670,60	1.046,50	3.717,10	51.217,77	6,77
01.08.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	-		-	54,31	5.431,16	-	-	-	5.431,16	0,00
01.08.002	Revisão de esquadria de ferro	m2	100,00	-	17,05	17,05	61,38	6.137,81	-	1.046,50	1.046,50	5.091,31	17,05
01.08.003	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	und.	40,00	-		-	555,33	22.213,12	-	-	-	22.213,12	0,00
01.08.004	Porta em madeira mista, almofadada, 70 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	und.	20,00	-		-	523,52	10.470,40	-	-	-	10.470,40	0,00
01.08.005	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	und.	20,00	5,00		5,00	534,12	10.682,39	2.670,60	-	2.670,60	8.011,79	25,00
01.09	DIVERSOS							157.745,00	107.359,91	-	107.359,91	50.385,09	68,06
01.09.001	Reboço ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/cal/areia), espessura 1,5cm	m2	1.200,00	884,33		884,33	23,71	28.452,78	20.968,04	-	20.968,04	7.484,74	73,69
01.09.002	Reboço ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), espessura 2,0cm	m2	1.600,00	948,64		948,64	26,02	41.630,66	24.682,82	-	24.682,82	16.947,84	59,29
01.09.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015	m2	2.200,00	1.654,38		1.654,38	4,89	10.758,34	8.090,17	-	8.090,17	2.668,17	75,20
01.09.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 Mpa, e = 7 cm - não inclui formas para juntas de concretagem	m2	1.900,00	1.855,30		1.855,30	28,90	54.910,73	53.618,88	-	53.618,88	1.291,85	97,65
01.09.005	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	300,00	-		-	73,31	21.992,49	-	-	-	21.992,49	0,00
01.10	LIMPEZA							265.449,57	133.841,79	7.672,68	141.514,47	123.935,11	53,31
01.10.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	50.000,00	42.648,50	939,10	43.587,60	2,56	128.201,39	109.351,94	2.407,88	111.759,82	16.441,57	87,18
01.10.002	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	1.000,00	500,00		500,00	2,11	2.114,66	1.057,33	-	1.057,33	1.057,33	50,00

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 098/2020						
			B.M.Nº. 24/2022				ORÇ. EM DE SERVIÇO: 27/07/2020						
			PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022				DATA: 01/11/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.10.003	Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos moles, materia orgânica ou entulhos	m3	7.000,00	1.410,08		1.410,08	12,62	88.322,39	17.791,66	-	17.791,66	70.530,73	20,14
01.10.004	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	und	600,00	300,00	280,00	580,00	18,80	11.281,72	5.640,86	5.264,80	10.905,66	376,06	96,67
01.10.005	Limpeza de reservatório	m3	100,00	-		-	10,91	1.090,81	-	-	-	1.090,81	0,00
01.10.006	Limpeza de fossa até 5m3	und	150,00	-		-	229,59	34.438,60	-	-	-	34.438,60	0,00
01.11	EQUIPE DIRIGENTE							102.436,48	61.845,10	1.198,73	63.043,83	39.392,65	61,54
01.11.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	430,00	257,62	5,00	262,62	92,39	39.729,04	23.802,31	461,97	24.264,28	15.464,76	61,07
01.11.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.475,00	894,84	17,33	912,17	42,51	62.707,44	38.042,79	736,76	38.779,55	23.927,89	61,84
Total geral								2.036.230,61	1.085.800,19	24.383,05	1.110.183,23	926.047,38	54,52
  Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 270606578-2			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____				Aprovado para pagamento Data: ____/____/____						

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA nº 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 24: 01/11/2022
		
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:	
098/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE	
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	
01.01	EMASSAMENTO	
01.01.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	
	Praça do cemitério do Povoado pé do Veado = BANCOS ((10m x (0,6m + 0,6m + 0,4m) + (0,6m x 0,6m)x2) x 6 bancos) = 100,32m²	
	Praça do cemitério do Povoado pé do Veado = PILARES (40 X (0,25m + 0,25m + 0,25m + 0,25m) X 2,20m) = 88m²	
	Lavandeira do Povoado Serra: (1,90m x 2,20m) + (3,2m x 1,1m) + (1m x 2,3m) + (11,10m x 2,3m) + (5,1m x 2,3m) = 58,54m²	
	TOTAL: 246,86	
01.02	PINTURA SOBRE PAREDES	
01.02.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	
	Praça do cemitério do Povoado pé do Veado = BANCOS ((10m x (0,6m + 0,6m + 0,4m) + (0,6m x 0,6m)x2) x 6 bancos) = 100,32m²	
	Praça do cemitério do Povoado pé do Veado = PILARES (40 X (0,25m + 0,25m + 0,25m + 0,25m) X 2,20m) = 88m²	
	Praça do cemitério do Povoado pé do Veado = RAMPAS DE CADEIRANTE (3 RAMPAS x (1,5m x 2m)) = 9 m²	
	Lavandeira do Povoado Serra: (1,90m x 2,20m) + (3,2m x 1,1m) + (1m x 2,3m) + (11,10m x 2,3m) + (5,1m x 2,3m) + (7m x 0,60m) = 62,74m²	
	TOTAL: 260,06m²	
01.03	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS E SOBRE MADEIRA	
01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	
	Lavandeira do Povoado Serra: (1,10m x 1,5m X 2 LADOS) = 3,30m²	
	Cemitério do Povoado Pé do Veado: Portão de acesso ((3,5m + 3,5m)X2,20mX2 LADOS) = 30,8m²	
	Grades do Cemitério do Povoado Pé do Veado: ((40m + 72m) x 1,1m) X 2 LADOS = 246,4m²	
	TOTAL: 280,5m²	
01.04	PINTURA SOBRE CANTEIROS	
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	
	Praça Fausto Cardoso: ((55,11 + 55,14 + 44,63 + 50,59 + 49,74 + 52,00 + 64,63 + 41,67 + 42,74 + 90,53 + 53,36 + 59,42 + 66,74 + 71,59 + 42,21 + 57,44 + 71,68 + 46,44) x 0,35m) + (6 qtd. x 8,00 x 0,60m) = 384,28m²	
	Canteiros ao redor da Praça Fausto Cardoso: (57,47 + 54,47 + 45,12 + 50,86 + 35,91 + 39,34 + 90,70 + 44,79 + 43,98 + 36,18) x 0,65m = 324,23m²	
	Total: 708,51 m²	
01.08	ESQUADRIAS	
01.08.002	Revisão de esquadria de ferro	
	Lavandeira do Povoado Serra: (1,10m x 1,5m = 1,65m²	
	Cemitério do Povoado Pé do Veado: Portão de acesso ((3,5m + 3,5m)X2,20m = 15,4m²	
	TOTAL: 17,05m²	
01.10	LIMPEZA	
01.10.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	
	Praça do Cemitério do Povoado Pé Do Veado: 50,8 m² + 30,9m² + 67,6m² + 53,5m² + 35,6m² + 59,2m² + 135,1m² + 77,1m² + 48,8m² = 558,6m²	
	Rua Miguel Carvalho Peixoto: 190,26m x 2m = 380,52m²	
	Total: 939,10 m²	
01.10.004	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	
	Diversas Ruas da Cidade: 280 und	
	TOTAL: 280 und	
01.11	EQUIPE DIRIGENTE	
01.11.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	
	(Acumulado até o período x engenheiro)/(Valor total do orçamento – administração local) (R\$ 23.184,32 x 430,00 h) / (R\$ 2.036.230,61 – R\$ 39.729,04) = 5,0h	
01.11.002	Mestre de obras com encargos complementares	
	(Acumulado até o período x mestre) / (Valor total do orçamento – administração local) (R\$ 23.184,32 x 1.475,00 h) / (R\$ 2.036.230,61 – R\$ 62.707,44) = 17,33h	


CAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 0760557-0

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-24	
CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO Nº: 098/2020	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	DATA: 01/11/2022	
 LIMPEZA, PINTURA E EMASSAMENTO - PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO	 LIMPEZA E PINTURA DE BANCOS, PILARES E ESQUADRIA METÁLICA - PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO	 LIMPEZA, PINTURA E EMASSAMENTO - PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO
 LIMPEZA, PINTURA E EMASSAMENTO - PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO	 LIMPEZA - RUA MIGUEL CARVALHO PEIXOTO	 LIMPEZA - RUA MIGUEL CARVALHO PEIXOTO
ELABORADO POR: <u>CAL CONSTRUÇÕES EIRELI</u> <u>Jefferson Rodrigues Nascimento</u> Engenheiro CIVIL CREA nº 176668-0/SE	FISCALIZAÇÃO: <u>José Robson Santos da Paixão</u> <u>Eng. Civil - CREA/SE 2720293954</u> <u>Coordenador de Núcleo</u> <u>Prefeitura Municipal de Itabaiana</u>	Observações:

OBRA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-24



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº: 098/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 01/11/2022



LIMPEZA DE CAIXAS- DIVERSAS RUAS DA CIDADE



LIMPEZA DE CAIXAS- DIVERSAS RUAS DA CIDADE



LIMPEZA DE CAIXAS- DIVERSAS RUAS DA CIDADE



LIMPEZA DE CAIXAS- DIVERSAS RUAS DA CIDADE



LIMPEZA DE CAIXAS- DIVERSAS RUAS DA CIDADE



REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO E PINTURA - PORTÃO DO
CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA Nº 77095577-0

FISCALIZAÇÃO:

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Observações:

OBRA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-24



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº: 098/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 01/11/2022



LIMPEZA DE CAIXAS- DIVERSAS RUAS DA CIDADE




LIMPEZA DE CAIXAS- DIVERSAS RUAS DA CIDADE



LIMPEZA DE CAIXAS- DIVERSAS RUAS DA CIDADE



LIMPEZA DE CAIXAS- DIVERSAS RUAS DA CIDADE

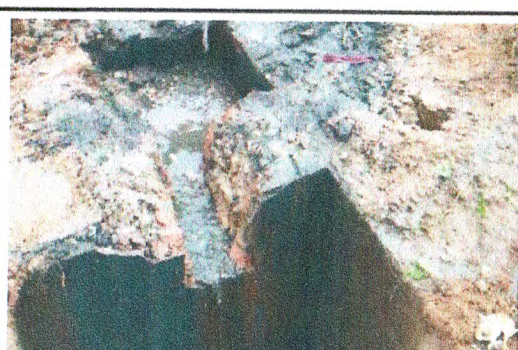

LIMPEZA DE CAIXAS- DIVERSAS RUAS DA CIDADE



REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO E PINTURA - PORTÃO DO
CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 776955-1

FISCALIZAÇÃO:
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720299954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Observações:

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-24	
CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI		CONTRATO Nº: 098/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		DATA: 01/11/2022
 LIMPEZA, PINTURA E EMASSAMENTO - PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO	 LIMPEZA E PINTURA DE BANCOS, PILARES E ESQUADRIA METÁLICA - PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO	 LIMPEZA, PINTURA E EMASSAMENTO - PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO
 LIMPEZA, PINTURA E EMASSAMENTO - PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO	 LIMPEZA - RUA MIGUEL CARVALHO PEIXOTO	 LIMPEZA - RUA MIGUEL CARVALHO PEIXOTO
ELABORADO POR: <u>CAL CONSTRUÇÕES EIRELI</u> <u>Jefferson Rodrigues Nascimento</u> Engenheiro Civil CREA nº 770660-1	FISCALIZAÇÃO: <u>José Robson Santos da Paixão</u> Eng. Civil - CREA/SE 272020-9954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	Observações:
