



OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 098/2020						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº. 25/2022				ORDEM DE SERVIÇO: 27/07/2020						
			PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022				DATA: 30/11/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS						2.036.230,61	1.110.183,22	34.317,57	1.144.500,80	891.729,81	56,21	
01.01	EMASSAMENTO						167.366,70	70.292,16	13.164,50	83.456,67	83.910,03	49,86	
01.01.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	6.000,00	1.107,65		1.107,65	6,86	41.183,05	7.602,73	-	7.602,73	33.580,32	18,46
01.01.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	9.000,00	5.580,26	1.171,83	6.752,09	11,23	101.107,28	62.689,43	13.164,50	75.853,94	25.253,34	75,02
01.01.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	2.000,00	-		-	12,54	25.076,37	-	-	-	25.076,37	0,00
01.02	PINTURA SOBRE PAREDES						350.474,87	219.414,78	14.927,48	234.342,26	116.132,60	66,86	
01.02.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m2	11.550,00	6.705,52		6.705,52	10,05	116.117,42	67.413,65	-	67.413,65	48.703,77	58,06
01.02.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético	m2	3.000,00	778,01		778,01	12,09	36.266,46	9.405,22	-	9.405,22	26.861,24	25,93
01.02.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	18.000,00	12.957,31	1.356,42	14.313,73	11,01	198.090,99	142.595,91	14.927,48	157.523,39	40.567,60	79,52
01.03	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS E SOBRE MADEIRA						57.859,77	44.444,97	-	44.444,97	13.414,80	76,81	
01.03.001	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	2.100,00	1.200,00		1.200,00	6,51	13.673,94	7.813,68	-	7.813,68	5.860,26	57,14
01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	2.100,00	2.097,76		2.097,76	12,41	26.052,60	26.024,81	-	26.024,81	27,79	99,89
01.03.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético	m2	1.500,00	877,38		877,38	12,09	18.133,22	10.606,48	-	10.606,48	7.526,74	58,49
01.04	PINTURA SOBRE CANTEIROS						188.777,65	75.727,63	208,18	75.935,81	112.841,84	40,23	
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	25.000,00	10.028,68	27,57	10.056,25	7,55	188.777,65	75.727,63	208,18	75.935,81	112.841,84	40,23
01.05	PINTURA SOBRE MEIO-FIO						200.628,57	197.902,32	1.835,35	199.737,67	890,90	99,56	
01.05.001	Pintura de meio-fio (caiação)	m	90.000,00	88.777,03	823,32	89.600,35	2,23	200.628,57	197.902,32	1.835,35	199.737,67	890,90	99,56
01.06	INSTALAÇÕES PREDIAIS						39.261,35	3.804,93	-	3.804,93	35.456,42	9,69	
01.06.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	200,00	5,00		5,00	14,38	2.875,94	71,90	-	71,90	2.804,04	2,50
01.06.002	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	200,00	46,00		46,00	60,66	12.131,11	2.790,16	-	2.790,16	9.340,95	23,00
01.06.003	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	150,00	2,00		2,00	65,22	9.782,96	130,44	-	130,44	9.652,52	1,33
01.06.004	Revisão de ponto de água tipo 2	und	150,00	9,00		9,00	59,25	8.886,87	533,21	-	533,21	8.353,66	6,00
01.06.005	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	und	100,00	5,00		5,00	55,84	5.584,47	279,22	-	279,22	5.305,25	5,00
01.07	COBERTURA						451.295,78	182.961,04	-	182.961,04	268.334,74	40,54	
01.07.001	Revisão de cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	2.600,00	2.236,63		2.236,63	40,52	105.357,75	90.633,20	-	90.633,20	14.724,55	86,02
01.07.002	Revisão de cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m2	1.200,00	1.175,73		1.175,73	47,71	57.254,48	56.096,51	-	56.096,51	1.157,97	97,98

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI



Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CRE 7.76E 2720298954
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 098/2020						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº. 25/2022				ORDEM DE SERVIÇO: 27/07/2020						
			PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022				DATA: 30/11/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.07.003	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	750,00	18,20		18,20	33,69	25.270,21	613,22	-	613,22	24.656,99	2,43
01.07.004	Revisão de cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m2	1.000,00	-		-	13,66	13.657,19	-	-	-	13.657,19	0,00
01.07.005	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,50mm	m2	500,00	-		-	44,82	22.411,01	-	-	-	22.411,01	0,00
01.07.006	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	3.000,00	-		-	22,80	68.409,32	-	-	-	68.409,32	0,00
01.07.007	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	1.500,00	349,03		349,03	56,65	84.969,77	19.771,33	-	19.771,33	65.198,44	23,27
01.07.008	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00	-		-	44,01	22.005,70	-	-	-	22.005,70	0,00
01.07.009	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	250,00	140,64		140,64	91,56	22.891,22	12.877,68	-	12.877,68	10.013,54	56,26
01.07.010	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	250,00	-		-	82,50	20.624,56	-	-	-	20.624,56	0,00
01.07.011	Ruífo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	400,00	140,64		140,64	21,11	8.444,55	2.969,10	-	2.969,10	5.475,45	35,16
01.08	ESQUADRIAS							54.934,88	3.717,10	1.148,24	4.865,34	50.069,53	8,86
01.08.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	-		-	54,31	5.431,16	-	-	-	5.431,16	0,00
01.08.002	Revisão de esquadria de ferro	m2	100,00	17,05	9,66	26,71	61,38	6.137,81	1.046,50	592,91	1.639,41	4.498,40	26,71
01.08.003	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	und.	40,00	-	1,00	1,00	555,33	22.213,12	-	555,33	555,33	21.657,79	2,50
01.08.004	Porta em madeira mista, almofadada, 70 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	und.	20,00	-		-	523,52	10.470,40	-	-	-	10.470,40	0,00
01.08.005	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	und.	20,00	5,00		5,00	534,12	10.682,39	2.670,60	-	2.670,60	8.011,79	25,00
01.09	DIVERSOS							157.745,00	107.359,91	-	107.359,91	50.385,09	68,06
01.09.001	Reboço ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/cal/areia), espessura 1,5cm	m2	1.200,00	884,33		884,33	23,71	28.452,78	20.968,04	-	20.968,04	7.484,74	73,69
01.09.002	Reboço ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), espessura 2,0cm	m2	1.600,00	948,64		948,64	26,02	41.630,66	24.682,82	-	24.682,82	16.947,84	59,29
01.09.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015	m2	2.200,00	1.654,38		1.654,38	4,89	10.758,34	8.090,17	-	8.090,17	2.668,17	75,20
01.09.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 Mpa, e = 7 cm - não inclui formas para juntas de concretagem	m2	1.900,00	1.855,30		1.855,30	28,90	54.910,73	53.618,88	-	53.618,88	1.291,85	97,65
01.09.005	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	300,00	-		-	73,31	21.992,49	-	-	-	21.992,49	0,00
01.10	LIMPEZA							265.449,57	141.514,47	1.348,32	142.862,79	122.586,79	53,82
01.10.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	50.000,00	43.587,60	525,86	44.113,46	2,56	128.201,39	111.759,82	1.348,32	113.108,14	15.093,25	88,23
01.10.002	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	1.000,00	500,00		500,00	2,11	2.114,66	1.057,33	-	1.057,33	1.057,33	50,00

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270306578-2

José Robson dos Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 272029954
Página 2 de 3
Coordenador de Núcleo

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 098/2020						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 25/2022				ORDEM DE SERVIÇO: 27/07/2020						
			PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022				DATA: 30/11/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.10.003	Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos moles, materia orgânica ou entulhos	m3	7.000,00	1.410,08		1.410,08	12,62	88.322,39	17.791,66	-	17.791,66	70.530,73	20,14
01.10.004	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	und	600,00	580,00		580,00	18,80	11.281,72	10.905,66	-	10.905,66	376,06	96,67
01.10.005	Limpeza de reservatório	m3	100,00	-		-	10,91	1.090,81	-	-	-	1.090,81	0,00
01.10.006	Limpeza de fossa até 5m3	und	150,00	-		-	229,59	34.438,60	-	-	-	34.438,60	0,00
01.11	EQUIPE DIRIGENTE							102.436,48	63.043,83	1.685,50	64.729,33	37.707,15	63,19
01.11.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	430,00	262,62	7,02	269,64	92,39	39.729,04	24.264,28	648,60	24.912,88	14.816,16	62,71
01.11.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.475,00	912,17	24,39	936,56	42,51	62.707,44	38.779,55	1.036,90	39.816,45	22.890,99	63,50
Total geral								2.036.230,61	1.110.183,23	34.317,57	1.144.500,80	891.729,81	56,21
 Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 270606578-2			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						


José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 25: 30/11/2022



TRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
098/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
01.01	EMASSAMENTO
	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03
1.01.002	<p>Pórtico da Av. Dr. Luiz Magalhães = $(18,55 \text{ m}^2 \times 2 \text{ Lados} \times 4 \text{ Petalas}) + (0,25\text{m} \times 10,25\text{m} \times 4 \text{ Petalas}) + (46,52\text{m}^2 \times 2 \text{ Lados} \times 2 \text{ Braços}) + (8,32\text{m}^2 \times 2 \text{ Braços}) + (95,23\text{m}^2 \times 2 \text{ Lados} \times 2 \text{ Braços}) + (25,98\text{m}^2 \text{ parede frontal}) + (19,67\text{m}^2 \times 2 \text{ lados}) = 807,61 \text{ m}^2$</p> <p>Muro da Fachada da Escola Maria Clíméria de Jesus = $42,75\text{m} \times 2,3\text{m} = 98,325 \text{ m}^2$</p> <p>Lavadeira do Povoado Gandú 2 = $(1,90\text{m} \times 4 \text{ lados} \times 2,25\text{m}) + (2,30\text{m} \times 1 \text{ lado} \times 2,25\text{m}) = 22,27\text{m}^2$</p> <p>Sede da Secretaria de Comercio = $(8,90\text{m} \times 3,15\text{m}) \times 3 \text{ andares} + (3,28\text{m} \times 1,9\text{m} \times 2 \text{ paredes}) + (2,23\text{m} \times 1\text{m} \times 3 \text{ lados}) + (3,81\text{m} \times 1\text{m} \times 3 \text{ lados}) = 132,80 \text{ m}^3$</p> <p>Coreto da Praça Fausto Cardoso = $(5,14\text{m} \times 2,72\text{m}) + (1 \times 5,14) + ((5,14^2) \times 3,14) / 4 \times 2 \text{ lados} + (8 \text{ Pilares} \times (0,4\text{m} \times 3,14 \times 2 \times 2,5\text{m})) = 110,83 \text{ m}^2$</p> <p>TOTAL: 1171,83m²</p>
01.02	PINTURA SOBRE PAREDES
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional
1.02.003	<p>Pórtico da Av. Dr. Luiz Magalhães = $(18,55 \text{ m}^2 \times 2 \text{ Lados} \times 4 \text{ Petalas}) + (0,25\text{m} \times 10,25\text{m} \times 4 \text{ Petalas}) + (46,52\text{m}^2 \times 2 \text{ Lados} \times 2 \text{ Braços}) + (8,32\text{m}^2 \times 2 \text{ Braços}) + (95,23\text{m}^2 \times 2 \text{ Lados} \times 2 \text{ Braços}) + (25,98\text{m}^2 \text{ parede frontal}) + (19,67\text{m}^2 \times 2 \text{ lados}) = 807,61 \text{ m}^2$</p> <p>Muro da Fachada da Escola Maria Clíméria de Jesus = $42,75\text{m} \times 2,3\text{m} = 98,325 \text{ m}^2$</p> <p>Lavadeira do Povoado Gandú 2 = $(1,90\text{m} \times 4 \text{ lados} \times 2,25\text{m}) + (2,30\text{m} \times 1 \text{ lado} \times 2,25\text{m}) + (2 \times 3,14 \times 2,2\text{m} \times 0,8\text{m}) = 33,33\text{m}^2$</p> <p>Sede da Secretaria de Comercio = $(8,90\text{m} \times 3,15\text{m}) \times 3 \text{ andares} + (3,28\text{m} \times 1,9\text{m} \times 2 \text{ paredes}) + (2,23\text{m} \times 1\text{m} \times 3 \text{ lados}) + (3,81\text{m} \times 1\text{m} \times 3 \text{ lados}) + (3,5\text{m} \times 1,1\text{m}) \text{ rampa de cadeirante} = 136,65 \text{ m}^3$</p> <p>Praça Santa Clara: Bancos de concreto $(62,53\text{m} \times (0,6\text{m} + 0,6\text{m} + 0,4\text{m})) + (17 \text{ bancos} \times ((0,4\text{m} \times 0,8\text{m} \times 2) + (0,4\text{m} \times 4\text{m} \times 2))) = 169,68\text{m}^2$</p> <p>Coreto da Praça Fausto Cardoso = $(5,14\text{m} \times 2,72\text{m}) + (1 \times 5,14) + ((5,14^2) \times 3,14) / 4 \times 2 \text{ lados} + (8 \text{ Pilares} \times (0,4\text{m} \times 3,14 \times 2 \times 2,5\text{m})) = 110,83 \text{ m}^2$</p> <p>TOTAL: 1356,42 m²</p>
01.04	PINTURA SOBRE CANTEIROS
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)
1.04.001	<p>Canteiro Pórtico da Av. Dr. Luiz Magalhães: $(91,9\text{m} \times 0,3\text{m}) = 27,57\text{m}^2$</p> <p>Total: 27,57 m²</p>
01.05	PINTURA SOBRE MEIO-FIO
	Pintura de meio-fio (calação)
1.05.001	<p>Praça Fausto Cardoso: $(336,98\text{m} \text{ Ao Redor da Praça}) + (187,91\text{m} + 55,35\text{m} + 132,58\text{m}) = 712,82\text{m}$</p> <p>Pórtico Av. Dr. Luiz Magalhães: $110,50\text{m}$</p> <p>Total: 823,32 m²</p>
01.08	ESQUADRIAS
	Revisão de esquadria de ferro
1.08.002	<p>Portão Escola Maria Clíméria de Jesus = $4,60\text{m} \times 2,10\text{m} = 9,66\text{m}^2$</p> <p>TOTAL: 9,66m²</p>
	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens
1.08.003	<p>Sede da Secretaria de Obras: 1und</p> <p>TOTAL: 1 Und</p>
01.10	LIMPEZA
	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima
1.10.001	<p>Praça Santa Clara: $119,32\text{m}^2 + 289,25\text{m}^2 + 107,29\text{m}^2 = 525,86\text{m}^2$</p> <p>TOTAL: 525,86m²</p>
01.11	EQUIPE DIRIGENTE
1.11.001	<p>Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares (Acumulado até o período x engenheiro) / (Valor total do orçamento – administração local) $(\text{R\\$ } 32.632,07 \times 430,00 \text{ h}) / (\text{R\\$ } 2.036.230,61 - \text{R\\$ } 39.729,04) = 7,02\text{h}$</p>
1.11.002	<p>Mestre de obras com encargos complementares (Acumulado até o período x mestre) / (Valor total do orçamento – administração local) $(\text{R\\$ } 32.632,07 \times 1.475,00 \text{ h}) / (\text{R\\$ } 2.036.230,61 - \text{R\\$ } 62.707,44) = 24,39\text{h}$</p>

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 70606578-8

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-25



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº: 098/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 30/11/2022




PINTURA DE MEIO-FIO - PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RUAS
ADJACENTES



PINTURA DE MEIO-FIO - PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RUAS
ADJACENTES



PINTURA DE MEIO-FIO - PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RUAS
ADJACENTES

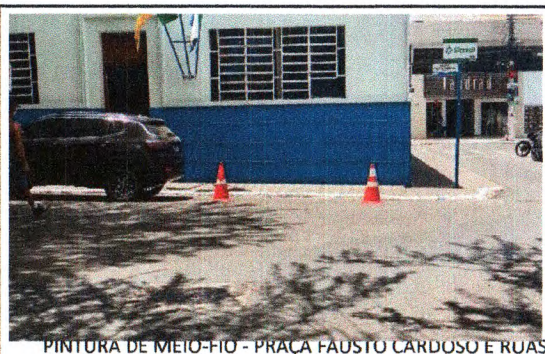

PINTURA DE MEIO-FIO - PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RUAS
ADJACENTES



PINTURA DE MEIO-FIO - PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RUAS
ADJACENTES



PINTURA DE MEIO-FIO - PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RUAS
ADJACENTES

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270606578-2

FISCALIZAÇÃO:
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720299954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Observações:

OBRA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-25



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI


CONTRATO Nº: 098/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 30/11/2022



EMASSAMENTO E PINTURA - CORETO DA PRAÇA FRUSTO
CARDOSO

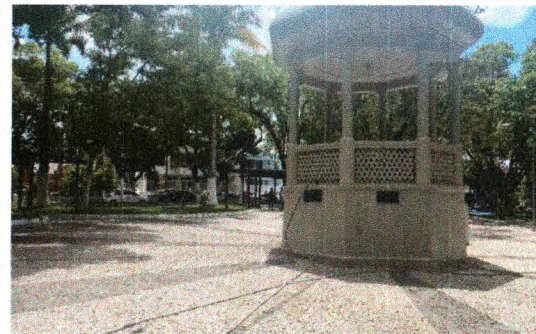

EMASSAMENTO E PINTURA - CORETO DA PRAÇA FRUSTO
CARDOSO



EMASSAMENTO E PINTURA - PÓRTICO DA AV. DR. LUIZ
MAGALHÃES



EMASSAMENTO E PINTURA - PÓRTICO DA AV. DR. LUIZ
MAGALHÃES



PINTURA DE CANTEIROS E MEIO-FIO - PÓRTICO DA AV. DR. LUIZ
MAGALHÃES



INSTALAÇÃO DE PORTA - SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS

ELABORADO POR:

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA Nº 270606579 P

FISCALIZAÇÃO:

José Robson Santos da Paixão
Eng. CIVIL - CREA Nº SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Observações:

OBRA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-25



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI


CONTRATO Nº: 098/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE


DATA: 30/11/2022



EMASSAMENTO E PINTURA - SEDE DA SECRETARIA DE COMERCIO

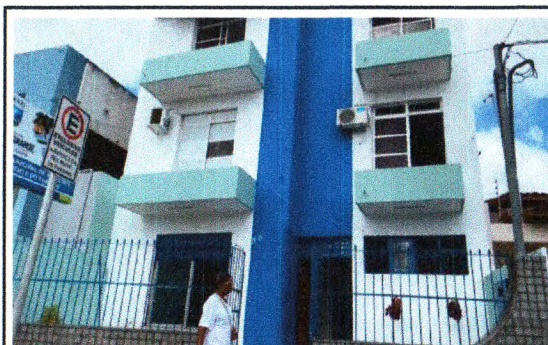

EMASSAMENTO E PINTURA - SEDE DA SECRETARIA DE COMERCIO

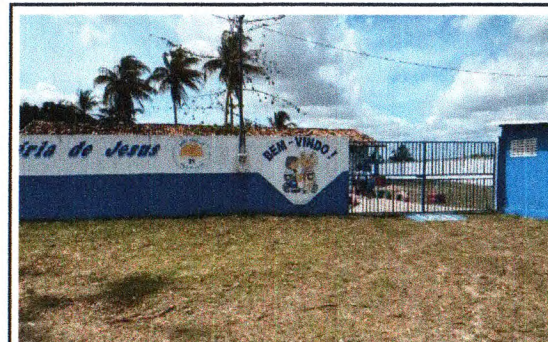

REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO - ESCOLA MARIA CLIMÉRIA DE JESUS



EMASSAMENTO E PINTURA - ESCOLA MARIA CLIMÉRIA DE JESUS



EMASSAMENTO E PINTURA - LAVANDERIA DO POVOADO GANDÚ 2



LIMPEZA E PINTURA - PRAÇA SANTA CLARA


ELABORADO POR:

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA Nº 2706606577

FISCALIZAÇÃO:

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720299954
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Observações:




OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-25	
CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO Nº: 098/2020	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	DATA: 30/11/2022	



LIMPEZA E PINTURA - PRAÇA SANTA CLARA



LIMPEZA E PINTURA - PRAÇA SANTA CLARA



ELABORADO POR: <u>CAL CONSTRUÇÕES EIRELI</u> <i>Jefferson Rodrigues Nascimento</i> Engenheiro Civil CREA nº 270606578-8	FISCALIZAÇÃO: <u>José Robson Santos da Paixão</u> Eng. Civil - CREA nº 2720298954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	Observações:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------
