

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024				
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA			PERÍODO DE MEDIÇÃO 11/05/2026 a 01/06/2026			LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARINA JACINTA DE SOUZA NO POVOADO ZANGUÊ				
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE			LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARINA JACINTA DE SOUZA NO POVOADO ZANGUÊ							
Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado	Do Período	Acumulado	Saldo a Melhor	Medição
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE									
01.01	ESQUADRIAS									
01.01.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	und	50,00		2,00					
01.01.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	und	50,00		2,00					
01.01.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	und	25,00		-					
01.01.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	60,00		-					
01.01.005	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	300,00		4,00					
01.01.006	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	40,00		-					
01.01.007	Vidro liso incolor 6mm - Ver 01/10/2021	m2	100,00		-					
01.01.008	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00		-					
01.02	COBERTURA									
01.02.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	1.000,00		-					
01.02.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	600,00		-					
01.02.003	Maedramento em massarandubá/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8m	un	20,00		-					
01.02.004	Maedramento em massarandubá/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusiva peças principais	m2	800,00		-					
01.02.005	Maedramento em massarandubá/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20cm com abertura de encaixes	m	200,00		-					
01.02.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ re-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	800,00		117,62					
01.02.007	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aratorros ou similar, instalado - Rev 06/10/2021	m2	1.000,00		65,55					
01.02.008	Fôrro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	500,00							
01.02.009	Impermeabilização de superfície com mania asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm, al 09/2023	m2	1.000,00							
01.02.010	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	500,00							
01.02.011	Emassamento de algeroz	m	1.000,00		38,00					
01.03	PAREDES									
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1.400,00		6,41					
01.03.002	Chapisco em parede argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015	m2	2.200,00		5,42					
01.03.003	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.200,00		-					
01.03.004	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2.200,00		5,42					
01.03.005	Demolição de reboco	m2	1.500,00		-					
01.03.006	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00		-					
01.04	PINTURA									
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.000,00		4,00					

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024							
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA			PERÍODO DE MEDIÇÃO 11/05/2026 a 01/06/2026										
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE			LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARINA JACINTA DE SOUZA NO POVOADO ZANGUÊ										
Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Preço Unitário R\$	Contabilização	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a Medir	% Medição
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	4.500,00	838,47	705,22	1.543,69	R\$ 15,90	R\$ 71.546,20	13.330,96	11.212,40	24.543,37	47.002,83	34,30
01.04.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	400,00		-	-	R\$ 26,82	R\$ 10.728,00	-	-	-	10.728,00	0,00
01.04.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corídea, lixamento e retoques - R1	m2	2.500,00		-	-	R\$ 12,78	R\$ 31.939,80	-	-	-	31.939,80	0,00
01.04.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4.500,00	159,48	50,63	210,11	R\$ 13,24	R\$ 59.566,81	2.111,05	670,19	2.781,24	56.785,57	4,67
01.04.006	Pintura de mão fix (calçada)	m	500,00	4,77	4,77	4,77	R\$ 4,96	R\$ 2.478,68	-	23,65	23,65	2.455,03	0,95
01.04.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	600,00	79,80	45,68	125,48	R\$ 21,34	R\$ 12.803,17	1.702,82	974,75	2.677,57	10.125,60	20,91
01.05 INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIO													
01.05.001	Torneira plástica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	40,00			-	R\$ 27,21	R\$ 1.088,31	-	-	-	1.088,31	0,00
01.05.002	Lavatório louça (Decca-Ravenna ref L-915) sem coluna, c/ válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (decca ref sp7) ou similares	un	40,00			-	R\$ 270,58	R\$ 10.822,33	-	-	-	10.822,33	0,00
01.05.003	Caixa de descarga de sobrepot completa akros ou similar	un	100,00		-	-	R\$ 70,61	R\$ 7.060,82	-	-	-	7.060,82	0,00
01.05.004	Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plástico universal branco e conjunto de fixação, exceto carga descarga - Rev 04	un	40,00		-	-	R\$ 365,88	R\$ 14.635,61	-	-	-	14.635,61	0,00
01.05.005	Ponto de água fria aparente, c/ material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	40,00		-	-	R\$ 71,05	R\$ 2.841,93	-	-	-	2.841,93	0,00
01.05.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, misturários, ralos sifonados, etc...)	un	40,00		-	-	R\$ 91,78	R\$ 3.671,16	-	-	-	3.671,16	0,00
01.05.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	40,00		-	-	R\$ 127,02	R\$ 5.080,60	-	-	-	5.080,60	0,00
01.05.008	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40,00		-	-	R\$ 114,50	R\$ 4.580,05	-	-	-	4.580,05	0,00
01.06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
01.06.001	Luminária calha sobrepot plammp fluorescente 1x40w, completa, incl. reator convencional e lâmpada - Rev. 01	un	50,00		4,00	4,00	R\$ 146,40	R\$ 7.320,21	-	585,92	585,92	6.734,59	8,00
01.06.002	Luminária calha sobrepot plammp fluorescente 1x20w, completa, incl. reator convencional e lâmpada	un	50,00		2,00	2,00	R\$ 100,14	R\$ 5.007,13	-	200,29	200,29	4.806,84	4,00
01.06.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	50,00			-	R\$ 317,77	R\$ 15.888,67	-	-	-	15.888,67	0,00
01.06.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	50,00			-	R\$ 269,22	R\$ 13.460,83	-	-	-	13.460,83	0,00
01.06.005	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	20,00			-	R\$ 68,62	R\$ 1.376,32	-	-	-	1.376,32	0,00
01.06.006	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	100,00			-	R\$ 31,58	R\$ 3.157,82	-	-	-	3.157,82	0,00
01.06.007	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	50,00		8,00	8,00	R\$ 25,47	R\$ 1.273,40	-	203,74	203,74	1.069,66	16,00
01.07 LIMPEZA													
01.07.001	Limpeza de calha de passagem ou de gordura com ressenamento de tampa	un	50,00			-	R\$ 27,66	R\$ 1.382,92	-	-	-	1.382,92	0,00
01.07.002	Limpeza de calha de zinco	m	200,00			-	R\$ 21,07	R\$ 4.213,22	-	-	-	4.213,22	0,00
01.07.003	Limpeza de fossa acima de 5m3	m3	200,00			-	R\$ 51,29	R\$ 10.258,47	-	-	-	10.258,47	0,00
01.07.004	Limpeza de reservatório	m3	200,00			-	R\$ 12,30	R\$ 2.460,86	-	-	-	2.460,86	0,00
01.08 PAVIMENTAÇÃO													
01.08.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af. 08/2022	m2	500,00		142,50	142,50	R\$ 62,11	R\$ 31.054,18	-	8.850,44	8.850,44	22.203,74	28,50
01.08.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	500,00		20,19	20,19	R\$ 16,65	R\$ 8.326,88	-	336,24	336,24	7.990,64	4,04
01.08.003	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	500,00			-	R\$ 55,34	R\$ 27.668,93	-	-	-	27.668,93	0,00
01.08.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas na altura das paredes, af. 02/2023, pe	m2	300,00			-	R\$ 59,76	R\$ 17.928,21	-	-	-	17.928,21	0,00

Jeovânio Oliveira de Trindade
 Arq.º Eng.º - 125358126362-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 272482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA			PERÍODO DE MEDIÇÃO 11/05/2026 a 01/06/2026			LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARINA JACINTA DE SOUZA NO POVOADO ZANGUÊ		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE			Item			Descrição dos Serviços		
Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Médio	Saldo a Medir	Acumulado	Medido
01.08.005	m2	300,00	R\$ 56,75	R\$ 17.025,83	-	-	-	0,00
01.08.006	m2	500,00	R\$ 41,82	R\$ 20.809,34	20,19	840,28	840,28	4,04
01.08.007	un	20,00	R\$ 354,81	R\$ 7.096,24	1,00	354,81	354,81	5,00
01.08.008	m3	60,00	R\$ 2.368,64	R\$ 142.118,32	-	-	-	0,00
01.08.009	m2	300,00	R\$ 43,39	R\$ 13.016,97	-	-	-	0,00
01.09	JARDINAGEM			R\$ 26.512,92	-	-	-	0,00
01.09.001	Gram. esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	R\$ 26,51	R\$ 7.951,67	-	-	-	0,00
01.09.002	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais	un	R\$ 37,12	R\$ 18.561,24	-	-	-	0,00
Total geral				R\$ 1.582.882,26	R\$ 17.444,93	R\$ 38.060,09	R\$ 55.204,92	R\$ 1.527.677,34

Documento assinado digitalmente
LUIZ MARIO NERIALFANO JUNIOR
Data: 02/06/2026 12:44:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>




Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482/87
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq.º Urb. - CREA 126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2º BM - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARINA JACINTA DE SOUZA NO POVOADO ZANGUÊ				
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA				
PREGÃO ELETRÔNICO: 005/2024			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/05/2026 a 01/06/2026	
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	
01.08.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af 08/2022	m2	142,50	$(9,00 \times 3,28) + (5,30 \times 11,37) + (11,40 \times 3,59) + (8,89 \times 0,5) + (8,61 \times 0,5) + (6,09 \times 0,5) = 142,50m^2$
01.08.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	20,19	$(2,64 \times 4,65) + (3,45 \times 1,90) + (1,70 \times 0,8) = 20,19m^2$
01.08.006	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af 02/2023 pe	m2	20,19	$(2,64 \times 4,65) + (3,45 \times 1,90) + (1,70 \times 0,8) = 20,19m^2$
01.08.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	1 rampa para acesso de deficientes

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIZ MARIO NERI ALFARO JUNIOR
Data: 02/06/2026 12:44:16-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


Jeovânio Oliveira Tintade
Arquiteto - CREA 126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaitana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaitana

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2º BM - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARINA JACINTA DE SOUZA NO POVOADO ZANGUÊ					
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA					
PREGÃO ELETRÔNICO: 005/2024					
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/05/2026 a 01/06/2026					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
01.01 ESQUADRIAS					
01.01.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, / inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	und	2,00	2 unidades	
01.01.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, / inclusive batente e ferragens	und	2,00	2 unidades	
01.01.005	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	4,00	1,60 x 2,50 = 4,00 m²	
01.02 COBERTURA					
01.02.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabalana ou similar - Rev 01	m2	117,62	(8,83 x 6,16) + (10,08 x 3,58) = 90,4792 x 1,30 inclinação 30 % = 117,62m²	
01.02.007	Ferro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	65,55	(2,73x 3,62) + (2,22 x 1,98) + (2,97 x 3,36) + (0,80 x 2,60) + (4,15 x 2,47) + (1,20 x 2,00) + (2,00 x 1,65) + (5,06 x 3,00) + (2,23 x 1,59) + (1,83 x 2,48) = 65,55m²	
01.02.011	Emassamento de algeroz	m	38,00	(14 x 0,9) + (28,26 x 0,9) + (14x 0,9) = 50,63m	
01.03 PAREDES					
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	6,41	5,00 + 1,41 = 6,41m²	
01.03.002	Chapisco em parede argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015	m2	5,42	(0,2115 x 2) + (0,5 x 10,00) = 5,42m²	
01.03.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	5,42	(0,2115 x 2) + (0,5 x 10,00) = 5,42m²	
01.04 PINTURA					
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético, sobre superfícies metálicas - R1	m2	4,00	1,60 x 2,50 = 4,00 m²	
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	705,22	Pintura paredes externas (104,961 + 130,707 + 1,41 + 303,804 + 75,6 + paredes internas 88,7449) = 705,22m²	
01.04.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	50,63	(14 x 0,9) + (28,26 x 0,9) + (14x 0,9) = 50,63 m²	
01.04.006	Pintura de meio fio (calação)	m	4,77	(31,77 x 0,15) = 4,77m	
01.04.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	45,68	(3,78 x 4,00) + (3,36 x 2,00) + (1,47 x 2,00) + (4,00 x 2,00) + (2,40 x 2,00) + (1,80 x 2,00) + (2,25 x 2) = 45,68m²	
01.06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
01.06.001	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lâmpada - Rev. 01	un	4,00	Jocvânio Oliveira da Trindade 4 unidades	
01.06.002	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lâmpada	un	2,00	Arq. Urb. A. A. AUSE A134362.3 Coordenador de Núcleo 2 unidades	
01.06.007	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	8,00	Prefeitura Municipal de Itabalana 8 pontos de tomadas	
01.08 PAVIMENTAÇÃO					
				Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 272482468 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabalana	


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722492487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana


EXECUÇÃO DA CALÇADA

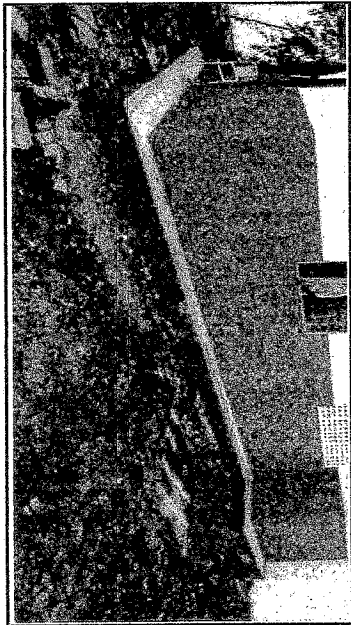


INSTALAÇÃO DA PORTA E PINTURA




REVISÃO DE PONTO TOMADA COM REPOSIÇÃO

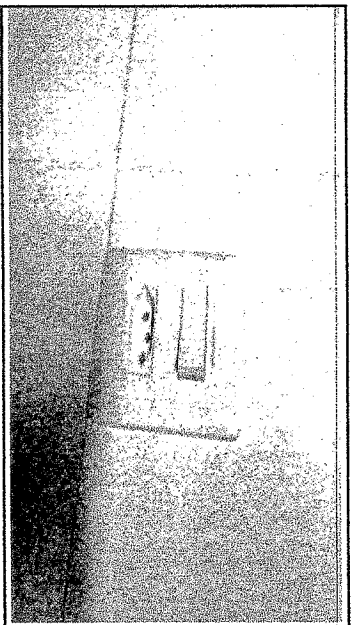

EXECUÇÃO DA CALÇADA

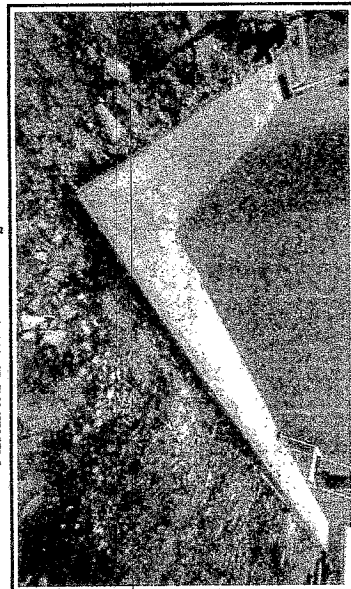

INSTALAÇÃO DA PORTA E PINTURA

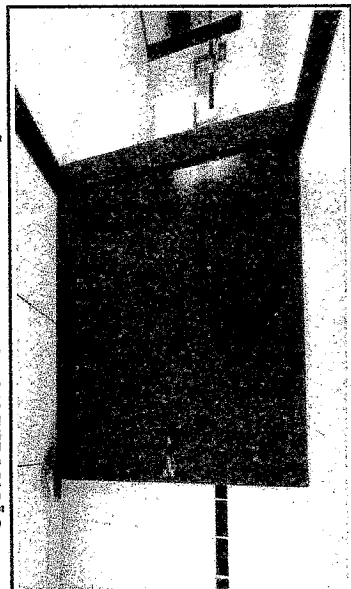


REVISÃO DE PONTO TOMADA COM REPOSIÇÃO




INSTALAÇÃO DA GRADE DE FERRO



INSTALAÇÃO DA PORTA E PINTURA

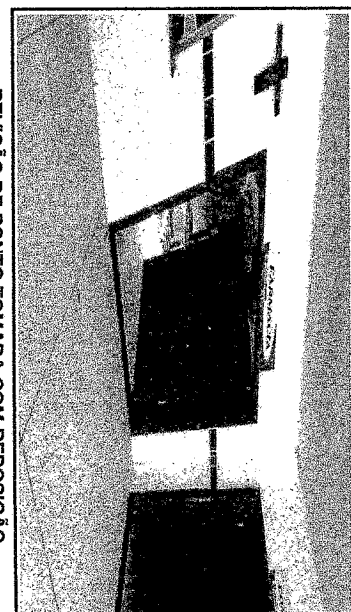


REVISÃO DE PONTO TOMADA COM REPOSIÇÃO




COORDENADOR DE NÚCLEO
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA - 272245287
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


EMASSAMENTO NAS PAREDES

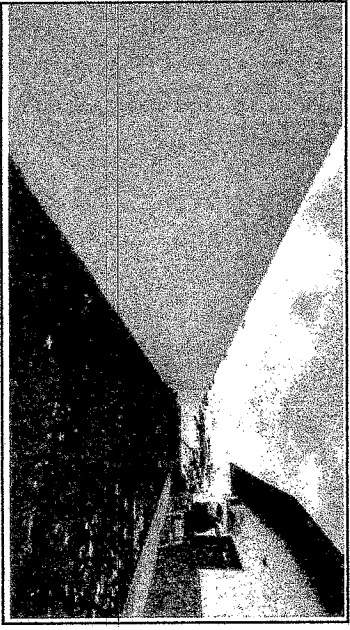

PINTURA NAS PAREDES E JANELAS

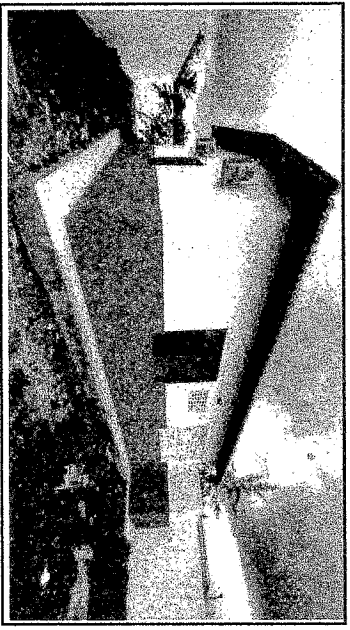

PINTURA NAS PAREDES, MEIO FIO, GRADE E CALÇADA

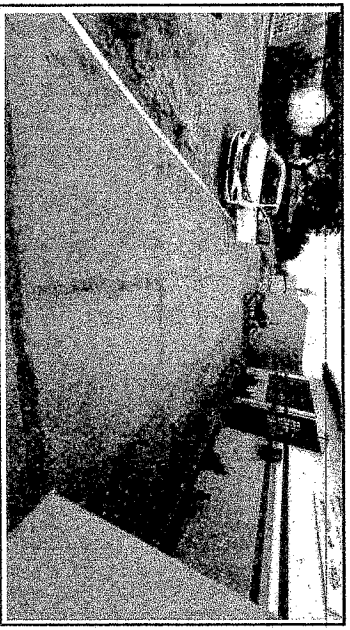


EMASSAMENTO NAS PAREDES




PINTURA NAS PAREDES, JANELAS E PORTAS




PINTURAS NAS PAREDES, MEIO FIO E CALÇADA

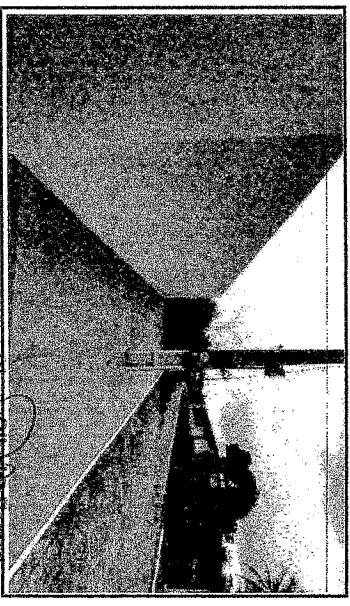


PINTURA NAS PAREDES

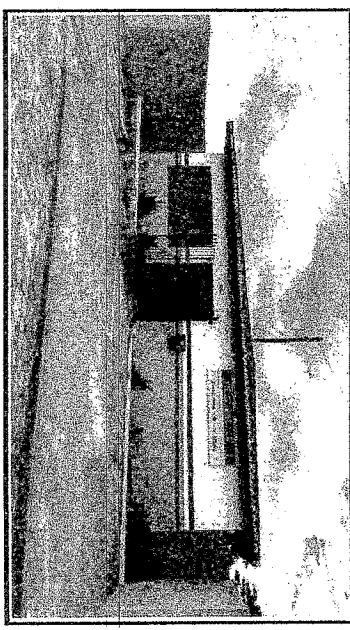

PINTURA NAS PAREDES

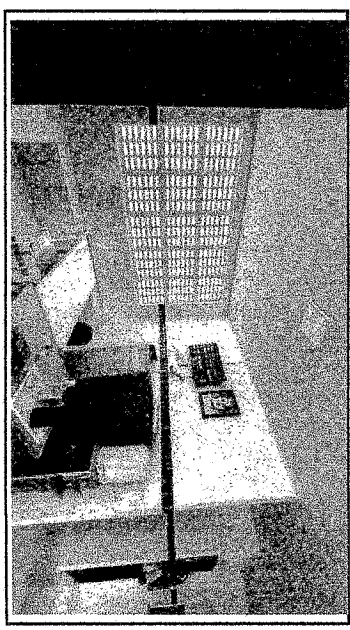

EXECUÇÃO DE RAMPA PARA DEFICIENTES

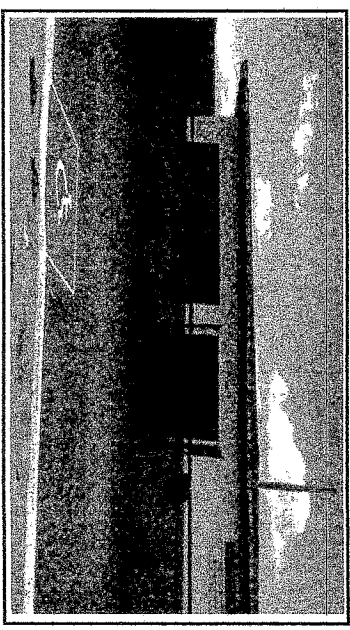


OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA-SE		PREÇAO ELETRÔNICO N° 005/2024	RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDICAÇÃO N° 02
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARINA JACINTA DE SOUZA NO POVOADO ZANGUÊ			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA		DATA DA MEDICAÇÃO: 01/06/2024	PERÍODO: 13/05/2024 a 01/06/2024

RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS




INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E LUMINÁRIA

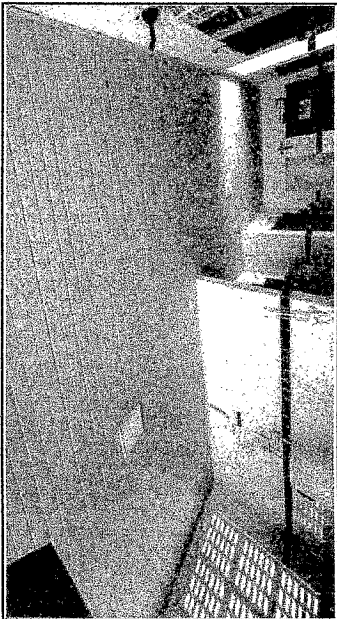


INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E LUMINÁRIA




RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS

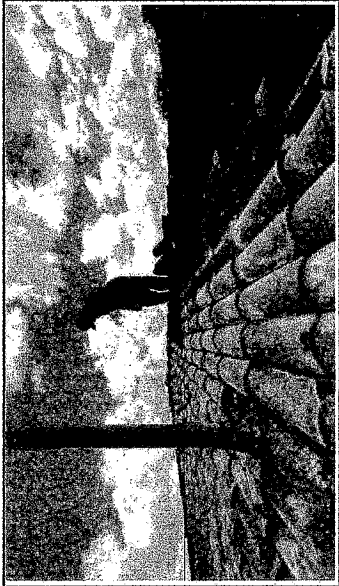


INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E LUMINÁRIA

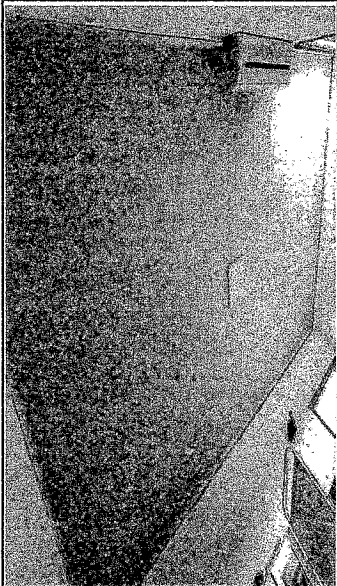


INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E LUMINÁRIA

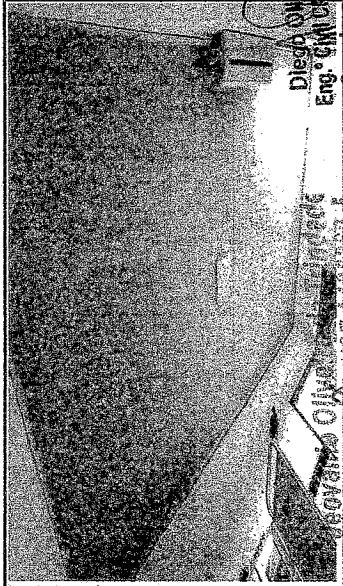


RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS

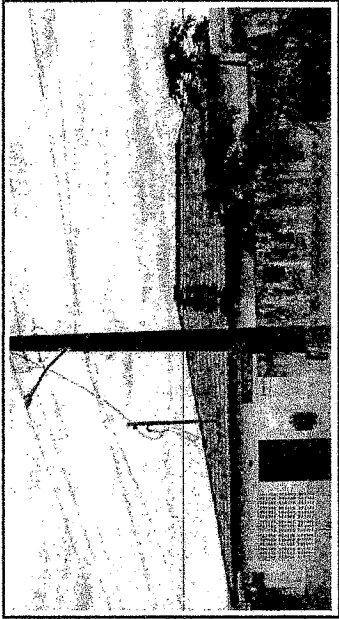

INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E LUMINÁRIA

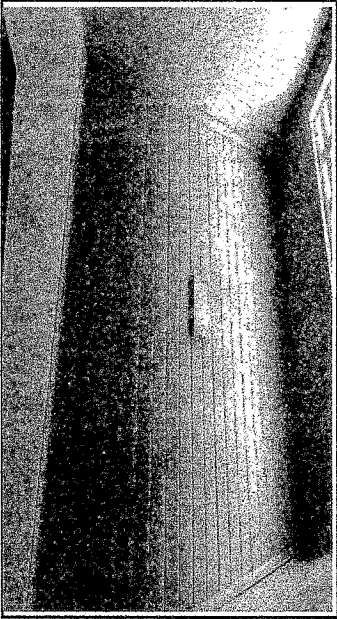

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

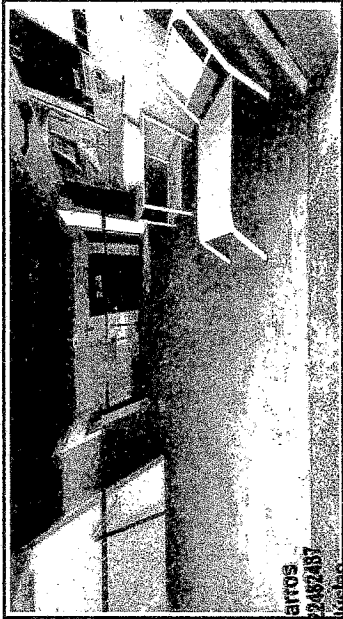




Diego Oliveira Barros
Eng.º CREA - 272482/SE
Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Arq. Urb. CAUSE ALVES
Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA-SE		PREFEÇAÇÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024	RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDICAÇÃO Nº 02
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARINA JACINTA DE SOUZA NO POVOADO ZANGUÊ		DATA DA MEDICAÇÃO: 01/06/2026	PERÍODO: 11/05/2026 a 01/06/2026
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA			

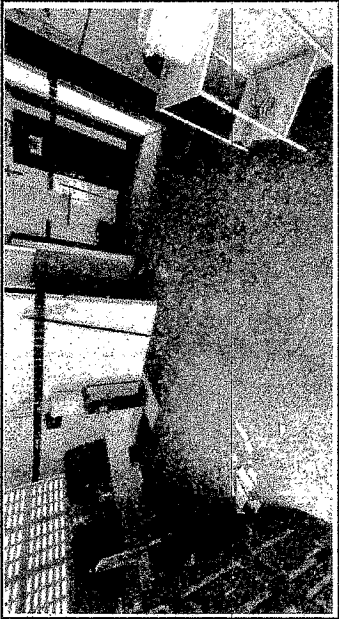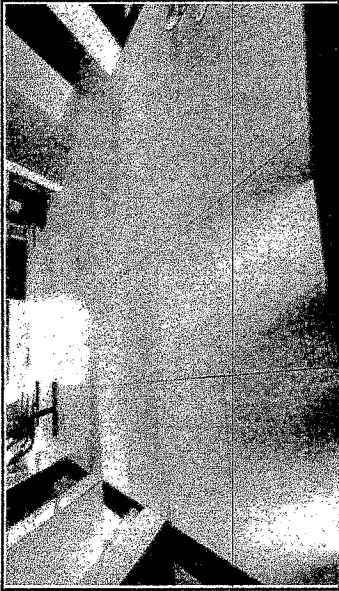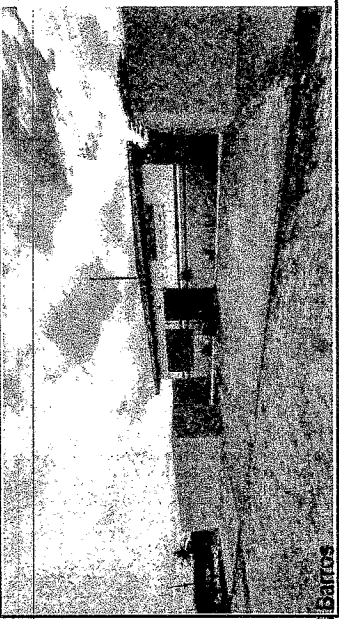DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		REVESTIMENTO CERÂMICO		REVESTIMENTO CERÂMICO	
	EXECUÇÃO DE ALVENARIA		EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO		
	EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO		EXECUÇÃO DA CALÇADA		

Jeovani Oliveira da Silva
 Arq e Urb - CREA 123362-5
 Coordenador de Núcleo

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil-REA - 272482487
 Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana
