

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 284/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDO E QUALIDADE	
				B.M.Nº. 02/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025				DATA: 10/11/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								18.139,60	18.139,60	0,00	18.139,60	0,00	100,00
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	355,94	2.135,64	2.135,64	0,00	2.135,64	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	174,67	174,67	0,00	174,67	27,47	4.798,18	4.798,18	0,00	4.798,18	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	2.427,95	2.427,95	0,00	2.427,95	4,57	11.095,73	11.095,73	0,00	11.095,73	0,00	100,00
1.004	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	3,00	3,00	0,00	3,00	36,68	110,04	110,04	0,00	110,04	0,00	100,00
2 MOVIMENTAÇÕES DE SOLO								2.312,17	2.312,17	0,00	2.312,17	0,00	100,00
2.005	Colchão de areia	m3	17,73	17,73		17,73	130,41	2.312,17	2.312,17	0,00	2.312,17	0,00	100,00
3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								6.724,55	4.614,22	2.110,33	6.724,55	0,00	100,00
3.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	290,81	83,10	207,71	290,81	10,16	2.954,63	844,30	2.110,33	2.954,63	0,00	100,00
3.012	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	51,40	51,40	0,00	51,40	13,33	685,16	685,16	0,00	685,16	0,00	100,00
3.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	100,00	100,00	0,00	100,00	26,47	2.647,00	2.647,00	0,00	2.647,00	0,00	100,00
3.015	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	8,00	8,00	0,00	8,00	54,72	437,76	437,76	0,00	437,76	0,00	100,00
4 PAVIMENTAÇÃO								37.932,55	30.180,70	7.751,85	37.932,55	0,00	100,00
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af_01/2024	m	174,67	0,00	174,67	174,67	44,38	7.751,85	0,00	7.751,85	7.751,85	0,00	100,00
4.005	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	170,00	170,00	0,00	170,00	120,08	20.413,60	20.413,60	0,00	20.413,60	0,00	100,00
4.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	51,40	51,40	0,00	51,40	111,50	5.731,10	5.731,10	0,00	5.731,10	0,00	100,00
4.007	Piso cimentado desmoldado traço 1:5, e = 5 cm	m2	100,00	100,00	0,00	100,00	40,36	4.036,00	4.036,00	0,00	4.036,00	0,00	100,00
5 ACESSIBILIDADE								93,84	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
5.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	8,00	0,00	0,00	0,00	11,73	93,84	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
6 REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS								41,09	0,00	41,09	41,09	0,00	100,00
6.005	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,00	0,00	1,00	1,00	6,66	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	100,00
6.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,00	0,00	1,00	1,00	34,43	34,43	0,00	34,43	34,43	0,00	100,00
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								2.982,46	0,00	0,00	0,00	2.982,46	0,00
7.007	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	134,30	537,20	0,00	0,00	0,00	537,20	0,00
7.030	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.222,63	2.445,26	0,00	0,00	0,00	2.445,26	0,00
8 PINTURA								28.868,08	0,00	28.868,08	28.868,08	0,02	100,00
8.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af_05/2021	m2	680,82	0,00	680,82	680,82	20,22	13.766,16	0,00	13.766,16	13.766,16	0,00	100,00
8.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	581,62	0,00	581,62	581,62	4,74	2.756,88	0,00	2.756,88	2.756,88	0,00	100,00
8.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos), af_01/2020	m2	7,00	0,00	7,00	7,00	28,46	199,22	0,00	199,22	199,22	0,00	100,00
8.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	263,01	0,00	263,01	263,01	46,18	12.145,80	0,00	12.145,80	12.145,80	0,00	100,00
9 EQUIPAMENTOS DIVERSOS								35.936,75	0,00	10.448,62	10.448,62	25.488,13	29,08
9.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	7,00	0,00	0,00	0,00	333,63	2.335,41	0,00	0,00	0,00	2.335,41	0,00

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Rizila Muler S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 284/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA QUALIDADE E QUALIDADE	
			B.M.Nº. 02/2025					ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025					
			PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025					DATA: 10/11/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		
9.005	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	12.822,76	12.822,76	0,00	0,00	0,00	12.822,76	0,00
9.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.706,09	3.706,09	0,00	3.706,09	3.706,09	0,00	100,00
9.010	Brinquedo - Gira-gira (carrossel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.859,06	3.859,06	0,00	3.859,06	3.859,06	0,00	100,00
9.011	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.883,47	2.883,47	0,00	2.883,47	2.883,47	0,00	100,00
9.013	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	0,00	0,00	0,00	4.177,74	8.355,48	0,00	0,00	0,00	8.355,48	0,00
9.014	Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48	0,00	0,00	0,00	1.974,48	0,00
11 PAISAGISMO								12.701,75	0,00	0,00	0,00	12.701,75	0,00
11.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	392,43	0,00	0,00	0,00	25,37	9.955,95	0,00	0,00	0,00	9.955,95	0,00
11.007	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	50,00	0,00	0,00	0,00	37,38	1.869,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00
11.008	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	10,00	0,00	0,00	0,00	87,68	876,80	0,00	0,00	0,00	876,80	0,00
13 DIVERSOS								8.683,07	239,87	479,30	719,18	7.963,90	8,28
13.001	Limpeza geral	m2	2.427,95	0,00	0,00	0,00	2,42	5.875,64	0,00	0,00	0,00	5.875,64	0,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	22,19	22,19	0,00	22,19	10,81	239,87	239,87	0,00	239,87	0,00	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	399,42	0,00	399,42	399,42	1,20	479,30	0,00	479,30	479,30	0,00	100,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								6.602,61	3.301,31	3.301,31	6.602,61	0,00	100,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	21,00	10,50	10,50	21,00	154,93	3.253,53	1.626,77	1.626,77	3.253,53	0,00	100,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	42,00	21,00	21,00	42,00	79,74	3.349,08	1.674,54	1.674,54	3.349,08	0,00	100,00
TOTAL GERAL								161.018,52	58.787,87	53.000,56	111.788,43	49.230,09	69,43
CONSTRUTORA ROCHA LTDA CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__					


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.ª Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rízia Muelene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO		BM 02
		CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:	
284/2025/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	
3.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado - 207,71 M2	
4	PAVIMENTAÇÃO	
	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).	
4.001	af_01/2024 - 174,67 M	
6	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS	
6.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 - 1,00 M2	
6.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm - 1,00 M2	
8	PINTURA	
8.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 - 680,82 M2	
8.002	Pintura de meio fio (calação) - 581,62 M	
8.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 - 7,00 M2	
8.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 - 263,01 M2	
9	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
9.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4" - 1,00 UND	
9.010	Brinquedo - Gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar - 1,00 UND	
9.011	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 - 1,00 UND	
13	DIVERSOS	
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ - 1,5X15,00X17,75= 399,42 TKM	
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 10,50H	
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - 21,00 H	

gov.br

Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 24/11/2025 12:22:31-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

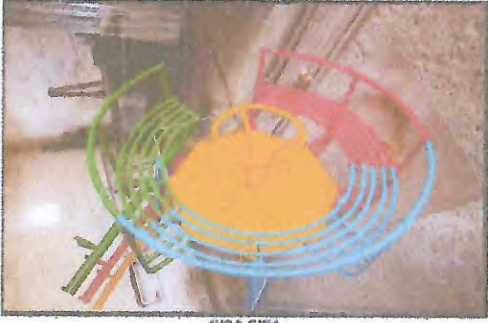
Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 24/11/2025 12:08:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJO
 Data: 25/11/2025 08:43:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 284/2025/PMI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 10/11/2025
		
DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	ASSENTAMENTO DE GUIA	CHAPISCO
		
REBOCO	PINTURA DE PISO	PINTURA DE MEIO FIO
ELABORADO POR: 	FISCALIZAÇÃO:  Sherrissa Bezerra de Macedo Eng.ª Civil - CREA 2722159830 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	Observações:


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715918424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA	CONTRATO Nº: 284/2025/PMI	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE	DATA: 10/11/2025	
		
PINTURA METÁLICA	PINTURA EXTERIORES	BALANÇO
		
GIRA GIRA	ELÍPTICO	

ELABORADO POR:  Documento assinado digitalmente MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA Data: 28/11/2025 11:32:06 -0300 Verifique em https://validar.it.gov.br	FISCALIZAÇÃO:  Sherissa Bezerra de Macedo Eng.ª Civil - CREA 27221598/30 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	Observações:
--	--	---------------------


 Rízia Nênes S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 27158184/24
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
