

Item	Descrição dos Serviços	Unid	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$					Saldo a Medir	% Medir
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período			
01 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE														
01.01 ESQUADRIAS														
01.01.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-laca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	und	50,00	2,00		2,00	R\$ 608,83	R\$ 30.441,59	1.217,66	-	1.217,66	29.223,93	4,00	
01.01.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-laca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	und	50,00	2,00	4,00	6,00	R\$ 641,15	R\$ 32.057,71	1.282,31	2.564,62	3.846,92	28.210,79	12,00	
01.01.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-laca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	und	25,00				R\$ 658,21	R\$ 16.455,15				16.455,15	0,00	
01.01.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	60,00		27,00	27,00	R\$ 129,40	R\$ 7.764,28	-	3.493,93	3.493,93	4.270,35	45,00	
01.01.005	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	300,00	4,00		4,00	R\$ 215,58	R\$ 64.672,98	882,31	-	882,31	65.810,67	1,33	
01.01.006	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	40,00				R\$ 833,43	R\$ 33.337,29	-	-	-	33.337,29	0,00	
01.01.007	Vidro liso incoler 6mm - Ver 01.10/2021	m2	100,00		3,90	3,90	R\$ 194,81	R\$ 19.481,44	-	759,78	759,78	18.721,66	3,90	
01.01.008	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00				R\$ 119,30	R\$ 11.930,13	-	-	-	11.930,13	0,00	
01.02 COBERTURA														
01.02.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	1.000,00				R\$ 11,17	R\$ 11.172,36	-	-	-	11.172,36	0,00	
01.02.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm	m2	800,00				R\$ 77,42	R\$ 46.452,96	-	-	-	46.452,96	0,00	
01.02.003	Maderamento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8m	un	20,00				R\$ 1.281,62	R\$ 25.632,33	-	-	-	25.632,33	0,00	
01.02.004	Maderamento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	600,00				R\$ 98,17	R\$ 51.703,17	-	-	-	51.703,17	0,00	
01.02.005	Maderamento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20cm com abertura de encaixes	m	200,00				R\$ 101,88	R\$ 20.376,49	-	-	-	20.376,49	0,00	
01.02.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ re-aproveitamento de 80%, labialina ou similar - Rev 01	m2	800,00	117,62	476,42	594,04	R\$ 46,04	R\$ 36.833,22	5.415,40	21.936,10	27.350,51	9.482,71	74,26	
01.02.007	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Avaflores ou similar, instalado - Rev 08.10/2021	m2	1.000,00	65,55	173,13	238,68	R\$ 63,58	R\$ 63.575,66	4.167,36	11.008,85	15.174,24	48.401,42	23,87	
01.02.008	Fôrro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	500,00				R\$ 35,57	R\$ 17.785,67	-	-	-	17.785,67	0,00	
01.02.009	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm, af 08/2023	m2	1.000,00		60,30	60,30	R\$ 114,89	R\$ 114.888,95	-	6.927,80	6.927,80	107.961,15	6,03	
01.02.010	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	500,00				R\$ 120,03	R\$ 60.017,48	443,27	-	443,27	60.017,48	0,00	
01.02.011	Emassamento de alvenoz	m	1.000,00	38,00		38,00	R\$ 11,96	R\$ 11.954,97	-	-	-	11.221,70	3,80	
01.03 PAREDES														
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=8cm, com argamassa f5 - 1:2 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09	m2	1.400,00	6,41		6,41	R\$ 42,64	R\$ 59.689,43	273,29	-	273,29	59.416,14	0,46	
01.03.002	Chapisco em parede argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisão 08/2015	m2	2.200,00	5,42		5,42	R\$ 8,96	R\$ 15.287,08	37,66	-	37,66	15.249,42	0,25	
01.03.003	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço f5 - 1:2-10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.200,00				R\$ 27,78	R\$ 61.125,28	-	-	-	61.125,28	0,00	
01.03.004	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço f5 - 1:2-6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2.200,00	5,42	18,22	23,64	R\$ 41,34	R\$ 90.908,96	224,04	753,14	977,18	89.961,36	1,07	
01.03.005	Demolição de reboco	m2	1.500,00				R\$ 10,50	R\$ 15.752,43	-	-	-	15.752,43	0,00	
01.03.006	Paralela de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00				R\$ 51,29	R\$ 25.646,17	-	-	-	25.646,17	0,00	

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE (Clínica de Família Dr. Ormeil Câmara de Oliveira)			Boletim de Medição 03											
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA			Data da medição: 18/06/2026			Período: 11/05/2026 a 18/06/2026								
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABAUAENSE			LOCAL: Centro de Saúde da Família Dr. Ormeil Câmara de Oliveira, Bairro SÃO CRISTÓVÃO											
Item	Descrição dos Serviços	Unid	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALOR TOTAL R\$				Saldo a Medir	% Medição	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01.04 PINTURA														
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.000,00	4,00		4,00	R\$ 22,00	R\$ 211.061,86	30.113,83	74.690,13	104.803,96	106.257,69	49,66	
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	4.500,00	1.543,89	1.762,67	3.306,56	R\$ 15,90	R\$ 71.546,20	24.543,37	28.024,96	52.568,33	18.977,87	73,47	
01.04.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa de obo, lixamento e retoques	m2	400,00				R\$ 26,82	R\$ 10.728,00				10.728,00	0,00	
01.04.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	2.500,00				R\$ 12,78	R\$ 31.939,80				31.939,80	0,00	
01.04.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev.03	m2	4.500,00	210,11	3.525,34	3.735,45	R\$ 13,24	R\$ 59.566,81	2.781,24	46.665,17	49.446,41	10.120,40	83,01	
01.04.006	Pintura de meio fio (calçamento)	m	500,00	4,77		4,77	R\$ 4,96	R\$ 2.478,68	23,65		23,65	2.455,03	0,95	
01.04.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	600,00	125,48		125,48	R\$ 21,34	R\$ 12.803,17	2.677,57		2.677,57	10.125,60	20,91	
01.06 INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIO														
01.06.001	Torneira plástica para jardins, H-ERC 1128, 1/2" ou similar	un	40,00				R\$ 27,21	R\$ 1.088,31				1.088,31	0,00	
01.06.002	Lavatório bacia (Deca-Ravenna nel (-,915) sem coluna, c/valvula, sifão, engate e torneira (nenc nel 1984) todos de plástico, conj. de fixação (deca nel 587) ou similares	un	40,00				R\$ 270,56	R\$ 10.822,33				10.822,33	0,00	
01.06.003	Caixa de descarga de sobrepor completa outros ou similar	un	100,00				R\$ 70,61	R\$ 7.060,82				7.060,82	0,00	
01.06.004	Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plástico universal branco e conjunto de fixação, exceto carga descarga - Rev.04	un	40,00				R\$ 365,89	R\$ 14.635,61				14.635,61	0,00	
01.06.005	Porto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	40,00				R\$ 71,05	R\$ 2.841,93				2.841,93	0,00	
01.06.006	Porto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mistóios, ralos sanitários, etc.)	un	40,00				R\$ 91,78	R\$ 3.671,16				3.671,16	0,00	
01.06.007	Porto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	un	40,00				R\$ 127,02	R\$ 5.080,80				5.080,80	0,00	
01.06.008	Porto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40,00				R\$ 114,50	R\$ 4.580,05				4.580,05	0,00	
01.08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
01.08.001	Luminária calha sobrepor plamp fluorescente 1x40w, completa, incl. reator convencional e lâmpada - Rev. 01	un	50,00	4,00	29,00	33,00	R\$ 146,40	R\$ 7.320,21	566,62	4.245,72	4.831,34	2.488,87	66,00	
01.08.002	Luminária calha sobrepor plamp fluorescente 1x20w, completa, incl. reator convencional e lâmpada	un	50,00	2,00		2,00	R\$ 100,14	R\$ 5.007,13	200,29		200,29	4.806,84	4,00	
01.08.003	Porto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanitizado embutido Ø 3/4"	un	50,00				R\$ 317,77	R\$ 15.898,67				15.898,67	0,00	
01.08.004	Porto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanitizado aparente Ø 3/4"	un	50,00				R\$ 269,22	R\$ 13.460,83				13.460,83	0,00	
01.08.005	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	20,00				R\$ 88,82	R\$ 1.376,32				1.376,32	0,00	
01.08.006	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame lãpado	m	100,00				R\$ 31,58	R\$ 3.157,82				3.157,82	0,00	
01.08.007	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	50,00	8,00		8,00	R\$ 25,47	R\$ 1.273,40	203,74		203,74	1.069,66	16,00	
01.07 LIMPEZA														
01.07.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento de lâmpa	un	50,00				R\$ 27,86	R\$ 1.382,92				1.382,92	0,00	
01.07.002	Limpeza de calha de zinco	m	200,00				R\$ 21,07	R\$ 4.213,22				4.213,22	0,00	
01.07.003	Limpeza de fossa acima de 5m3	m3	200,00				R\$ 51,29	R\$ 10.256,47				10.256,47	0,00	
01.07.004	Limpeza de reservatório	m3	200,00				R\$ 12,30	R\$ 2.460,96				2.460,96	0,00	

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUANA/SE

LOCAL: Centro de Saúde da Família Dr. Orneli Câmara de Oliveira, Bairro SÃO CRISTÓVÃO

Item	Descrição dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período						
01.08	PAYMENTAÇÃO						R\$	285.044,92	10.381,77	36.109,26	46.491,04	239.553,88	16,96				
01.08.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. al_08/2022	m2	500,00	142,50	214,40	356,90	R\$	31.054,18	8.850,44	13.316,03	22.166,48	8.887,70	71,38				
01.08.002	Demolição de piso cerâmico ou lajotão	m2	500,00	20,19		20,19	R\$	8.326,88	336,24	-	336,24	7.990,64	4,04				
01.08.003	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	500,00		239,80	239,80	R\$	27.688,93	-	14.376,78	14.376,78	13.292,15	51,95				
01.08.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaladas padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac II, aplicadas na altura das paredes. al_02/2023 pe	m2	300,00			-	R\$	17.928,21	-	-	-	17.928,21	0,00				
01.08.005	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaladas padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac I, aplicadas a meia altura das paredes. al_02/2023 pe	m2	300,00			-	R\$	17.025,83	-	-	-	17.025,83	0,00				
01.08.006	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaladas padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. al_02/2023 pe	m2	500,00	20,19	178,20	198,39	R\$	20.809,34	840,28	7.416,45	8.256,73	12.552,61	39,68				
01.08.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	20,00	1,00		1,00	R\$	7.096,24	354,81	-	354,81	6.741,43	5,00				
01.08.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado (resinado 12mm) (05 usos)	m3	60,00			-	R\$	142.118,32	-	-	-	142.118,32	0,00				
01.08.009	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusiva argamassa de regularização, aplicado	m2	300,00			-	R\$	13.016,97	-	-	-	13.016,97	0,00				
01.09	JARDINAGEM						R\$	26.612,92	-	1.707,22	1.707,22	24.806,70	6,44				
01.09.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	300,00		64,41	64,41	R\$	7.961,67	-	1.707,22	1.707,22	6.244,45	21,47				
01.09.002	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais	un	500,00			-	R\$	18.561,24	-	-	-	18.561,24	0,00				
Total Geral							R\$	1.582.892,26	R\$	66.204,92	R\$	163.193,56	R\$	218.398,47	R\$	1.364.493,79	13,85

Documento assinado digitalmente
LUIZ MARCO NERI ALFARO JUNIOR
Data: 21/06/2026 09:53:44 -0500
Verifique em: https://validar.br.gov.br

Josémaria Oliveira de Fátima
Arquiteta - CREA 22.525
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabuna

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabuna



OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE (Clínica de Família Dr. Ormeil Câmara de Oliveira)			Boletim de Medição 03		MEMÓRIA DE CÁLCULO	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA			Data da medição: 18/06/2026		Período: 11/05/2026 a 18/06/2026	
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANASE			LOCAL: Centro de Saúde da Família Dr. Ormeil Câmara de Oliveira, Bairro SÃO CRISTÓVÃO			
Item	Descrição dos Serviços	Und	MEMÓRIA DE CÁLCULO			
01 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE						
01.01 ESQUADRIAS						
01 01 002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	und	4,00	4 Unidades		
01 01 004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	27,00	(4,35x2,5) + (21,0x0,5) + (11,26 x 0,5)		
01 01 007	Vidro liso incoler 6mm - Ver 01_10/2021	m2	3,90	3,90 m²		
01.02 COBERTURA						
01 02 006	Reforço, lavagem, carga e retilhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ re-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	476,42	Área do telhado do prédio retirado do projeto em DWG		
01 02 007	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Anforros ou similar, instalado - Rev 06/10/2021	m2	173,13	Recepção 1_101,71 m² + Recepção 2_71,42m²		
01 02 009	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm af 09/2023	m2	60,30	9,26+9,26+23,11+8,71+4,80+5,16		
01.03 PAREDES						
01 03 004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa tipo f5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	18,22	Reboco muqueta frontal (16,45x0,4) + (18,89x0,4) + 4,09m2		
01.04 PINTURA						
01 04 002	Primura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	1.762,67	(403,60x1,6) + (88x2,2x2) + (133,35 x 5) + (62,96) m²		
01 04 005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	3.525,34	((403,60x1,6) + (88x2,2x2) + (133,35 x 5) + (62,96) m²) x 2 demãos		
01.06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
01 06 001	Luminária caixa sobrepor plamp fluorescente 1x40w, completa, incluído reator convencional e lâmpada - Rev 01	un	29,00	29 Unidades		
01.08 PAVIMENTAÇÃO						
01 08 001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado af_08/2022	m2	214,40	(44,25 x 2,80) + ((20,0+29,72+10,20+6,70+8,58+15,26) x 1,00)		
01 08 003	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	259,80	(29,50 x 7,80) + (12,00x2,46)		
01 08 006	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmalhada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2 af_02/2023 pe	m2	178,20	((19,0+32,94+11,90)m x 2,0m) + 28,94m² + 15,0m² + 6,58m²		
01.09 JARDINAGEM						
01 09 001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	64,41	Área 1_37,92 m² + Área 2_26,49m² (áreas frontais do prédio)		

Jecyário Oliveira da Silva
 Atua e Urb - CREA 12509-3
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
 Engº Civil CREA - 272482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Documento assinado digitalmente
 LUIZ MÁRIO NEVES ALFARO JUNIOR
 DATA: 22/06/2026 09:55:44 -0300
 Verificar em: https://validar.dfe.gov.br

OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA-SE		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024	RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 03	
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CLÍNICA DA FAMÍLIA DR. ORMEIL CÂMARA DE OLIVEIRA, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO				
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA		DATA DA MEDIÇÃO: 18/06/2026	PERÍODO: 11/05/2026 a 18/06/2026	

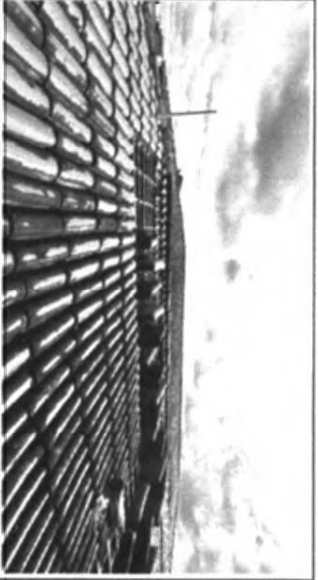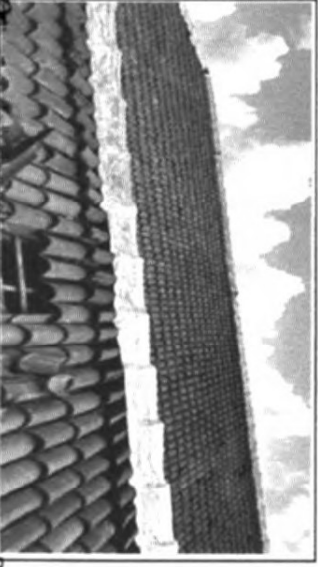
RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS	RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS	RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS E EXECUÇÃO DA MANTA ASFÁLTICA
		
RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS	RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS	RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS E EXECUÇÃO DA MANTA ASFÁLTICA
		
EXECUÇÃO DA MANTA ASFÁLTICA	EXECUÇÃO DA MANTA ASFÁLTICA	EXECUÇÃO DA MANTA ASFÁLTICA
		

OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA-SE		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024	RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDICAÇÃO Nº 03	
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CLÍNICA DA FAMÍLIA DR. ORMEIL CÂMARA DE OLIVEIRA, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO				
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA		DATA DA MEDIÇÃO: 18/06/2026	PERÍODO: 11/05/2026 a 18/06/2026	


INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E LUMINÁRIA



INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E LUMINÁRIA

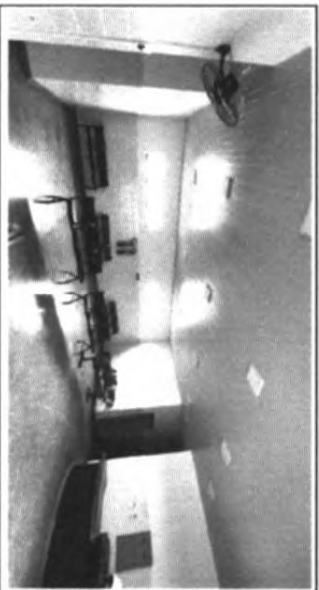


INSTALAÇÃO DAS PORTAS E PINTURA

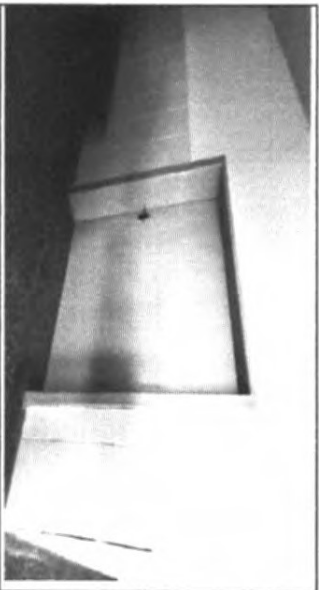

INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E LUMINÁRIA



INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIA

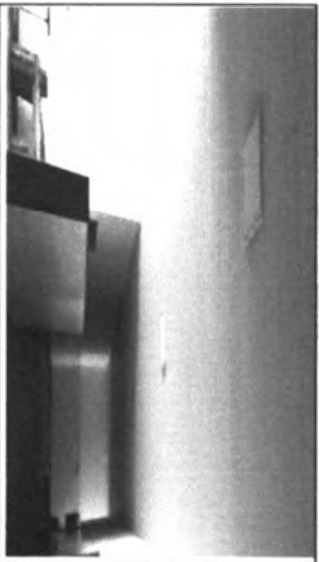

INSTALAÇÃO DAS PORTAS E PINTURA



INSTALAÇÃO DE FORRO PVC




INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIA



INSTALAÇÃO DAS PORTAS E PINTURA



OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA-SE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024	RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 03	
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CLÍNICA DA FAMÍLIA DR. ORMEIL CÂMARA DE OLIVEIRA, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA	DATA DA MEDIÇÃO: 18/06/2026	PERÍODO: 11/05/2026 a 18/06/2026	

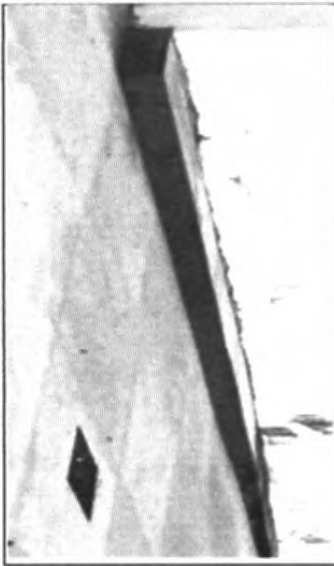
GRAMA		GRAMA		EXECUÇÃO DO REBOCO	
					
EXECUÇÃO DO REBOCO		EXECUÇÃO DO REBOCO		EXECUÇÃO DA CALÇADA	
					
EXECUÇÃO DA CALÇADA		EXECUÇÃO DA CALÇADA		EXECUÇÃO DA CALÇADA	
					

OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA -SE		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024	RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDICÇÃO Nº 03	
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CLÍNICA DA FAMÍLIA DR. ORMEIL CÂMARA DE OLIVEIRA, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO				
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA		DATA DA MEDIÇÃO: 18/06/2026	PERÍODO: 11/05/2026 a 18/06/2026	

EXECUÇÃO DA CALÇADA

EXECUÇÃO DA CALÇADA

EXECUÇÃO DA CALÇADA

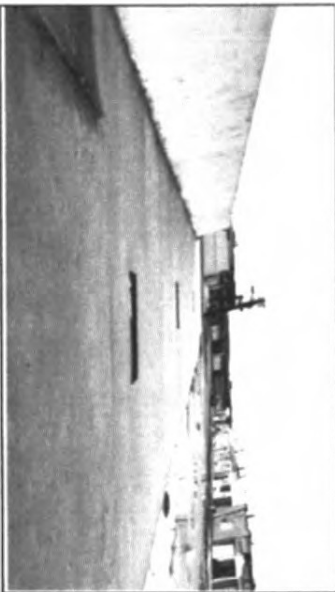


EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO SIMPLES




EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO SIMPLES




EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO SIMPLES

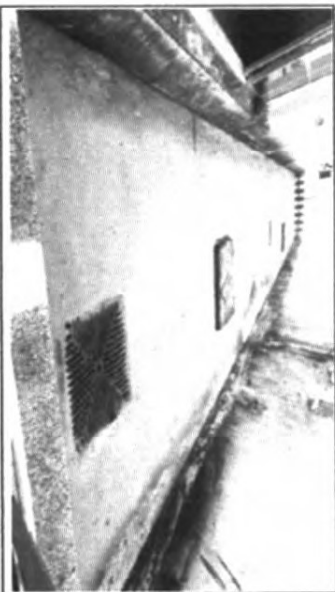



EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES E PISO
CERÂMICO

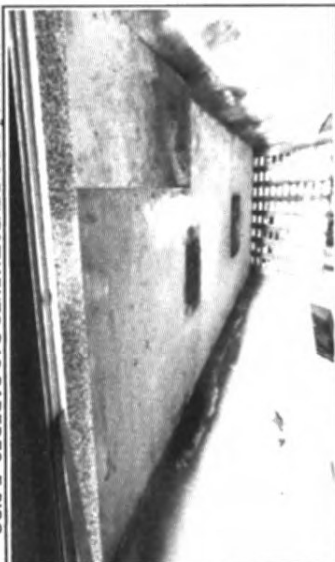

EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES E PISO
CERÂMICO

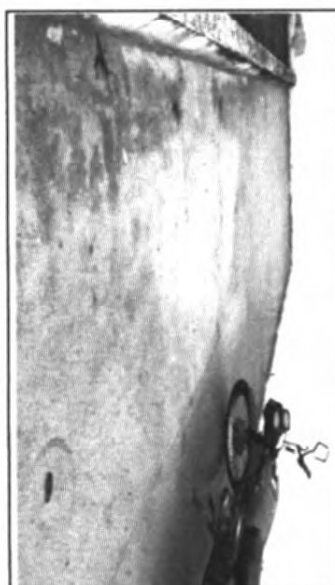


EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES

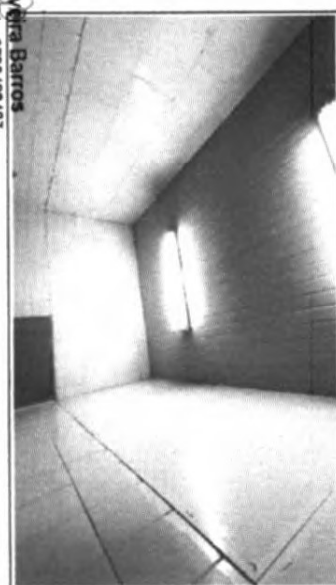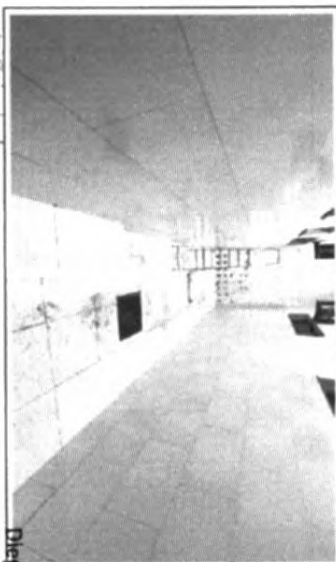


OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA -SE		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024	RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDICÇÃO Nº 03	
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CLÍNICA DA FAMÍLIA DR. ORMEIL CÂMARA DE OLIVEIRA, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO				
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA		DATA DA MEDIÇÃO: 18/06/2026	PERÍODO: 11/05/2026 a 18/06/2026	

EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES E PISO
CERÂMICO

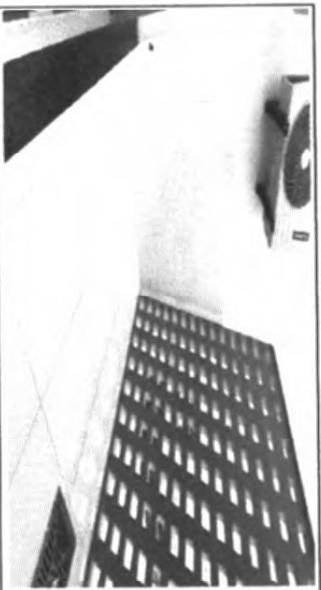

REVISÃO DAS ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

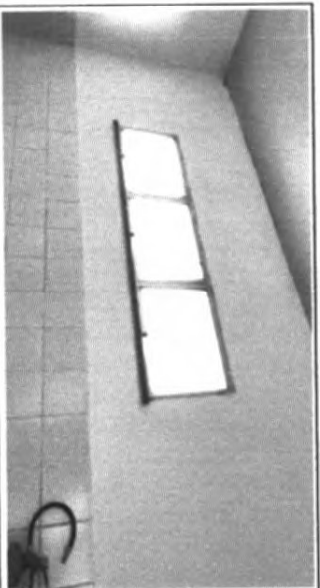

REVISÃO DAS ESQUADRIA DE ALUMÍNIO



REVISÃO DAS ESQUADRIA DE ALUMÍNIO



REVISÃO DAS ESQUADRIA DE ALUMÍNIO



REVISÃO DAS ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E INSTALAÇÃO DO
VIDRO



REVISÃO DAS ESQUADRIA DE ALUMÍNIO




REVISÃO DAS ESQUADRIA DE ALUMÍNIO



REVISÃO DAS ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E INSTALAÇÃO DO
VIDRO






OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA -SE		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024	RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDICÇÃO Nº 03
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CLÍNICA DA FÂMILIA DR. ORMEIL CÂMARA DE OLIVEIRA, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA		DATA DA MEDIÇÃO: 18/06/2026	PERÍODO: 11/05/2026 a 18/06/2026

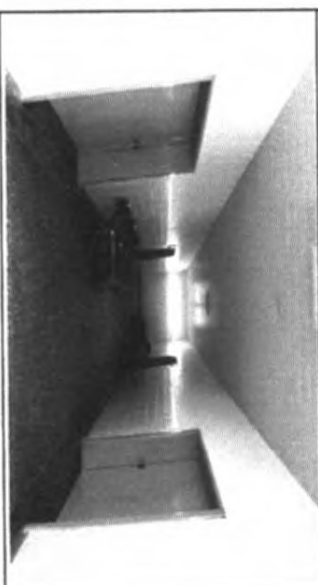PINTURA NAS PAREDES		PINTURA NAS PAREDES		PINTURA NAS PAREDES	
					
PINTURA NAS PAREDES		PINTURA NAS PAREDES		PINTURA NAS PAREDES	
					
PINTURA NAS PAREDES		PINTURA NAS PAREDES		PINTURA NAS PAREDES	
					

JOSE DA SILVA
 APOIADO POR
 COORDENADOR DE NÚCLEO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

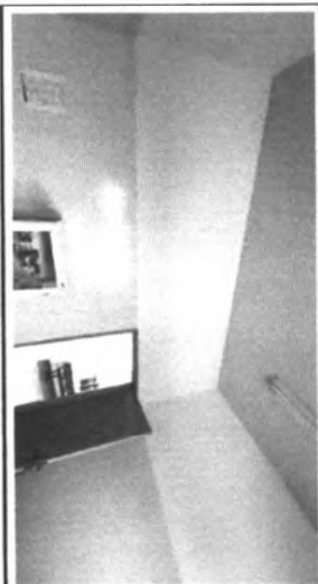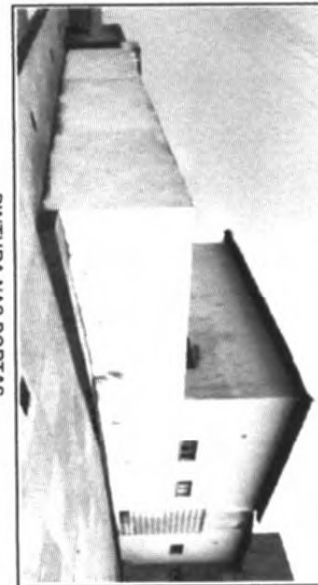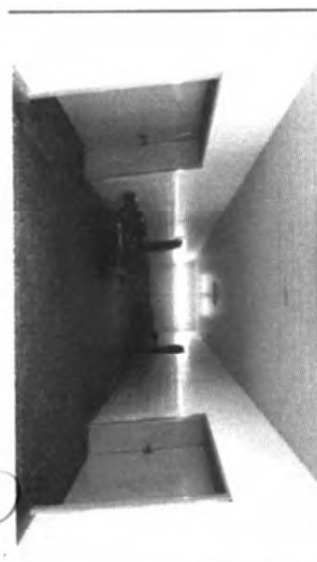OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA -SE		PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO N° 03	
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CLÍNICA DA FAMÍLIA DR. ORMEIL. CÂMARA DE OLIVEIRA, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO		DATA DA MEDIÇÃO: 18/06/2026			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA		PERÍODO: 11/05/2026 a 18/06/2026			
PINTURA NAS PAREDES		EMASSAMENTO NAS PAREDES		EMASSAMENTO NAS PAREDES	
	EMASSAMENTO NAS PAREDES		EMASSAMENTO NAS PAREDES		
	EMASSAMENTO NAS PAREDES		EMASSAMENTO NAS PAREDES		
PINTURA NAS PORTAS	PINTURA NAS PORTAS	PINTURA NAS PORTAS	PINTURA NAS PORTAS	PINTURA NAS PORTAS	
	PINTURA NAS PORTAS		PINTURA NAS PORTAS		

Jeovânio Oliveira da Trindade
 Área Urb. - Obras e Manutenção
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaituba

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482/87
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaituba
