



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO :					03	CONTRATO Nº: 045/2023					
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana			PERÍODO:					FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO					DATA:	
			18/10/2023 A 23/10/2023										23/10/2023	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					% Medido	
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir		
<b>1</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS</b>													
	<b>01.01 CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E</b>						<b>R\$ 6.247.320,78</b>							
01.01.001	Administração Local	mês	1,77	0,77	1,00	1,77	R\$ 176.125,07	R\$ 312.621,99	135.616,30	177.005,69	312.621,99	R\$ 0,00	100,00%	
01.01.002	Mobilização e desmobilização (3 trechos)	und	3,00	2,00	1,00	3,00	R\$ 184.567,98	R\$ 553.703,94	369.135,96	184.567,98	553.703,94	R\$ 0,00	100,00%	
01.01.003	Canteiro de Obras	und	0,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 241.066,98	R\$ 60.266,74	-	-	-	R\$ 60.266,74	0,00%	
	<b>01.02 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO</b>						<b>R\$ 2.209.293,37</b>	<b>R\$ 1.085.312,83</b>	<b>R\$ 500.991,84</b>	<b>R\$ 1.586.304,66</b>	<b>R\$ 622.988,70</b>	<b>71,80%</b>		
01.02.001	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	61,60	24,00	0,00	24,00	R\$ 435,58	R\$ 26.831,72	10.453,92	-	10.453,92	R\$ 16.377,80	38,96%	
01.02.002	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada, da mistura betuminosa (Residência Rodoviária RR-03 à obra, DTM máximo 195,50 km)	t/Km	69.366,52	2592,00	0,00	2592,00	R\$ 0,90	R\$ 62.429,87	2.332,80	-	2.332,80	R\$ 60.097,07	3,74%	
01.02.003	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	62.115,38	46372,48	13.250,00	59622,48	R\$ 0,47	R\$ 29.194,23	21.795,07	6.227,50	28.022,57	R\$ 1.171,66	95,99%	
01.02.004	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	ton	6.858,44	4316,44	1.996,52	6242,96	R\$ 190,80	R\$ 1.308.590,35	829.300,75	361.856,16	1.191.156,91	R\$ 117.433,44	91,03%	
01.02.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, da massa usinada	t/Km	1.071.571,50	303328,70	182.065,99	485394,69	R\$ 0,73	R\$ 782.247,20	221.430,29	132.908,18	354.338,46	R\$ 427.908,73	45,30%	
	<b>02.01 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO</b>						<b>R\$ 3.111.434,74</b>	<b>R\$ 1.769.176,39</b>	<b>R\$ 777.434,49</b>	<b>R\$ 2.546.610,88</b>	<b>R\$ 564.823,86</b>	<b>81,85%</b>		
02.01.001	Aquisição de Emulsão asfáltica - RR - 1C	ton	0,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.538,96	R\$ 1.521,75	-	-	-	R\$ 1.521,75	0,00%	
02.01.002	Transporte de Emulsão Asfáltica - RR - 1C	ton	0,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 760,64	R\$ 327,07	-	-	-	R\$ 327,07	0,00%	
02.01.003	Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação - EAI	ton	80,75	42,70	20,00	62,70	R\$ 3.225,32	R\$ 260.444,59	137.721,16	64.506,40	202.227,56	R\$ 58.217,03	77,65%	
02.01.004	Transporte de emulsão asfáltica para imprimação - EAI	ton	80,75	42,70	20,00	62,70	R\$ 760,64	R\$ 61.421,68	32.479,33	15.212,80	47.692,13	R\$ 13.729,55	77,65%	
02.01.005	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	ton	431,92	247,74	108,10	355,84	R\$ 5.273,77	R\$ 2.277.846,73	1.306.523,78	570.103,42	1.876.627,20	R\$ 101.219,52	82,39%	
02.01.006	Transporte de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	ton	431,92	247,74	108,10	355,84	R\$ 1.180,48	R\$ 509.872,92	292.452,12	127.611,88	420.063,99	R\$ 89.808,93	82,39%	
<b>TOTAL DA 03ª MEDIÇÃO</b>							<b>R\$ 6.247.320,78</b>	<b>R\$ 3.359.241,48</b>	<b>R\$ 1.640.000,00</b>	<b>R\$ 4.999.241,48</b>	<b>R\$ 1.248.079,30</b>	<b>80,02%</b>		
<b>PERCENTUAL MEDIDO (%)</b>														



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

*[Handwritten signature]*

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191  
Dados: 2023.10.23 10:13:56 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Milene Tavares Santana  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

**OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

CONTRATO: 045/2023

DATA: 23/10/2023


LOCAL	RECAPEAMENTO						REPERFILAMENTO					
	ÁREA (M²)	VOLUME	PESO EM TON (Esp. = 2,40 TON/M²)	IMPRIMAÇÃO M² (Esp. = 0,3 MM)	IMPRIMAÇÃO (2,40 TON/M²)	CAP (0,057 TON/TON DE CBUQ)	ÁREA (M²)	ESP.	PESO (TON)	CAP (0,057 TON/TON DE CBUQ)	IMPRIMAÇÃO M² (Esp. = 0,3 MM)	IMPRIMAÇÃO (2,40 TON/M²)
RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA	4.224,37	126,73	304,15	1,27	3,04	17,34	4224,37	0,030	304,15	17,34	1,27	3,04
TRAVESSA TERÊNCIO BISPO	1.232,19	36,97	88,72	0,37	0,89	5,06	1232,19	0,025	73,93	4,21	0,37	0,89
RUA JOSÉ HENRIQUE DA SILVEIRA	1.502,89	45,09	108,21	0,45	1,08	6,17	1502,89	0,025	90,17	5,14	0,45	1,08
RUA SÃO JORGE	1.193,40	36,55	87,73	0,36	0,86	5,00	1193,40	0,025	71,60	4,08	0,36	0,86
TRAVESSA SANTO ANTONIO	1.273,04	39,46	94,71	0,38	0,92	5,40	1273,04	0,025	76,38	4,35	0,38	0,92
TRAVESSA SÃO LUIZ	1.176,74	41,19	98,85	0,35	0,85	5,63	1176,74	0,025	70,60	4,02	0,35	0,85
TRAVESSA PROJETADA	727,37	25,46	61,10	0,22	0,52	3,48	727,37	0,025	43,64	2,49	0,22	0,52
RUA ALOISIO SANTANA	1.920,00	76,80	184,32	0,58	1,38	10,51	1920,00	0,030	138,24	7,88	0,58	1,38
<b>TOTAL</b>	<b>13.250,00</b>	<b>428,25</b>	<b>1.027,79</b>	<b>3,97</b>	<b>9,54</b>	<b>58,58</b>			<b>868,73</b>	<b>49,52</b>	<b>3,97</b>	<b>9,54</b>


TRANSPORTE (TKM) - CBUQ + REPERFILAMENTO	PESO (TON)	DIST. (KM)	TRANSPORTE (TKM)
	1.896,52	96,00	182.065,99

**TOTAL DE CAP**

**108,10**

01.01.001	Administração Local	1 mês
01.01.002	Mobilização e desmobilização (3 trechos)	1 und
02.01.003	Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação - EAI	20,0 ton
02.01.004	Transporte de emulsão asfáltica para imprimação - EAI	20,0 ton
02.01.005	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	108,1 ton
02.01.006	Transporte de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	108,1 ton

  
 José Roberto Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Assinado de forma digital por MILTON  
 SALES SANTANA:81309147191  
 Dados: 2023.10.25 13:00:39 -03'00'  
 Versão do Adobe Acrobat Reader:  
 2023.006.20360





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 03

CONTRATO Nº: 045/2023

PERÍODO: 18/10/2023 A 23/10/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**TRAVESSA 01 - BAIRRO MIGUEL TELES**



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**TRAVESSA 01 - BAIRRO MIGUEL TELES**



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES  
SANTANA:81309147191  
Dados: 2023.10.23 08:35:49 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

Yan Henrique Tomares Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**


**CONTRATO Nº: 045/2023**

**PERÍODO: 18/10/2023 A 23/10/2023**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 03**

**FUNTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO**

**CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana**

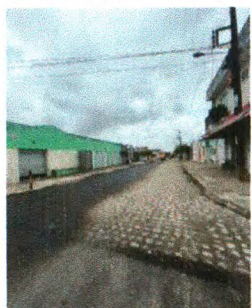

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**TRAVESSA 02 - BAIRRO MIGUEL TELES**



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**TRAVESSA 02 - BAIRRO MIGUEL TELES**



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES  
SANTANA:81309147191  
Dados: 2023.10.23 08:36:05 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

*Henrique Soares Santana*  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Jose Roberto Santos da Paixão*  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

**CONTRATO Nº: 045/2023**

**PERÍODO: 18/10/2023 A 23/10/2023**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 03**

**FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO**



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**TRAVESSA 03 - BAIRRO MIGUEL TELES**



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO




RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

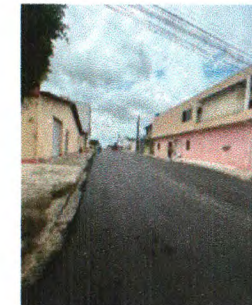

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**TRAVESSA 03 - BAIRRO MIGUEL TELES**



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

*[Handwritten signature]*

Assinado de forma digital por MILTON SALES  
SANTANA:81309147191  
Dados: 2023.10.23 08:36:25 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

*[Handwritten signature]*  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*[Handwritten signature]*  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 03

CONTRATO Nº: 045/2023

PERÍODO: 18/10/2023 A 23/10/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO

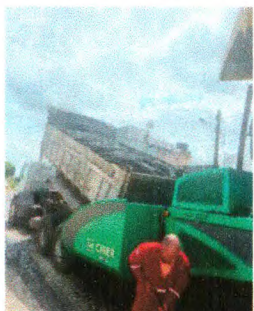

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO




RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**TRAVESSA 04 - BAIRRO MIGUEL TELES**

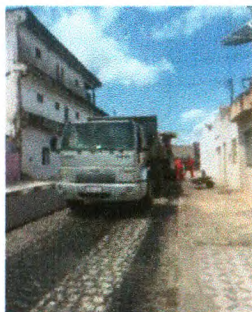

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**TRAVESSA 04 - BAIRRO MIGUEL TELES**



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES

SANTANA:81309147191

Dados: 2023.10.23 08:36:37 -03'00'

Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

*Van Henrique Tavares Santana*  
Eng. Civil CREA 715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*José Robson Santos da Paixão*  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

<b>OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE</b> <b>CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana</b>	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 03</b>	<b>CONTRATO Nº: 045/2023</b> <b>PERÍODO: 18/10/2023 A 23/10/2023</b> <b>FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO</b>
--	---------------------------------	--



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**TRAVESSA 05 - RUA SÃO LUIZ**



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  
**TRAVESSA 05 - RUA SÃO LUIZ**



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES  
SANTANA:81309147191  
Dados: 2023.10.25 10:26:30 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

*Henrique Tevares Santana*  
Engº Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Cultura Municipal de Itabaiana

*Robson Santos de Matos*  
Eng. Civil CREA 2726293954  
Coordenador de Núcleo  
Cultura Municipal de Itabaiana





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**  
**CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 03**

**CONTRATO Nº: 045/2023 PERÍODO: 18/10/2023 A 23/10/2023**

**FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO**



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**TRAVESSA 06 - TRAVESSA PROJETADA**



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**TRAVESSA 06 - TRAVESSA PROJETADA**



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº  
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES  
SANTANA:81309147191  
Dados: 2023.10.25 10:26:44 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

Eng. Henrique Tavares Santana  
Eng.º Civil CREA 271563835-2  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Wilson Sales da Paixão  
Eng.º Civil CREA 272029395-4  
Coordenador do Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**  
**CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 03**

**CONTRATO Nº: 045/2023 PERÍODO: 18/10/2023 A 23/10/2023**

**FUNTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO**



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**TRAVESSA 07 - RUA FRANCISCO ANTONIO DE LIMA**




RECAPEAMENTO ASFÁLTICO




RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

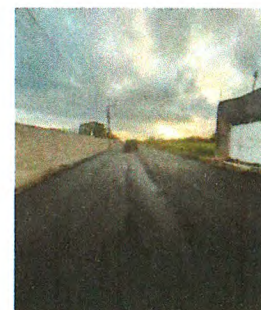

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

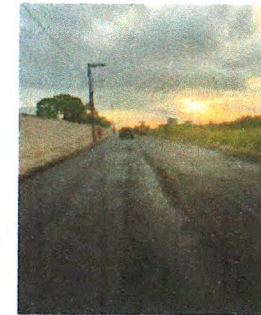

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**TRAVESSA 07 - RUA FRANCISCO ANTONIO DE LIMA**



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES  
SANTANA:81309147191  
Dados: 2023.10.25 10:27:11 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

Milton Sales Santana  
Eng.º Civil CREA 715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Roberto de Jesus  
Eng.º Civil CREA 2720293953  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 03**

**CONTRATO Nº: 045/2023**


**PERÍODO: 18/10/2023 A 23/10/2023**

**CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana**

**FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO**



**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

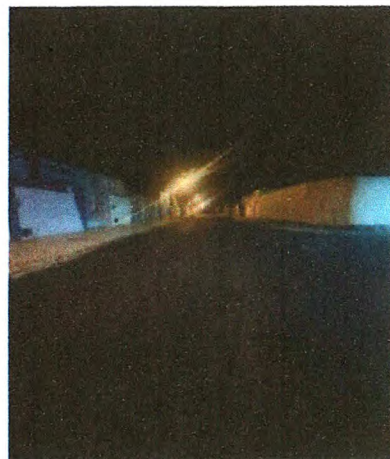

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**



**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**



**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

**RUA ALOISIO DE SANTANA**



**ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.**

**DATA:**

**APROVADO PARA PAGAMENTO**

**DATA:**

Assinado de forma digital por MILTON SALES  
SANTANA:81309147191

Dados: 2023.10.25 10:27:23 -03'00'

Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

Milton Sales Santana  
Engº Civil CREA 214563835-7  
Coordenador de Núcleo

Milton Sales Santana  
Engº Civil CREA 214563835-7  
Coordenador de Núcleo
