

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 286/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE				B.M.Nº. 03/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025					
				PERÍODO: 01/11/2025 a 26/12/2025				DATA: 26/12/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	355,94	13.185,11	13.185,11	0,00	13.185,11	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	178,00	178,00	0,00	178,00	27,47	4.889,66	4.889,66	0,00	4.889,66	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.347,88	1.347,88	0,00	1.347,88	4,57	6.159,81	6.159,81	0,00	6.159,81	0,00	100,00
2	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO												
2.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	2,01	2,01	0,00	2,01	96,90	430,43	430,43	0,00	430,43	0,00	100,00
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,07	0,07	0,00	0,07	54,72	3,83	3,83	0,00	3,83	0,00	100,00
2.003	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	6,13	6,13	0,00	6,13	10,81	66,27	66,27	0,00	66,27	0,00	100,00
2.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	137,97	137,97	0,00	137,97	1,20	165,56	165,56	0,00	165,56	0,00	100,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												
3.008	Demolição de concreto manualmente	m3	1,00	1,00	0,00	1,00	266,29	2.228,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	100,00
3.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	84,18	84,18	0,00	84,18	10,16	266,29	266,29	0,00	266,29	0,00	100,00
3.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	41,80	41,80	0,00	41,80	26,47	855,27	855,27	0,00	855,27	0,00	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO												
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	92,11	92,11	0,00	92,11	44,38	1.106,45	1.106,45	0,00	1.106,45	0,00	100,00
4.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	1,00	1,00	0,00	1,00	111,50	5.886,39	5.886,39	0,00	5.886,39	0,00	100,00
4.007	Piso cimentado desmoldado traço 1:5, e = 5 cm	m2	41,80	41,80	0,00	41,80	40,36	4.087,84	4.087,84	0,00	4.087,84	0,00	100,00
5	ACESSIBILIDADE												
5.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	22,00	22,00	0,00	22,00	11,73	1.687,05	1.687,05	0,00	1.687,05	0,00	100,00
6	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS												
6.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	9,85	9,85	0,00	9,85	64,57	258,06	258,06	0,00	258,06	0,00	100,00
6.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	12,87	12,87	0,00	12,87	6,66	1.623,11	1.623,10	0,00	1.623,11	0,00	100,00
6.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	12,87	12,87	0,00	12,87	34,43	636,01	636,01	0,00	636,01	0,00	100,00
6.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	0,71	0,71	0,00	0,71	645,44	443,11	443,11	0,00	443,11	0,00	100,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
7.007	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	134,30	7.073,53	0,00	6.536,33	6.536,33	537,20	92,41
7.015	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00	0,00	3,00	3,00	18,27	537,20	0,00	0,00	0,00	537,20	0,00
7.016	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	3,00	0,00	3,00	3,00	41,79	54,81	0,00	54,81	54,81	0,00	100,00
7.017	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	3,00	0,00	3,00	3,00	5,83	125,37	0,00	125,37	125,37	0,00	100,00
7.024	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	3,00	0,00	3,00	3,00	13,08	17,49	0,00	17,49	17,49	0,00	100,00
7.026	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2,32	39,24	0,00	39,24	39,24	0,00	100,00
7.030	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	5,00	0,00	5,00	5,00	1.222,63	6.113,15	0,00	6.113,15	6.113,15	0,00	100,00
7.033	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	5,00	0,00	5,00	5,00	36,79	183,95	0,00	183,95	183,95	0,00	100,00
8	PINTURA												
8.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	446,13	446,13	0,00	446,13	20,22	15.536,97	15.536,97	0,00	15.536,97	0,00	100,00
8.002	Pintura de meio fio (caliação)	m	428,82	428,82	0,00	428,82	4,74	9.020,75	9.020,75	0,00	9.020,75	0,00	100,00
								2.032,61	2.032,61	0,00	2.032,61	0,00	100,00

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETTA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 286/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLUÇÕES E QUALIDADE	
				B.M.Nº. 03/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025					
				CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE				PERÍODO: 01/11/2025 a 26/12/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
8.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	87,89	87,89	0,00	87,89	46,18	4.058,76	4.058,76	0,00	4.058,76	0,00	100,00
8.008	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	14,04	14,04	0,00	14,04	30,26	424,85	424,85	0,00	424,85	0,00	100,00
9 EQUIPAMENTOS DIVERSOS								26.123,40	12.552,19	13.571,21	26.123,40	0,00	100,00
9.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	7,00	0,00	7,00	7,00	333,63	2.335,41	0,00	2.335,41	2.335,41	0,00	100,00
	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	3.706,09	3.706,09	3.706,09	0,00	3.706,09	0,00	100,00
9.007	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00	1,00	0,00	1,00	4.987,04	4.987,04	4.987,04	0,00	4.987,04	0,00	100,00
9.010	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	3.859,06	3.859,06	3.859,06	0,00	3.859,06	0,00	100,00
09.011	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	um	1,00	0,00	1,00	1,00	2.883,47	2.883,47	0,00	2.883,47	2.883,47	0,00	100,00
09.012	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	und	1,00	0,00	1,00	1,00	2.845,39	2.845,39	0,00	2.845,39	2.845,39	0,00	100,00
09.015	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	UND.	1,00	0,00	1,00	1,00	3.438,09	3.438,09	0,00	3.438,09	3.438,09	0,00	100,00
09.016	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	UND.	1,00	0,00	1,00	1,00	2.068,85	2.068,85	0,00	2.068,85	2.068,85	0,00	100,00
11 PAISAGISMO								8.987,30	0,00	8.987,30	8.987,30	0,00	100,00
11.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	3,56	0,00	3,56	3,56	25,37	90,32	0,00	90,32	90,32	0,00	100,00
11.003	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	8,00	0,00	8,00	8,00	793,93	6.351,44	0,00	6.351,44	6.351,44	0,00	100,00
11.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	8,00	0,00	8,00	8,00	81,64	653,12	0,00	653,12	653,12	0,00	100,00
11.006	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	5,00	0,00	5,00	5,00	84,06	420,30	0,00	420,30	420,30	0,00	100,00
11.007	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	30,00	0,00	30,00	30,00	37,38	1.121,40	0,00	1.121,40	1.121,40	0,00	100,00
11.008	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	4,00	0,00	4,00	4,00	87,68	350,72	0,00	350,72	350,72	0,00	100,00
13 DIVERSOS								5.350,12	0,00	5.350,12	5.350,12	0,00	100,00
13.001	Limpeza geral	m2	1.347,88	0,00	1.347,88	1.347,88	2,42	3.261,87	0,00	3.261,87	3.261,87	0,00	100,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.088,25	2.088,25	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	100,00
14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								3.854,94	3.301,31	553,63	3.854,94	0,00	100,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	11,50	10,50	1,00	11,50	154,93	1.781,70	1.626,77	154,93	1.781,70	0,00	100,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	26,00	21,00	5,00	26,00	79,74	2.073,24	1.674,54	398,70	2.073,24	0,00	100,00
TOTAL GERAL								90.537,35	55.001,55	34.998,59	90.000,14	537,21	99,41
CONSTRUTORA ROCHA LTDA			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.					Aprovado para pagamento					
Documento assinado digitalmente			Data: __/__/__					Data: __/__/__					
MADIA GADENIA ADALIO SILVA													

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA

Data: 08/01/2026 08:32:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.

Data: __/__/__


Aprovado para pagamento

Data: __/__/__


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.ª Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Riziane S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO		BM 03
		CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:	
286/2025/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)	
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.015	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa - 3,00 und	
7.016	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m - 3,00 und	
7.017	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) - 3,00 und	
7.024	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") - 3,00 m	
7.026	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") - 1,00 und	
7.030	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar -5,00 und	
7.033	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af. 02/2025- 5,00 und	
9 EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
9.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar - 7,00 und	
09.011	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 - 1,00 und	
09.012	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 - 1,00 und	
09.015	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01 - 1,00 und	
09.016	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar - 1,00 und	
11 PAISAGISMO		
11.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - 3,56 m2	
11.003	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) - 8,00 und	
11.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio - 8,00 und	
11.006	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio - 5,00 und	
11.007	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais - 30,00 und	
11.008	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio - 4,00 und	
13 DIVERSOS		
13.001	Limpeza geral - 1.347,88 m2	
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m - 1,00 und	
14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 1,00h	
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - 5,00 h	


Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 08/01/2026 08:37:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO,
MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO
MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 286/2025/PMI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 26/12/2025



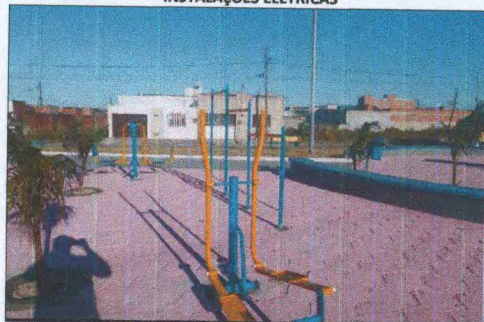
INSTALAÇÕES ELETRICAS



INSTALAÇÕES ELETRICAS



LIXEIRA



ELIPTICO



LEG PRESS



ABDOMINAL DUPLO

ELABORADO POR:

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

[Signature]
MAYRA GARDENIA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270433654-9

FISCALIZAÇÃO:


Observações:

[Signature]
Shaissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


[Signature]
Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.º Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 286/2025/PMI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		DATA: 26/12/2024

		
BARRA FIXA	GRAMA	PALMEIRA IMPERIAL
		
IPÊ	ARBUSTOS	FLAMBOYANT

ELABORADO POR CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA ELIZABETH ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9	FISCALIZAÇÃO: _____	Observações:
---	--	--------------


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Maria Elizabeth Araújo Silva
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 286/2025/PMI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		DATA: 26/12/2024
 LIMPEZA GERAL	 PLACA DE INAUGURAÇÃO	
ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA CASSIANA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9	FISCALIZAÇÃO: 	Observações:


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
