

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO 06				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2024 a 17/11/2024										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			LOCAL: CENTRO DE REFERÊNCIA EM AUTISMO										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE						R\$ 1.510.289,30	165.861,69	44.891,86	210.753,55	1.299.535,75	13,95	
01.01	ESQUADRIAS						R\$ 206.228,10	R\$ 8.833,50	R\$ 2.966,23	R\$ 11.799,73	R\$ 194.428,37	5,72	
01.01.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	und	50,00	5,00	3,00	8,00	R\$ 580,91	R\$ 29.045,50	2.904,55	1.742,73	4.647,28	24.398,22	16,00
01.01.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	und	50,00	7,00	2,00	9,00	R\$ 611,75	R\$ 30.587,50	4.282,25	1.223,50	5.505,75	25.081,75	18,00
01.01.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	und	25,00				R\$ 628,02	R\$ 15.700,50				15.700,50	0,00
01.01.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	60,00	8,51		8,51	R\$ 123,47	R\$ 7.408,20	1.050,73		1.050,73	6.357,47	14,18
01.01.005	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	300,00				R\$ 205,69	R\$ 61.707,00				61.707,00	0,00
01.01.006	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	40,00				R\$ 795,21	R\$ 31.808,40				31.808,40	0,00
01.01.007	Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021	m2	100,00	1,02		1,02	R\$ 185,88	R\$ 18.588,00	189,60		189,60	18.398,40	1,02
01.01.008	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	3,57		3,57	R\$ 113,83	R\$ 11.383,00	406,37		406,37	10.976,63	3,57
01.02	COBERTURA						R\$ 439.001,80	R\$ 27.142,88	R\$ 18.137,16	R\$ 45.280,04	R\$ 393.721,76	10,31	
01.02.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	1.000,00	43,48		43,48	R\$ 10,66	R\$ 10.660,00	463,50		463,50	10.196,50	4,35
01.02.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	600,00	46,85	66,27	113,12	R\$ 73,87	R\$ 44.322,00	3.460,81	4.895,36	8.356,17	35.965,83	18,85
01.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8m	un	20,00				R\$ 1.222,84	R\$ 24.456,80				24.456,80	0,00
01.02.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	600,00	20,97	66,27	87,24	R\$ 82,22	R\$ 49.332,00	1.724,15	5.448,72	7.172,87	42.159,13	14,54
01.02.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20cm com abertura de encaixes	m	200,00		23,43	23,43	R\$ 97,21	R\$ 19.442,00		2.277,63	2.277,63	17.164,37	11,71
01.02.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	800,00				R\$ 43,93	R\$ 35.144,00				35.144,00	0,00
01.02.007	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	1.000,00	139,81	79,69	219,50	R\$ 60,66	R\$ 60.660,00	8.480,87	4.834,00	13.314,87	47.345,13	21,95
01.02.008	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	500,00				R\$ 33,94	R\$ 16.970,00				16.970,00	0,00
01.02.009	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af 09/2023	m2	1.000,00	3,60		3,60	R\$ 109,62	R\$ 109.620,00	394,63		394,63	109.225,37	0,36
01.02.010	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	500,00	110,18	5,95	116,13	R\$ 114,53	R\$ 57.265,00	12.618,92	681,45	13.300,37	43.964,63	23,23
01.02.011	Emassamento de algeroz	m	1.000,00				R\$ 11,13	R\$ 11.130,00				11.130,00	0,00
01.03	PAREDES						R\$ 256.128,00	10.670,14	10.312,65	20.982,79	235.145,21	8,19	
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1.400,00	2,87	105,67	108,54	R\$ 40,68	R\$ 56.952,00	116,75	4.298,66	4.415,41	52.536,59	7,75
01.03.002	Chapisco em parede argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015	m2	2.200,00	55,88	105,67	161,55	R\$ 6,63	R\$ 14.586,00	370,48	700,59	1.071,07	13.514,93	7,34
01.03.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.200,00	55,88	105,67	161,55	R\$ 26,51	R\$ 58.322,00	1.481,38	2.801,31	4.282,69	54.039,31	7,34
01.03.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2.200,00				R\$ 39,44	R\$ 86.768,00				86.768,00	0,00
01.03.005	Demolição de reboco	m2	1.500,00				R\$ 10,02	R\$ 15.030,00				15.030,00	0,00
01.03.006	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00	177,80	51,33	229,13	R\$ 48,94	R\$ 24.470,00	8.701,53	2.512,09	11.213,62	13.256,38	45,83
01.04	PINTURA						R\$ 201.382,00	102.843,70	7.021,66	109.865,36	91.516,64	54,56	
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.000,00	216,40		216,40	R\$ 20,99	R\$ 20.990,00	4.542,24		4.542,24	16.447,76	21,64
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	4.500,00	3.084,11	208,33	3.292,44	R\$ 15,17	R\$ 68.265,00	46.785,95	3.160,37	49.946,32	18.318,68	73,17

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO 06				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2024 a 17/11/2024										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			LOCAL: CENTRO DE REFERÊNCIA EM AUTISMO										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.04.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	400,00	165,09	26,77	191,86	R\$ 25,59	R\$ 10.236,00	4.224,64	685,04	4.909,68	5.326,32	47,96
01.04.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	2.500,00	1.112,75		1.112,75	R\$ 12,19	R\$ 30.475,00	13.564,42	-	13.564,42	16.910,58	44,51
01.04.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4.500,00	2.042,67	208,33	2.251,00	R\$ 12,63	R\$ 56.835,00	25.798,91	2.631,21	28.430,12	28.404,88	50,02
01.04.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	500,00	46,35		46,35	R\$ 4,73	R\$ 2.365,00	219,24	-	219,24	2.145,76	9,27
01.04.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	600,00	378,60	26,77	405,37	R\$ 20,36	R\$ 12.216,00	7.708,30	545,04	8.253,34	3.962,66	67,56
01.05	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO							R\$ 47.497,80	406,74	-	406,74	47.091,06	0,86
01.05.001	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	40,00			-	R\$ 25,96	R\$ 1.038,40	-	-	-	1.038,40	0,00
01.05.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	40,00			-	R\$ 258,15	R\$ 10.326,00	-	-	-	10.326,00	0,00
01.05.003	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	100,00			-	R\$ 67,37	R\$ 6.737,00	-	-	-	6.737,00	0,00
01.05.004	Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto carga descarga - Rev 04	un	40,00			-	R\$ 349,11	R\$ 13.964,40	-	-	-	13.964,40	0,00
01.05.005	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	40,00	6,00		6,00	R\$ 67,79	R\$ 2.711,60	406,74	-	406,74	2.304,86	15,00
01.05.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	40,00			-	R\$ 87,57	R\$ 3.502,80	-	-	-	3.502,80	0,00
01.05.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	40,00			-	R\$ 121,19	R\$ 4.847,60	-	-	-	4.847,60	0,00
01.05.008	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40,00			-	R\$ 109,25	R\$ 4.370,00	-	-	-	4.370,00	0,00
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 45.306,70	2.095,35	2.657,34	4.752,69	40.554,01	10,49
01.06.001	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	50,00	15,00	6,00	21,00	R\$ 139,69	R\$ 6.984,50	2.095,35	838,14	2.933,49	4.051,01	42,00
01.06.002	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	50,00			-	R\$ 95,55	R\$ 4.777,50	-	-	-	4.777,50	0,00
01.06.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	50,00		6,00	6,00	R\$ 303,20	R\$ 15.160,00	-	1.819,20	1.819,20	13.340,80	12,00
01.06.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	50,00			-	R\$ 256,87	R\$ 12.843,50	-	-	-	12.843,50	0,00
01.06.005	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	20,00			-	R\$ 65,66	R\$ 1.313,20	-	-	-	1.313,20	0,00
01.06.006	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	100,00			-	R\$ 30,13	R\$ 3.013,00	-	-	-	3.013,00	0,00
01.06.007	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	50,00	10,00	13,00	23,00	R\$ 24,30	R\$ 1.215,00	243,00	315,90	558,90	656,10	46,00
01.07	LIMPEZA							R\$ 17.475,50	244,70	-	244,70	17.230,80	1,40
01.07.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento de tampa	un	50,00			-	R\$ 26,39	R\$ 1.319,50	-	-	-	1.319,50	0,00
01.07.002	Limpeza de calha de zinco	m	200,00			-	R\$ 20,10	R\$ 4.020,00	-	-	-	4.020,00	0,00
01.07.003	Limpeza de fossa acima de 5m3	m3	200,00	5,00		5,00	R\$ 48,94	R\$ 9.788,00	244,70	-	244,70	9.543,30	2,50
01.07.004	Limpeza de reservatório	m3	200,00			-	R\$ 11,74	R\$ 2.348,00	-	-	-	2.348,00	0,00
01.08	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 271.972,40	13.026,82	3.796,82	16.823,64	255.148,76	6,19
01.08.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af_08/2022	m2	500,00	177,21		177,21	R\$ 59,26	R\$ 29.630,00	10.501,46	-	10.501,46	19.128,54	35,44
01.08.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	500,00	10,00		10,00	R\$ 15,89	R\$ 7.945,00	158,90	-	158,90	7.786,10	2,00
01.08.003	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	500,00	34,02		34,02	R\$ 52,80	R\$ 26.400,00	1.796,26	-	1.796,26	24.603,74	6,80
01.08.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas na altura das paredes. af_02/2023 pe	m2	300,00	10,00		10,00	R\$ 57,02	R\$ 17.106,00	570,20	-	570,20	16.535,80	3,33

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO 06				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2024 a 17/11/2024										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			LOCAL: CENTRO DE REFERÊNCIA EM AUTISMO										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.08.005	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023 pe	m2	300,00			-	R\$ 54,15	R\$ 16.245,00	-	-	-	16.245,00	0,00
01.08.006	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023 pe	m2	500,00			-	R\$ 39,71	R\$ 19.855,00	-	-	-	19.855,00	0,00
01.08.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	un	20,00			-	R\$ 338,54	R\$ 6.770,80	-	-	-	6.770,80	0,00
01.08.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	60,00		1,68	1,68	R\$ 2.260,01	R\$ 135.600,60	-	3.796,82	3.796,82	131.803,78	2,80
01.08.009	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	300,00			-	R\$ 41,40	R\$ 12.420,00	-	-	-	12.420,00	0,00
01.09	JARDINAGEM							R\$ 25.297,00	597,86	-	597,86	24.699,14	2,36
01.09.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	300,00	23,64		23,64	R\$ 25,29	R\$ 7.587,00	597,86	-	597,86	6.989,14	7,88
01.09.002	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais	un	500,00			-	R\$ 35,42	R\$ 17.710,00	-	-	-	17.710,00	0,00
Total geral								R\$ 1.510.289,30	R\$ 165.861,69	R\$ 44.891,86	R\$ 210.753,55	R\$ 1.299.535,75	13,95

Documento assinado digitalmente
 LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR
 Data: 26/11/2024 07:31:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
 Data: 26/11/2024 08:05:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
 Data: 26/11/2024 08:14:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 6º BM - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CENTRO DE REFERÊNCIA EM AUTISMO

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI

PREGÃO ELETRÔNICO: 005/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2024 a 17/11/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01.01	ESQUADRIAS			
01.01.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	UND	3,00	03 UND
01.01.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	UND	2,00	02 UND
01.02	COBERTURA			
01.02.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	66,27	5,77m X 11,485m = 66,27m ²
01.02.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	66,27	5,77m X 11,485m = 66,27m ²
01.02.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20cm com abertura de encaixes	m	23,43	7,81m + 6,64m + 5,24m + 3,74m = 23,43 m
01.02.007	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06	m2	79,69	(4,473 x 3,00) + (22,09 x 3,00) = 79,69 m ²
01.02.010	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	5,95	5,95 m
01.03	PAREDES			
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	105,67	35,225 x 3,00 = 105,67 m ²
01.03.002	Chapisco em parede argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015	m2	105,67	35,225 x 3,00 = 105,67 m ²
01.03.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	105,67	35,225 x 3,00 = 105,67 m ²
01.03.006	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	51,33	(2,00 + 1,87 + 3,50 + 3,50 + 6,24) x 3,00 m = 51,33 m ²
01.04	PINTURA			
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	208,33	(35,225 x 3,00) + (17,11 x 3,00 x 2 lados) = 208,33m ²
01.04.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	26,77	(0,90x2,10x3und + 0,80x2,10x3und) x 2,50 lados = 26,77m ²
01.04.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m	208,33	(35,225 x 3,00) + (17,11 x 3,00 x 2 lados) = 208,33m ²
01.04.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	26,77	(0,90x2,10x3und + 0,80x2,10x3und) x 2,50 lados = 26,77m ²

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 6º BM - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CENTRO DE REFERÊNCIA EM AUTISMO

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI

PREGÃO ELETRÔNICO: 005/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2024 a 17/11/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICA			
01.06.001	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	UND	6,00	06 UNIDADES
01.06.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UND	6,00	06 UNIDADES
01.06.007	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	UND	13,00	13 UNIDADES
01.08	PAVIMENTAÇÃO			
01.08.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,68	0,15m x 0,30m x 3,00m x 5 und = 0,67 m3 0,15m x 0,30m x 7,81m x 2 und = 0,70 m3 0,15m x 0,30m x 3,44m x 2 und = 0,31m3 TOTAL = 1,68 m3

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR**
 Data: 26/11/2024 07:31:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA**
 Data: 26/11/2024 08:01:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO**
 Data: 26/11/2024 08:14:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EXECUÇÃO DO CONCRETO ARMADO



EXECUÇÃO DO CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO

EXECUÇÃO DO CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO




EXECUÇÃO DE CHAPISCO, MADEIRAMENTO E TELHAMENTO

EXECUÇÃO DO CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO



EXECUÇÃO DE REBOCO, MADEIRAMENTO E TELHAMENTO

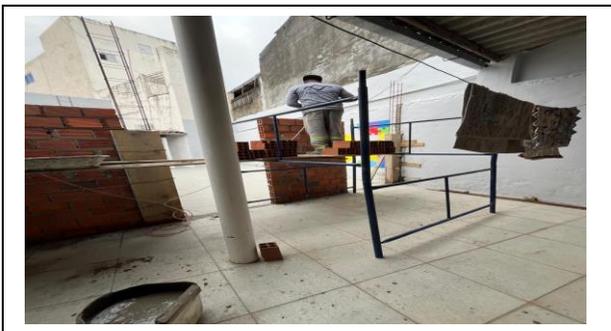

EXECUÇÃO DE PAREDES DE GESSO



EXECUÇÃO DE PAREDES DE GESSO



EXECUÇÃO DE PAREDES DE GESSO



OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº
005/2024

RELATÓRIO
FOTOGRAFICO DA
MEDIÇÃO Nº 06

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CENTRO DE REFERÊNCIA EM AUTISMO

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

PERÍODO: 30/10/2024 a 17/11/2024

COLOCAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA



COLOCAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA



REVISÃO DE PONTO DE TOMADA



INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC E PONTO DE LUZ



INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC E LUMINÁRIAS EMASSAMENTO
E PINTURA DE PAREDES



INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC E LUMINÁRIA INSTALAÇÃO
DE CALHA EM CHAPA EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES



EMASSAMENTO E PINTURA DE PORTAS



EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES



EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES



Documento assinado digitalmente
LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR
Data: 26/11/2024 07:31:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
Data: 26/11/2024 08:04:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
Data: 26/11/2024 08:14:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
