

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO 07				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			DATA DA MEDIÇÃO: 04/02/2025 a 07/03/2025										
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CORUJA										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE</b>							<b>R\$ 1.510.289,30</b>	<b>210.753,55</b>	<b>112.902,70</b>	<b>323.656,23</b>	<b>1.186.633,07</b>	<b>21,43</b>
<b>01.01</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>R\$ 206.228,10</b>	<b>R\$ 11.799,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.799,73</b>	<b>R\$ 194.428,37</b>	<b>5,72</b>
01.01.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	und	50,00	8,00		8,00	R\$ 580,91	R\$ 29.045,50	4.647,28	-	4.647,28	24.398,22	16,00
01.01.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	und	50,00	9,00		9,00	R\$ 611,75	R\$ 30.587,50	5.505,75	-	5.505,75	25.081,75	18,00
01.01.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	und	25,00			-	R\$ 628,02	R\$ 15.700,50		-	-	15.700,50	0,00
01.01.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	60,00	8,51		8,51	R\$ 123,47	R\$ 7.408,20	1.050,73	-	1.050,73	6.357,47	14,18
01.01.005	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	300,00			-	R\$ 205,69	R\$ 61.707,00	-	-	-	61.707,00	0,00
01.01.006	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	40,00			-	R\$ 795,21	R\$ 31.808,40	-	-	-	31.808,40	0,00
01.01.007	Vidro liso incolor 6mm - Ver 01 10/2021	m2	100,00	1,02		1,02	R\$ 185,88	R\$ 18.588,00	189,60	-	189,60	18.398,40	1,02
01.01.008	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	3,57		3,57	R\$ 113,83	R\$ 11.383,00	406,37	-	406,37	10.976,63	3,57
<b>01.02</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>R\$ 439.001,80</b>	<b>R\$ 45.280,04</b>	<b>R\$ 33.384,17</b>	<b>R\$ 78.664,21</b>	<b>R\$ 360.337,59</b>	<b>17,92</b>
01.02.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	1.000,00	43,48	<b>209,88</b>	253,36	R\$ 10,66	R\$ 10.660,00	463,50	2.237,32	2.700,82	7.959,18	25,34
01.02.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	600,00	113,12	<b>209,88</b>	323,00	R\$ 73,87	R\$ 44.322,00	8.356,17	15.503,84	23.860,01	20.461,99	53,83
01.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8m	un	20,00			-	R\$ 1.222,84	R\$ 24.456,80	-	-	-	24.456,80	0,00
01.02.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	600,00	87,24		87,24	R\$ 82,22	R\$ 49.332,00	7.172,87	-	7.172,87	42.159,13	14,54
01.02.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20cm com abertura de encaixes	m	200,00	23,43	<b>135,00</b>	158,43	R\$ 97,21	R\$ 19.442,00	2.277,63	13.123,35	15.400,98	4.041,02	79,21
01.02.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	800,00			-	R\$ 43,93	R\$ 35.144,00	-	-	-	35.144,00	0,00
01.02.007	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	1.000,00	219,50		219,50	R\$ 60,66	R\$ 60.660,00	13.314,87	-	13.314,87	47.345,13	21,95
01.02.008	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	500,00			-	R\$ 33,94	R\$ 16.970,00	-	-	-	16.970,00	0,00
01.02.009	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af 09/2023	m2	1.000,00	3,60		3,60	R\$ 109,62	R\$ 109.620,00	394,63	-	394,63	109.225,37	0,36
01.02.010	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	500,00	116,13	<b>22,00</b>	138,13	R\$ 114,53	R\$ 57.265,00	13.300,37	2.519,66	15.820,03	41.444,97	27,63
01.02.011	Emassamento de algeroz	m	1.000,00			-	R\$ 11,13	R\$ 11.130,00	-	-	-	11.130,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>PAREDES</b>							<b>R\$ 256.128,00</b>	<b>20.982,80</b>	<b>26.001,49</b>	<b>46.984,27</b>	<b>209.143,73</b>	<b>18,34</b>
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1.400,00	108,54	<b>170,10</b>	278,64	R\$ 40,68	R\$ 56.952,00	4.415,41	6.919,67	11.335,08	45.616,92	19,90
01.03.002	Chapisco em parede argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015	m2	2.200,00	161,55	<b>340,20</b>	501,75	R\$ 6,63	R\$ 14.586,00	1.071,08	2.255,53	3.326,59	11.259,41	22,81
01.03.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.200,00	161,55		161,55	R\$ 26,51	R\$ 58.322,00	4.282,69	-	4.282,69	54.039,31	7,34
01.03.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2.200,00		<b>340,20</b>	340,20	R\$ 39,44	R\$ 86.768,00	-	13.417,49	13.417,49	73.350,51	15,46
01.03.005	Demolição de reboco	m2	1.500,00		<b>340,20</b>	340,20	R\$ 10,02	R\$ 15.030,00	-	3.408,80	3.408,80	11.621,20	22,68
01.03.006	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00	229,13		229,13	R\$ 48,94	R\$ 24.470,00	11.213,62	-	11.213,62	13.256,38	45,83
<b>01.04</b>	<b>PINTURA</b>							<b>R\$ 201.382,00</b>	<b>109.865,35</b>	<b>-</b>	<b>109.865,36</b>	<b>91.516,64</b>	<b>54,56</b>
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.000,00	216,40		216,40	R\$ 20,99	R\$ 20.990,00	4.542,24	-	4.542,24	16.447,76	21,64
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	4.500,00	3.292,44		3.292,44	R\$ 15,17	R\$ 68.265,00	49.946,31	-	49.946,32	18.318,68	73,17

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng. Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO 07				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			DATA DA MEDIÇÃO: 04/02/2025 a 07/03/2025										
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CAMPO GRANDE										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.04.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	400,00	191,86		191,86	R\$ 25,59	R\$ 10.236,00	4.909,69	-	4.909,68	5.326,32	47,96
01.04.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	2.500,00	1.112,75		1.112,75	R\$ 12,19	R\$ 30.475,00	13.564,42	-	13.564,42	16.910,58	44,51
01.04.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4.500,00	2.251,00		2.251,00	R\$ 12,63	R\$ 56.835,00	28.430,12	-	28.430,12	28.404,88	50,02
01.04.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	500,00	46,35		46,35	R\$ 4,73	R\$ 2.365,00	219,24	-	219,24	2.145,76	9,27
01.04.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	600,00	405,37		405,37	R\$ 20,36	R\$ 12.216,00	8.253,33	-	8.253,34	3.962,66	67,56
<b>01.05</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO</b>						<b>R\$ 47.497,80</b>	<b>406,74</b>	<b>-</b>	<b>406,74</b>	<b>47.091,06</b>	<b>0,86</b>	
01.05.001	Torneira plástica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	40,00			-	R\$ 25,96	R\$ 1.038,40	-	-	-	1.038,40	0,00
01.05.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	40,00			-	R\$ 258,15	R\$ 10.326,00	-	-	-	10.326,00	0,00
01.05.003	Caixa de descarga de sobrepôr completa akros ou similar	un	100,00			-	R\$ 67,37	R\$ 6.737,00	-	-	-	6.737,00	0,00
01.05.004	Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plástico universal branco e conjunto de fixação, exceto carga descarga - Rev 04	un	40,00			-	R\$ 349,11	R\$ 13.964,40	-	-	-	13.964,40	0,00
01.05.005	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	40,00	6,00		6,00	R\$ 67,79	R\$ 2.711,60	406,74	-	406,74	2.304,86	15,00
01.05.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	40,00			-	R\$ 87,57	R\$ 3.502,80	-	-	-	3.502,80	0,00
01.05.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	40,00			-	R\$ 121,19	R\$ 4.847,60	-	-	-	4.847,60	0,00
01.05.008	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40,00			-	R\$ 109,25	R\$ 4.370,00	-	-	-	4.370,00	0,00
<b>01.06</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 45.306,70</b>	<b>4.752,69</b>	<b>-</b>	<b>4.752,69</b>	<b>40.554,01</b>	<b>10,49</b>	
01.06.001	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	50,00	21,00		21,00	R\$ 139,69	R\$ 6.984,50	2.933,49	-	2.933,49	4.051,01	42,00
01.06.002	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	50,00			-	R\$ 95,55	R\$ 4.777,50	-	-	-	4.777,50	0,00
01.06.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	50,00	6,00		6,00	R\$ 303,20	R\$ 15.160,00	1.819,20	-	1.819,20	13.340,80	12,00
01.06.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	50,00			-	R\$ 256,87	R\$ 12.843,50	-	-	-	12.843,50	0,00
01.06.005	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	20,00			-	R\$ 65,66	R\$ 1.313,20	-	-	-	1.313,20	0,00
01.06.006	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	100,00			-	R\$ 30,13	R\$ 3.013,00	-	-	-	3.013,00	0,00
01.06.007	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	50,00	23,00		23,00	R\$ 24,30	R\$ 1.215,00	558,90	-	558,90	656,10	46,00
<b>01.07</b>	<b>LIMPEZA</b>						<b>R\$ 17.475,50</b>	<b>244,70</b>	<b>-</b>	<b>244,70</b>	<b>17.230,80</b>	<b>1,40</b>	
01.07.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento de tampa	un	50,00			-	R\$ 26,39	R\$ 1.319,50	-	-	-	1.319,50	0,00
01.07.002	Limpeza de calha de zinco	m	200,00			-	R\$ 20,10	R\$ 4.020,00	-	-	-	4.020,00	0,00
01.07.003	Limpeza de fossa acima de 5m3	m3	200,00	5,00		5,00	R\$ 48,94	R\$ 9.788,00	244,70	-	244,70	9.543,30	2,50
01.07.004	Limpeza de reservatório	m3	200,00			-	R\$ 11,74	R\$ 2.348,00	-	-	-	2.348,00	0,00
<b>01.08</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 271.972,40</b>	<b>16.823,64</b>	<b>53.517,04</b>	<b>70.340,67</b>	<b>201.631,73</b>	<b>25,86</b>	
01.08.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af 08/2022	m2	500,00	177,21		177,21	R\$ 59,26	R\$ 29.630,00	10.501,46	-	10.501,46	19.128,54	35,44
01.08.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	500,00	10,00		10,00	R\$ 15,89	R\$ 7.945,00	158,90	-	158,90	7.786,10	2,00
01.08.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	500,00	34,02		34,02	R\$ 52,80	R\$ 26.400,00	1.796,26	-	1.796,26	24.603,74	6,80
01.08.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas na altura das paredes. af_02/2023 pe	m2	300,00	10,00		10,00	R\$ 57,02	R\$ 17.106,00	570,20	-	570,20	16.535,80	3,33
01.08.005	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023 pe	m2	300,00			-	R\$ 54,15	R\$ 16.245,00	-	-	-	16.245,00	0,00

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Rizla Milena S. Rodrigues Araújo**  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*[Assinatura]*  
Eng.ª Civil CREA  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO 07					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			DATA DA MEDIÇÃO: 04/02/2025 a 07/03/2025										
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CORUJA										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.08.006	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023 pe	m2	500,00			-	R\$ 39,71	R\$ 19.855,00	-	-	-	19.855,00	0,00
01.08.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor_02 demãos	un	20,00			-	R\$ 338,54	R\$ 6.770,80	-	-	-	6.770,80	0,00
01.08.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	60,00	1,68	23,68	25,36	R\$ 2.260,01	R\$ 135.600,60	3.796,82	53.517,04	57.313,86	78.286,75	42,27
01.08.009	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	300,00			-	R\$ 41,40	R\$ 12.420,00	-	-	-	12.420,00	0,00
01.09	JARDINAGEM							R\$ 25.297,00	597,86	-	597,86	24.699,14	2,36
01.09.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	300,00	23,64		23,64	R\$ 25,29	R\$ 7.587,00	597,86	-	597,86	6.989,14	7,88
01.09.002	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais	un	500,00			-	R\$ 35,42	R\$ 17.710,00	-	-	-	17.710,00	0,00
<b>Total geral</b>								<b>R\$ 1.510.289,30</b>	<b>R\$ 210.753,56</b>	<b>R\$ 112.902,70</b>	<b>R\$ 323.656,25</b>	<b>R\$ 1.186.633,05</b>	<b>21,43</b>

*Ju*  
 Lic. Milene S. Rodrigues Araujo  
 Engenheira Civil  
 CREA - 2715818424

*Diego B.*  
**Diego Oliveira Barros**  
 Eng. Civil CREA-2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Rozza*  
**Rizta Milene S. Rodrigues Araujo**  
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - 7º BM - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CORUJA

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI

**PREGÃO ELETRÔNICO:** 005/2024

**DATA DA MEDIÇÃO:** 04/02/2025 a 07/03/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
<b>01.02</b>	<b>COBERTURA</b>			
01.02.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m2	209,88	203,98m <sup>2</sup> (UBS) + 5,90m <sup>2</sup> (CASA DE LIXO) = 209,88
01.02.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	209,88	203,98m <sup>2</sup> (UBS) + 5,90m <sup>2</sup> (CASA DE LIXO) = 209,88
01.02.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20cm com abertura de encaixes	m	135,00	15 linhas x 9,00m = 135,00m
01.02.010	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	22,00	comprimento da UBS = 22,00m
<b>01.03</b>	<b>PAREDES</b>			
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	170,10	68,04m x 2,50m = 170,10m <sup>2</sup>
01.03.002	Chapisco em parede argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015	m2	340,20	170,10m <sup>2</sup> x 2 lados = 340,20m <sup>2</sup>
01.03.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	340,20	170,10m <sup>2</sup> x 2 lados = 340,20m <sup>2</sup>
01.03.005	Demolição de reboco	m2	340,20	170,10m <sup>2</sup> x 2 lados = 340,20m <sup>2</sup>
<b>01.08</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
01.08.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	23,68	<b>ESTRUTURA DO MURO</b>
				SAPATAS (28 SAPATAS X 1,00M X 1,00M X 0,50M = 14,00m <sup>3</sup> )
				PILARES (28 PILARES X 0,13M X 0,30M X 4,00M = 4,37M <sup>3</sup> )
				CINTAMENTO DE TRAVAMENTO (68,04M X 0,13M X 0,30M X 2 = 5,31M <sup>3</sup> )
				TOTAL = 23,68M <sup>3</sup>

  
**Diego Oliveira Barros**  
 Eng. Civil CREA-2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabelena

  
**Rizia Milene S. Rodrigues Araújo**  
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabelena

  
**Luiz Carlos dos Santos Junior**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-2722482487


<b>OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA - SE</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024</b>	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07</b>
<b>LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CORUJA</b>		
<b>CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI</b>	<b>DATA DA MEDIÇÃO: 07/03/2025</b>	<b>PERÍODO: 04/02/2025 a 07/03/2025</b>

DEMOLIÇÃO DE REBOCO E MURO



DEMOLIÇÃO DE REBOCO E MURO

DEMOLIÇÃO DE REBOCO E MURO

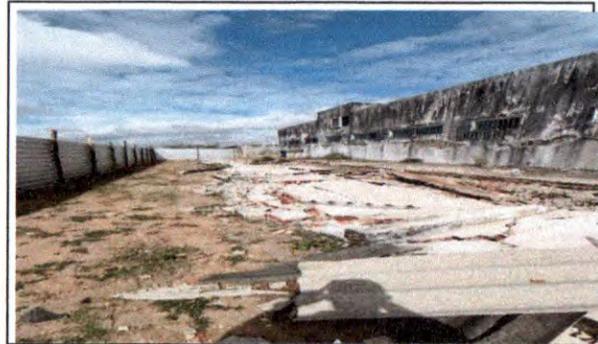

DEMOLIÇÃO DE REBOCO E MURO

DEMOLIÇÃO DE REBOCO E MURO



DEMOLIÇÃO DE REBOCO E MURO



ESCAVAÇÃO DE SAPATAS



ESCAVAÇÃO DE SAPATAS



ESCAVAÇÃO DE SAPATAS



**Diego Oliveira Barros**  
 Eng. Civil CREA 2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**Rizia Milene S. Rodrigues Araújo**  
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 2715818424

OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ITABAIANA - SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPO GRANDE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 07/03/2025

PERÍODO: 04/02/2025 a 07/03/2025

ESCAVAÇÃO DE SAPATAS



ESCAVAÇÃO DE SAPATAS



EXECUÇÃO DE SAPATA



EXECUÇÃO DE SAPATA



EXECUÇÃO DE SAPATA



EXECUÇÃO DE SAPATA



EXECUÇÃO DE SAPATA



EXECUÇÃO DE SAPATA



EXECUÇÃO DE CINTAMENTO INFERIOR



**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*[Handwritten Signature]*  
Engenheiro Civil  
CONCRETO

*[Handwritten Signature]*  
**Rízia Milene S. Rodrigues Araújo**  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ITABAIANA - SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07


LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPO GRANDE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 07/03/2025

PERÍODO: 04/02/2025 a 07/03/2025

EXECUÇÃO DE CINTAMENTO INFERIOR

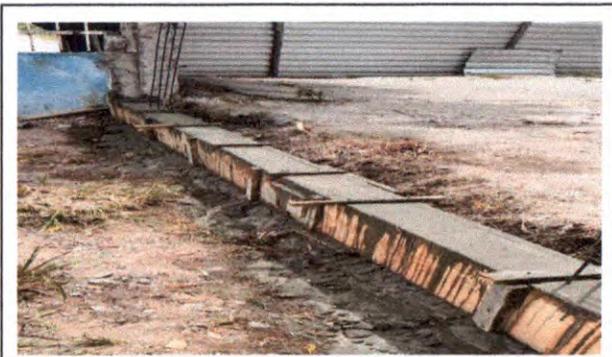

EXECUÇÃO DE CINTAMENTO INFERIOR




EXECUÇÃO DE CINTAMENTO INFERIOR



EXECUÇÃO DE CINTAMENTO INFERIOR



EXECUÇÃO DE ALVENARIA BLOCO

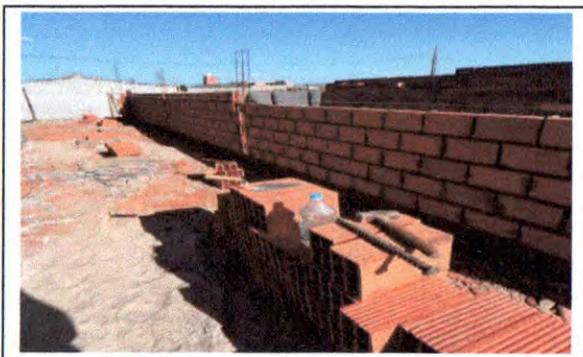


EXECUÇÃO DE ALVENARIA BLOCO




EXECUÇÃO DE ALVENARIA E PILAR DE CONCRETO



EXECUÇÃO DE ALVENARIA E PILAR DE CONCRETO

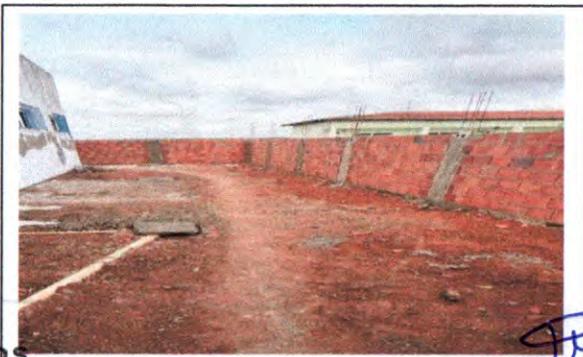

EXECUÇÃO DE ALVENARIA E PILAR DE CONCRETO

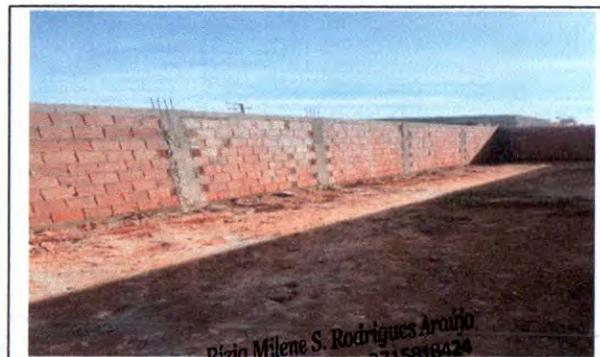

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*[Handwritten signature]*  
Eng.ª Milene S. Rodrigues Araújo  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*[Handwritten signature]*  
Eng.ª Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715018424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

<b>OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA - SE</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024</b>	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07</b>
<b>LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPO GRANDE</b>		
<b>CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI</b>	<b>DATA DA MEDIÇÃO: 07/03/2025</b>	<b>PERÍODO: 04/02/2025 a 07/03/2025</b>

EXECUÇÃO DE CHAPISCO



EXECUÇÃO DE CHAPISCO



EXECUÇÃO DE CHAPISCO



EXECUÇÃO DE CHAPISCO




EXECUÇÃO DE REBOCO




EXECUÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE REBOCO

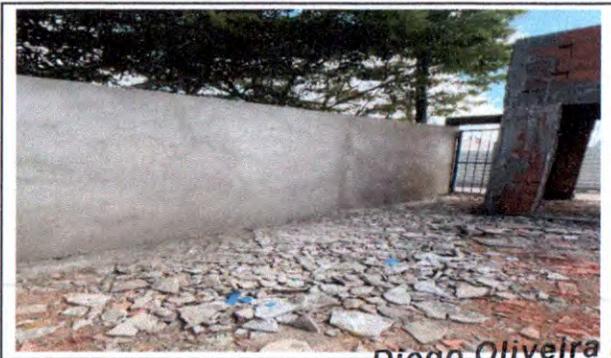

EXECUÇÃO DE REBOCO

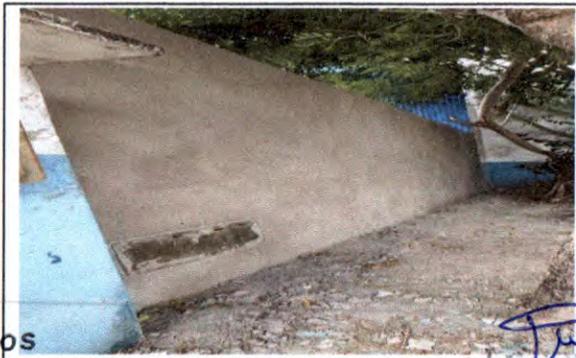

EXECUÇÃO DE REBOCO



**Diego Oliveira Barros**  
 Eng. Civil CREA 2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**Rizia Wilene S. Rodrigues Araújo**  
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


  
**Rizia Wilene S. Rodrigues Araújo**  
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

<b>OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA - SE</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024</b>	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07</b>
<b>LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPO GRANDE</b>		
<b>CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI</b>	<b>DATA DA MEDIÇÃO: 07/03/2025</b>	<b>PERÍODO: 04/02/2025 a 07/03/2025</b>

**REMOÇÃO DE TELHAMENTO**



**REMOÇÃO DE TELHAMENTO**

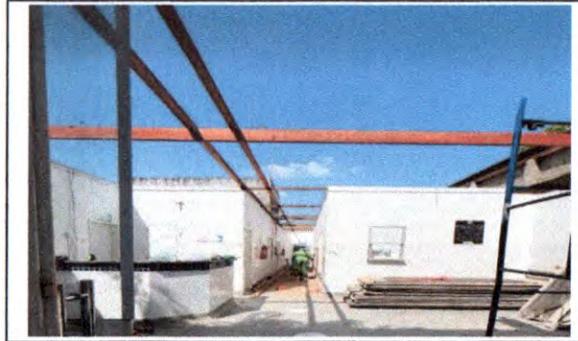

**MADEIRAMENTO COM PEÇA SERRADA**



**MADEIRAMENTO COM PEÇA SERRADA**



**EXECUÇÃO DO TELHADO E CALHA**



**EXECUÇÃO DO TELHADO E CALHA**



**EXECUÇÃO DO TELHADO E CALHA**



**EXECUÇÃO DO TELHADO E CALHA**



**EXECUÇÃO DO TELHADO E CALHA**



**Diego Oliveira Barros**  
 Eng. Civil CREA 2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Rizia Milene S. Rodrigues Araújo**  
 Engenheira Civil  
 CREA 2715818424

**Rizia Milene S. Rodrigues Araújo**  
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ITABAIANA - SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPO GRANDE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 07/03/2025

PERÍODO: 04/02/2025 a 07/03/2025

EXECUÇÃO DO TELHADO E CALHA



CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO



CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO



CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO



CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO



  
**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Luiz Manoel Henri Affonso Junior  
Engenheiro Civil  
CREA 2722482487

  
Rízia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana
