

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA

R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46



Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE

[illegible]

5

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA			
							06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		
									007		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES		SALDO
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL					VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
02.05.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	2,19	2,19	0,00	2,19	5,93	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00
02.05.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	PAVIMENTAÇÃO										42,67		
02.06.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	1,84	1,84	0,00	0,00	23,19	42,67	0,00	42,67	42,67	1,84	0,00
02.06.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	PASSEIO										511,52		
02.07.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	13,81	13,81	0,00	13,81	37,04	511,52	0,00	511,52	511,52	0,00	0,00
02.08	ESQUADRIAS												
02.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA										9.835,05		
02.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2,00	0,00	2,00	1.405,58	2.811,16	0,00	2.811,16	2.811,16	0,00	0,00
02.08.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2,00	0,00	2,00	1.298,95	2.597,90	0,00	2.597,90	2.597,90	0,00	0,00
02.08.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.217,35	1.217,35	0,00	1.217,35	1.217,35	0,00	0,00
02.08.001.004	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,70	3,70	0,00	3,70	666,88	2.467,46	0,00	2.467,46	2.467,46	0,00	0,00
02.08.001.005	Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante modulado, acabamento cromado	cj	4,00	4,00	0,00	4,00	160,82	643,28	0,00	643,28	643,28	0,00	0,00
02.08.001.006	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	0,54	0,54	0,00	0,54	181,30	97,90	0,00	97,90	97,90	0,00	0,00
02.09	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										1.016,19		
02.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5,00	5,00	0,00	5,00	101,70	508,50	0,00	508,50	508,50	0,00	0,00
02.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	1,00	0,00	1,00	134,41	134,41	0,00	134,41	134,41	0,00	0,00
02.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00	4,00	0,00	4,00	77,36	309,44	0,00	309,44	309,44	0,00	0,00
02.09.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	4,00	4,00	0,00	4,00	15,96	63,84	0,00	63,84	63,84	0,00	0,00
02.10	METAIS E LOUÇAS										1.019,41		
02.10.001	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	412,05	412,05	0,00	412,05	412,05	0,00	0,00
02.10.002	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	1,00	0,00	1,00	254,28	254,28	0,00	254,28	254,28	0,00	0,00
02.10.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	19,11	19,11	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00
02.10.004	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	1,00	1,00	0,00	1,00	291,72	291,72	0,00	291,72	291,72	0,00	0,00
02.10.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	42,25	42,25	0,00	42,25	42,25	0,00	0,00

000016

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
								067/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Obr: Reforma de Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
								007			Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	VALORES		VALOR CONTRATO (R\$)	SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL	DO PERÍODO EM R\$		ACUMULADO ATUAL EM R\$	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
02.11	PINTURAS												
02.11.001	PINTURA INTERNA												
02.11.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	131,77	131,77	0,00	7,73	1.018,58	0,00	1.018,58	1.018,58	0,00	0,00	
02.11.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	131,77	131,77	0,00	17,68	2.329,69	0,00	2.329,69	2.329,69	0,00	0,00	
02.11.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	131,77	131,77	0,00	14,64	1.929,11	0,00	1.929,11	1.929,11	0,00	0,00	
02.11.002	PINTURA EXTERNA												
02.11.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	85,80	85,80	0,00	33,55	2.878,59	0,00	2.878,59	2.878,59	0,00	0,00	
02.11.004	ESQUADRIAS												
02.11.004.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	22,65	22,65	0,00	16,62	376,44	0,00	376,44	376,44	0,00	0,00	
02.11.004.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12	DIVERSOS												
02.12.001	Limpeza geral	m2	60,00	60,00	0,00	2,33	139,80	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00	
3	ADMINISTRAÇÃO												
03.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									R\$ 97.744,98			
03.01.001	Demolição de reboco	m2	194,80	129,50	0,00					6.381,03			
03.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	46,50	46,50	0,00	R\$ 7,33	949,24	0,00	949,24	R\$ 1.427,88	65,30	478,65	
03.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	14,60	14,60	0,00	R\$ 16,98	789,57	0,00	789,57	R\$ 789,57	0,00	0,00	
03.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	63,06	62,83	0,00	R\$ 11,46	167,32	0,00	167,32	R\$ 167,32	0,00	0,00	
03.01.005	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	88,04	88,04	0,00	R\$ 21,55	1.353,99	0,00	1.353,99	R\$ 1.358,94	0,23	4,95	
03.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	42,97	42,97	0,00	R\$ 4,87	428,75	0,00	428,75	R\$ 428,75	0,00	0,00	
03.01.007	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	9,30	5,80	0,00	R\$ 13,06	561,19	0,00	561,19	R\$ 561,19	0,00	0,00	
03.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	3,00	3,00	0,00	R\$ 15,14	87,81	0,00	87,81	R\$ 140,80	3,50	52,99	
03.01.009	Remoção de lavatório	un	3,00	3,00	0,00	R\$ 11,59	34,77	0,00	34,77	R\$ 34,77	0,00	0,00	
03.01.010	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	31,23	0,00	31,23	R\$ 31,23	0,00	0,00	
03.01.011	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	44,47	44,47	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	
03.01.012	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	29,50	29,50	0,00	R\$ 10,66	474,05	0,00	474,05	R\$ 474,05	0,00	0,00	
03.01.013	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	9,00	9,00	0,00	R\$ 12,69	374,36	0,00	374,36	R\$ 374,36	0,00	0,00	
03.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	30,00	30,00	0,00	R\$ 16,83	151,47	0,00	151,47	R\$ 151,47	0,00	0,00	
03.01.015	Demolição de peitoril de mármore	m2	4,42	4,42	0,00	R\$ 14,69	440,70	0,00	440,70	R\$ 440,70	0,00	0,00	
03.01.016	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	4,04	4,04	0,00	R\$ 12,03	53,17	0,00	53,17	R\$ 53,17	0,00	0,00	
03.01.017	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	295,02	295,02	0,00	R\$ 4,07	16,44	0,00	16,44	R\$ 16,44	0,00	0,00	
03.02	ELEVAÇÃO												
										396,19			

nnnn17

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiuna/SE		BOLETIM DE	DATA			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		
							067/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	007		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	VALORES		VALOR CONTRATO (R\$)	SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL			ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$		QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
03.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 36,98	59,17	0,00	59,17	59,17	0,00	0,00
03.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 5,93	9,49	0,00	9,49	9,49	0,00	0,00
03.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 28,57	45,71	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00
03.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 46,97	281,82	0,00	281,82	281,82	0,00	0,00
03.03	COBERTURA										9.820,36		
03.03.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	79,20	77,64	0,00	77,64	R\$ 6,48	503,11	0,00	503,11	513,22	1,56	10,11
03.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	29,50	29,50	0,00	29,50	R\$ 87,75	2.588,63	0,00	2.588,63	2588,63	0,00	0,01
03.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	44,47	44,47	0,00	44,47	R\$ 55,99	2.489,88	0,00	2.489,88	2489,88	0,00	0,00
03.03.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	29,65	28,45	0,00	28,45	R\$ 18,64	530,31	0,00	530,31	552,68	1,20	22,37
03.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	295,02	295,02	0,00	295,02	R\$ 12,46	3.675,95	0,00	3.675,95	3675,95	0,00	0,00
03.04	REVESTIMENTO										6.610,72		
03.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	198,00	176,95	0,00	176,95	5,93	1.049,31	0,00	1.049,31	1.174,14	21,05	124,83
03.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	128,00	72,37	0,00	72,37	25,85	1.870,76	0,00	1.870,76	3.308,80	55,63	1.438,04
03.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	70,00	70,00	0,00	70,00	28,57	1.999,90	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00	0,00
03.04.004	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	46,50	46,50	0,00	46,50	2,75	127,88	0,00	127,88	127,88	0,00	0,00
03.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	90,18	88,59	0,00	88,59	50,03	4.432,16	0,00	4.432,16	4.511,71	1,59	79,55
03.05	FORRO										3.955,62		
03.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, af. 05/2017 ps	m2	159,18	159,18	0,00	159,18	24,85	3.955,62	0,00	3.955,62	3.955,62	0,00	0,00
03.06	PILARES										1.457,04		
03.06.001	Demolição de reboco	m2	6,60	2,82	0,00	2,82	7,33	20,67	0,00	20,67	48,38	3,78	27,71
03.06.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	2,82	0,00	2,82	5,93	16,72	0,00	16,72	39,14	3,78	22,42
03.06.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	2,82	0,00	0,00	28,57	80,57	0,00	80,57	188,56	6,60	107,99
03.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	35,20	18,10	0,00	0,00	33,55	607,26	0,00	607,26	1.180,96	35,20	573,71
03.07	PAVIMENTAÇÃO										4.055,14		
03.07.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	199,28	199,28	0,00	0,00	18,65	3.716,57	0,00	3.716,57	3.716,57	199,28	0,00
03.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00

nnnn19

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabirana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
03.07.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	14,60	14,60	0,00	14,60	23,19	338,57	0,00	338,57	338,57	0,00	0,00	
03.07.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riveria, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	14,80	14,60	0,00	14,60	48,22	704,01	0,00	704,01	713,66	0,20	9,65	
03.07.005	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	28,81	28,81	0,00	28,81	90,61	2.610,47	0,00	2.610,47	2.610,47	0,00	0,00	
03.08	PASSEIO										2.335,74			
03.08.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	63,06	62,83	0,00	62,83	37,04	2.327,22	0,00	2.327,22	2.335,74	0,23	8,52	
03.09	ESQUADRIAS													
03.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA										17.143,77			
03.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	5,00	0,00	5,00	1.405,58	7.027,90	0,00	7.027,90	7.027,90	0,00	0,00	
03.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	4,00	0,00	4,00	1.298,95	5.195,80	0,00	5.195,80	5.195,80	0,00	0,00	
03.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.217,35	1.217,35	0,00	1.217,35	1.217,35	0,00	0,00	
03.09.001.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	4,00	4,00	0,00	4,00	152,41	609,64	0,00	609,64	609,64	0,00	0,00	
03.09.001.005	Porta em madeira de lei muirocaciara com almofadas	M2	4,32	4,32	0,00	4,32	375,25	1.621,08	0,00	1.621,08	1.621,08	0,00	0,00	
03.09.001.006	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	4,00	4,00	0,00	4,00	270,83	1.083,32	0,00	1.083,32	1.083,32	0,00	0,00	
03.09.001.007	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	12,00	12,00	0,00	12,00	32,39	388,68	0,00	388,68	388,68	0,00	0,00	
03.09.001.008	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,04	4,04	0,00	4,04	65,71	265,47	0,00	265,47	265,47	0,00	0,00	
03.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										10.403,72			
03.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	27,49	27,42	0,00	27,42	279,77	7.671,29	0,00	7.671,29	7.690,88	0,07	19,59	
03.09.002.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	5,20	5,20	0,00	5,20	360,93	1.876,84	0,00	1.876,84	1.876,84	0,00	0,00	
03.09.002.003	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	3,74	3,74	0,00	3,74	223,53	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	
03.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										1.862,49			
03.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	9,00	9,00	0,00	9,00	101,70	915,30	0,00	915,30	915,30	0,00	0,00	
03.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00	6,00	0,00	6,00	77,36	464,16	0,00	464,16	464,16	0,00	0,00	
03.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	3,00	3,00	0,00	3,00	134,41	403,23	0,00	403,23	403,23	0,00	0,00	
03.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	5,00	5,00	0,00	5,00	15,96	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	
03.11	METAIS E LOUÇAS										3.963,84			
03.11.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	3,00	3,00	0,00	3,00	254,28	762,84	0,00	762,84	762,84	0,00	0,00	
03.11.002	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	3,00	3,00	0,00	3,00	412,05	1.236,15	0,00	1.236,15	1.236,15	0,00	0,00	

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabulana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
									067/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Outra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
											007		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91	
ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES					SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
03.11.003	Chuveiro em aço antivandalismo Deka C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	3,00	3,00	0,00	3,00	291,72	875,16	0,00	875,16	875,16	0,00	0,00	
03.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	3,00	3,00	0,00	3,00	19,11	57,33	0,00	57,33	57,33	0,00	0,00	
03.11.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	3,00	3,00	0,00	3,00	42,25	126,75	0,00	126,75	126,75	0,00	0,00	
03.11.006	Saboneteira para sabão líquido	un	3,00	3,00	0,00	3,00	88,49	265,47	0,00	265,47	265,47	0,00	0,00	
03.11.007	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	3,00	3,00	0,00	3,00	105,83	317,49	0,00	317,49	317,49	0,00	0,00	
03.11.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	3,00	3,00	0,00	3,00	107,55	322,65	0,00	322,65	322,65	0,00	0,00	
03.12	PINTURAS													
03.12.001	PINTURA INTERNA										16.039,11			
03.12.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	342,29	341,18	0,00	341,18	7,73	2.637,32	0,00	2.637,32	2.645,90	1,11	8,58	
03.12.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	342,29	341,18	0,00	341,18	17,68	6.032,06	0,00	6.032,06	6.051,69	1,11	19,63	
03.12.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	501,47	500,36	0,00	500,36	14,64	7.325,27	0,00	7.325,27	7.341,52	1,11	16,25	
03.12.002	PINTURA EXTERNA										8.793,46			
03.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	262,10	201,21	0,00	201,21	33,55	6.750,60	0,00	6.750,60	8.793,46	60,89	2.042,86	
03.12.003	ESQUADRIAS										3.839,38			
03.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	27,83	27,83	0,00	27,83	18,33	510,12	0,00	510,12	510,12	0,00	0,00	
03.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	49,65	49,65	0,00	49,65	16,62	825,18	0,00	825,18	825,18	0,00	0,00	
03.12.003.002.001	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcao), duas demãos	m2	77,96	77,96	0,00	77,96	16,57	1.291,80	0,00	1.291,80	1.291,80	0,00	0,00	
03.12.003.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	77,96	77,96	0,00	77,96	15,55	1.212,28	0,00	1.212,28	1.212,28	0,00	0,00	
03.13	DIVERSOS										687,37			
03.13.001	Limpeza geral	m2	295,01	295,01	0,00	295,01	2,33	687,37	0,00	687,37	687,37	0,00	0,00	
4	LABORATÓRIO										R\$ 114.406,91			
04.01	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO										22.254,02			
04.01.001	Demolição de reboco	m2	173,63	173,63	0,00	173,63	R\$ 7,33	1.272,71	0,00	1.272,71	R\$ 1.272,71	0,00	0,00	
04.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	23,70	23,70	0,00	23,70	R\$ 16,98	402,43	0,00	402,43	R\$ 402,43	0,00	0,00	
04.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	6,38	6,38	0,00	6,38	R\$ 11,46	73,11	0,00	73,11	R\$ 73,11	0,00	0,00	
04.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	61,89	61,89	0,00	61,89	R\$ 21,55	1.333,73	0,00	1.333,73	R\$ 1.333,73	0,00	0,00	
04.01.005	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	82,50	82,50	0,00	82,50	R\$ 4,87	401,78	0,00	401,78	R\$ 401,78	0,00	0,00	
04.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	63,91	63,91	0,00	63,91	R\$ 13,06	834,66	0,00	834,66	R\$ 834,66	0,00	0,00	
04.01.007	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,24	3,24	0,00	3,24	R\$ 15,14	49,05	0,00	49,05	R\$ 49,05	0,00	0,00	
04.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 11,59	23,18	0,00	23,18	R\$ 23,18	0,00	0,00	
04.01.009	Remoção de lavatório	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 10,41	31,23	0,00	31,23	R\$ 31,23	0,00	0,00	
04.01.010	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 16,83	16,83	0,00	16,83	R\$ 16,83	0,00	0,00	

nnnn20

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
								06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
										007	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91		
ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
04.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	301,83	301,83	0,00	301,83	R\$ 55,36	16.709,31	0,00	16.709,31	R\$ 16.709,31	0,00	0,00
04.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,24	40,24	0,00	40,24	R\$ 10,66	428,96	0,00	428,96	R\$ 428,96	0,00	0,00
04.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	30,20	30,20	0,00	30,20	R\$ 12,69	383,24	0,00	383,24	R\$ 383,24	0,00	0,00
04.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,00	20,00	0,00	20,00	R\$ 14,69	293,80	0,00	293,80	R\$ 293,80	0,00	0,00
04.02	ELEVAÇÃO										316,95		
04.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 36,98	47,33	0,00	47,33	47,33	0,00	0,00
04.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 5,93	7,59	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00
04.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 28,57	36,57	0,00	36,57	36,57	0,00	0,00
04.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	4,80	4,80	0,00	4,80	R\$ 46,97	225,46	0,00	225,46	225,46	0,00	0,00
04.03	COBERTURA										9.657,52		
04.03.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	76,16	76,16	0,00	76,16	R\$ 6,48	493,52	0,00	493,52	493,52	0,00	0,00
04.03.002	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	26,83	26,83	0,00	26,83	R\$ 18,64	500,11	0,00	500,11	500,11	0,00	0,00
04.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	30,20	30,20	0,00	30,20	R\$ 87,75	2.650,05	0,00	2.650,05	2650,05	0,00	0,00
04.03.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	40,24	40,24	0,00	40,24	R\$ 55,99	2.253,04	0,00	2.253,04	2253,04	0,00	0,00
04.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	301,83	301,83	0,00	301,83	R\$ 12,46	3.760,80	0,00	3.760,80	3760,80	0,00	0,00
04.04	REVESTIMENTO										7.326,32		
04.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	173,63	173,63	0,00	173,63	5,93	1.029,63	0,00	1.029,63	1.029,63	0,00	0,00
04.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	108,97	108,97	0,00	108,97	25,85	2.816,87	0,00	2.816,87	2.816,87	0,00	0,00
04.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	64,66	64,66	0,00	64,66	28,57	1.847,34	0,00	1.847,34	1.847,34	0,00	0,00
04.04.004	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	23,70	23,70	0,00	23,70	2,75	65,18	0,00	65,18	65,18	0,00	0,00
04.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	47,74	47,74	0,00	47,74	32,83	1.567,30	0,00	1.567,30	1.567,30	0,00	0,00
04.05	FORRO										4.355,46		
04.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017 ps	m2	175,27	175,27	0,00	175,27	24,85	4.355,46	0,00	4.355,46	4.355,46	0,00	0,00
04.06	PILARES										1.005,09		
04.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	5,93	32,62	0,00	32,62	32,62	0,00	0,00
04.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	28,57	157,14	0,00	157,14	157,14	0,00	0,00
04.06.003	Demolição de reboco	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	7,33	40,32	0,00	40,32	40,32	0,00	0,00
04.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	23,10	23,10	0,00	23,10	33,55	775,01	0,00	775,01	775,01	0,00	0,00
04.07	PAVIMENTAÇÃO										4.167,66		

12000021

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
								06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
										007		Valor do Contrato: R\$ 1.023.301,91	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
04.07.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	202,75	202,75	0,00	202,75	18,65	3.781,29	0,00	3.781,29	3.781,29	0,00	0,00
04.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	6,38	6,38	0,00	6,38	37,37	238,42	0,00	238,42	238,42	0,00	0,00
04.07.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	6,38	6,38	0,00	6,38	23,19	147,95	0,00	147,95	147,95	0,00	0,00
04.08	PASSEIO										2.292,41		
04.08.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	61,89	61,89	0,00	61,89	37,04	2.292,41	0,00	2.292,41	2.292,41	0,00	0,00
04.09	ESQUADRIAS												
04.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA										28.116,27		
04.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	4,00	0,00	4,00	1.405,58	5.622,32	0,00	5.622,32	5.622,32	0,00	0,00
04.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.298,95	1.298,95	0,00	1.298,95	1.298,95	0,00	0,00
04.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	4,00	4,00	0,00	4,00	1.217,35	4.869,40	0,00	4.869,40	4.869,40	0,00	0,00
04.09.001.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	2,00	2,00	0,00	2,00	152,41	304,82	0,00	304,82	304,82	0,00	0,00
04.09.001.005	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	49,00	49,00	0,00	49,00	279,77	13.708,73	0,00	13.708,73	13.708,73	0,00	0,00
04.09.001.006	Porta em madeira de lei mui raciata com almofadas	M2	4,20	4,20	0,00	4,20	375,25	1.576,05	0,00	1.576,05	1.576,05	0,00	0,00
04.09.001.007	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	2,00	2,00	0,00	2,00	270,83	541,66	0,00	541,66	541,66	0,00	0,00
04.09.001.008	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	6,00	6,00	0,00	6,00	32,39	194,34	0,00	194,34	194,34	0,00	0,00
04.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										9.176,46		
04.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	32,80	32,80	0,00	32,80	279,77	9.176,46	0,00	9.176,46	9.176,46	0,00	0,00
04.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										894,18		
04.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4,00	4,00	0,00	4,00	101,70	406,80	0,00	406,80	406,80	0,00	0,00
04.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	2,00	0,00	2,00	77,36	154,72	0,00	154,72	154,72	0,00	0,00
04.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	2,00	0,00	2,00	134,41	268,82	0,00	268,82	268,82	0,00	0,00
04.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	4,00	4,00	0,00	4,00	15,96	63,84	0,00	63,84	63,84	0,00	0,00
04.11	METAIS E LOUÇAS										831,31		
04.11.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	2,00	0,00	2,00	254,28	508,56	0,00	508,56	508,56	0,00	0,00
04.11.002	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	0,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.11.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	2,00	2,00	0,00	2,00	19,11	38,22	0,00	38,22	38,22	0,00	0,00
04.11.004	Saboneteira para sabão líquido	un	2,00	2,00	0,00	2,00	88,49	176,98	0,00	176,98	176,98	0,00	0,00

nnnn22

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
								067/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Obs: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES					
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
04.11.005	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	1,00	1,00	0,00	1,00	107,55	107,55	0,00	107,55	107,55	0,00	0,00
04.11.006	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,00	2,00	0,00	2,00	842,55	1.685,10	0,00	1.685,10	1.685,10	0,00	0,00
04.12	PINTURAS												
04.12.001	PINTURA INTERNA												
04.12.001.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	323,43	323,43	0,00	323,43					10.764,91		
04.12.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	498,70	450,00	0,00	450,00	10,71	3.463,94	0,00	3.463,94	3.463,94	0,00	0,00
04.12.002	PINTURA EXTERNA						14,64	6.588,00	0,00	6.588,00	7.300,97	48,70	712,97
04.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	253,85	210,00	0,00	210,00					8.516,67		
04.12.003	PINTURAS ESQUADRIAS						33,55	7.045,50	0,00	7.045,50	8.516,67	43,85	1.471,17
04.12.003.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	99,95	99,95	0,00	0,00					4.028,42		
04.12.003.002	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos	m2	73,70	73,70	0,00	0,00	16,62	1.661,17	0,00	1.661,17	1.661,17	99,95	0,00
04.12.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	73,70	73,70	0,00	0,00	16,57	1.221,21	0,00	1.221,21	1.221,21	73,70	0,00
04.13	DIVERSOS						15,55	1.146,04	0,00	1.146,04	1.146,04	73,70	0,00
04.13.001	Limpeza geral	m2	301,83	301,83	0,00	301,83					703,26		
5	SALAS DE AULAS						2,33	703,26	0,00	703,26	703,26	0,00	0,00
05.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										R\$ 123.819,11		
05.01.001	Demolição de reboco	m2	238,87	93,43	0,00	93,43	R\$ 7,33	684,84	0,00	684,84	R\$ 1.750,92	145,44	1.066,08
05.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	196,50	196,50	0,00	196,50	R\$ 16,98	3.336,57	0,00	3.336,57	R\$ 3.336,57	0,00	0,00
05.01.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	101,04	81,40	0,00	81,40	R\$ 21,55	1.754,17	0,00	1.754,17	R\$ 2.177,41	19,64	423,24
05.01.004	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	225,00	225,00	0,00	225,00	R\$ 1,72	387,00	0,00	387,00	R\$ 387,00	0,00	0,00
05.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	9,60	9,60	0,00	9,60	R\$ 13,06	125,38	0,00	125,38	R\$ 125,38	0,00	0,00
05.01.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabiana ou similar	m2	484,50	357,86	0,00	357,86	R\$ 55,36	19.811,13	0,00	19.811,13	R\$ 26.821,92	126,64	7.010,79
05.01.007	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	42,67	16,00	0,00	16,00	R\$ 10,66	170,56	0,00	170,56	R\$ 454,86	26,67	284,30
05.01.008	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	48,45	48,42	0,00	48,42	R\$ 12,69	614,45	0,00	614,45	R\$ 614,83	0,03	0,38
05.01.009	Coleta e carga manuais de entulho	m3	30,00	30,00	0,00	30,00	R\$ 14,69	440,70	0,00	440,70	R\$ 440,70	0,00	0,00
05.01.010	Demolição de peitoril de mármore	m2	4,53	4,53	0,00	4,53	R\$ 12,03	54,50	0,00	54,50	R\$ 54,50	0,00	0,00
05.02	ELEVAÇÃO												
05.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 5,93	9,49	0,00	9,49	9,49	0,00	0,00
05.02.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 36,98	59,17	0,00	59,17	59,17	0,00	0,00
05.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 28,57	45,71	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00

3300000

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA			
								06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO N°	15/1/2024	Obs: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES					Valor do Contrato: R\$ 1.023.301,91	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
05.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 46,97	281,82	0,00	281,82	281,82	0,00	0,00	
05.03	COBERTURA													
05.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	48,45	48,45	0,00	48,45	R\$ 87,75	4.251,49	0,00	4.251,49	4251,49	0,00	0,00	
05.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	42,67	16,00	0,00	16,00	R\$ 55,99	895,84	0,00	895,84	2389,09	26,67	1.493,25	
05.03.003	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	28,45	24,10	0,00	24,10	R\$ 18,64	449,22	0,00	449,22	530,31	4,35	81,08	
05.03.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	75,86	75,84	0,00	75,84	R\$ 6,48	491,44	0,00	491,44	491,57	0,02	0,13	
05.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	484,50	484,50	0,00	484,50	R\$ 12,46	6.036,87	0,00	6.036,87	6036,87	0,00	0,00	
05.04	REVESTIMENTO													
05.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	238,87	235,18	0,00	235,18	5,93	1.394,62	0,00	1.394,62	1.416,50	3,69	21,88	
05.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	238,87	114,78	0,00	114,78	28,57	3.279,26	0,00	3.279,26	6.824,52	124,09	3.545,25	
05.04.003	Apicoamento total de reboco com ponteirolas/talhadeiras	m2	196,50	190,50	0,00	190,50	2,75	523,88	0,00	523,88	540,38	6,00	16,50	
05.04.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	192,50	192,50	0,00	192,50	50,03	9.630,78	0,00	9.630,78	9.630,78	0,00	0,00	
05.05	FORRO													
05.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 ps	m2	225,00	225,00	0,00	225,00	24,85	5.591,25	0,00	5.591,25	5.591,25	0,00	0,00	
05.06	PILARES													
05.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,60	3,57	0,00	3,57	5,93	21,17	0,00	21,17	21,35	0,03	0,18	
05.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	3,60	3,57	0,00	3,57	28,57	101,99	0,00	101,99	102,85	0,03	0,86	
05.06.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	25,38	25,25	0,00	0,00	33,55	847,14	0,00	847,14	851,50	25,38	4,36	
05.07	PASSEIO													
05.07.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	101,04	81,40	0,00	81,40	37,04	3.015,06	0,00	3.015,06	3.742,52	19,64	727,47	
05.08	ESQUADRIAS													
05.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA													
05.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	5,00	0,00	5,00	1.405,58	7.027,90	0,00	7.027,90	7.027,90	0,00	0,00	
05.08.002	ESQUADRIAS METÁLICAS													
05.08.002.001	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	34,00	24,00	0,00	24,00	117,22	2.813,28	0,00	2.813,28	3.985,48	10,00	1.172,20	
05.08.002.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	30,20	30,20	0,00	30,20	117,20	3.539,44	0,00	3.539,44	3.539,44	0,00	0,00	
05.09	PINTURAS													
05.09.001	PINTURA EXTERNA													
05.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	8,40	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	119,62	8,40	119,62	

700000

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaitana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
						06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Obr: Reforma de Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos					
								007	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES							
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$		
05.09.001.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1099,09	665,24	0,00	665,24	33,55	22.318,80	0,00	22.318,80	36.874,47	433,85	14.555,67		
05.09.002	ESQUADRIAS														
05.09.002.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	21,00	21,00	0,00	21,00					349,02				
05.09.003	PINTURA DE FORRO						16,62	349,02	0,00	349,02	349,02	0,00	0,00		
05.09.003.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	225,00	225,00	0,00	225,00	22,39	5.037,75	0,00	5.037,75	5.037,75	0,00	0,00		
05.09.004	PINTURA INTERNA														
05.09.004.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	153,10	153,10	0,00	153,10	6,12	936,97	0,00	936,97	936,97	0,00	0,00		
05.09.004.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	153,10	153,10	0,00	153,10	17,68	2.706,81	0,00	2.706,81	2.706,81	0,00	0,00		
05.09.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	153,10	153,10	0,00	153,10	14,64	2.241,38	0,00	2.241,38	2.241,38	0,00	0,00		
05.10	DIVERSOS														
05.10.001	Limpeza geral	m2	484,50	484,50	0,00	484,50	2,33	1.128,89	0,00	1.128,89	1.128,89	0,00	0,00		
05.10.002	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	15,00	0,00	0,00	0,00	346,97	0,00	0,00	0,00	5.204,55	15,00	5.204,55		
6	VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO														
06.01	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO														
06.01.001	Demolição de reboco	m2	87,70	67,20	0,00	67,20	R\$ 7,33	492,58	0,00	492,58	R\$ 642,84	20,50	150,27		
06.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	286,32	286,32	0,00	286,32	R\$ 16,98	4.861,71	0,00	4.861,71	R\$ 4.861,71	0,00	0,00		
06.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	148,78	129,27	0,00	129,27	R\$ 11,46	1.481,43	0,00	1.481,43	R\$ 1.705,02	19,51	223,58		
06.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	70,70	61,58	0,00	61,58	R\$ 21,55	1.327,05	0,00	1.327,05	R\$ 1.523,59	9,12	196,54		
06.01.005	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,40	0,40	0,00	0,40	R\$ 30,98	12,39	0,00	12,39	R\$ 12,39	0,00	0,00		
06.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	28,86	28,23	0,00	28,23	R\$ 13,06	368,68	0,00	368,68	R\$ 376,91	0,63	8,23		
06.01.007	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	132,45	132,45	0,00	132,45	R\$ 1,72	227,81	0,00	227,81	R\$ 227,81	0,00	0,00		
06.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	10,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 11,59	115,90	0,00	115,90	R\$ 115,90	0,00	0,00		
06.01.009	Remoção de lavatório	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 10,41	52,05	0,00	52,05	R\$ 52,05	0,00	0,00		
06.01.010	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaitana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00		
06.01.011	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,80	40,80	0,00	40,80	R\$ 10,66	434,93	0,00	434,93	R\$ 434,93	0,00	0,00		
06.01.012	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	24,48	24,48	0,00	24,48	R\$ 12,69	310,65	0,00	310,65	R\$ 310,65	0,00	0,00		
06.01.013	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	20,00	20,00	0,00	20,00	R\$ 16,83	336,60	0,00	336,60	R\$ 336,60	0,00	0,00		
06.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	25,00	25,00	0,00	25,00	R\$ 14,69	367,25	0,00	367,25	R\$ 367,25	0,00	0,00		
06.01.015	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,17	0,17	0,00	0,17	R\$ 12,03	2,05	0,00	2,05	R\$ 2,05	0,00	0,00		
06.01.016	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaitana ou similar - Rev 01	m2	244,78	244,78	0,00	244,78	R\$ 41,06	10.050,67	0,00	10.050,67	R\$ 10.050,67	0,00	0,00		
06.02	ELEVAÇÃO														
											396,19				

nnnn25

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabulana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
												067/2023	08.12.2023 a 12.01.2024
								007		Valor do Contrato: R\$ 1.023.301,91			
ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES						
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
06.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 36,98	59,17	0,00	59,17	59,17	0,00	0,00
06.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 5,93	9,49	0,00	9,49	9,49	0,00	0,00
06.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 28,57	45,71	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00
06.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 46,97	281,82	0,00	281,82	281,82	0,00	0,00
06.03	COBERTURA										9.638,76		
06.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	24,48	24,48	0,00	24,48	R\$ 87,75	2.148,12	0,00	2.148,12	2148,12	0,00	0,00
06.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	40,80	40,80	0,00	40,80	R\$ 55,99	2.284,39	0,00	2.284,39	2284,39	0,00	0,00
06.03.003	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	27,20	0,00	27,20	27,20	R\$ 18,64	0,00	507,01	507,01	507,01	0,00	0,00
06.03.004	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	73,20	73,20	0,00	73,20	R\$ 6,48	474,34	0,00	474,34	474,34	0,00	0,00
06.03.005	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	244,78	220,78	24,00	244,78	R\$ 17,26	3.810,66	414,24	4.224,90	4224,90	0,00	0,00
06.04	REVESTIMENTO										3.527,47		
06.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	87,70	87,70	0,00	87,70	5,93	520,06	0,00	520,06	520,06	0,00	0,00
06.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	20,50	0,00	20,50	20,50	14,64	0,00	300,12	300,12	300,12	0,00	0,00
06.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	67,20	67,20	0,00	67,20	28,57	1.919,90	0,00	1.919,90	1.919,90	0,00	0,00
06.04.004	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	286,32	175,15	0,00	175,15	2,75	481,66	0,00	481,66	787,38	111,17	305,72
06.04.005	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	478,78	326,60	152,18	478,78	50,03	16.339,80	7.613,57	23.953,36	23.953,36	0,00	0,00
06.05	FORRO										3.697,18		
06.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 ps	m2	148,78	148,78	0,00	148,78	24,85	3.697,18	0,00	3.697,18	3.697,18	0,00	0,00
06.06	PILARES										1.220,85		
06.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	5,50	5,50	5,93	0,00	32,62	32,62	39,14	1,10	6,52
06.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	5,50	5,50	28,57	0,00	157,14	157,14	188,56	1,10	31,43
06.06.003	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	5,50	5,50	7,33	0,00	40,32	40,32	48,38	1,10	8,06
06.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	28,16	28,16	0,00	28,16	33,55	944,77	0,00	944,77	944,77	0,00	0,00
06.07	PAVIMENTAÇÃO										4.226,05		
06.07.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	148,78	0,00	148,78	148,78	23,19	0,00	3.450,21	3.450,21	3.450,21	0,00	0,00

nnnn26

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
								067/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES							
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$		
06.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.07.003	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	41,60	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	775,84	41,60	775,84		
06.07.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00	7.174,17	148,78	7.174,17		
06.08	PASSEIO														
06.08.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	70,70	61,58	0,00	61,58	37,04	2.280,92	0,00	2.280,92	2.618,73	9,12	337,80		
06.09	ESQUADRIAS														
06.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA														
06.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	2,00	0,00	2,00	1.405,58	2.811,16	0,00	2.811,16	5.622,32	2,00	2.811,16		
06.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	3,00	0,00	3,00	1.298,95	3.896,85	0,00	3.896,85	3.896,85	0,00	0,00		
06.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 1,60 m, inclusive batente e dobradiças, exclusive fechadura	un	21,00	7,00	14,00	21,00	852,26	5.965,82	11.931,64	17.897,46	17.897,46	0,00	0,00		
06.09.001.004	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	21,00	0,00	21,00	21,00	57,52	0,00	1.207,92	1.207,92	1.207,92	0,00	0,00		
06.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS														
06.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	17,10	0,00	1,65	1,65	279,77	0,00	461,62	461,62	4.784,07	15,45	4.322,45		
06.09.002.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	1,15	0,00	1,15	1,15	90,61	0,00	104,20	104,20	104,20	0,00	0,00		
06.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOSTO														
06.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	24,00	24,00	0,00	24,00	101,70	2.440,80	0,00	2.440,80	2.440,80	0,00	0,00		
06.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	14,00	0,00	14,00	77,36	1.083,04	0,00	1.083,04	1.083,04	0,00	0,00		
06.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	10,00	10,00	0,00	10,00	134,41	1.344,10	0,00	1.344,10	1.344,10	0,00	0,00		
06.10.004	Raio seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	24,00	24,00	0,00	24,00	15,96	383,04	0,00	383,04	383,04	0,00	0,00		
06.11	METAIS E LOUÇAS														
06.11.001	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	0,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	7.349,65	0,00	0,00		
06.11.002	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	10,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	2.542,80	10,00	2.542,80		
06.11.003	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02 10/2021	un	9,00	0,00	9,00	9,00	291,72	0,00	2.625,48	2.625,48	2.625,48	0,00	0,00		
06.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	10,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	191,10	10,00	191,10		
06.11.005	Saboneteira para sabão líquido	un	5,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	442,45	5,00	442,45		
06.11.006	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	9,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	380,25	9,00	380,25		

nnnn27

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Outra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		
							06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Valor do Contrato: R\$ 1.023.301,91		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
06.11.007	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	2,00	2,00	0,00	2,00	107,55	215,10	0,00	215,10	215,10	0,00	0,00
06.11.008	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	9,00	9,00	0,00	9,00	105,83	952,47	0,00	952,47	952,47	0,00	0,00
06.11.009	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,30x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.541,95	2.541,95	0,00	2.541,95	2.541,95	0,00	0,00
06.11.010	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.209,20	0,00	1.209,20	1.209,20	1.209,20	0,00	0,00
06.12	PINTURAS												
06.12.001	PINTURA DE FORRO										3.331,18		
06.12.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	148,78	74,39	74,39	148,78	22,39	1.665,59	1.665,59	3.331,18	3.331,18	0,00	0,00
06.12.002	PINTURA EXTERNA										9.222,22		
06.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	274,88	274,88	0,00	274,88	33,55	9.222,22	0,00	9.222,22	9.222,22	0,00	0,00
06.12.003	PINTURAS ESQUADRIAS										1.419,35		
06.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	6,51	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	119,33	6,51	119,33
06.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m2	78,22	0,00	78,22	0,00	16,62	0,00	1.300,02	1.300,02	1.300,02	78,22	0,00
06.13	DIVERSOS										570,34		
06.13.001	Limpeza geral	m2	244,78	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	570,34	244,78	570,34
7	REFEITÓRIO/COZINHA										R\$ 70.990,05		
07.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										9.727,25		
07.01.001	Demolição de reboco	m2	67,00	0,00	18,49	18,49	R\$ 7,33	0,00	135,53	135,53	R\$ 491,11	48,51	355,58
07.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	155,25	0,00	155,25	155,25	R\$ 16,98	0,00	2.636,15	2.636,15	R\$ 2.636,15	0,00	0,00
07.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	23,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 266,56	23,26	266,56
07.01.004	Demolição de piso de alta resistência	m2	178,34	0,00	178,34	178,34	R\$ 20,63	0,00	3.679,15	3.679,15	R\$ 3.679,15	0,00	0,00
07.01.005	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	51,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.099,70	51,03	1.099,70
07.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	13,23	0,00	13,23	13,23	R\$ 13,06	0,00	172,78	172,78	R\$ 172,78	0,00	0,00
07.01.007	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	14,90	0,00	14,90	14,90	R\$ 4,87	0,00	72,56	72,56	R\$ 72,56	0,00	0,00
07.01.008	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	12,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 186,52	12,32	186,52
07.01.009	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	1,00	11,59
07.01.010	Remoção de lavatório	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	1,00	10,41
07.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabiana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
07.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	42,67	0,00	42,67	42,67	R\$ 10,66	0,00	454,86	454,86	R\$ 454,86	0,00	0,00
07.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	26,90	0,00	26,90	26,90	R\$ 12,69	0,00	341,36	341,36	R\$ 341,36	0,00	0,00

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
								067/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO N°	15/1/2024	007	
										Valor do Contrato: R\$ 1.023.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES					
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
07.01.014	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 84,15	5,00	84,15
07.01.015	Coleta e carga manuais de entulho	m3	15,00	0,00	15,00	15,00	R\$ 14,69	0,00	220,35	220,35	R\$ 220,35	0,00	0,00
07.01.016	Demolição de peitoril de mármore	m2	3,56	0,00	3,56	3,56	R\$ 12,03	0,00	42,83	42,83	R\$ 42,83	0,00	0,00
07.01.017	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	0,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,07	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,46	0,85	3,46
07.01.018	Remoção, lavagem, carga e retelamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	269,83	0,00	204,00	204,00	R\$ 41,06	0,00	8.376,24	8.376,24	R\$ 11.079,22	65,83	2.702,98
07.02	ELEVACÃO										128,25		
07.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,93	0,00	0,00	0,00	2,85	0,48	2,85
07.02.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,98	0,00	0,00	0,00	17,75	0,48	17,75
07.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,57	0,00	0,00	0,00	13,71	0,48	13,71
07.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,97	0,00	0,00	0,00	93,94	2,00	93,94
07.03	COBERTURA										9.132,50		
07.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	26,90	0,00	26,90	26,90	R\$ 87,75	0,00	2.360,48	2.360,48	2360,48	0,00	0,00
07.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	42,67	0,00	42,67	42,67	R\$ 55,99	0,00	2.389,09	2.389,09	2389,09	0,00	0,00
07.03.003	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	75,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	490,54	75,70	490,54
07.03.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	28,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	530,31	28,45	530,31
07.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	269,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	3362,08	269,83	3.362,08
07.04	REVESTIMENTO										2.738,44		
07.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	397,31	67,00	397,31
07.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.914,19	67,00	1.914,19
07.04.003	Apicoamento total de reboco com pontadeiras/talhadeiras	m2	155,25	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	426,94	155,25	426,94
07.04.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	348,66	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	17.443,46	348,66	17.443,46
07.05	FORRO										1.006,05		
07.05.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	1.006,05	14,90	1.006,05
07.06	PAVIMENTAÇÃO										12.208,89		
07.06.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	201,60	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	4.675,10	201,60	4.675,10
07.06.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	201,60	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	7.533,79	201,60	7.533,79

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabiana/SE				
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	
							06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDIÇÃO Nº	15/1/2024	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		
							007	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91					
ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
07.07	PASSEIO												
07.07.001	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	51,03	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	2.009,88		
07.07.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	10,92	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	1.605,40	51,03	1.605,40
07.08	ESQUADRIAS												
07.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA												
07.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.346,58	0,00	0,00	0,00	2.693,16	2,00	2.693,16
07.08.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.633,74	0,00	0,00	0,00	3.267,48	2,00	3.267,48
07.08.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	1.298,95	1,00	1.298,95
07.08.001.004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.217,35	0,00	0,00	0,00	2.434,70	2,00	2.434,70
07.08.001.005	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas	M2	2,52	0,00	0,00	0,00	375,25	0,00	0,00	0,00	945,63	2,52	945,63
07.08.001.006	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41	1,00	152,41
07.08.001.007	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	3,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00	97,17	3,00	97,17
07.08.001.008	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00	270,83	1,00	270,83
07.08.002	ESQUADRIAS METÁLICAS												
07.08.002.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	16,80	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	1.601,21	17,10	1.601,21
07.08.002.002	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	3,50	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	782,36	17,10	782,36
07.08.002.003	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	3,36	0,00	0,00	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	609,17	17,10	609,17
07.08.002.004	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	10,00	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	3.609,30	10,00	3.609,30
07.08.002.005	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	23,71	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	2.148,36	23,71	2.148,36
07.09	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO												
07.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	610,20	6,00	610,20
07.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	386,80	5,00	386,80
07.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41	1,00	134,41
07.09.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, af. 08/2022	un	4,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	63,84	4,00	63,84
07.10	METAIS E LOUÇAS												
07.10.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	254,28	1,00	254,28
07.10.002	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	1,00	291,72
07.10.003	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação, af. 01/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	412,05	1,00	412,05
07.10.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	1,00	19,11
07.10.005	Saboneteira para sabão líquido	un	1,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	88,49	1,00	88,49

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE				
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	
									06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO N°	15/1/2024	Obras: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos
											007		Valor do Contrato: R\$ 1.023.301,91
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES					
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
07.10.006	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.617,85	0,00	0,00	0,00	1.617,85	1,00	1.617,85
07.10.007	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	105,83	1,00	105,83
07.10.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	2,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	215,10	2,00	215,10
07.11	PINTURAS												
07.11.001	PINTURA DE FORRO										218,14		
07.11.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	218,14	14,90	218,14
07.11.002	ESQUADRIAS										1.580,42		
07.11.002.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	27,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	419,85	27,00	419,85
07.11.002.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	69,83	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	1.160,57	69,83	1.160,57
07.11.003	PINTURA EXTERNA										9.610,73		
07.11.003.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	286,46	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	9.610,73	286,46	9.610,73
07.12	DIVERSOS										667,45		
07.12.001	Limpeza geral	m2	286,46	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	667,45	286,46	667,45
8	RAMPAS/CIRCULAÇÕES/CANTEIROS/CAIXA D'ÁGUA/CASA DE BOMBA										R\$ 26.015,11		
08.01	RAMPAS DAS CIRCULAÇÕES										958,40		
08.01.001	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 439,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 878,50	2,00	878,50
08.01.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,90	2,00	79,90
08.02	CIRCULAÇÕES										2.094,00		
08.02.001	Demolição de piso de alta resistência	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,63	0,00	0,00	0,00	412,60	20,00	412,60
08.02.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,93	0,00	0,00	0,00	418,60	20,00	418,60
08.02.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,19	0,00	0,00	0,00	463,80	20,00	463,80
08.02.004	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,95	0,00	0,00	0,00	799,00	20,00	799,00
08.02.005	Demolição de reboco	m2	19,66	0,00	19,66	19,66	R\$ 7,33	0,00	144,11	144,11	144,11	0,00	0,00
08.02.006	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	30,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	388,06	30,58	388,06
08.02.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	19,66	0,00	19,66	19,66	R\$ 5,93	0,00	116,58	116,58	116,58	0,00	0,00
08.02.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	19,66	0,00	19,66	19,66	R\$ 28,57	0,00	561,69	561,69	561,69	0,00	0,00
08.02.009	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de C1 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	181,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,55	0,00	0,00	0,00	6073,89	181,04	6.073,89

1000001

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
									06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
											007		Valor do Contrato: R\$ 1.023.301,91	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES						SALDO
					DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
08.02.010	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	305,77	0,00	200,00	200,00	R\$ 41,06	0,00	8.212,00	8.212,00	12554,92	105,77	4.342,92	
08.02.011	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	30,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	2683,40	30,58	2.683,40	
08.02.012	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	154,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	999,28	154,21	999,28	
08.02.013	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento / cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	83,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	1562,78	83,84	1.562,78	
08.02.014	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	305,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	3809,89	305,77	3.809,89	
08.02.015	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	56,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 104,74	0,00	0,00	0,00	5865,44	56,00	5.865,44	
08.03	PASSEIO ENTRE ADM. E VEST.										2.481,90			
08.03.001	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,96	2,88	0,00	2,88	R\$ 439,25	1.265,04	0,00	1.265,04	1300,18	0,08	35,14	
08.03.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	29,58	29,58	0,00	29,58	R\$ 39,95	1.181,72	0,00	1.181,72	1181,72	0,00	0,00	
08.04	RAMPA DA ENTRADA PRINCIPAL										12.039,46			
08.04.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	2,06	2,06	0,00	2,06	457,66	942,78	0,00	942,78	942,78	0,00	0,00	
08.04.002	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	10,32	1,00	0,00	1,00	439,25	439,25	0,00	439,25	4.533,06	9,32	4.093,81	
08.04.003	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2")	m	14,00	0,00	0,00	0,00	254,58	0,00	0,00	0,00	3.564,12	14,00	3.564,12	
08.04.004	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	14,00	0,00	0,00	0,00	214,25	0,00	0,00	0,00	2.999,50	14,00	2.999,50	
08.05	CANTEIROS										2.725,64			
08.05.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.271,37	44,50	1.271,37	
08.05.002	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	343,99	44,50	343,99	
08.05.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	476,60	44,50	476,60	
08.05.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	633,68	44,50	633,68	
08.06	CAIXA D'ÁGUA										2.858,85			
08.06.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	87,48	87,48	0,00	87,48	7,73	676,22	0,00	676,22	676,22	0,00	0,00	
08.06.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	87,48	87,48	0,00	87,48	10,71	936,91	0,00	936,91	936,91	0,00	0,00	
08.06.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	87,48	87,48	0,00	87,48	14,24	1.245,72	0,00	1.245,72	1.245,72	0,00	0,00	
08.07	CASA DE BOMBA										1.356,74			
08.07.001	PINTURA EXTERNA										1.356,74			
08.07.001.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	7,00	7,00	0,00	7,00	28,57	199,99	0,00	199,99	199,99	0,00	0,00	
08.07.001.002	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m2	26,26	26,26	0,00	26,26	11,37	298,58	0,00	298,58	298,58	0,00	0,00	

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
									06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDIDÃO Nº	15/1/2024	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
									007	VALORES		Valor do Contrato: R\$. 1.023.301,91		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	SALDO						
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
08.07.001.003	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	26,26	26,26	0,00	26,26	7,73	202,99	0,00	202,99	202,99	0,00	0,00	
08.07.001.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	26,26	26,26	0,00	26,26	10,71	281,24	0,00	281,24	281,24	0,00	0,00	
08.07.001.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	26,26	26,26	0,00	26,26	14,24	373,94	0,00	373,94	373,94	0,00	0,00	
08.07.002	PINTURA INTERNA										1.170,33			
08.07.002.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	3,30	3,30	0,00	3,30	25,85	85,31	0,00	85,31	85,31	0,00	0,00	
08.07.002.002	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	32,80	32,80	0,00	32,80	7,73	253,54	0,00	253,54	253,54	0,00	0,00	
08.07.002.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	32,80	32,80	0,00	32,80	10,71	351,29	0,00	351,29	351,29	0,00	0,00	
08.07.002.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	32,80	32,80	0,00	32,80	14,64	480,19	0,00	480,19	480,19	0,00	0,00	
08.07.003	PINTURA DE LAJE										271,26			
08.07.003.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	8,20	8,20	0,00	8,20	7,73	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	0,00	
08.07.003.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	8,20	8,20	0,00	8,20	10,71	87,82	0,00	87,82	87,82	0,00	0,00	
08.07.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	8,20	8,20	0,00	8,20	14,64	120,05	0,00	120,05	120,05	0,00	0,00	
08.07.004	ESQUADRIA										58,53			
08.07.004.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	3,15	3,15	0,00	3,15	18,58	58,53	0,00	58,53	58,53	0,00	0,00	
9	ABRIGO/OFICINA/DEPOSITO										R\$ 76.880,36			
09.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										10.337,86			
09.01.001	Demolição de reboco	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.162,17	158,55	1.162,17	
09.01.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	74,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.602,03	74,34	1.602,03	
09.01.003	Demolição de piso de alta resistência	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.506,48	169,97	3.506,48	
09.01.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	5,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 116,01	5,98	116,01	
09.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	4,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,56	4,79	62,56	
09.01.006	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	28,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 434,52	28,70	434,52	
09.01.007	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	1,00	11,59	
09.01.008	Remoção de lavatório	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	1,00	10,41	
09.01.009	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 67,32	4,00	67,32	
09.01.010	Coleta e carga manuais de entulho	m3	150,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.203,50	150,00	2.203,50	
09.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	
09.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	63,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 678,30	63,63	678,30	
09.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	38,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 482,98	38,06	482,98	
09.01.014	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	380,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 15.630,72	380,68	15.630,72	
09.02	COBERTURA										12.776,51			

nnnn33

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO		PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
										06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDIDÃO N°	15/1/2024
							007	VALORES		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	SALDO						
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
09.02.001	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	380,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	4743,27	380,68	4.743,27
09.02.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	38,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	3339,77	38,06	3.339,77
09.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	63,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	3562,64	63,63	3.562,64
09.02.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	30,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	572,25	30,70	572,25
09.02.005	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	86,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	558,58	86,20	558,58
09.03	REVESTIMENTO										5.932,22		
09.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	940,20	158,55	940,20
09.03.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	4.529,77	158,55	4.529,77
09.03.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	12,50	0,00	0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	462,25	12,50	462,25
09.04	PILARES										1.161,80		
09.04.001	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	48,38	6,60	48,38
09.04.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	39,14	6,60	39,14
09.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	188,56	6,60	188,56
09.04.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	26,40	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	885,72	26,40	885,72
09.05	PAVIMENTAÇÃO										13.296,75		
09.05.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	3.941,60	169,97	3.941,60
09.05.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00	9.355,15	169,97	9.355,15
09.06	PASSEIO										5.938,70		
09.06.001	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	130,09	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	4.092,63	130,09	4.092,63
09.06.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	49,84	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	1.846,07	34,83	1.846,07
09.07	ESQUADRIAS METÁLICAS										8.462,50		
09.08	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	1,98	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	442,59	1,98	442,59
09.08.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	0,80	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	223,82	0,80	223,82
09.08.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	21,60	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	7.796,09	21,60	7.796,09
09.09	PINTURAS										9.519,43		
09.09.001	PINTURA INTERNA												
09.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	375,52	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	5.497,61	375,52	5.497,61
09.09.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	375,52	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	4.021,82	375,52	4.021,82
09.09.002	PINTURA EXTERNA										6.617,40		

700000

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE				
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	
									067/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO N°	15/1/2024	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos
											007		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
09.09.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	197,24	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	6.617,40	197,24	6.617,40
09.09.004	ESQUADRIAS										1.850,11		
09.09.005	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), duas demaos	m2	57,60	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	954,43	57,60	954,43
09.09.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	57,60	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	895,68	57,60	895,68
09.10	DIVERSOS										987,08		
09.10.001	Limpeza geral	m2	423,64	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	987,08	423,64	987,08
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$ 131.056,65		
10.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
10.01.001	PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICO										2.879,62		
10.01.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 414,30	15,00	414,30
10.01.001.002	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45
10.01.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,75	5,00	52,75
10.01.001.004	Cabeçote de alumínio de 2"	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,06	2,00	37,06
10.01.001.005	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 413,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 413,84	1,00	413,84
10.01.001.006	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72
10.01.001.007	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12
10.01.001.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	60,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,91	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.374,60	60,00	1.374,60
10.01.001.009	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 487,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 487,78	1,00	487,78
10.01.002	QD1 - ADMINISTRATIVO										22.984,62		
10.01.002.001	RAMAL DE ENTRADA										2.574,48		
10.01.002.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	156,00	156,00	0,00	156,00	R\$ 10,10	1.575,60	0,00	1.575,60	R\$ 1.575,60	0,00	0,00
10.01.002.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	39,00	39,00	0,00	39,00	R\$ 20,94	816,66	0,00	816,66	R\$ 816,66	0,00	0,00
10.01.002.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00
10.01.002.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	13,00	13,00	0,00	13,00	R\$ 4,45	57,85	0,00	57,85	R\$ 57,85	0,00	0,00
10.01.002.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00
10.01.002.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 18,62	37,24	0,00	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00
10.01.002.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00
10.01.002.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.578,01		
10.01.002.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 612,34	612,34	0,00	612,34	R\$ 612,34	0,00	0,00
10.01.002.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00
10.01.002.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00
10.01.002.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 88,94	88,94	0,00	88,94	R\$ 88,94	0,00	0,00

၁၁၁၁၁၁၁၁

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA			
							06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prof. João Alves dos Santos		
									007		Valor do Contrato: R\$ 1.023.301,91		
ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	VALORES		VALOR CONTRATO (R\$)	SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL			DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$		QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
10.01.002.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 119,15	357,45	0,00	357,45	R\$ 357,45	0,00	0,00
10.01.002.002.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 50,66	253,30	0,00	253,30	R\$ 253,30	0,00	0,00
10.01.002.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 12,25	61,25	0,00	61,25	R\$ 61,25	0,00	0,00
10.01.002.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00
10.01.002.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										18.832,13		
10.01.002.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	23,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 161,17	3.706,91	0,00	3.706,91	R\$ 3.706,91	0,00	0,00
10.01.002.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	8,00	8,00	0,00	8,00	R\$ 166,77	1.334,16	0,00	1.334,16	R\$ 1.334,16	0,00	0,00
10.01.002.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	10,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 120,42	1.204,20	0,00	1.204,20	R\$ 1.204,20	0,00	0,00
10.01.002.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	36,00	36,00	0,00	36,00	R\$ 100,89	3.632,04	0,00	3.632,04	R\$ 3.632,04	0,00	0,00
10.01.002.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	12,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 106,11	1.273,32	0,00	1.273,32	R\$ 1.273,32	0,00	0,00
10.01.002.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 102,90	411,60	0,00	411,60	R\$ 411,60	0,00	0,00
10.01.002.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	33,00	33,00	0,00	33,00	R\$ 220,30	7.269,90	0,00	7.269,90	R\$ 7.269,90	0,00	0,00
10.01.003	QD2 - LABORATÓRIO/AUDITÓRIO										21.197,79		
10.01.003.001	RAMAL DE ENTRADA										3.012,76		
10.01.003.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	184,00	184,00	0,00	184,00	R\$ 10,10	1.858,40	0,00	1.858,40	R\$ 1.858,40	0,00	0,00
10.01.003.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	46,00	46,00	0,00	46,00	R\$ 20,94	963,24	0,00	963,24	R\$ 963,24	0,00	0,00
10.01.003.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00
10.01.003.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	15,00	15,00	0,00	15,00	R\$ 4,45	66,75	0,00	66,75	R\$ 66,75	0,00	0,00
10.01.003.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00
10.01.003.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 18,62	37,24	0,00	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00
10.01.003.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00
10.01.003.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.455,38		
10.01.003.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 612,34	612,34	0,00	612,34	R\$ 612,34	0,00	0,00
10.01.003.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00
10.01.003.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00
10.01.003.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 88,94	88,94	0,00	88,94	R\$ 88,94	0,00	0,00
10.01.003.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 119,15	357,45	0,00	357,45	R\$ 357,45	0,00	0,00
10.01.003.002.006	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 47,64	95,28	0,00	95,28	R\$ 95,28	0,00	0,00
10.01.003.002.007	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 47,64	47,64	0,00	47,64	R\$ 47,64	0,00	0,00

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
								067/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Obras: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
										007		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91	
ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES					SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
10.01.003.002.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,25	49,00	0,00	49,00	R\$ 49,00	0,00	0,00
10.01.003.002.009	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00
10.01.003.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										16.729,65		
10.01.003.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 161,17	805,85	0,00	805,85	R\$ 805,85	0,00	0,00
10.01.003.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	18,00	18,00	0,00	18,00	R\$ 166,77	3.001,86	0,00	3.001,86	R\$ 3.001,86	0,00	0,00
10.01.003.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	9,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 120,42	1.083,78	0,00	1.083,78	R\$ 1.083,78	0,00	0,00
10.01.003.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	9,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 106,11	954,99	0,00	954,99	R\$ 954,99	0,00	0,00
10.01.003.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	23,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 100,89	2.320,47	0,00	2.320,47	R\$ 2.320,47	0,00	0,00
10.01.003.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 102,90	411,60	0,00	411,60	R\$ 411,60	0,00	0,00
10.01.003.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	37,00	37,00	0,00	37,00	R\$ 220,30	8.151,10	0,00	8.151,10	R\$ 8.151,10	0,00	0,00
10.01.004	QD3 - SALAS DE AULA										30.766,39		
10.01.004.001	RAMAL DE ENTRADA										3.585,51		
10.01.004.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	208,00	208,00	0,00	208,00	R\$ 11,02	2.292,16	0,00	2.292,16	R\$ 2.292,16	0,00	0,00
10.01.004.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	52,00	52,00	0,00	52,00	R\$ 20,94	1.088,88	0,00	1.088,88	R\$ 1.088,88	0,00	0,00
10.01.004.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00
10.01.004.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	18,00	18,00	0,00	18,00	R\$ 4,45	80,10	0,00	80,10	R\$ 80,10	0,00	0,00
10.01.004.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00
10.01.004.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 18,62	37,24	0,00	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00
10.01.004.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00
10.01.004.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.321,14		
10.01.004.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 612,34	612,34	0,00	612,34	R\$ 612,34	0,00	0,00
10.01.004.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00
10.01.004.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00
10.01.004.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 73,12	73,12	0,00	73,12	R\$ 73,12	0,00	0,00
10.01.004.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 119,15	357,45	0,00	357,45	R\$ 357,45	0,00	0,00
10.01.004.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 12,25	73,50	0,00	73,50	R\$ 73,50	0,00	0,00
10.01.004.002.007	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00
10.01.004.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										25.859,74		
10.01.004.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	33,00	33,00	0,00	33,00	R\$ 166,77	5.503,41	0,00	5.503,41	R\$ 5.503,41	0,00	0,00

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		
							06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Valor de Contrato: R\$: 1.023.301,91		
									007		SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)		
10.01.004.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	7,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 120,42	842,94	0,00	842,94	R\$ 842,94	0,00	0,00
10.01.004.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	61,00	61,00	0,00	61,00	R\$ 220,30	13.438,30	0,00	13.438,30	R\$ 13.438,30	0,00	0,00
10.01.004.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	54,00	54,00	0,00	54,00	R\$ 100,89	5.448,06	0,00	5.448,06	R\$ 5.448,06	0,00	0,00
10.01.004.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 106,11	318,33	0,00	318,33	R\$ 318,33	0,00	0,00
10.01.004.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 102,90	308,70	0,00	308,70	R\$ 308,70	0,00	0,00
10.01.005	QD4 - REFEITÓRIO										18.125,48		
10.01.005.001	RAMAL DE ENTRADA										2.054,45		
10.01.005.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	116,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.278,32	116,00	1.278,32
10.01.005.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	29,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 607,26	29,00	607,26
10.01.005.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45
10.01.005.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 44,50	10,00	44,50
10.01.005.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96
10.01.005.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24
10.01.005.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72
10.01.005.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.529,97		
10.01.005.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34
10.01.005.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12
10.01.005.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16
10.01.005.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	1,00	73,12
10.01.005.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45
10.01.005.002.006	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,33	1,00	233,33
10.01.005.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,00	4,00	49,00
10.01.005.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45
10.01.005.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										14.541,06		
10.01.005.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	21,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 166,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.502,17	21,00	3.502,17
10.01.005.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.445,04	12,00	1.445,04
10.01.005.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	30,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.609,00	30,00	6.609,00
10.01.005.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.412,46	14,00	1.412,46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obs: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		
							06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91		
									007				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
10.01.005.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 954,99	9,00	954,99
10.01.005.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,40	6,00	617,40
10.01.006	QD5 - VESTIÁRIO										13.666,14		
10.01.006.001	RAMAL DE ENTRADA										2.852,49		
10.01.006.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	164,00	164,00	0,00	164,00	R\$ 11,02	1.807,28	0,00	1.807,28	R\$ 1.807,28	0,00	0,00
10.01.006.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	41,00	41,00	0,00	41,00	R\$ 20,94	858,54	0,00	858,54	R\$ 858,54	0,00	0,00
10.01.006.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	14,00	14,00	0,00	14,00	R\$ 4,45	62,30	0,00	62,30	R\$ 62,30	0,00	0,00
10.01.006.001.004	Fita em aço inox, fusimex ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00
10.01.006.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00
10.01.006.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 18,62	37,24	0,00	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00
10.01.006.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00
10.01.006.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.167,48		
10.01.006.002.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 499,96	499,96	0,00	499,96	R\$ 499,96	0,00	0,00
10.01.006.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00
10.01.006.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00
10.01.006.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 68,59	0,00	68,59	68,59	R\$ 68,59	0,00	0,00
10.01.006.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 119,15	0,00	357,45	357,45	R\$ 357,45	0,00	0,00
10.01.006.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 12,25	0,00	36,75	36,75	R\$ 36,75	0,00	0,00
10.01.006.002.007	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 40,45	0,00	40,45	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00
10.01.006.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										9.646,17		
10.01.006.003.001	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	6,00	4,00	2,00	6,00	R\$ 120,42	481,68	240,84	722,52	R\$ 722,52	0,00	0,00
10.01.006.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	4,00	2,00	2,00	4,00	R\$ 161,17	322,34	322,34	644,68	R\$ 644,68	0,00	0,00
10.01.006.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	26,00	26,00	0,00	26,00	R\$ 220,30	5.727,80	0,00	5.727,80	R\$ 5.727,80	0,00	0,00
10.01.006.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	17,00	0,00	17,00	17,00	R\$ 100,89	0,00	1.715,13	1.715,13	R\$ 1.715,13	0,00	0,00
10.01.006.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 106,11	0,00	424,44	424,44	R\$ 424,44	0,00	0,00
10.01.006.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 102,90	0,00	411,60	411,60	R\$ 411,60	0,00	0,00
10.01.007	QD6 - ABRIGO										14.827,57		
10.01.007.001	RAMAL DE ENTRADA										1.646,53		
10.01.007.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	92,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.013,84	92,00	1.013,84

nnnnnn

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		
							06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91		
									007				
ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
10.01.007.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	23,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 481,62	23,00	481,62
10.01.007.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,70	6,00	26,70
10.01.007.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45
10.01.007.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96
10.01.007.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24
10.01.007.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72
10.01.007.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.496,12		
10.01.007.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34
10.01.007.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12
10.01.007.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16
10.01.007.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,97	1,00	79,97
10.01.007.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45
10.01.007.002.006	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 192,63	3,00	192,63
10.01.007.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,00	4,00	49,00
10.01.007.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45
10.01.007.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										11.684,92		
10.01.007.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.901,06	18,00	2.901,06
10.01.007.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 842,94	7,00	842,94
10.01.007.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.507,50	25,00	5.507,50
10.01.007.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.816,02	18,00	1.816,02
10.01.007.003.005	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,40	6,00	617,40
10.01.008	QD7 - CASA DE APOIO										6.609,04		
10.01.008.001	RAMAL DE ENTRADA										926,01		
10.01.008.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	56,00	56,00	0,00	56,00	R\$ 11,02	617,12	0,00	617,12	R\$ 617,12	0,00	0,00
10.01.008.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	14,00	14,00	0,00	14,00	R\$ 13,23	185,22	0,00	185,22	R\$ 185,22	0,00	0,00
10.01.008.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 3,12	15,60	0,00	15,60	R\$ 15,60	0,00	0,00
10.01.008.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00
10.01.008.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00
10.01.008.001.006	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 10,47	20,94	0,00	20,94	R\$ 20,94	0,00	0,00
10.01.008.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00
10.01.008.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										398,06		

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
								06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO N°	15/1/2024	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
										007		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91	
ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
10.01.008.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 143,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 143,09	1,00	143,09
10.01.008.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00
10.01.008.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00
10.01.008.002.004	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 13,49	13,49	0,00	13,49	R\$ 13,49	0,00	0,00
10.01.008.002.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 12,25	36,75	0,00	36,75	R\$ 36,75	0,00	0,00
10.01.008.002.006	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00
10.01.008.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										5.284,97		
10.01.008.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	8,00	8,00	0,00	8,00	R\$ 161,17	1.289,36	0,00	1.289,36	R\$ 1.289,36	0,00	0,00
10.01.008.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 120,42	602,10	0,00	602,10	R\$ 602,10	0,00	0,00
10.01.008.003.003	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 237,23	237,23	0,00	237,23	R\$ 237,23	0,00	0,00
10.01.008.003.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	10,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 220,30	2.203,00	0,00	2.203,00	R\$ 2.203,00	0,00	0,00
10.01.008.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	7,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 106,11	742,77	0,00	742,77	R\$ 742,77	0,00	0,00
10.01.008.003.006	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 70,17	210,51	0,00	210,51	R\$ 210,51	0,00	0,00
10.01.009	QD8 - CIRCULAÇÃO										6.355,86		
10.01.009.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										20,12		
10.01.009.001.001	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,12	2,00	20,12
10.01.009.002	PONTOS DE LUZ E FORÇA										6.335,74		
10.01.009.002.001	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.016,09	19,00	2.016,09
10.01.009.002.002	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un.	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 227,35	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.319,65	19,00	4.319,65
11	FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO/CAIXAS										15.829,59		
11.01	FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO										11.838,49		
11.01.001	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23.180,40	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
11.01.002	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 5,6 x h=1,67 m, volume útil: 10752 l (para 103 contribuintes). af 12/2020	un	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12.675,09	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
11.01.003	Sumidouro paredes com tijolo maciço (dobrado), Ø(int) = 3,00m, h=3,55m	un	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14.284,67	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
11.01.004	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.741,63	1.741,63	0,00	1.741,63	R\$ 1.741,63	0,00	0,00
11.01.005	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 613,25	1.226,50	0,00	1.226,50	R\$ 1.226,50	0,00	0,00
11.01.006	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 431,66	431,66	0,00	431,66	R\$ 431,66	0,00	0,00
11.01.007	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 5338,6 l (para 34 contribuintes). af 12/2020 pa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 4.248,69	4.248,69	0,00	4.248,69	R\$ 4.248,69	0,00	0,00

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
								06/7/2023	08.12.2023 a 12.01.2024	MEDICÃO Nº	15/1/2024	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
										007		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91	
ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
11.01.008	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes), af. 12/2020 pa	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 1.396,67	4.190,01	0,00	4.190,01	R\$ 4.190,01	0,00	0,00
11.02	CAIXAS										3.991,10		
11.02.001	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,30 x 0,65m	un	3,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 392,90	0,00	392,90	392,90	R\$ 1.178,70	2,00	785,80
11.02.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m	un	10,00	3,00	3,00	6,00	R\$ 281,24	843,72	843,72	1.687,44	R\$ 2.812,40	4,00	1.124,96
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										47.572,00		
12.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
12.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	350,00	238,28	20,00	258,28	R\$ 88,60	21.111,61	1.772,00	22.883,61	R\$ 31.010,00	91,72	8.126,39
12.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	350,00	238,28	20,00	258,28	R\$ 47,32	11.275,41	946,40	12.221,81	R\$ 16.562,00	91,72	4.340,19
13	TRANSPORTE DE ENTULHO										10.454,40		
13.01	TRANSPORTE DE ENTULHO												
13.01.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm), af. 07/2020	m³xkm	5280,00	3.700,00	0,00	3.700,00	R\$ 1,98	7.326,00	0,00	7.326,00	R\$ 10.454,40	1.580,00	3.128,40
TOTAL DO ÍTEM								613.289,42		683.798,67			339.503,24
TOTAL DA MEDICÃO									70.509,25		1.023.301,91		



Documento assinado digitalmente
BRENO DE ASSIS PINTO
Data: 18/01/2024 11:57:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
BRUNO BEIRIZ PINTO
Data: 18/01/2024 12:41:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
THAISA LIMA SANTOS
Data: 18/01/2024 12:58:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 18/01/2024 13:02:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

nnnn42

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES - SBP CONSTRUÇÕES - CNPJ Nº 29.553.812/0001-46			
RUA TERÊNCIO SAMPAIO, 532 - GRAGERU - ARACAJU-SE			
REFORMA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA PREFEITO JOÃO ALVES DOS SANTOS - CONTRATO Nº 067/2023			
MEMORIAL DE CÁLCULO DA 7ª MEDIÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
6	VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO		
06.03	COBERTURA		
06.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	-
06.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	-
06.03.003	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	27,20
06.03.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	-
06.03.005	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	15,80 x 1,519 = 24,00
06.04	REVESTIMENTO		
06.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	-
06.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	0,62 x 0,53 x 48 + 0,53 x 0,372 x 24 = 20,50
06.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	-
06.04.004	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	-
06.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	-
06.04.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha rivierra, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	(46,153 x 2,80 + 18,49 x 1,80) - (0,90 x 2,10 + 0,70 x 2,10 x 2 + 4,00 x 1,00 + 3,00 x 0,50) = 152,18
06.06	PILARES		
06.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,10m x 1,00m x 5un = 5,50
06.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,10m x 1,00m x 5un = 5,50
06.06.003	Demolição de reboco	m2	1,10m x 1,00m x 5un = 5,50
06.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	

06.07	PAVIMENTAÇÃO		
06.07.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	148,78
06.09	ESQUADRIAS		
06.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA		
06.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	-
06.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	-
06.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 1.60 m, inclusive batente e dobradiças, exclusive fechadura	un	14,00
06.09.001.004	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	21,00
06.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS		
06.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1,10 x 1,50 = 1,65
06.09.002.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	1,15
06.11	METAIS E LOUÇAS		
06.11.001	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	
06.11.002	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	
06.11.003	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C-Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	9,00
06.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	
06.11.005	Saboneteira para sabão líquido	un	
06.11.006	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020	un	
06.11.007	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	
06.11.008	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	
06.11.009	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,30x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	

06.11.010	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.50x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00
06.12	PINTURAS		
06.12.001	PINTURA DE FORRO		
06.12.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	(Primeiros socorros (16,34) Vestiário masculino (21,78) Sanitário masculino (44,58) Vestiário masculino (21,45) Sanitário feminino (21,55) Vestiário feminino (23,08)) - 74,39 = 74,39
06.12.002	PINTURA EXTERNA		
06.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	
06.12.003	PINTURAS ESQUADRIAS		
06.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	
06.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	78,22
06.13	DIVERSOS		
06.13.001	Limpeza geral	m2	
7	REFEITÓRIO/COZINHA		
07.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
07.01.001	Demolição de reboco	m2	15,41 x 1,20 = 18,49
07.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	103,50 x 1,50 = 155,25
07.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	
07.01.004	Demolição de piso de alta resistência	m2	178,34
07.01.005	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	
07.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	13,23
07.01.007	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	14,90
07.01.008	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	
07.01.009	Remoção de vaso sanitário	un	
07.01.010	Remoção de lavatório	un	
07.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	
07.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	42,67
07.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	26,90
07.01.014	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	

07.01.015	Coleta e carga manuais de entulho	m3	15,00
07.01.016	Demolição de peitoril de mármore	m2	3,56
07.01.017	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	
07.01.018	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	204,00
07.02	ELEVAÇÃO		
07.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	
07.02.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	
07.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	
07.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	
07.03	COBERTURA		
07.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	26,90
07.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	42,67
07.03.003	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	
07.03.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	
07.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	
08.02	CIRCULAÇÕES		
08.02.005	Demolição de reboco	m2	19,66
08.02.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	19,66
08.02.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	19,66
08.02.010	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	200,00
10.01.006	QD5 - VESTIÁRIO		
10.01.006.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
10.01.006.002.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	

10.01.006.002.	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	
10.01.006.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	
10.01.006.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00
10.01.006.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00
10.01.006.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	3,00
10.01.006.002.007	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00
10.01.006.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA		
10.01.006.003.001	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	2,00
10.01.006.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	2,00
10.01.006.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	
10.01.006.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	17,00
10.01.006.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	4,00
10.01.006.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00
11.02	CAIXAS		
11.02.001	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.30 x 0.65m	un	1,00
11.02.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	un	3,00
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
12.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
12.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	20,00
12.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	20,00

gov.br Documento assinado digitalmente
BRENO DE ASSIS PINTO
Data: 18/01/2024 11:57:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO BEIRIZ PINTO
Data: 18/01/2024 12:41:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
THAISA LIMA SANTOS
Data: 18/01/2024 12:58:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 18/01/2024 13:02:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

nnnn77

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

0000028

MEDICÃO Nº 7 /

Período: 08.12.2023 a 12.01.2024

Objeto: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos, em Itabaiana/SE

Contrato nº 067/2023 /

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo servir de memória para os pagamentos efetuados por conta da referida medição, como também informar o andamento de serviços. Ele não substitui a medição efetuada considerando-se a planilha orçamentária, servindo de resumo para suporte à mesma.




Fotos 01. Caixas de passagem e de gordura




000000


Fotos 02. Foto da parte externa do Bloco dos Vestiários: pintura externa, emassamento de cumieira, passeio, fossas. Instalação de refletores externos.

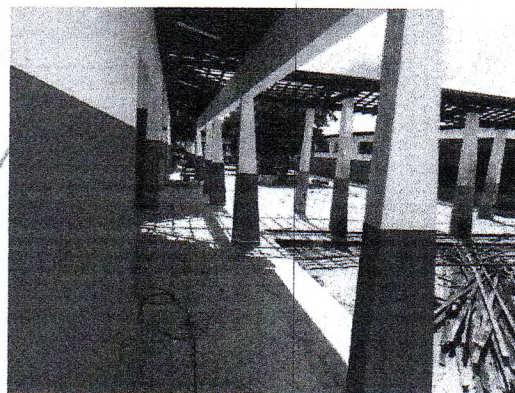

Fotos 03. Parte externa do Bloco dos Vestiários: recuperação dos pilares, emassamento e pintura dos pilares, instalação de janela de alumínio, emassamento de cumieira.

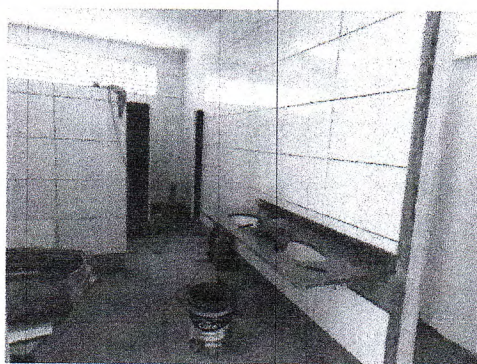



Fotos 04. Instalação de bancada de granito e revestimento nos vestiários. Preparação de base para piso. Instalação de luminárias

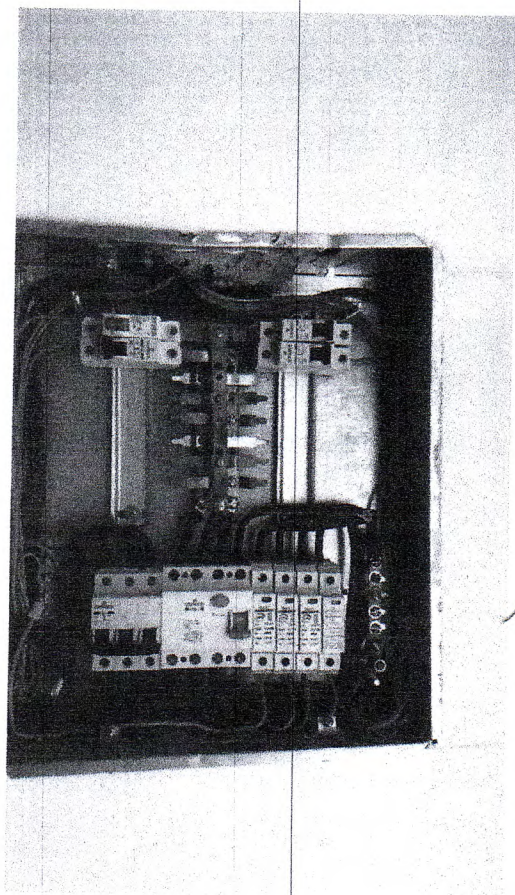



Fotos 05. Finalização do quadro de energia com instalação dos disjuntores; instalação de luminárias nos vestiários. Pintura do forro de gesso





Fotos 06. Instalação dos chuveiros dos vestiários; luminárias acesas; pintura de forro de gesso

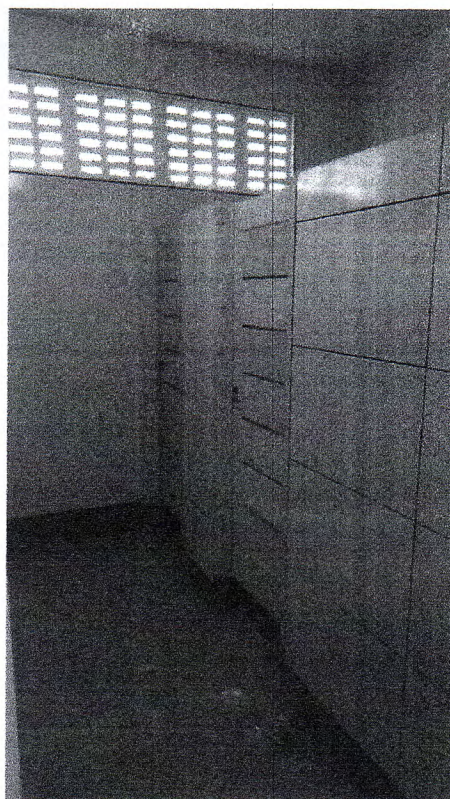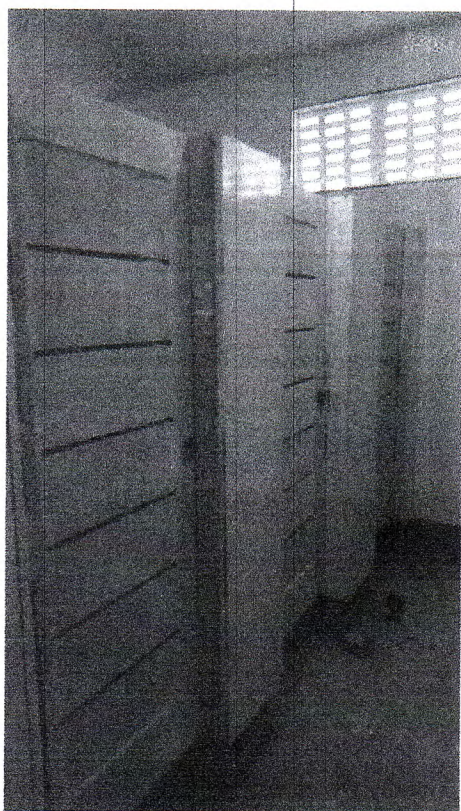


Fotos 07. Instalação de portas de madeira com fechaduras; emassamento de portas e pintura.

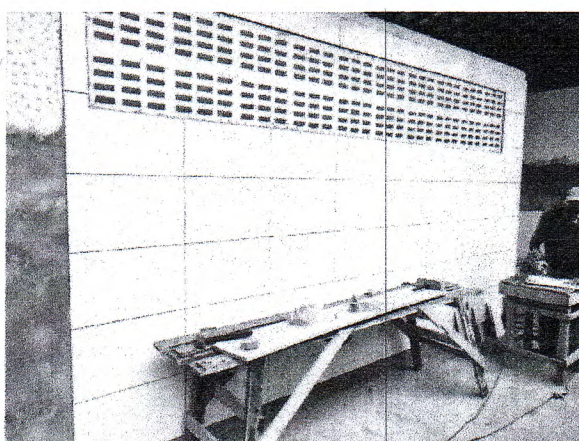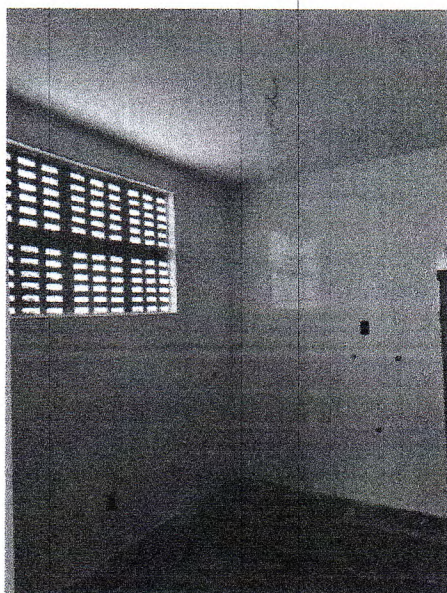



Fotos 08. Revestimentos aplicados nos vestiários

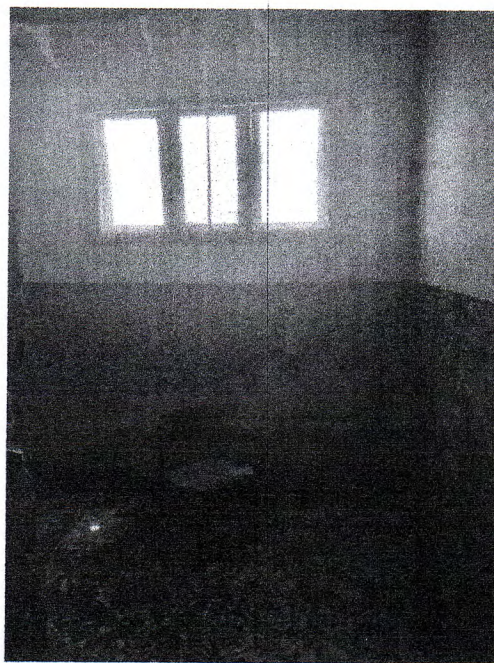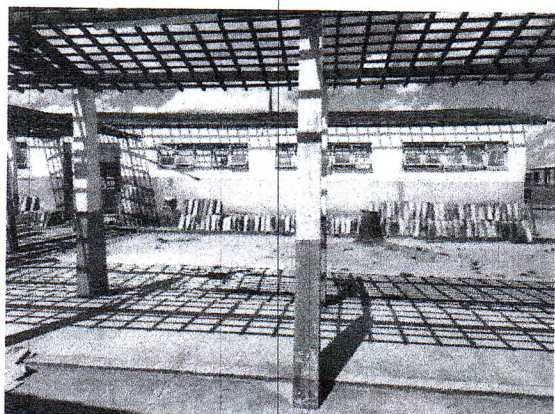


Fotos 09. Início dos serviços no Bloco do Refeitório: retirada de todas as telhas para substituição e troca de madeiramento; demolição de revestimentos e rebocos das paredes. Remoção de teto de gesso.

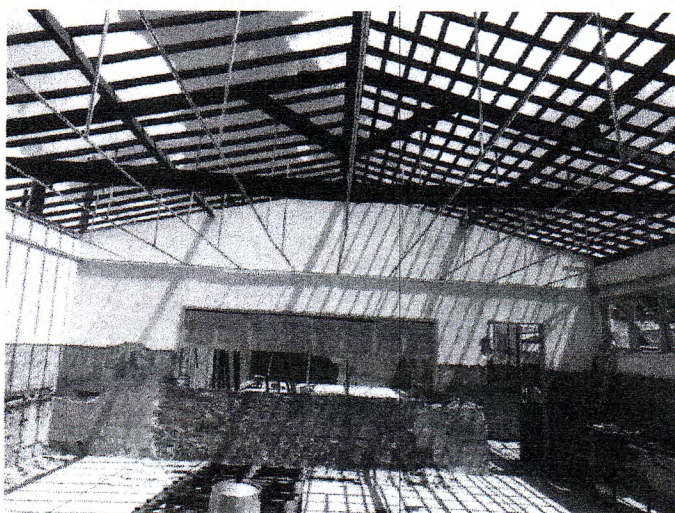

Fotos 10. Remoção de revestimento do Refeitório; remoção do forro de gesso. Remoção de esquadrias.

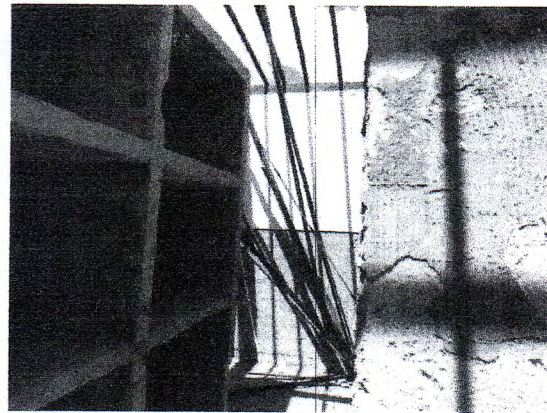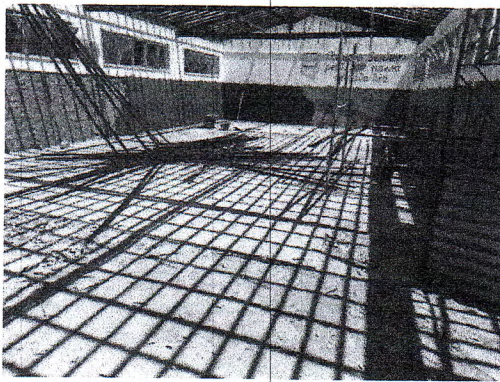

Fotos 11. Demolição de piso de alta resistência; retirada de peças de madeira do telhado para substituição; realização de chapisco e reboco nas paredes. Remoção de forro de pvc de todo o refeitório.

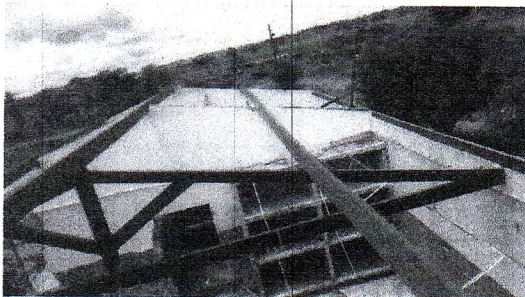

Fotos 12. Realização da substituição do madeiramento do telhado do refeitório com instalação de novas ripas e ripões



Fotos 13. Realização da substituição do madeiramento do telhado do refeitório com instalação de novas ripas e ripões



000054

Fotos 14. Telhas que serão instaladas em todo o Bloco do Refeitório e na área de circulação, onde toda a cobertura já foi retirada.



Fotos 15. Retirada de toda a cobertura (telhas) da área de circulação, para fins de verificação do madeiramento, com a instalação de telhas novas, conforme imagens anteriores.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRENO DE ASSIS PINTO
Data: 18/01/2024 11:57:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO BEIRIZ PINTO
Data: 18/01/2024 12:41:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
THAISA LIMA SANTOS
Data: 18/01/2024 12:58:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 18/01/2024 13:02:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
