

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 09	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI	DATA DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 23/04/2025	
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE	LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL PEREIRA DE ANDRADE	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE						R\$ 1.510.289,30	390.312,63	33.981,22	424.293,85	1.085.996,45	28,09	
01.01	ESQUADRIAS						R\$ 206.228,10	R\$ 24.068,00	R\$ 3.956,97	R\$ 28.024,98	R\$ 178.203,12	13,59	
01.01.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	und	50,00	8,00	6,00	14,00	R\$ 580,91	R\$ 29.045,50	4.647,28	3.485,46	8.132,74	20.912,76	28,00
01.01.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	und	50,00	27,00		27,00	R\$ 611,75	R\$ 30.587,50	16.517,25	-	16.517,25	14.070,25	54,00
01.01.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	und	25,00			-	R\$ 628,02	R\$ 15.700,50			-	15.700,50	0,00
01.01.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	60,00	8,51	2,27	10,78	R\$ 123,47	R\$ 7.408,20	1.050,73	280,28	1.331,01	6.077,19	17,97
01.01.005	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	300,00	6,11		6,11	R\$ 205,69	R\$ 61.707,00	1.256,77	-	1.256,77	60.450,23	2,04
01.01.006	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	40,00			-	R\$ 795,21	R\$ 31.808,40	-	-	-	31.808,40	0,00
01.01.007	Vidro liso incolor 6mm - Ver 01 10/2021	m2	100,00	1,02		1,02	R\$ 185,88	R\$ 18.588,00	189,60	-	189,60	18.398,40	1,02
01.01.008	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	3,57	1,68	5,25	R\$ 113,83	R\$ 11.383,00	408,37	191,23	597,61	10.785,39	5,25
01.02	COBERTURA						R\$ 439.001,80	R\$ 90.935,12	R\$ 4.376,04	R\$ 95.311,17	R\$ 343.690,63	21,71	
01.02.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	1.000,00	253,36		253,36	R\$ 10,66	R\$ 10.660,00	2.700,82	-	2.700,82	7.959,18	25,34
01.02.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	600,00	323,00		323,00	R\$ 73,87	R\$ 44.322,00	23.860,01	-	23.860,01	20.461,99	53,83
01.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8m	un	20,00			-	R\$ 1.222,84	R\$ 24.456,80	-	-	-	24.456,80	0,00
01.02.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	600,00	87,24		87,24	R\$ 82,22	R\$ 49.332,00	7.172,87	-	7.172,87	42.159,13	14,54
01.02.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20cm com abertura de encaixes	m	200,00	158,43		158,43	R\$ 97,21	R\$ 19.442,00	15.400,98	-	15.400,98	4.041,02	79,21
01.02.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	800,00		41,84	41,84	R\$ 43,93	R\$ 35.144,00	-	1.838,03	1.838,03	33.305,97	5,23
01.02.007	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	1.000,00	421,79	41,84	463,63	R\$ 60,66	R\$ 60.660,00	25.585,78	2.538,01	28.123,80	32.536,20	46,36
01.02.008	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	500,00			-	R\$ 33,94	R\$ 16.970,00	-	-	-	16.970,00	0,00
01.02.009	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af 09/2023	m2	1.000,00	3,60		3,60	R\$ 109,62	R\$ 109.620,00	394,63	-	394,63	109.225,37	0,36
01.02.010	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	500,00	138,13		138,13	R\$ 114,53	R\$ 57.265,00	15.820,03	-	15.820,03	41.444,97	27,63
01.02.011	Emassamento de algeroz	m	1.000,00			-	R\$ 11,13	R\$ 11.130,00	-	-	-	11.130,00	0,00
01.03	PAREDES						R\$ 256.128,00	46.984,28	-	46.984,27	209.143,73	18,34	
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1.400,00	278,64		278,64	R\$ 40,68	R\$ 56.952,00	11.335,08	-	11.335,08	45.616,92	19,90
01.03.002	Chapisco em parede argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015	m2	2.200,00	501,75		501,75	R\$ 6,63	R\$ 14.586,00	3.326,60	-	3.326,59	11.259,41	22,81
01.03.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.200,00	161,55		161,55	R\$ 26,51	R\$ 58.322,00	4.282,69	-	4.282,69	54.039,31	7,34
01.03.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2.200,00	340,20		340,20	R\$ 39,44	R\$ 86.768,00	13.417,49	-	13.417,49	73.350,51	15,46
01.03.005	Demolição de reboco	m2	1.500,00	340,20		340,20	R\$ 10,02	R\$ 15.030,00	3.408,80	-	3.408,80	11.621,20	22,68
01.03.006	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00	229,13		229,13	R\$ 48,94	R\$ 24.470,00	11.213,62	-	11.213,62	13.256,38	45,83
01.04	PINTURA						R\$ 201.382,00	133.447,36	25.570,33	159.017,68	42.364,32	78,96	
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.000,00	226,64	8,06	234,70	R\$ 20,99	R\$ 20.990,00	4.757,17	169,18	4.926,35	16.063,65	23,47
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	4.500,00	4.098,90	401,10	4.500,00	R\$ 15,17	R\$ 68.265,00	62.180,31	6.084,69	68.265,00	-	100,00

Andre Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 09	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI	DATA DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 23/04/2025	
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE	LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL PEREIRA DE ANDRADE	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.04.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	400,00	191,86		191,86	R\$ 25,59	R\$ 10.236,00	4.909,69	-	4.909,68	5.326,32	47,96
01.04.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	2.500,00	1.919,21		1.919,21	R\$ 12,19	R\$ 30.475,00	23.395,17	-	23.395,17	7.079,83	76,77
01.04.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4.500,00	2.251,00	1.341,48	3.592,48	R\$ 12,63	R\$ 56.835,00	28.430,12	16.942,89	45.373,01	11.461,99	79,83
01.04.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	500,00	61,35		61,35	R\$ 4,73	R\$ 2.365,00	290,19	-	290,19	2.074,81	12,27
01.04.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	600,00	465,85	116,58	582,43	R\$ 20,36	R\$ 12.216,00	9.484,71	2.373,57	11.858,28	357,72	97,07
01.05	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO							R\$ 47.497,80	406,74	77,88	484,62	47.013,18	1,02
01.05.001	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	40,00		3,00	3,00	R\$ 25,96	R\$ 1.038,40	-	77,88	77,88	960,52	7,50
01.05.002	Lavatório louça (Deca-Ravenna ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	40,00				R\$ 258,15	R\$ 10.326,00	-	-	-	10.326,00	0,00
01.05.003	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	100,00				R\$ 67,37	R\$ 6.737,00	-	-	-	6.737,00	0,00
01.05.004	Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto carga descarga - Rev 04	un	40,00				R\$ 349,11	R\$ 13.964,40	-	-	-	13.964,40	0,00
01.05.005	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	40,00	6,00		6,00	R\$ 67,79	R\$ 2.711,60	406,74	-	406,74	2.304,86	15,00
01.05.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	40,00				R\$ 87,57	R\$ 3.502,80	-	-	-	3.502,80	0,00
01.05.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	40,00				R\$ 121,19	R\$ 4.847,60	-	-	-	4.847,60	0,00
01.05.008	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40,00				R\$ 109,25	R\$ 4.370,00	-	-	-	4.370,00	0,00
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 45.306,70	5.266,43	-	5.266,43	40.040,27	11,62
01.06.001	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	50,00	21,00		21,00	R\$ 139,69	R\$ 6.984,50	2.933,49	-	2.933,49	4.051,01	42,00
01.06.002	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	50,00				R\$ 95,55	R\$ 4.777,50	-	-	-	4.777,50	0,00
01.06.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	50,00	6,00		6,00	R\$ 303,20	R\$ 15.160,00	1.819,20	-	1.819,20	13.340,80	12,00
01.06.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	50,00	2,00		2,00	R\$ 256,87	R\$ 12.843,50	513,74	-	513,74	12.329,76	4,00
01.06.005	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	20,00				R\$ 65,66	R\$ 1.313,20	-	-	-	1.313,20	0,00
01.06.006	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	100,00				R\$ 30,13	R\$ 3.013,00	-	-	-	3.013,00	0,00
01.06.007	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	50,00	23,00		23,00	R\$ 24,30	R\$ 1.215,00	558,90	-	558,90	656,10	46,00
01.07	LIMPEZA							R\$ 17.475,50	244,70	-	244,70	17.230,80	1,40
01.07.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento de tampa	un	50,00				R\$ 26,39	R\$ 1.319,50	-	-	-	1.319,50	0,00
01.07.002	Limpeza de calha de zinco	m	200,00				R\$ 20,10	R\$ 4.020,00	-	-	-	4.020,00	0,00
01.07.003	Limpeza de fossa acima de 5m3	m3	200,00	5,00		5,00	R\$ 48,94	R\$ 9.788,00	244,70	-	244,70	9.543,30	2,50
01.07.004	Limpeza de reservatório	m3	200,00				R\$ 11,74	R\$ 2.348,00	-	-	-	2.348,00	0,00
01.08	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 271.972,40	87.299,66	-	87.299,66	184.672,74	32,10
01.08.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af_08/2022	m2	500,00	177,21		177,21	R\$ 59,26	R\$ 29.630,00	10.501,46	-	10.501,46	19.128,54	35,44
01.08.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	500,00	10,00		10,00	R\$ 15,89	R\$ 7.945,00	158,90	-	158,90	7.786,10	2,00
01.08.003	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	500,00	261,71		261,71	R\$ 52,80	R\$ 26.400,00	13.818,29	-	13.818,29	12.581,71	52,34
01.08.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas na altura das paredes. af_02/2023 pe	m2	300,00	10,00		10,00	R\$ 57,02	R\$ 17.106,00	570,20	-	570,20	16.535,80	3,33
01.08.005	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas na altura das paredes. af_02/2023 pe	m2	300,00	84,92		84,92	R\$ 54,15	R\$ 16.245,00	4.598,42	-	4.598,42	11.646,58	28,31

Andre Agosti Reis Lago
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[Handwritten Signature]

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[Handwritten Signature]

Rizla Maene S. Rodrigues Araújo
Eng.º Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO 09				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			DATA DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 23/04/2025										
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE			LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL PEREIRA DE ANDRADE										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.08.006	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023 pe	m2	500,00			-	R\$ 39,71	R\$ 19.855,00	-	-	-	19.855,00	0,00
01.08.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	un	20,00	1,00		1,00	R\$ 338,54	R\$ 6.770,80	338,54	-	338,54	6.432,26	5,00
01.08.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	60,00	25,36		25,36	R\$ 2.260,01	R\$ 135.600,60	57.313,85	-	57.313,85	78.286,75	42,27
01.08.009	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	300,00			-	R\$ 41,40	R\$ 12.420,00	-	-	-	12.420,00	0,00
01.09	JARDINAGEM							R\$ 25.297,00	1.660,32	-	1.660,32	23.636,68	6,56
01.09.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	300,00	37,64		37,64	R\$ 25,29	R\$ 7.587,00	951,92	-	951,92	6.635,08	12,56
01.09.002	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais	un	500,00	20,00		20,00	R\$ 35,42	R\$ 17.710,00	708,40	-	708,40	17.001,60	4,00
Total geral								R\$ 1.510.289,30	R\$ 390.312,63	R\$ 33.981,22	R\$ 424.293,85	R\$ 1.086.996,45	28,09


 Engenheiro Civil
 R. S. S. S. S.


André Agassi Reis Lapa
 Arq. Urb. CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024		MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 09	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI				DATA DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 23/04/2025	
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE				LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL PEREIRA DE ANDRADE	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de Cálculo	
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE				
01.01	ESQUADRIAS				
01.01.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	und	50,00	06 Unidades	
01.01.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	60,00	$(4,32 \times 2,1 \times 0,15) + (3,0 \times 2,1 \times 0,15) = 2,27 \text{ m}^2$	
01.01.008	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	$0,8 \times 2,10 \times 0,5 \times 2 = 1,68 \text{ m}^2$	
01.02	COBERTURA				
01.02.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	800,00	$(10,23 \times 3,33) + (5,19 \times 1,50) = 41,84$	
01.02.007	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	1.000,00	$(10,23 \times 3,33) + (5,19 \times 1,50) = 41,84$	
01.04	PINTURA				
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.000,00	$(1,6 \times 2,1 \times 0,35) + (1,1 \times 11,21 \times 0,3) + (1,1 \times 9,70 \times 0,3) = 8,06 \text{ m}^2$	
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	4.500,00	Fachada: $(110,56+45,94+44,28+54,45+94,23+17,73+19,35+6+30,69+20,34+9,90+18,58+24,52+74,02+23,85+36,27-67,73) = 562,98 \text{ m}^2 + \text{Muro}=135,04 \text{ m}^2 +$ Paredes internas: $(18,76+96,55+28,57+37,70+51,30+41,28+46,52+8,59+16,17+16,52+27,06+14,505+16,39+15,53+131,68+19,48+8,02+14,21+14,21+20,42)=643,46 \text{ m}^2$ >TOTAL EXECUTADO=1.341,48M ² >TOTAL MEDIDO=401,10 M ² >A ADITAR=940,38M ²	


 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 André Agassi Reis Lapa
 Arq. Urb. CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024		MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 09	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI				DATA DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 23/04/2025	
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE				LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL PEREIRA DE ANDRADE	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de Cálculo	
01.04.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4.500,00	Fachada: $(110,56+45,94+44,28+54,45+94,23+17,73+19,35+6+30,69+20,34+9,90+18,58+24,52+74,02+23,85+36,27-67,73) = 562,98 \text{ m}^2 + \text{Muro}=135,04 \text{ m}^2 +$ Paredes internas: $(18,76+96,55+28,57+37,70+51,30+41,28+46,52+8,59+16,17+16,52+27,06+14,505+16,39+15,53+131,68+19,48+8,02+14,21+14,21+20,42)=643,46 \text{ m}^2$ >TOTAL EXECUTADO=1.341,48M ² >TOTAL MEDIDO=1.341,48 m2	
01.04.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	600,00	$(12 \times 0,9 \times 2,10 \times 2) + (03 \times 0,8 \times 2,10 \times 2) + (10 \times 0,7 \times 2,10 \times 2) + (04 \times 0,6 \times 2,10 \times 2) + (12 \times 0,15 \times 5,10) + (03 \times 0,15 \times 5,0) + (10 \times 0,15 \times 4,9) + (04 \times 0,15 \times 4,8) = 116,58 \text{ M}^2$ >>TOTAL EXECUTADO=116,58M ² >TOTAL MEDIDO=116,58M ²	
01.05	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO				
01.05.001	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	40,00	03 UNIDADES	


 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


André Agassi Reis Lapa
 Eng. Urb. CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
DA MEDIÇÃO Nº 09

LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL PEREIRA DE ANDRADE

DATA DA MEDIÇÃO: 23/04/2025

PERÍODO: 01/04/2025 a
23/04/2025

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

INSTALAÇÃO DA PORTA E FECHADURA



INSTALAÇÃO DA PORTA E FECHADURA



INSTALAÇÃO DA PORTA E FECHADURA



INSTALAÇÃO DA PORTA E FECHADURA



INSTALAÇÃO DA FECHADURA



INSTALAÇÃO DA FECHADURA



PINTURA DAS PORTAS



PINTURA DA PORTA



PINTURA DAS PORTAS



André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Página 1 de 4

Luiz Mario Neri Alfano Junior
Engenheiro Civil
CREAISE: 2706505522

OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
DA MEDIÇÃO Nº 09


LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL PEREIRA DE ANDRADE

DATA DA MEDIÇÃO: 23/04/2025

PERÍODO: 01/04/2025 a
23/04/2025

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

PINTURA DAS PORTAS

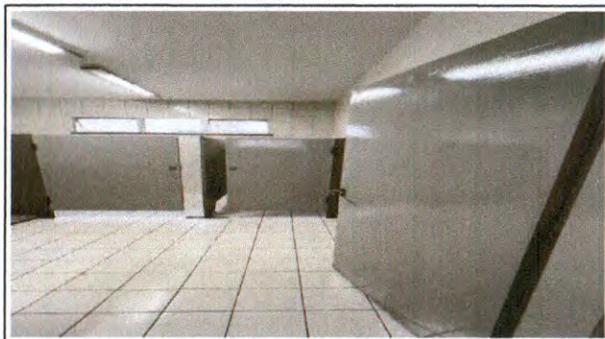

MANUTENÇÃO DAS JANELAS DE ALUMÍNIO E TROCA DA
FECHADURA



MANUTENÇÃO DAS JANELAS DE ALUMÍNIO E TROCA DA
FECHADURA



André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


PINTURA DA PORTA



MANUTENÇÃO DO FORRO DE PVC




MANUTENÇÃO DAS JANELAS DE ALUMÍNIO E TROCA DA
FECHADURA

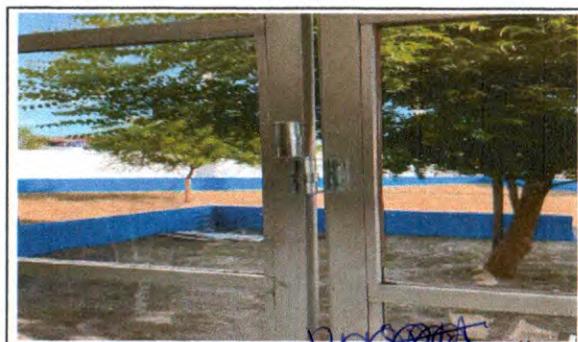

Rizida Milene S. Rodrigues Azeiteiro
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Página 02
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO DO FORRO DE PVC

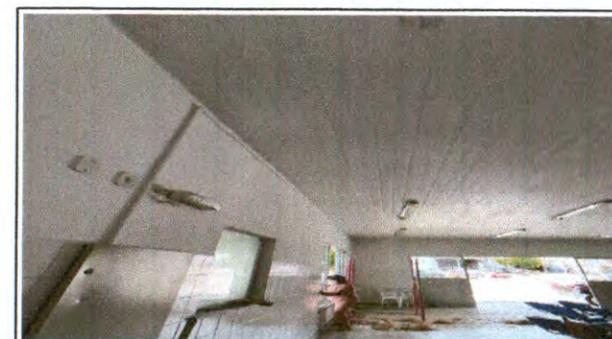

INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE ALUMÍNIO E FECHADURAS



EMASSAMENTO DE PAREDES



Luiz Mario Neri Alfaro
Engenheiro Civil
CREA/SE: 270690552

OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
DA MEDIÇÃO Nº 09

LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL PEREIRA DE ANDRADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 23/04/2025

PERÍODO: 01/04/2025 a
23/04/2025


EMASSAMENTO DE PAREDES




EMASSAMENTO DE PAREDE E PINTURA



PINTURA DE PAREDES

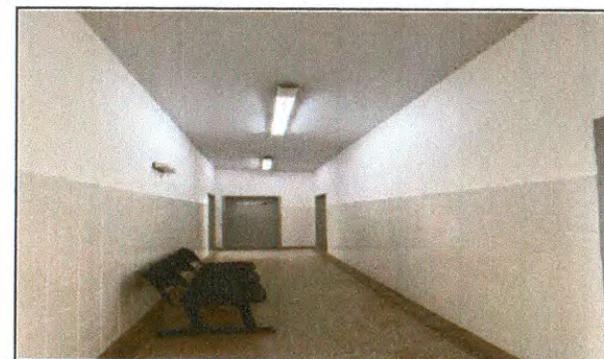


PINTURA DE PAREDES

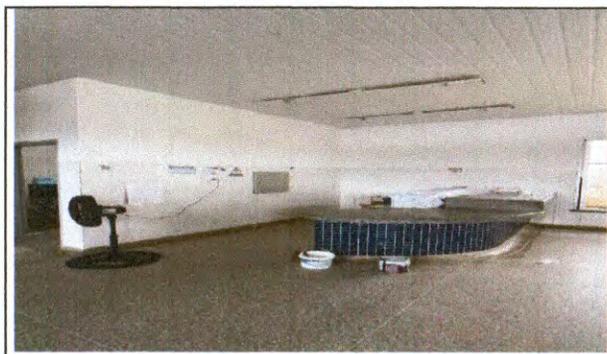


PINTURAS DAS PAREDES




PINTURAS DAS PAREDES

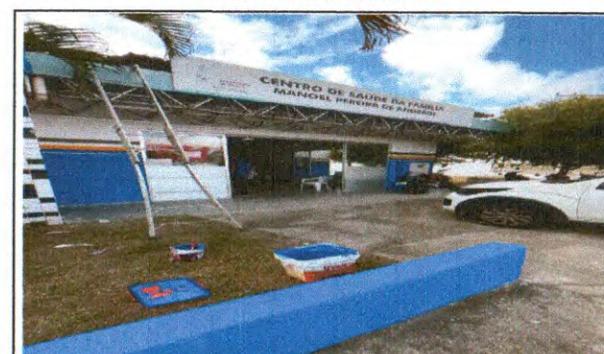

PINTURAS DAS PAREDES

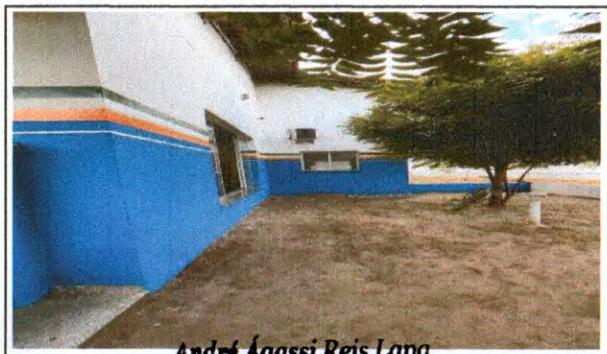

PINTURAS DAS PAREDES

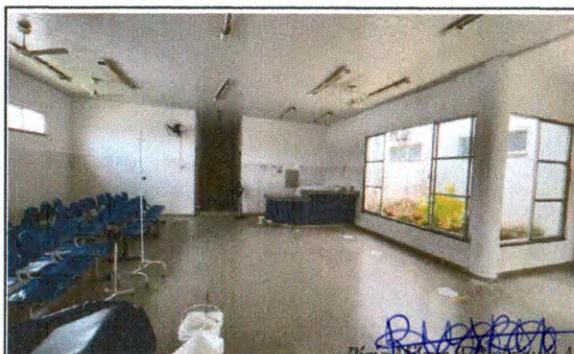

PINTURAS DAS PAREDES



André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Rizalaine G. Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Página 3 de 4

Luzia Maria Neri Alfaro Junior
Engenheiro Civil
CREASE 27/030552

OBRA: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
DA MEDIÇÃO Nº 09

LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL PEREIRA DE ANDRADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI


DATA DA MEDIÇÃO: 23/04/2025

PERÍODO: 01/04/2025 a
23/04/2025

PINTURA DE PAREDE








PINTURAS DAS PAREDES

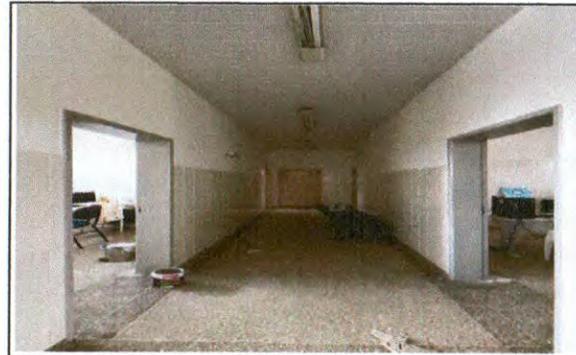

PINTURA DE GRADE E CORRIMÃO



PINTURA DE GRADE E CORRIMÃO



André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Página 4 de 4

Luiz Mario Neri Alfano Junior
Engenheiro Civil
CREABE: 270995522
