


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021				 CONSTRUIR		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 10/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 04/03/2022 a 11/03/2022				DATA: 11/03/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							1.188.016,40	509.363,60	66.615,81	575.979,41	612.036,99	48,48
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	13.297,12	1.800,45	15.097,57	36,21	1.158.720,00	481.488,72	65.194,29	546.683,01	612.036,99	47,18
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	28,24	1,76	30,00	807,68	24.230,40	22.808,88	1.421,52	24.230,40	0,00	100,00
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							48.081,24	20.617,24	2.692,55	23.309,79	24.771,45	48,48
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,43	0,0560	0,48	48.081,24	48.081,24	20.617,24	2.692,55	23.309,79	24.771,45	48,48
Total geral								1.236.097,64	529.980,84	69.308,36	599.289,20	636.808,44	48,48
 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____				Aprovado para pagamento Data: ____/____/____						

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353353
Coordenador de Núcleo

Fornan
2027

3ª: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 10/2022	ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 04/03/2022 A 11/03/2022	DATA: 11/03/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	04/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES ✓	S/N	INVASÃO	2,00	35,10	70,20
2	04/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES ✓	S/N	INVASÃO	1,65	80,10	132,17
3	04/03/2022	RUA C ✓	-	INVASÃO	2,10	18,10	38,01
4	04/03/2022	RUA D ✓	-	INVASÃO	1,80	14,70	26,46
5	04/03/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2073	BAIRRO MIGUEL TELES	4,60	3,10	14,26
6	04/03/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2064	BAIRRO MIGUEL TELES	3,00	4,20	12,60
7	07/03/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2045	BAIRRO MIGUEL TELES	2,40	13,60	32,64
8	07/03/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2033	BAIRRO MIGUEL TELES	2,10	12,20	25,62
9	07/03/2022	RUA D ✓	-	INVASÃO	1,90	25,10	47,69
10	07/03/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2026	BAIRRO MIGUEL TELES	1,70	8,50	14,45
11	07/03/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2020	BAIRRO MIGUEL TELES	2,40	4,40	10,56
12	07/03/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	2,75	9,80	26,95
13	07/03/2022	RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA ✓	220	-	1,90	4,50	8,55
14	07/03/2022	PRAÇA JOÃO PESSOA ✓	S/N	EM FRENTE A BANCA DE REVISTA	1,10	1,90	2,09
15	07/03/2022	RUA ALUISIO SANTANA ✓	63	-	1,60	45,90	73,44
16	07/03/2022	RUA JOSEFA VIEIRA SANTOS ✓	S/N	-	1,40	19,40	27,16
17	07/03/2022	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS ✓	625	-	4,50	8,50	38,25
18	08/03/2022	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO ✓	165	-	1,90	22,90	43,51
19	08/03/2022	RUA SANTA CRUZ ✓	29	-	1,10	1,40	1,54
20	08/03/2022	RUA SANTA CRUZ ✓	18	-	1,20	2,70	3,24
21	08/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES ✓	S/N	INVASÃO	1,65	80,10	132,17
22	08/03/2022	RUA D ✓	-	INVASÃO	1,90	25,10	47,69
23	08/03/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2026	BAIRRO MIGUEL TELES	1,70	8,50	14,45
24	08/03/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	2020	BAIRRO MIGUEL TELES	2,40	4,40	10,56
25	08/03/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	2,75	9,80	26,95
26	09/03/2022	RUA ALVARO ANDRADE ✓	24	INVASÃO	1,80	44,70	80,46
27	09/03/2022	RUA ALVARO ANDRADE ✓	64	INVASÃO	1,90	120,10	228,19
28	10/03/2022	RUA ALVARO ANDRADE ✓	315	INVASÃO	2,60	2,90	7,54
29	10/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES ✓	36	INVASÃO	1,50	25,50	38,25
30	10/03/2022	RUA MANOEL SERAFIM ✓	71	INVASÃO	1,70	3,60	6,12
31	10/03/2022	RUA D ✓	76	EM FRENTE A HOLLYWOOD	1,80	27,10	48,78
32	10/03/2022	RUA D ✓	32	EM FRENTE A HOLLYWOOD	1,90	30,10	57,19
33	10/03/2022	RUA D ✓	18	EM FRENTE A HOLLYWOOD	1,90	24,10	45,79
34	10/03/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	2,75	26,80	73,70
35	11/03/2022	RUA SÃO PEDRO ✓	1931	BAIRRO MIGUEL TELES	2,60	80,10	208,26
36	11/03/2022	RUA PROJETADA 11 ✓	S/N	RIO DAS PEDRAS - RUA DA CERAMICA	3,90	9,20	35,88
37	11/03/2022	RUA PROJETADA 11 ✓	S/N	RIO DAS PEDRAS - RUA DA CERAMICA	5,90	15,10	89,09
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							1.800,45


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Junior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

YAN HENRIQUE
 TAVARES
 SANTANA:05411146542

Assinado de forma digital por
 YAN HENRIQUE TAVARES
 SANTANA:05411146542
 Dados: 2022.03.11 13:26:34
 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10/2022**



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



RUA C



RUA D



RUA SÃO PEDRO




RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO

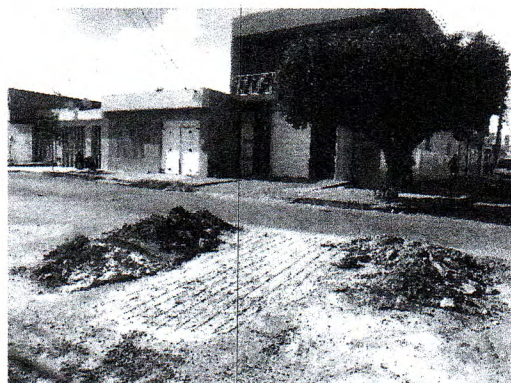

RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA



RUA ALUISIO SANTANA



RUA JOSEFA VIEIRA SANTOS



PRAÇA JOÃO PESSOA



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO



RUA SANTA CRUZ



RUA SANTA CRUZ



RUA ALVARO ANDRADE



RUA ALVARO ANDRADE



RUA ALVARO ANDRADE

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

YAN HENRIQUE
TAVARES
SANTANA:05411146542

Assinado de forma digital por
YAN HENRIQUE TAVARES
SANTANA:05411146542
Dados: 2022.03.11 13:30:52
-03'00'



RUA ALVARO ANDRADE



RUA D



RUA D



RUA D



RUA D



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



RUA MANOEL SERAFIM



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO




RUA PROJETADA 11


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

YAN HENRIQUE
TAVARES
SANTANA:0541114
6542

Assinado de forma digital
por YAN HENRIQUE
TAVARES
SANTANA:05411146542
Dados: 2022.03.11 13:32:44
-03'00'

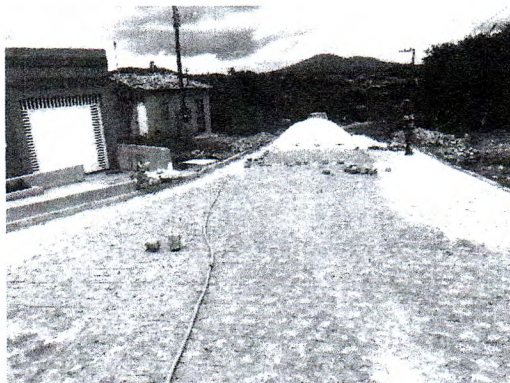

RUA PROJETADA 11

YAN HENRIQUE
TAVARES
SANTANA:054111465
42

Assinado de forma digital
por YAN HENRIQUE TAVARES
SANTANA:05411146542
Dados: 2022.03.11 13:34:03
-03'00'


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232
