


OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO 10				CONTRATO Nº 032/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/07/2025 a 31/07/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 07/08/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								8.603,70	8.603,70	-	8.603,70	-	100,00
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00		6,00	0,00	468,11	2.808,66	2.808,66	-	2.808,66	-	100,00
01.002	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	6,00		6,00	0,00	965,84	5.795,04	5.795,04	-	5.795,04	-	100,00
02	RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS								632.420,81	632.420,82	-	632.420,81	-	100,00
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								28.350,29	28.350,29	-	28.350,29	-	100,00
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.847,01	3.847,01		3.847,01	0,00	1,68	6.462,98	6.462,98	-	6.462,98	-	100,00
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	3.971,41	3.971,41		3.971,41	0,00	1,36	5.401,12	5.401,12	-	5.401,12	-	100,00
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.241,07	1.241,07		1.241,07	0,00	1,12	1.390,00	1.390,00	-	1.390,00	-	100,00
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.723,20	3.723,20		3.723,20	0,00	1,29	4.802,93	4.802,93	-	4.802,93	-	100,00
02.001.005	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	4,88	4,88		4,88	0,00	28,02	136,60	136,60	-	136,60	-	100,00
02.001.006	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	und	6,00	6,00		6,00	0,00	204,70	1.228,20	1.228,20	-	1.228,20	-	100,00
02.001.007	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	13,00	13,00		13,00	0,00	24,75	321,75	321,75	-	321,75	-	100,00
02.001.008	Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 5 fios arame farpado	m	227,21	227,21		227,21	0,00	37,88	8.606,71	8.606,71	-	8.606,71	-	100,00
02.002	PAVIMENTAÇÃO								570.607,28	570.607,28	-	570.607,28	-	100,00
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.598,21	3.598,21		3.598,21	0,00	125,68	452.223,03	452.223,03	-	452.223,03	-	100,00
02.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	829,35	829,35		829,35	0,00	54,87	45.506,43	45.506,43	-	45.506,43	-	100,00
02.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	829,35	829,35		829,35	0,00	4,39	3.640,85	3.640,85	-	3.640,85	-	100,00
02.002.004	Colchão de areia	m3	251,87	251,87		251,87	0,00	156,22	39.347,13	39.347,13	-	39.347,13	-	100,00
02.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	11.194,49	11.194,49		11.194,49	0,00	1,29	14.440,89	14.440,89	-	14.440,89	-	100,00
2.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	829,35	829,35		829,35	0,00	10,09	8.368,14	8.368,14	-	8.368,14	-	100,00
2.002.007	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m3	149,70	149,70		149,70	0,00	28,53	4.270,94	4.270,94	-	4.270,94	-	100,00
2.002.008	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	149,70	149,70		149,70	0,00	18,77	2.809,87	2.809,87	-	2.809,87	-	100,00
02.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								31.270,44	31.270,44	-	31.270,44	-	100,00
02.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	248,81	248,81		248,81	0,00	125,68	31.270,44	31.270,44	-	31.270,44	-	100,00
02.004	LIMPEZA GERAL								2.192,80	2.192,80	-	2.192,80	-	100,00
02.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.847,01	3.847,01		3.847,01	0,00	0,57	2.192,80	2.192,80	-	2.192,80	-	100,00
03	RUA PADRE FILISMINO								230.824,24	230.824,24	-	230.824,24	-	100,00
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								6.175,53	6.175,53	-	6.175,53	-	100,00


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO 10				CONTRATO Nº 032/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/07/2025 a 31/07/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 07/08/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Valores (R\$)							
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.316,97	1.316,97		1.316,97	0,00	1,68	2.212,51	2.212,51	-	2.212,51	-	100,00
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.357,49	1.357,49		1.357,49	0,00	1,36	1.846,19	1.846,19	-	1.846,19	-	100,00
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	424,21	424,21		424,21	0,00	1,12	475,12	475,12	-	475,12	-	100,00
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.272,64	1.272,64		1.272,64	0,00	1,29	1.641,71	1.641,71	-	1.641,71	-	100,00
03.002	PAVIMENTAÇÃO								213.714,19	213.714,19	-	213.714,19	-	100,00
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.235,94	1.235,94		1.235,94	0,00	125,68	155.332,94	155.332,94	-	155.332,94	-	100,00
03.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	270,10	270,10		270,10	0,00	54,87	14.820,39	14.820,39	-	14.820,39	-	100,00
03.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	270,10	270,10		270,10	0,00	4,39	1.185,74	1.185,74	-	1.185,74	-	100,00
03.002.004	Colchão de areia	m3	86,52	86,52		86,52	0,00	156,22	13.516,15	13.516,15	-	13.516,15	-	100,00
03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	10.601,39	10.601,39		10.601,39	0,00	1,29	13.675,79	13.675,79	-	13.675,79	-	100,00
3.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	270,10	270,10		270,10	0,00	10,09	2.725,31	2.725,31	-	2.725,31	-	100,00
3.002.007	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m3	263,38	263,38		263,38	0,00	28,53	7.514,23	7.514,23	-	7.514,23	-	100,00
3.002.008	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	263,38	263,38		263,38	0,00	18,77	4.943,64	4.943,64	-	4.943,64	-	100,00
03.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								10.183,85	10.183,85	-	10.183,85	-	100,00
03.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	81,03	81,03		81,03	0,00	125,68	10.183,85	10.183,85	-	10.183,85	-	100,00
03.004	LIMPEZA GERAL								750,67	750,67	-	750,67	-	100,00
03.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.316,97	1.316,97		1.316,97	0,00	0,57	750,67	750,67	-	750,67	-	100,00
04	RUA ALVARO FONSECA DE OLIVEIRA								333.510,13	-	92.456,36	92.456,36	241.053,77	27,72
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								9.976,41	-	2.741,89	2.741,89	7.234,52	27,48
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.130,75	0,0000	585,00	585,00	1.545,75	1,68	3.579,66	-	982,80	982,80	2.596,86	27,46
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	2.191,13	0,0000	602,55	602,55	1.588,58	1,36	2.979,94	-	819,47	819,47	2.160,47	27,50
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	684,73	0,0000	188,30	188,30	496,43	1,12	766,90	-	210,90	210,90	556,00	27,50
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.054,19	0,0000	564,90	564,90	1.489,29	1,29	2.649,91	-	728,72	728,72	1.921,19	27,50
04.002	PAVIMENTAÇÃO								307.140,82	-	84.969,65	84.969,65	222.171,17	27,66
04.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.009,99	0,0000	549,90	549,90	1.460,09	125,68	252.615,54	-	69.111,43	69.111,43	183.504,11	27,36
04.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	402,55	0,0000	117,00	117,00	285,55	54,87	22.087,92	-	6.419,79	6.419,79	15.668,13	29,06

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO 10				CONTRATO Nº 032/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/07/2025 a 31/07/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 07/08/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	402,55	0,0000	117,00	117,00	285,55	4,39	1.767,19	-	513,63	513,63	1.253,56	29,06
04.002.004	Colchão de areia	m3	140,70	0,0000	40,95	40,95	99,75	156,22	21.980,15	-	6.397,21	6.397,21	15.582,94	29,10
04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.587,82	0,0000	1.044,23	1.044,23	2.543,59	1,29	4.628,29	-	1.347,06	1.347,06	3.281,23	29,10
4.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	402,55	-	117,00	117,00	285,55	10,09	4.061,73	-	1.180,53	1.180,53	2.881,20	29,06
04.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								15.178,37	-	4.411,37	4.411,37	10.767,00	29,06
04.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	120,77	0,0000	35,10	35,10	85,67	125,68	15.178,37	-	4.411,37	4.411,37	10.767,00	29,06
04.004	LIMPEZA GERAL								1.214,53	-	333,45	333,45	881,08	27,46
04.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.130,75	0,0000	585,00	585,00	1.545,75	0,57	1.214,53	-	333,45	333,45	881,08	27,46
05	RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS								244.590,18	185.272,42	-	185.272,42	59.317,76	75,75
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								64.217,73	4.899,97	-	4.899,97	59.317,76	7,63
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.038,07	1.038,07		1.038,07	0,00	1,68	1.743,96	1.743,96	-	1.743,96	-	100,00
05.001.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), af_06/2016	m	1.081,06	0,00		0,00	1.081,06	54,87	59.317,76	-	-	-	59.317,76	-
05.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	337,83	337,83		337,83	0,00	1,12	378,37	378,37	-	378,37	-	100,00
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.013,49	1.013,49		1.013,49	0,00	1,29	1.307,40	1.307,40	-	1.307,40	-	100,00
05.001.005	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, af_11/2019	m2	1.081,06	1.081,06		1.081,06	0,00	1,36	1.470,24	1.470,24	-	1.470,24	-	100,00
05.002	PAVIMENTAÇÃO								168.974,78	168.974,78	-	168.974,78	-	100,00
05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	952,09	952,09		952,09	0,00	125,68	119.658,67	119.658,67	-	119.658,67	-	100,00
05.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), af_06/2016	m	286,59	286,59		286,59	0,00	54,87	15.725,19	15.725,19	-	15.725,19	-	100,00
05.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	286,59	286,59		286,59	0,00	4,39	1.258,13	1.258,13	-	1.258,13	-	100,00
05.002.004	Colchão de areia	m3	66,65	66,65		66,65	0,00	156,22	10.412,06	10.412,06	-	10.412,06	-	100,00
05.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	7.769,13	7.769,13		7.769,13	0,00	1,29	10.022,18	10.022,18	-	10.022,18	-	100,00
05.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	286,59	286,59		286,59	0,00	10,09	2.891,69	2.891,69	-	2.891,69	-	100,00
05.002.007	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m3	190,42	190,42		190,42	0,00	28,53	5.432,68	5.432,68	-	5.432,68	-	100,00
05.002.008	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	190,42	190,42		190,42	0,00	18,77	3.574,18	3.574,18	-	3.574,18	-	100,00
05.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								10.805,97	10.805,97	-	10.805,97	-	100,00


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO 10				CONTRATO Nº 032/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/07/2025 a 31/07/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 07/08/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
05.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	85,98	85,98		85,98	0,00	125,68	10.805,97	10.805,97	-	10.805,97	-	100,00
05.004	LIMPEZA GERAL								591,70	591,70	-	591,70	-	100,00
05.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.038,07	1.038,0700		1.038,07	0,00	0,57	591,70	591,70	-	591,70	-	100,00
06	RUA ALLAN KARDEC								129.727,16	129.727,16	-	129.727,16	-	100,00
06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.762,57	3.762,57	-	3.762,57	-	100,00
06.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	796,40	796,40		796,40	0,00	1,68	1.337,95	1.337,95	-	1.337,95	-	100,00
06.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	830,53	830,53		830,53	0,00	1,36	1.129,52	1.129,52	-	1.129,52	-	100,00
06.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	259,54	259,54		259,54	0,00	1,12	290,68	290,68	-	290,68	-	100,00
06.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	778,62	778,62		778,62	0,00	1,29	1.004,42	1.004,42	-	1.004,42	-	100,00
06.002	PAVIMENTAÇÃO								116.931,72	116.931,72	-	116.931,72	-	100,00
06.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	728,14	728,14		728,14	0,00	125,68	91.512,64	91.512,64	-	91.512,64	-	100,00
06.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	227,54	227,54		227,54	0,00	54,87	12.485,12	12.485,12	-	12.485,12	-	100,00
06.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	227,54	227,54		227,54	0,00	4,39	998,90	998,90	-	998,90	-	100,00
06.002.004	Colchão de areia	m3	50,97	50,97		50,97	0,00	156,22	7.962,53	7.962,53	-	7.962,53	-	100,00
06.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.299,73	1.299,73		1.299,73	0,00	1,29	1.676,65	1.676,65	-	1.676,65	-	100,00
06.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	227,54	227,54		227,54	0,00	10,09	2.295,88	2.295,88	-	2.295,88	-	100,00
06.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								8.578,92	8.578,92	-	8.578,92	-	100,00
06.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	68,26	68,26		68,26	0,00	125,68	8.578,92	8.578,92	-	8.578,92	-	100,00
06.004	LIMPEZA GERAL								453,95	453,95	-	453,95	-	100,00
06.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	796,40	796,4000		796,40	0,00	0,57	453,95	453,95	-	453,95	-	100,00
07	RUA ARGENTINA								262.828,20	262.828,20	-	262.828,20	-	100,00
07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								7.602,12	7.602,12	-	7.602,12	-	100,00
07.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.607,77	1.607,77		1.607,77	0,00	1,68	2.701,05	2.701,05	-	2.701,05	-	100,00
07.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.678,80	1.678,80		1.678,80	0,00	1,36	2.283,17	2.283,17	-	2.283,17	-	100,00
07.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	524,63	524,63		524,63	0,00	1,12	587,59	587,59	-	587,59	-	100,00
07.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.573,88	1.573,88		1.573,88	0,00	1,29	2.030,31	2.030,31	-	2.030,31	-	100,00
07.002	PAVIMENTAÇÃO								236.454,29	236.454,29	-	236.454,29	-	100,00
07.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.465,71	1.465,71		1.465,71	0,00	125,68	184.210,43	184.210,43	-	184.210,43	-	100,00

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO 10				CONTRATO Nº 032/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/07/2025 a 31/07/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 07/08/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
07.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	473,55	473,55		473,55	0,00	54,87	25.983,69	25.983,69	-	25.983,69	-	100,00
07.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	473,55	473,55		473,55	0,00	4,39	2.078,88	2.078,88	-	2.078,88	-	100,00
07.002.004	Colchão de areia	m3	102,60	102,60		102,60	0,00	156,22	16.028,17	16.028,17	-	16.028,17	-	100,00
07.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.616,28	2.616,28		2.616,28	0,00	1,29	3.375,00	3.375,00	-	3.375,00	-	100,00
07.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	473,55	473,55		473,55	0,00	10,09	4.778,12	4.778,12	-	4.778,12	-	100,00
07.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								17.855,36	17.855,36	-	17.855,36	-	100,00
07.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	142,07	142,07		142,07	0,00	125,68	17.855,36	17.855,36	-	17.855,36	-	100,00
07.004	LIMPEZA GERAL								916,43	916,43	-	916,43	-	100,00
07.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.607,77	1.607,77		1.607,77	0,00	0,57	916,43	916,43	-	916,43	-	100,00
08	TRAVESSA IVAN ANDRADE								299.488,70	299.488,70	-	299.488,70	-	100,00
08.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								8.201,23	8.201,23	-	8.201,23	-	100,00
08.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.737,75	1.737,75		1.737,75	0,00	1,68	2.919,42	2.919,42	-	2.919,42	-	100,00
08.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.809,23	1.809,23		1.809,23	0,00	1,36	2.460,55	2.460,55	-	2.460,55	-	100,00
08.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	565,38	565,38		565,38	0,00	1,12	633,23	633,23	-	633,23	-	100,00
08.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.696,15	1.696,15		1.696,15	0,00	1,29	2.188,03	2.188,03	-	2.188,03	-	100,00
08.002	PAVIMENTAÇÃO								272.330,99	272.330,99	-	272.330,99	-	100,00
08.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.594,80	1.594,80		1.594,80	0,00	125,68	200.434,46	200.434,46	-	200.434,46	-	100,00
08.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	476,50	476,50		476,50	0,00	54,87	26.145,56	26.145,56	-	26.145,56	-	100,00
08.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	476,50	476,50		476,50	0,00	4,39	2.091,84	2.091,84	-	2.091,84	-	100,00
08.002.004	Colchão de areia	m3	111,64	111,64		111,64	0,00	156,22	17.440,40	17.440,40	-	17.440,40	-	100,00
08.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	9.241,48	9.241,48		9.241,48	0,00	1,29	11.921,51	11.921,51	-	11.921,51	-	100,00
08.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	476,50	476,50		476,50	0,00	10,09	4.807,89	4.807,89	-	4.807,89	-	100,00
08.002.007	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m3	200,62	200,62		200,62	0,00	28,53	5.723,69	5.723,69	-	5.723,69	-	100,00
08.002.008	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	200,62	200,62		200,62	0,00	18,77	3.765,64	3.765,64	-	3.765,64	-	100,00
08.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								17.965,96	17.965,96	-	17.965,96	-	100,00
08.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	142,95	142,9500		142,95	0,00	125,68	17.965,96	17.965,96	-	17.965,96	-	100,00

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO 10				CONTRATO Nº 032/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/07/2025 a 31/07/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 07/08/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
08.004	LIMPEZA GERAL								990,52	990,52	-	990,52	-	100,00
08.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.737,75	1.737,7500		1.737,75	0,00	0,57	990,52	990,52	-	990,52	-	100,00
09	RUA EGILDO SANTOS								46.643,84	46.643,84	-	46.643,84	-	100,00
09.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.229,90	1.229,90	-	1.229,90	-	100,00
09.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	252,58	252,58		252,58	0,00	1,68	424,33	424,33	-	424,33	-	100,00
09.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	275,94	275,94		275,94	0,00	1,36	375,28	375,28	-	375,28	-	100,00
09.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	86,23	86,23		86,23	0,00	1,12	96,58	96,58	-	96,58	-	100,00
09.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	258,69	258,69		258,69	0,00	1,29	333,71	333,71	-	333,71	-	100,00
09.002	PAVIMENTAÇÃO								39.398,20	39.398,20	-	39.398,20	-	100,00
09.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	205,86	205,86		205,86	0,00	125,68	25.872,48	25.872,48	-	25.872,48	-	100,00
09.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	155,74	155,74		155,74	0,00	54,87	8.545,45	8.545,45	-	8.545,45	-	100,00
09.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	155,74	155,74		155,74	0,00	4,39	683,70	683,70	-	683,70	-	100,00
09.002.004	Colchão de areia	m3	14,41	14,41		14,41	0,00	156,22	2.251,13	2.251,13	-	2.251,13	-	100,00
09.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	367,46	367,46		367,46	0,00	1,29	474,02	474,02	-	474,02	-	100,00
09.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	155,74	155,74		155,74	0,00	10,09	1.571,42	1.571,42	-	1.571,42	-	100,00
09.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								5.871,77	5.871,77	-	5.871,77	-	100,00
09.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	46,72	46,72		46,72	0,00	125,68	5.871,77	5.871,77	-	5.871,77	-	100,00
09.004	LIMPEZA GERAL								143,97	143,97	-	143,97	-	100,00
09.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	252,58	252,5800		252,58	0,00	0,57	143,97	143,97	-	143,97	-	100,00
10	RUA PROJETADA								144.935,41	144.935,41	-	144.935,41	-	100,00
10.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.749,15	3.749,15	-	3.749,15	-	100,00
10.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	794,85	794,85		794,85	0,00	1,68	1.335,35	1.335,35	-	1.335,35	-	100,00
10.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	826,82	826,82		826,82	0,00	1,36	1.124,48	1.124,48	-	1.124,48	-	100,00
10.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	258,38	258,38		258,38	0,00	1,12	289,39	289,39	-	289,39	-	100,00
10.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	775,14	775,14		775,14	0,00	1,29	999,93	999,93	-	999,93	-	100,00
10.002	PAVIMENTAÇÃO								132.698,48	132.698,48	-	132.698,48	-	100,00
10.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	730,92	730,92		730,92	0,00	125,68	91.862,03	91.862,03	-	91.862,03	-	100,00


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO 10										CONTRATO Nº 032/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA		Período: 01/07/2025 a 31/07/2025												
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		Data de medição: 07/08/2025												
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
10.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), af_06/2016	m	213,10	213,10		213,10	0,00	54,87	11.692,80	11.692,80	-	11.692,80	-	100,00
10.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	213,10	213,10		213,10	0,00	4,39	935,51	935,51	-	935,51	-	100,00
10.002.004	Colchão de areia	m3	51,16	51,16		51,16	0,00	156,22	7.992,22	7.992,22	-	7.992,22	-	100,00
10.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5.964,18	5.964,18		5.964,18	0,00	1,29	7.693,79	7.693,79	-	7.693,79	-	100,00
10.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	213,10	213,10		213,10	0,00	10,09	2.150,18	2.150,18	-	2.150,18	-	100,00
10.002.007	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m3	219,28	219,28		219,28	0,00	28,53	6.256,06	6.256,06	-	6.256,06	-	100,00
10.002.008	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	219,28	219,28		219,28	0,00	18,77	4.115,89	4.115,89	-	4.115,89	-	100,00
10.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								8.034,72	8.034,72	-	8.034,72	-	100,00
10.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1.3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	63,93	63,93		63,93	0,00	125,68	8.034,72	8.034,72	-	8.034,72	-	100,00
10.004	LIMPEZA GERAL								453,06	453,06	-	453,06	-	100,00
10.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	794,85	794,8500		794,85	0,00	0,57	453,06	453,06	-	453,06	-	100,00
11	DRENAGEM PROFUNDA								1.538.484,60	1.445.968,09	-	1.445.968,09	92.516,51	93,99
11.001	LOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO E INTERLIGAÇÕES								693.594,15	693.594,15	-	693.594,15	-	100,00
11.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	2.910,10	2.910,10		2.910,10	0,00	13,04	37.947,70	37.947,70	-	37.947,70	-	100,00
11.001.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	1.163,35	1.163,35		1.163,35	0,00	19,59	22.790,03	22.790,03	-	22.790,03	-	100,00
11.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	3.637,63	3.637,63		3.637,63	0,00	1,12	4.074,14	4.074,14	-	4.074,14	-	100,00
11.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	10.912,86	10.912,86		10.912,86	0,00	1,29	14.077,59	14.077,59	-	14.077,59	-	100,00
11.001.005	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	1.454,19	1.454,19		1.454,19	0,00	3,33	4.842,45	4.842,45	-	4.842,45	-	100,00
11.001.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.362,57	4.362,57		4.362,57	0,00	1,29	5.627,72	5.627,72	-	5.627,72	-	100,00
11.001.007	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	2.461,38	2.461,38		2.461,38	0,00	154,81	381.046,24	381.046,24	-	381.046,24	-	100,00
11.001.008	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	62.765,19	62.765,19		62.765,19	0,00	1,29	80.967,10	80.967,10	-	80.967,10	-	100,00
11.001.009	Escoramento metálico p/ valas, h<=2,50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	m2	2.029,35	2.029,35		2.029,35	0,00	39,37	79.895,51	79.895,51	-	79.895,51	-	100,00
11.001.010	Locação de rede de drenagem	m	1.588,04	1.588,04		1.588,04	0,00	1,96	3.112,56	3.112,56	-	3.112,56	-	100,00
11.001.011	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	833,87	833,87		833,87	0,00	71,01	59.213,11	59.213,11	-	59.213,11	-	100,00
11.002	TUBOS CENTRAIS E INTERLIGAÇÕES								840.190,45	747.673,94	-	747.673,94	92.516,51	88,99
11.002.001	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	335,00	335,00		335,00	0,00	86,53	28.987,55	28.987,55	-	28.987,55	-	100,00

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO 10				CONTRATO Nº 032/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/07/2025 a 31/07/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 07/08/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
11.002.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	250,97	250,97		250,97	0,00	305,94	76.781,76	76.781,76	-	76.781,76	-	100,00
11.002.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	565,82	565,82		565,82	0,00	180,49	102.124,85	102.124,85	-	102.124,85	-	100,00
11.002.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	111,25	111,25		111,25	0,00	503,98	56.067,78	56.067,78	-	56.067,78	-	100,00
11.002.005	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,20 m	m	325,00	325,00		325,00	0,00	924,95	300.608,75	300.608,75	-	300.608,75	-	100,00
11.002.006	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,51 e 2,00m - R1	un	63,00	37,00		37,00	26,00	2.921,04	184.025,52	108.078,48	-	108.078,48	75.947,04	58,73
11.002.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,60m	un	9,00	5,00		5,00	4,00	2.337,92	21.041,28	11.689,60	-	11.689,60	9.351,68	55,56
11.002.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,80m	un	9,00	9,00		9,00	0,00	3.212,90	28.916,10	28.916,10	-	28.916,10	-	100,00
11.002.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,40 x 1,40 x 1,80m	un	7,00	7,00		7,00	0,00	4.917,01	34.419,07	34.419,07	-	34.419,07	-	100,00
11.002.010	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1,00 m	un	1,00	0,00		0,00	1,00	7.217,79	7.217,79	-	-	-	7.217,79	-
11.003	SINALIZAÇÕES								4.700,00	4.700,00	-	4.700,00	-	100,00
11.003.001	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fixação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	500,00	500,00		500,00	0,00	3,69	1.845,00	1.845,00	-	1.845,00	-	100,00
11.003.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	500,00	500,00		500,00	0,00	5,71	2.855,00	2.855,00	-	2.855,00	-	100,00
12	SERVIÇOS DIVERSOS								49.454,62	49.454,62	-	49.454,62	-	100,00
12.001	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	18,00	18,00		18,00	0,00	801,09	14.419,62	14.419,62	-	14.419,62	-	100,00
12.002	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	50,00	50,00		50,00	0,00	700,70	35.035,00	35.035,00	-	35.035,00	-	100,00
13	EQUIPE DIRIGENTE								123.127,40	110.181,20	2.468,14	112.649,34	10.478,06	91,49
13.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	220,00	196,87	4,41	201,28	18,72	134,71	29.636,20	26.520,37	594,07	27.114,44	2.521,76	91,49
13.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	880,00	787,47	17,64	805,11	74,89	70,53	62.066,40	55.540,26	1.244,15	56.784,41	5.281,99	91,49
13.003	Topógrafo com encargos complementares	h	880,00	787,47	17,64	805,11	74,89	23,72	20.873,60	18.678,78	418,42	19.097,20	1.776,40	91,49
13.004	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	880,00	787,47	17,64	805,11	74,89	11,99	10.551,20	9.441,79	211,50	9.653,29	897,91	91,49
14	ESGOTO								539.087,25	539.087,25	-	539.087,25	-	100,00
14.001	Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018	m	2.703,22	2.703,22		2.703,22	0,00	6,34	17.138,41	17.138,41	-	17.138,41	-	100,00
14.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	648,77	648,77		648,77	0,00	13,04	8.459,96	8.459,96	-	8.459,96	-	100,00
14.003	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	m	2.703,22	2.703,22		2.703,22	0,00	108,68	293.785,95	293.785,95	-	293.785,95	-	100,00
14.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	810,97	810,97		810,97	0,00	1,12	908,29	908,29	-	908,29	-	100,00
14.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.432,90	2.432,90		2.432,90	0,00	1,29	3.138,44	3.138,44	-	3.138,44	-	100,00
14.006	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	601,00	601,00		601,00	0,00	154,81	93.040,81	93.040,81	-	93.040,81	-	100,00
14.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	15.325,57	15.325,57		15.325,57	0,00	1,29	19.769,99	19.769,99	-	19.769,99	-	100,00

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO 10				CONTRATO Nº 032/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/07/2025 a 31/07/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 07/08/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
14.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	und	140,00	140,00		140,00	0,00	603,92	84.548,80	84.548,80	-	84.548,80	-	100,00
14.009	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m	und	140,00	140,00		140,00	0,00	130,69	18.296,60	18.296,60	-	18.296,60	-	100,00
15	RUA PROJETADA B								155.070,78	155.070,78	-	155.070,78	-	100,00
15.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.694,55	3.694,55	-	3.694,55	-	100,00
15.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	783,82	783,82		783,82	0,00	1,68	1.316,82	1.316,82	-	1.316,82	-	100,00
15.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	814,47	814,47		814,47	0,00	1,36	1.107,68	1.107,68	-	1.107,68	-	100,00
15.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	254,52	254,52		254,52	0,00	1,12	285,06	285,06	-	285,06	-	100,00
15.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	763,56	763,56		763,56	0,00	1,29	984,99	984,99	-	984,99	-	100,00
15.002	PAVIMENTAÇÃO								143.225,27	143.225,27	-	143.225,27	-	100,00
15.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	722,52	722,52		722,52	0,00	125,68	90.806,31	90.806,31	-	90.806,31	-	100,00
15.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	204,34	204,34		204,34	0,00	54,87	11.212,14	11.212,14	-	11.212,14	-	100,00
15.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	204,34	204,34		204,34	0,00	4,39	897,05	897,05	-	897,05	-	100,00
15.002.004	Colchão de areia	m3	50,58	50,58		50,58	0,00	156,22	7.901,61	7.901,61	-	7.901,61	-	100,00
15.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	10.410,12	10.410,12		10.410,12	0,00	1,29	13.429,05	13.429,05	-	13.429,05	-	100,00
15.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	204,34	204,34		204,34	0,00	10,09	2.061,79	2.061,79	-	2.061,79	-	100,00
15.002.007	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m3	357,66	357,66		357,66	0,00	28,53	10.204,04	10.204,04	-	10.204,04	-	100,00
15.002.008	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	357,66	357,66		357,66	0,00	18,77	6.713,28	6.713,28	-	6.713,28	-	100,00
15.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								7.704,18	7.704,18	-	7.704,18	-	100,00
15.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	61,30	61,30		61,30	0,00	125,68	7.704,18	7.704,18	-	7.704,18	-	100,00
15.004	LIMPEZA GERAL								446,78	446,78	-	446,78	-	100,00
15.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	783,82	783,82		783,82	0,00	0,57	446,78	446,78	-	446,78	-	100,00
TOTAL:									4.738.797,09	4.240.520,41	94.924,50	4.335.444,91	403.352,18	91,49
PERCENTUAL										89,49	2,00	91,49	8,51	

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590

Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.08.07 14:27:34 -03'00

Engº Civil José Almeida Andrade
CREA RN 2714133398

Atestamos que os serviços constantes na NF -
foram recebidos por nós em perfeita ordem.

Data: ___/___/___

Aprovado para pagamento

Data: ___/___/___


Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 10	CONTRATO Nº 032/2024
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					
				Data de medição: 07/08/2025	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO		
04	RUA ALVARO FONSECA DE OLIVEIRA				
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	585,00	> 58,50 m x 10,00 m = 585,00 m ²	
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	602,55	> 58,50 m x 10,30 m = 602,55 m ²	
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	188,30	> 602,55 m ² x 0,25 m x 1,25 = 188,30 m ³	
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m ³	tkm	564,90	> 188,30 m ³ x 1,50 t/m ³ x 2,00 km = 564,90 tkm	
04.002	PAVIMENTAÇÃO				
04.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	549,90	> 58,50 m x 9,40 m = 549,90 m ²	
04.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	117,00	> 58,50 m x 2 = 117,00 m	
04.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	117,00	> 117,00 m	
04.002.004	Colchão de areia	m3	40,95	> (549,90 m ² + 35,10 m ²) x 0,07 m = 40,95 m ³	
04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m ³	tkm	1.044,23	> 40,95 m ³ x 1,50 t/m ³ x 17,00 km = 1.044,23 tkm	
04.002.006	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	117,00	> 117,00 m	
04.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				
04.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	35,10	> 58,50 m x 2 x 0,3 m = 35,10 m ²	
04.004	LIMPEZA GERAL				
04.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	585,00	> 58,50 m x 10,00 m = 585,00 m ²	


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 10	CONTRATO Nº 032/2024
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					
				Data de medição: 07/08/2025	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO		
13	EQUIPE DIRIGENTE				
13.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	4,41	VALOR TOTAL ADM = (4.332.976,77 - 110.181,20) / (4.738.797,09 - 123.127,40) = 0,9149 x 220h = 201,28h > TOTAL - ACUM. ANTERIOR = 201,28h - 196,87h = 4,41h	
13.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	17,64	VALOR TOTAL ADM = (4.332.976,77 - 110.181,20) / (4.738.797,09 - 123.127,40) = 0,9149 x 880h = 805,11h > TOTAL - ACUM. ANTERIOR = 805,11h - 787,47h = 17,64h	
13.003	Topografo com encargos complementares	h	17,64	VALOR TOTAL ADM = (4.332.976,77 - 110.181,20) / (4.738.797,09 - 123.127,40) = 0,9149 x 880h = 805,11h > TOTAL - ACUM. ANTERIOR = 805,11h - 787,47h = 17,64h	
13.004	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	17,64	VALOR TOTAL ADM = (4.332.976,77 - 110.181,20) / (4.738.797,09 - 123.127,40) = 0,9149 x 880h = 805,11h > TOTAL - ACUM. ANTERIOR = 805,11h - 787,47h = 17,64h	
JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590		Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Dados: 2025.08.07 14:28:06 -03'00'		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/_____	
Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398					


Diego Almeida Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 10

CONTRATO 032/2024

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 11/03/2024



PLACA DA OBRA



RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA



RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO, MEIO-FIO EM CONCRETO



RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO: MEIO-FIO EM CONCRETO



RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO: MEIO-FIO EM CONCRETO



RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO: MEIO-FIO EM CONCRETO

ELABORADO POR:

FOLHA 1


Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 10

CONTRATO 032/2024

ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 11/03/2024



RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA -
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO, MEIO-FIO EM

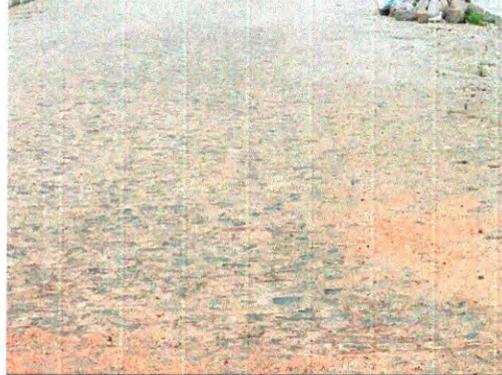

RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA - PAVIMENTAÇÃO
A PARALELEPÍPEDO, MEIO-FIO EM CONCRETO



RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA - PAVIMENTAÇÃO
A PARALELEPÍPEDO, MEIO-FIO EM CONCRETO




JOSE ALMEIDA
ANDRADE:0089
2714590

Assinado de forma digital
por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.08.07 14:30:03
-03'00'

ELABORADO POR:

FOLHA 2


Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
