

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 0194/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B. M. ADITIVO Nº. 01/2026					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP					
								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025					
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 05/06/2026 A 22/06/2026					DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a %
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							609,18	-	609,18	609,18	-	100,00
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2				-	353,13	-	-	-	-	-	#DIV/0!
01.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês				-	778,30	-	-	-	-	-	#DIV/0!
01.003	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN				-	685,44	-	-	-	-	-	#DIV/0!
01.004	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un				-	1.963,09	-	-	-	-	-	#DIV/0!
01.005	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m				-	178,05	-	-	-	-	-	#DIV/0!
01.006	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2				-	7,07	-	-	-	-	-	#DIV/0!
01.007	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2				-	2,12	-	-	-	-	-	#DIV/0!
01.008	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	61,04		61,04	61,04	9,98	609,18	-	609,18	609,18	-	100,00
02	QUADRA POLIESPORTIVA					-		124.992,06	-	124.992,06	124.992,06	-	100,00
02.001	QUADRA					-		30.533,48	-	30.533,48	30.533,48	-	100,00
02.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	50,50		50,50	50,50	11,22	566,61	-	566,61	566,61	-	100,00
02.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3				-	1,09	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm				-	1,47	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.001.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	50,40		50,40	50,40	522,17	26.317,37	-	26.317,37	26.317,37	-	100,00
02.001.005	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2				-	5,70	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.001.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2				-	45,54	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.001.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2				-	55,01	-	-	-	-	-	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 0194/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B. M. ADITIVO Nº. 01/2026					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP					
								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025					
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 05/06/2026 A 22/06/2026					DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a %
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
02.001.008	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	61,46		61,46	61,46	14,36	882,57	-	882,57	882,57	-	100,00
02.001.009	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	61,46		61,46	61,46	22,97	1.411,74	-	1.411,74	1.411,74	-	100,00
02.001.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	921,90		921,90	921,90	1,47	1.355,19	-	1.355,19	1.355,19	-	100,00
02.001.011	Lona plástica preta	m2				-	6,82	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.001.012	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2				-	21,42	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.001.013	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2				-	36,37	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.001.014	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2				-	39,24	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.001.015	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2				-	33,73	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.001.016	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m				-	11,33	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.002	MURETA E ALAMBRADO					-		49.319,45	-	49.319,45	49.319,45	-	100,00
02.002.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2				-	59,65	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.002.002	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg				-	12,26	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.002.003	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos	m2				-	91,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.002.004	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3				-	605,77	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.002.005	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2				-	5,70	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.002.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2				-	45,54	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.002.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2				-	55,01	-	-	-	-	-	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 0194/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B. M. ADITIVO Nº. 01/2026					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP					
								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025					
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 05/06/2026 A 22/06/2026					DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a % Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
02.002.008	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	157,84		157,84	157,84	281,97	44.506,14	-	44.506,14	44.506,14	-	100,00
02.002.009	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²				-	18,65	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.002.010	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2				-	801,47	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.002.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	137,85		137,85	137,85	25,61	3.530,34	-	3.530,34	3.530,34	-	100,00
02.002.012	Fornecimento de cabo de aço 9,5mm, média resistência	kg				-	13,59	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.002.013	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	138,85		138,85	138,85	9,24	1.282,97	-	1.282,97	1.282,97	-	100,00
02.003	ARQUIBANCADAS					-		9.369,52	-	9.369,52	9.369,52	-	100,00
02.003.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	20,85		20,85	20,85	11,22	233,94	-	233,94	233,94	-	100,00
02.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3				-	1,09	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm				-	1,47	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.003.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3				-	522,17	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.003.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3				-	2.581,10	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.003.006	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	21,78		21,78	21,78	71,05	1.547,47	-	1.547,47	1.547,47	-	100,00
02.003.007	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1,52		1,52	1,52	595,15	904,63	-	904,63	904,63	-	100,00
02.003.008	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	51,87		51,87	51,87	5,70	295,66	-	295,66	295,66	-	100,00
02.003.009	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	51,87		51,87	51,87	45,54	2.362,16	-	2.362,16	2.362,16	-	100,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 0194/2025							
			B. M. ADITIVO Nº. 01/2026				CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA													ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 05/06/2026 A 22/06/2026				DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a %	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
02.003.010	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	51,87		51,87	51,87	55,01	2.853,37	-	2.853,37	2.853,37	-		100,00
02.003.011	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	2,25		2,25	2,25	186,94	420,62	-	420,62	420,62	-		100,00
02.003.012	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	511,34		511,34	511,34	1,47	751,67	-	751,67	751,67	-		100,00
02.004	DRENAGEM					-		-	-	-	-	-		#DIV/0!
02.004.001	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	un				-	18,48	-	-	-	-	-		#DIV/0!
02.004.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	m				-	42,18	-	-	-	-	-		#DIV/0!
02.004.003	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un				-	79,51	-	-	-	-	-		#DIV/0!
02.004.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un				-	429,28	-	-	-	-	-		#DIV/0!
02.005	DIVERSOS					-		-	-	-	-	-		#DIV/0!
02.005.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par				-	3.949,04	-	-	-	-	-		#DIV/0!
02.006	ÁREA EXTERNA					-		20.756,23	-	20.756,23	20.756,23	-		100,00
02.006.001	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2				-	111,91	-	-	-	-	-		#DIV/0!
02.006.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	140,26		140,26	140,26	53,83	7.550,20	-	7.550,20	7.550,20	-		100,00
02.006.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2				-	23,02	-	-	-	-	-		#DIV/0!
02.006.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,22		6,22	6,22	52,97	329,47	-	329,47	329,47	-		100,00
02.006.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	124,31		124,31	124,31	42,31	5.259,56	-	5.259,56	5.259,56	-		100,00
02.006.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	124,31		124,31	124,31	4,16	517,13	-	517,13	517,13	-		100,00
02.006.007	Colchão de areia	m3	26,60		26,60	26,60	130,52	3.471,83	-	3.471,83	3.471,83	-		100,00
02.006.008	Lona plástica preta	m2	531,97		531,97	531,97	6,82	3.628,04	-	3.628,04	3.628,04	-		100,00
02.007	ACESSIBILIDADE					-		15.013,38	-	15.013,38	15.013,38	-		100,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 0194/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B. M. ADITIVO Nº. 01/2026					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP					
								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025					
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 05/06/2026 A 22/06/2026					DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a % Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
02.007.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	45,55		45,55	45,55	244,40	11.132,42	-	11.132,42	11.132,42	-	100,00
02.007.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un				-	464,77	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.007.003	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2				-	155,67	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.007.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	70,55		70,55	70,55	55,01	3.880,96	-	3.880,96	3.880,96	-	100,00
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-		214,79	-	214,79	214,79	-	100,00
03.001	PADRÃO DE ENTRADA					-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
03.001.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un				-	571,48	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03.001.002	Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un				-	69,38	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03.001.003	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un				-	19,93	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03.001.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un				-	151,35	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03.001.005	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un				-	21,36	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03.001.006	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm2	m				-	8,97	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03.001.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m				-	20,53	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03.001.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un				-	5,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03.001.009	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m				-	17,65	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03.001.010	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un				-	513,28	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03.001.011	Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un				-	69,38	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03.001.012	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un				-	58,08	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03.001.013	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un				-	12,79	-	-	-	-	-	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 0194/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B. M. ADITIVO Nº. 01/2026					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP						
								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025						
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 05/06/2026 A 22/06/2026					DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a %	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
03.001.014	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	un				-	44,62	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.001.015	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un				-	9,20	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.001.016	Contator 32 A, bobina de 24 a 220VAC, com contato NA-NF, para fixação em trilho.	un				-	266,80	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002	LUMINÁRIAS, REFLETORES, POSTES E CAIXAS DE PASSAGEM					-		214,79	-	214,79	214,79	-	100,00	
03.002.001	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un				-	1.348,04	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002.002	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un				-	91,53	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002.003	Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento e assentamento	un				-	2.104,11	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002.004	Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento	Un				-	345,91	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002.005	Caixa de passagem para eletricidade em alumínio, dim: 50 x 50 x 15 cm	un				-	142,48	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002.006	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un				-	231,95	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002.007	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un				-	151,35	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002.008	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	un				-	2.528,04	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002.009	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m				-	11,00	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002.010	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m				-	20,53	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un				-	5,00	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002.012	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m				-	17,94	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un				-	3,89	-	-	-	-	-		#DIV/0!
03.002.014	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	1,00		1,00	1,00	214,79	214,79	-	214,79	214,79	-	100,00	
04	SERVIÇOS FINAIS					-		-	-	-	-	-		#DIV/0!
04.001	Marco Inaugural - Rev. 01 - Padrão PMI	un				-	820,99	-	-	-	-	-		#DIV/0!
04.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un				-	2.009,40	-	-	-	-	-		#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 0194/2025						
			B. M. ADITIVO Nº. 01/2026				CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA													ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 05/06/2026 A 22/06/2026				DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a %
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
04.003	Limpeza geral	m2				-	2,47	-	-	-	-	-	#DIV/0!
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-		6.668,94	-	6.668,94	6.668,94	-	100,00
05.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	23,70		23,70	23,70	147,07	3.485,56	-	3.485,56	3.485,56	-	100,00
05.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	47,40		47,40	47,40	67,16	3.183,38	-	3.183,38	3.183,38	-	100,00
Total geral								132.484,97	0,00	132.484,97	132.484,97	0,00	100,00
JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Dados: 2026.06.22 11:34:26 -03'00' Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__					

Documento assinado digitalmente
gov.br JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 30/06/2026 10:35:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS DOS SANTOS RODRIGUES
Data: 30/06/2026 11:16:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER				MEMÓRIA DE CÁLCULO		CONTRATO Nº 0194/2025			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B. M. ADITIVO Nº. 01/2026		CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP			
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				PERÍODO: 05/06/2026 A 22/06/2026		ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025			
						DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.008	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	61,04	61,04M					
02	QUADRA POLIESPORTIVA								
02.001	QUADRA								
02.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	50,50		C(M)	L(M)	H(M)	TOTAL(M3)	
				A	17,2	1,1	0,5	9,46	
					15,1	0,7	0,5	5,29	
				B	9,4	1,5	0,5	7,05	
					6	1,1	0,5	3,30	
					4,92	0,7	0,5	1,72	
				C	20,32	1,5	0,5	15,24	
				D	32,3	1,5	0,5	24,23	
							TOTAL	66,28	
							MEDIDO	15,78	
							MEDIR	50,50	
				02.001.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	50,40		C(M)
A	17,2	0,8	0,5					6,88	
	15,1	0,4	0,5					3,02	
	32,3	0,4	0,5					6,46	
B	9,4	1,2	0,5					5,64	
	6	0,8	0,5					2,40	
	4,92	0,4	0,5					0,98	
C	20,32	1,2	0,5					12,19	
	20,32	0,8	0,6					9,75	
	20,32	0,4	0,55					4,47	
D	32,3	1,2	0,5					19,38	
	32,3	0,8	0,5					12,92	
	25,2	0,4	0,4					4,03	
			TOTAL					88,13	
02.001.008	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	61,46	ÁREA	H(M)	TOTAL(M3)			
				614,25	1,05	644,96			
						MEDIDO	583,50		
						MEDIR	61,46		
02.001.009	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	61,46	ÁREA	H(M)	TOTAL(M3)			
				614,25	1,05	644,96			
						MEDIDO	583,50		
						MEDIR	61,46		
02.001.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	921,90	VOLUME	DEN	KM	TKM		
				61,46	1,5	10	921,9		
02.002	MURETA E ALAMBRADO								
02.002.008	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	157,84	C(M)	H(M)	QUANT	TOTAL(M2)		
				20,3	5,5	2	223,3		
				32,3	5,5	2	355,3		
						TOTAL	578,6		
						MEDIDO	420,76		
						MEDIR	157,84		

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER				MEMÓRIA DE CÁLCULO				CONTRATO Nº 0194/2025		
				B. M. ADITIVO Nº. 01/2026				CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				PERÍODO: 05/06/2026 A 22/06/2026				DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO						
02.002.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	137,85	2 x p i x r			r			
				2,00	2,54	0,05	0,03			
					PI	R	PERIMETRO			
				2	3,14	0,03	0,19			
				ERIMETR	H(M)	UANT TUBO	TOTAL(M2)			
				0,19	5,50	54,00	56,43	ALAMBRADO		
				0,19	20,3	8	30,86			
				0,19	32,3	8	49,10			
				0,19	2,1	4	1,60	PORTÕES		
				0,19	1,15	4	0,87			
						TOTAL(M2)	138,85			
						MEDIDO	1,00			
						MEDIR	137,85			
02.002.013	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	138,85	2 x p i x r			r			
				2,00	2,54	0,05	0,03			
					PI	R	PERIMETRO			
				2	3,14	0,03	0,19			
				ERIMETR	H(M)	UANT TUBO	TOTAL(M2)			
				0,19	5,50	54,00	56,43	ALAMBRADO		
				0,19	20,3	8	30,86			
				0,19	32,3	8	49,10			
				0,19	2,1	4	1,60	PORTÕES		
				0,19	1,15	4	0,87			
						TOTAL(M2)	138,85			
				02.003	ARQUIBANCADAS					
02.003.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	20,85	C(M)	L(M)	H(M)	TOTAL(M3)			
				11,6	1,8	0,5	10,44			
				11,8	1,8	0,5	10,62			
				7,51	1,8	0,5	6,76			
				7,51	1,8	0,5	6,76			
						TOTAL(M3)	34,58			
						MEDIDO	13,73			
						MEDIR	20,85			
02.003.006	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	21,78	C(M)	H(M)	QUANT	TOTAL(M2)			
				11,60	1,20	1	13,92			
				11,60	0,40	2	9,28			
				11,80	1,20	1	14,16			
				11,80	0,40	2	9,44			
				0,50	0,40	4	0,8			
				0,50	0,80	4	1,6			
				0,40	1,20	4	1,92			
				7,51	1,20	2	18,02			
				6,30	0,40	4	10,08			
				0,80	0,40	4	1,28			
				0,45	0,80	4	1,44			
						TOTAL(M2)	81,94			
						MEDIDO	60,16			
						MEDIR	21,78			

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER				MEMÓRIA DE CÁLCULO				CONTRATO Nº 0194/2025		
				B. M. ADITIVO Nº. 01/2026				CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				PERÍODO: 05/06/2026 A 22/06/2026				DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO						
02.003.007	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1,52	C(M)	L(M)	H(M)	QUANT	TOTAL(M3)		
				11,60	0,07	1,20	1,00	0,97	FUNDO	
				11,80	0,07	1,20	1,00	0,99	FUNDO	
				7,51	0,07	1,20	2,00	1,26	FUNDO	
							TOTAL(M3)	3,23		
							MEDIDO	1,71		
							MEDIR	1,52		
02.003.008	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	51,87	C(M)	H(M)	QUANT	TOTAL(M2)			
				11,60	1,60	1	18,56			
				11,60	0,40	4	18,56			
				11,80	1,60	1	18,88			
				11,80	0,40	4	18,88			
				0,60	0,40	4	0,96			
				0,50	0,80	4	1,60			
				0,50	1,20	4	2,40			
				0,10	0,40	4	0,16			
				7,51	1,20	2	18,02			
				7,51	0,40	4	12,02			
				6,35	0,40	2	5,08			
				0,80	0,40	4	1,28			
				0,60	0,80	4	1,92			
				0,10	0,40	4	0,16			
						TOTAL(M2)	118,48			
						MEDIDO	66,61			
						MEDIR	51,87			
				02.003.009	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	51,87	C(M)	H(M)	QUANT
11,60	1,60	1	18,56							
11,60	0,40	4	18,56							
11,80	1,60	1	18,88							
11,80	0,40	4	18,88							
0,60	0,40	4	0,96							
0,50	0,80	4	1,60							
0,50	1,20	4	2,40							
0,10	0,40	4	0,16							
7,51	1,20	2	18,02							
7,51	0,40	4	12,02							
6,35	0,40	2	5,08							
0,80	0,40	4	1,28							
0,60	0,80	4	1,92							
0,10	0,40	4	0,16							
		TOTAL(M2)	118,48							
		MEDIDO	66,61							
		MEDIR	51,87							

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER				MEMÓRIA DE CÁLCULO				CONTRATO Nº 0194/2025						
				B. M. ADITIVO Nº. 01/2026				CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025						
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				PERÍODO: 05/06/2026 A 22/06/2026				DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO										
02.003.010	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	51,87	C(M)	H(M)	QUANT	TOTAL(M2)							
				11,60	1,60	1	18,56							
				11,60	0,40	4	18,56							
				11,80	1,60	1	18,88							
				11,80	0,40	4	18,88							
				0,60	0,40	4	0,96							
				0,50	0,80	4	1,60							
				0,50	1,20	4	2,40							
				0,10	0,40	4	0,16							
				7,51	1,20	2	18,02							
				7,51	0,40	4	12,02							
				6,35	0,40	2	5,08							
				0,80	0,40	4	1,28							
				0,60	0,80	4	1,92							
				0,10	0,40	4	0,16							
							TOTAL(M2)	118,48						
							MEDIDO	66,61						
							MEDIR	51,87						
02.003.011	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	2,25	C(M)	L(M)	H(M)	QUANT	TOTAL(M3)						
				11,60	0,6	0,40	1,00	2,784						
				11,60	0,5	0,40	1,00	2,32						
				11,60	0,4	0,40	1,00	1,856						
				11,80	0,6	0,40	1,00	2,832						
				11,80	0,5	0,40	1,00	2,36						
				11,80	0,4	0,40	1,00	1,888						
				7,51	0,40	0,80	2,00	4,81						
				6,35	0,80	0,40	2,00	4,06						
							TOTAL(M3)	22,91						
							MEDIDO	20,66						
							MEDIR	2,25						
				02.003.012	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	511,34	TKM	% DE AUMENTO	TOTAL TKM				
								309,9	0,65	511,34				
02.006	ÁREA EXTERNA													
02.006.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	140,26	ÁREA	423,44	1	423,44							
				18,1	1,65	29,87								
				28,39	2,3	65,30								
				26,73	0,5	13,37								
							TOTAL(M2)	531,97						
							MEDIDO	391,71						
02.006.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,22	C(M)	L(M)	H(M)	TOTAL(M3)							
				124,31	0,25	0,20	6,22							
02.006.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	124,31	EXTERN O	105,29									
				ARQUIB	19,02									
				TOTAL(M)	124,31									
02.006.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	124,31	124,31M										
02.006.007	Colchão de areia	m3	26,60	AREA	H(M)	TOTAL(M3)								
				531,97	0,05	26,60								

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER				MEMÓRIA DE CÁLCULO		CONTRATO Nº 0194/2026		
				B. M. ADITIVO Nº. 01/2026		CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				PERÍODO: 05/06/2026 A 22/06/2026		ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025		DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				MEMÓRIA DE CÁLCULO				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO					
02.006.008	Lona plástica preta	m2	531,97	ÁREA	423,44	1	423,44	
					18,1	1,65	29,87	
					28,39	2,3	65,30	
					26,73	0,5	13,37	
						TOTAL(M2)	531,97	
02.007	ACESSIBILIDADE			C(M)	H(M)	TOTAL(M2)		
02.007.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	45,55					
					41,5	1,7	70,55	
						MEDIDO	25	
						MEDIR	45,55	
02.007.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	70,55	C(M)	H(M)	TOTAL(M2)		
					41,5	1,7	70,55	
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
03.002	LUMINÁRIAS, REFLETORES, POSTES E CAIXAS DE PASSAGEM							
03.002.014	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	1,00	1,0UN				
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
05.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	23,70	23,7h				
05.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	47,40	47,4h				
JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398		Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Dados: 2026.06.22 11:35:00 -03'00'		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__		Aprovado para pagamento Data: __/__/__		

Documento assinado digitalmente
 JHON LENNON GOMES SANTOS
 Data: 30/06/2026 10:35:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 MATHEUS DOS SANTOS RODRIGUES
 Data: 30/06/2026 11:17:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
B. M. ADITIVO Nº. 01/2026

CONTRATO Nº 194/2025

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 13/10/2025

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 -
942897/2023/MESP



REMOÇÃO DE MEIO-FIO.



ESCAVAÇÃO E ALVENARIA DE PEDRA CONTENÇÃO
QUADRA.




ESCAVAÇÃO E ALVENARIA DE PEDRA CONTENÇÃO
QUADRA.



ESCAVAÇÃO E ALVENARIA DE PEDRA CONTENÇÃO
QUADRA.



ESCAVAÇÃO E ALVENARIA DE PEDRA CONTENÇÃO
QUADRA.

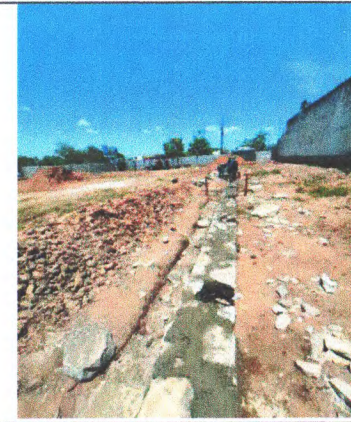

ESCAVAÇÃO E ALVENARIA DE PEDRA CONTENÇÃO
QUADRA.

ELABORADO POR:

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892
714590

Assinado de forma digital por
JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.06.22 11:35:30
-03'00'

FOLHA 1 de 4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
B. M. ADITIVO Nº. 01/2026

CONTRATO Nº 194/2025

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 -
942897/2023/MESP

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 13/10/2025

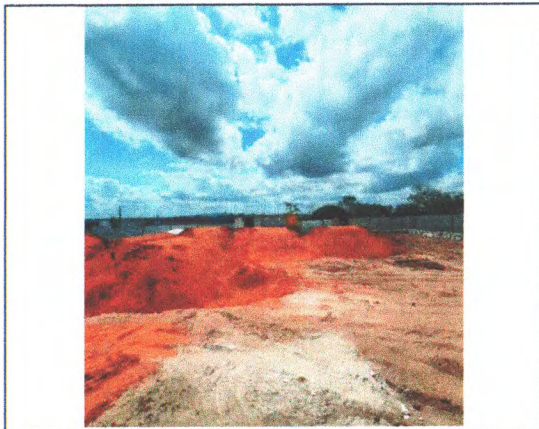

ATERRO.




ATERRO.



EXECUÇÃO DE PISO EM QUADRA; ALAMBRADO.



PINTURA METÁLICA EM ALAMBRADO, GALVIT E
ESMALTE.

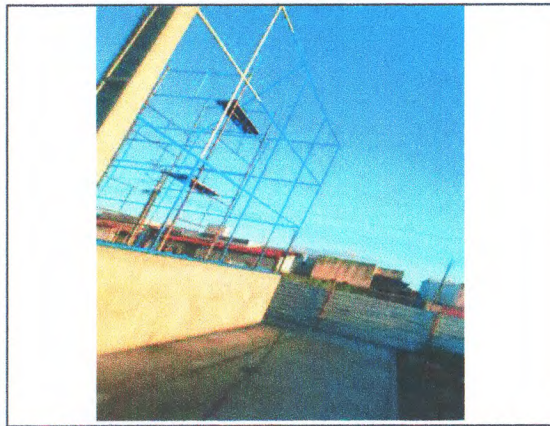

PINTURA METÁLICA EM ALAMBRADO, GALVIT E
ESMALTE.



ESCAVAÇÃO E ALVENARIA DE PEDRA ARQUIBANCADA.

ELABORADO POR:

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008927
14590

Assinado de forma digital por
JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.06.22 11:35:47
-03'00'

FOLHA 2 de 4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
B. M. ADITIVO Nº. 01/2026

CONTRATO Nº 194/2025

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 13/10/2025

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 -
942897/2023/MESP



EXECUÇÃO DE MURO.



ALVENARIA DE BLOCO E ENCHIMENTO COM
CONCRETO EM ARQUIBANCADA.




EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA.



EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA.



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO.

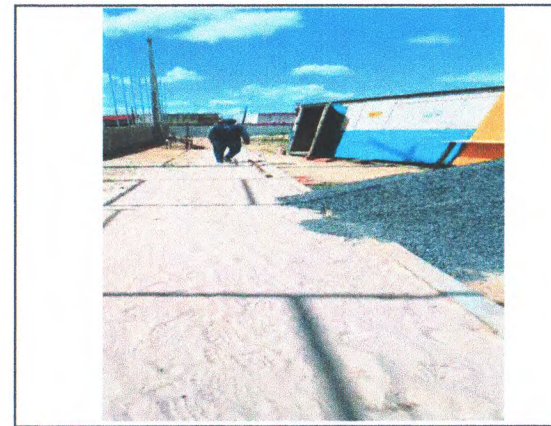

COLCHÃO DE AREIA PARA EXECUÇÃO DE PISO EM
CONCRETO DESEMPOLADO.

ELABORADO POR:

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:0089
2714590

Assinado de forma digital
por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.06.22 11:36:00
-03'00'

FOLHA 3 de 4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
B. M. ADITIVO Nº. 01/2026

CONTRATO Nº 194/2025

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 -
942897/2023/MESP

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 13/10/2025




PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO E
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO.



PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO E
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO.



PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO E
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO.

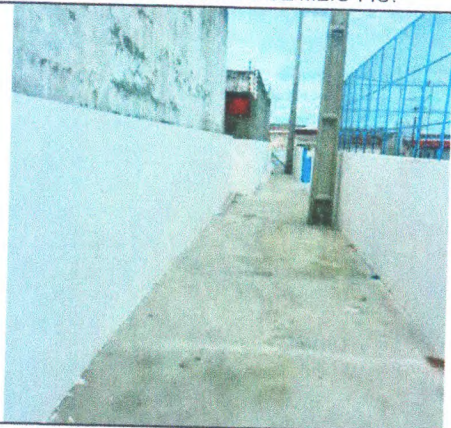

SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL.



SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL.



SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL.

ELABORADO POR:

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:0089
2714590

Assinado de forma digital
por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.06.22 11:36:14
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 30/06/2026 10:35:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
MATHEUS DOS SANTOS RODRIGUES
Data: 30/06/2026 11:17:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
