

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 284/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº. 01/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025						
			PERÍODO: 05/09/2025 a 30/09/2025				DATA: 10/10/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00		6,00	6,00	355,94	18.139,60	0,00	18.139,60	18.139,60	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	174,67		174,67	174,67	27,47	2.135,64	0,00	2.135,64	2.135,64	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	2.427,95		2.427,95	2.427,95	4,57	4.798,18	0,00	4.798,18	4.798,18	0,00	100,00
1.004	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	3,00		3,00	3,00	36,68	11.095,73	0,00	11.095,73	11.095,73	0,00	100,00
2 MOVIMENTAÇÕES DE SOLO													
2.005	Colchão de areia	m3	17,73		17,73	17,73	130,41	2.312,17	0,00	2.312,17	2.312,17	0,00	100,00
3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
3.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	290,81		83,10	83,10	10,16	2.312,17	0,00	2.312,17	2.312,17	0,00	100,00
3.012	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	51,40		51,40	51,40	13,33	6.724,55	0,00	4.614,22	4.614,22	2.110,33	68,62
								2.954,63	0,00	844,30	844,30	2.110,33	28,58
3.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	100,00		100,00	100,00	26,47	685,16	0,00	685,16	685,16	0,00	100,00
3.015	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	8,00		8,00	8,00	54,72	2.647,00	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00	100,00
4 PAVIMENTAÇÃO													
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af. 01/2024	m	174,67		0,00	0,00	44,38	37.932,55	0,00	30.180,70	30.180,70	7.751,85	79,56
4.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	170,00		170,00	170,00	120,08						
4.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	51,40		51,40	51,40	111,50	20.413,60	0,00	20.413,60	20.413,60	0,00	100,00
4.007	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	100,00		100,00	100,00	40,36	5.731,10	0,00	5.731,10	5.731,10	0,00	100,00
5 ACESSIBILIDADE													
5.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	8,00		0,00	0,00	11,73	93,84	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
6 REVISÕES, ELEVACOES E ESTRUTURAS													
6.005	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,00		0,00	0,00	6,66	41,09	0,00	0,00	0,00	41,09	0,00
6.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,00		0,00	0,00	34,43	93,84	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
7.007	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00		0,00	0,00	134,30	2.982,46	0,00	0,00	0,00	2.982,46	0,00
7.030	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	2,00		0,00	0,00	1.222,63	537,20	0,00	0,00	0,00	537,20	0,00
8 PINTURA													
8.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	680,82		0,00	0,00	20,22	28.868,08	0,00	0,00	0,00	28.868,08	0,00
8.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	581,62		0,00	0,00	4,74	13.766,18	0,00	0,00	0,00	13.766,18	0,00
8.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af. 01/2020	m2	7,00		0,00	0,00	28,46	2.756,88	0,00	0,00	0,00	2.756,88	0,00
8.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	263,01		0,00	0,00	46,18	199,22	0,00	0,00	0,00	199,22	0,00
9 EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
9.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	7,00		0,00	0,00	333,63	12.145,80	0,00	0,00	0,00	12.145,80	0,00
								35.936,75	0,00	0,00	0,00	35.936,75	0,00
								2.335,41	0,00	0,00	0,00	2.335,41	0,00

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715018424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

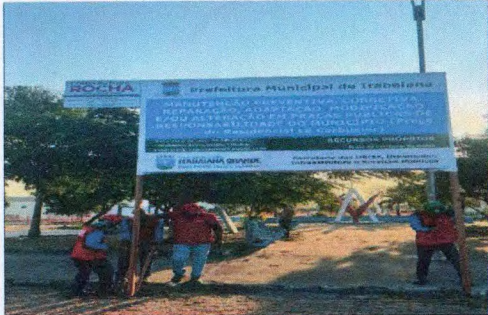
Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.ª Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9


OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 284/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
				B.M.Nº. 01/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025					
				PERÍODO: 05/09/2025 a 30/09/2025				DATA: 10/10/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
9.005	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	1,00		0,00	0,00	12.822,76	12.822,76	0,00	0,00	0,00	12.822,76	0,00
9.006	madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo	un	1,00		0,00	0,00	3.706,09	3.706,09	0,00	0,00	0,00	3.706,09	0,00
9.010	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00		0,00	0,00	3.859,06	3.859,06	0,00	0,00	0,00	3.859,06	0,00
9.011	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	2.883,47	2.883,47	0,00	0,00	0,00	2.883,47	0,00
9.013	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00		0,00	0,00	4.177,74	8.355,48	0,00	0,00	0,00	8.355,48	0,00
9.014	Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	1.974,48	1.974,48	0,00	0,00	0,00	1.974,48	0,00
11 PAISAGISMO								12.701,75	0,00	0,00	0,00	12.701,75	0,00
11.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	392,43		0,00	0,00	25,37	9.955,95	0,00	0,00	0,00	9.955,95	0,00
11.007	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	50,00		0,00	0,00	37,38	1.869,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00
11.008	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	10,00		0,00	0,00	87,68	876,80	0,00	0,00	0,00	876,80	0,00
13 DIVERSOS								8.683,07	0,00	239,87	239,87	8.443,20	2,76
13.001	Limpeza geral	m2	2.427,95		0,00	0,00	2,42	5.875,64	0,00	0,00	0,00	5.875,64	0,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	22,19		22,19	22,19	10,81	239,87	0,00	239,87	239,87	0,00	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	t/km	399,42		0,00	0,00	1,20	479,30	0,00	0,00	0,00	479,30	0,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								6.602,61	0,00	3.301,31	3.301,31	3.301,31	50,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	21,00		10,50	10,50	154,93	3.253,53	0,00	1.626,77	1.626,77	1.626,77	50,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	42,00		21,00	21,00	79,74	3.349,08	0,00	1.674,54	1.674,54	1.674,54	50,00
TOTAL GERAL								161.018,52	0,00	58.787,87	58.787,87	102.230,65	36,51
CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL							Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__			Aprovado para pagamento Data: __/__/__			


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana







 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 284/2025/PMI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 10/10/2025
		
PLACA DE OBRA	TAPUME	LIMPEZA
		
DESTOCAMENTO DE ÁRVORE	COLCHÃO DE AREIA	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO
ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9		FISCALIZAÇÃO:  Shailissa Bezerra de Macedo Eng.(a) Civil CREA 2722159830 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana
		Observações:



 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 284/2025/PMI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 10/10/2025
		
DEMOLIÇÃO DE LAJOTA HEXAGONAL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA
		
PISO INTERTRAVADO	PISO EXAGONAL SEXTAVADO	PISO CIMENTADO
ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439654-9		FISCALIZAÇÃO:  Sheissica Bezerra de Macedo Eng.ª Civil - CREA 2722159830 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana
Observações:		


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 284/2025/PMI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		DATA: 10/10/2024
 CARGA 	 	 

ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9	FISCALIZAÇÃO:  Sheissica Bezerra de Macedo Eng.ª Civil CREA 2722159830 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	Observações:
--	--	--------------



Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
