

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA SIZINHO)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº: 01

PERÍODO: 15/04/2026 a 31/05/2026

CONTRATO Nº 124/2026/PMI

ORDEM DE SERVIÇO: 15/04/2026

DATA: 01/06/2026




CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	0,00	6,00	6,00	355,94	5.887,48	0,00	5.887,48	5.887,48	0,00	100,00
								2.135,64	0,00	2.135,64	2.135,64	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	88,65	0,00	88,65	88,65	27,47	2.435,22	0,00	2.435,22	2.435,22	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	288,10	0,00	288,10	288,10	4,57	1.316,62	0,00	1.316,62	1.316,62	0,00	100,00
2 MOVIMENTAÇÕES DE SOLO													
2.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	14,00	0,00	14,00	14,00	96,90	1.356,60	0,00	1.356,60	1.356,60	0,00	100,00
2.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	16,80	0,00	16,80	16,80	10,81	181,61	0,00	181,61	181,61	0,00	100,00
2.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	252,00	0,00	252,00	252,00	1,20	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	100,00
3 PAVIMENTAÇÃO													
3.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	151,31	0,00	151,31	151,31	44,38	6.715,14	0,00	6.715,14	6.715,14	0,00	100,00
3.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	11,20	0,00	11,20	11,20	774,92	8.679,10	0,00	8.679,10	8.679,10	0,00	100,00
03.003	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	74,20	0,00	74,20	74,20	120,08	8.909,94	0,00	8.909,94	8.909,94	0,00	100,00
03.004	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	13,30	0,00	13,30	13,30	54,60	726,04	0,00	726,04	726,04	0,00	100,00
4 ACESSIBILIDADE													
4.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	0,00	0,00	0,00	416,48	832,96	0,00	832,96	832,96	0,00	100,00
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
5.001	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	1,00	0,00	1,00	1,00	294,27	294,27	0,00	294,27	294,27	0,00	100,00
5.002	5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	4,00	0,00	4,00	4,00	1.645,99	6.583,96	0,00	6.583,96	6.583,96	0,00	100,00
5.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	1,00	1,00	18,27	18,27	0,00	18,27	18,27	0,00	100,00
5.004	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	41,79	41,79	0,00	41,79	41,79	0,00	100,00
5.005	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1,00	0,00	1,00	1,00	5,83	5,83	0,00	5,83	5,83	0,00	100,00
5.006	Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	0,00	1,00	1,00	846,18	846,18	0,00	846,18	846,18	0,00	100,00
5.006	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	4,00	0,00	4,00	4,00	7,86	31,44	0,00	31,44	31,44	0,00	100,00
5.007	instalação	M	40,00	0,00	40,00	40,00	10,57	422,80	0,00	422,80	422,80	0,00	100,00
5.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	28,00	0,00	28,00	28,00	13,08	366,24	0,00	366,24	366,24	0,00	100,00
5.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	12,00	0,00	12,00	12,00	2,32	27,84	0,00	27,84	27,84	0,00	100,00
5.010	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	12,31	12,31	0,00	12,31	12,31	0,00	100,00
5.011	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	6,00	0,00	6,00	6,00	10,56	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	100,00
5.012	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	4,00	0,00	4,00	4,00	36,49	145,96	0,00	145,96	145,96	0,00	100,00
5.013	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	0,00	2,00	2,00	156,87	313,74	0,00	313,74	313,74	0,00	100,00

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA CAROLINA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA SIZINHO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 124/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE		
			B.M.Nº. 01				ORDEM DE SERVIÇO: 15/04/2026						
			PERÍODO: 15/04/2026 a 31/05/2026				DATA: 01/06/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
6	PINTURA							2.905,61	0,00	0,00	0,00	2.905,61	0,00
6.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	143,70	0,00	0,00	0,00	20,22	2.905,61	0,00	0,00	0,00	2.905,61	0,00
7	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4.044,88	0,00	3.377,62	3.377,62	667,26	83,50
7.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,77	0,00	15,77	15,77	214,18	3.377,62	0,00	3.377,62	3.377,62	0,00	100,00
7.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00	0,00	0,00	0,00	333,63	667,26	0,00	0,00	0,00	667,26	0,00
8	PAISAGISMO							3.799,07	0,00	0,00	0,00	3.799,07	0,00
8.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	81,85	0,00	0,00	0,00	25,37	2.076,53	0,00	0,00	0,00	2.076,53	0,00
8.002	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	0,00	0,00	0,00	81,64	326,56	0,00	0,00	0,00	326,56	0,00
8.003	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	35,00	0,00	0,00	0,00	37,38	1.308,30	0,00	0,00	0,00	1.308,30	0,00
8.004	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	1,00	0,00	0,00	0,00	87,68	87,68	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00
9	DIVERSOS							2.785,45	0,00	0,00	0,00	2.785,45	0,00
9.001	Limpeza geral	m2	288,10	0,00	0,00	0,00	2,42	697,20	0,00	0,00	0,00	697,20	0,00
9.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							2.966,40	0,00	2.302,40	2.302,40	664,00	77,62
10.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,50	0,00	8,17	8,17	154,93	1.626,77	0,00	1.265,78	1.265,78	360,99	77,81
10.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	16,80	0,00	13,00	13,00	79,74	1.339,63	0,00	1.036,62	1.036,62	303,01	77,38
TOTAL GERAL								59.266,67	0,00	48.445,28	48.445,28	10.821,39	81,74
CONSTRUTORA ROCHA LTDA CONSTRUTORA ROCHA LTDA 			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____				Aprovado para pagamento Data: ____/____/____						

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

ROCHA GARDENIA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Atestamos que os serviços constantes na NF -
foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ____/____/____

Aprovado para pagamento

Data: ____/____/____

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de W. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
BM 01 01/06/2026 CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATO N°	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
124/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA SIZINIO)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 = 3,00MX2,00: 6,00 M2
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto = 20 m+15 m+18m+20m+15,65m: 88,65m
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima = 28,81*10,00: 288,10 m2
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO
2.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023= 140,00 m2* 0,10m: 14,00 m3
2.002	Carga manual de material de 1ª categoria = 168,00m2*0,10m: 16,80 m3
2.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³: 25,2t*10km: 252,00 tkm
03	PAVIMENTAÇÃO
3001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 = 41,31 m+50,00m+30,00m+30,00m: 151,31m
3002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022= 112,00m*1m*0,10m: 11,20m3
03.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.= 37,10m * 2,0m: 74,20m2
03.004	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto: 13,30m*1,0m: 13,30m2
05	INSTALAÇÕES ELETRICAS
5.001	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.= 1 und
5.002	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar= 4 und
5.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa = 1 und
5.004	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m = 1 und
5.005	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) = 1 und
5.006	Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento = 1 und
5.006	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico= 4 und
5.007	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação = 20m+20m:40m
5.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") = 18m+10m:28m
5.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")= 12 und
5.010	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento = 1 und
5.011	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 =3m+3m:6m
5.012	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025 = 4 und
5.013	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m = 2 und
07	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
7.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos 5m+5,77m+5,00m:15,77m
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = 8,17 H
10.002	Mestre de obras com encargos complementares = 13,00 H



 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

gov.br


Documento assinado digitalmente
 MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 24/08/2026 15:16:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

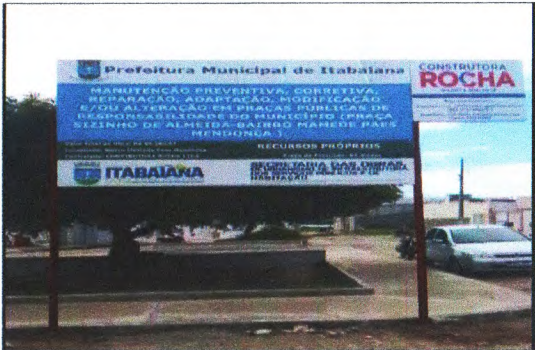MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA SIZINIO)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 124/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 01/06/2026
		
PLACA DE OBRA	TAPUME	ASSENTAMENTO BLOCO CONCRETO
		
EXECUÇÃO DE PASSEIO	BANCO DE CONCRETO	EXECUÇÃO DE PASSEIO
ELABORADO POR: 	FISCALIZAÇÃO: 	Observações:


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA SIZINIO)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	
---	-----------------------------	---


CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA	CONTRATO Nº: 124/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE	DATA: 01/06/2026






INSTALAÇÕES ELETICAS



INSTALAÇÕES ELETRICAS



INSTALAÇÕES ELETRICAS



ELABORADO POR:  Documento assinado digitalmente MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA Data: 27/08/2026 10:51:50-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br	FISCALIZAÇÃO: 	Observações:
--	----------------------------	--------------

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana
