

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO PRAÇA SÃO FRANCISCO (RIO DAS PEDRAS)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 285/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE		
			B.M.Nº. 01/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025						
			PERÍODO: 05/09/2025 a 30/09/2025				DATA: 10/10/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		6,00	6,00	355,94	2.135,64	0,00	2.135,64	2.135,64	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	155,00		155,00	155,00	27,47	4.257,85	0,00	4.257,85	4.257,85	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	795,17		795,17	795,17	4,57	3.633,93	0,00	3.633,93	3.633,93	0,00	100,00
	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	2,00		2,00	2,00	36,68	73,36	0,00	73,36	73,36	0,00	100,00
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
2.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	240,44		156,00	156,00	10,16	2.442,87	0,00	1.584,96	1.584,96	857,91	64,88
2.002	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	139,60		139,60	139,60	13,33	1.860,87	0,00	1.860,87	1.860,87	0,00	100,00
2.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	228,95		228,95	228,95	26,47	6.060,31	0,00	6.060,31	6.060,31	0,00	100,00
04 PAVIMENTAÇÃO													
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af 01/2024	m	240,44		156,00	156,00	44,38	10.670,73	0,00	6.923,28	6.923,28	3.747,45	64,88
	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	180,62		180,62	180,62	120,08	21.688,85	0,00	21.688,85	21.688,85	0,00	100,00
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	64,00		0,00	0,00	111,50	7.136,00	0,00	0,00	0,00	7.136,00	0,00
04.007	Piso cimentado desmoldado traço 1:5, e = 5 cm	m2	114,50		42,02	42,02	40,36	4.621,22	0,00	1.695,93	1.695,93	2.925,29	36,70
04.009	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	3,00		3,00	3,00	54,60	163,80	0,00	163,80	163,80	0,00	100,00
05 ACESSIBILIDADE													
05.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	6,60		0,00	0,00	11,73	77,42	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00
06 REVISÕES, ELEVACOES E ESTRUTURAS													
06.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda- corpo), exclusive tela	m²	4,00		4,00	4,00	66,29	265,16	0,00	265,16	265,16	0,00	100,00
07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
07.007	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00		0,00	0,00	134,30	537,20	0,00	0,00	0,00	537,20	0,00
07.030	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1,00		0,00	0,00	1.222,63	1.222,63	0,00	0,00	0,00	1.222,63	0,00
08 PINTURA													
08.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	240,44		0,00	0,00	4,74	1.139,69	0,00	0,00	0,00	1.139,69	0,00
08.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af 01/2020	m2	10,00		0,00	0,00	28,46	284,60	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	49,63		0,00	0,00	46,18	2.291,91	0,00	0,00	0,00	2.291,91	0,00
09 EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	5,00		0,00	0,00	333,63	1.668,15	0,00	0,00	0,00	1.668,15	0,00
09.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00		0,00	0,00	3.706,09	3.706,09	0,00	0,00	0,00	3.706,09	0,00
09.009	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00		0,00	0,00	8.944,94	8.944,94	0,00	0,00	0,00	8.944,94	0,00
11 PAISAGISMO													
11.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	178,40		0,00	0,00	25,37	4.526,01	0,00	0,00	0,00	4.526,01	0,00
11.003	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	4,00		0,00	0,00	793,93	3.175,72	0,00	0,00	0,00	3.175,72	0,00

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO PRAÇA SÃO FRANCISCO (RIO DAS PEDRAS)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 285/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
			B.M.Nº. 01/2025					ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025					
			PERIODO: 05/09/2025 a 30/09/2025					DATA: 10/10/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
11.004	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	20,00		0,00	0,00	46,05	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00
	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e												
11.005	plântio	un	4,00		0,00	0,00	81,64	326,56	0,00	0,00	0,00	326,56	0,00
11.007	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	25,00		0,00	0,00	37,38	934,50	0,00	0,00	0,00	934,50	0,00
11.008	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	6,00		0,00	0,00	87,68	526,08	0,00	0,00	0,00	526,08	0,00
13 DIVERSOS								5.012,21	0,00	285,77	285,77	4.726,45	5,70
13.001	Limpeza geral	m2	795,17		0,00	0,00	2,42	1.924,31	0,00	0,00	0,00	1.924,31	0,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	26,44		26,44	26,44	10,81	285,77	0,00	285,77	285,77	0,00	100,00
	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia												
13.003	pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	594,90		0,00	0,00	1,2	713,88	0,00	0,00	0,00	713,88	0,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								3.301,31	0,00	1.650,65	1.650,65	1.650,65	50,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,50		5,25	5,25	154,93	1.626,77	0,00	813,38	813,38	813,38	50,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,00		10,50	10,50	79,74	1.674,54	0,00	837,27	837,27	837,27	50,00
TOTAL GERAL								103.606,60	0,00	52.280,36	52.280,36	51.326,24	50,46
CONSTRUTORA ROCHA LTDA Documento assinado digitalmente  MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____					Aprovado para pagamento Data: __/__/____					

Documento assinado digitalmente
 **SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO**
 Data: 22/10/2025 13:28:42-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
 **RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ**
 Data: 22/10/2025 14:58:28-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

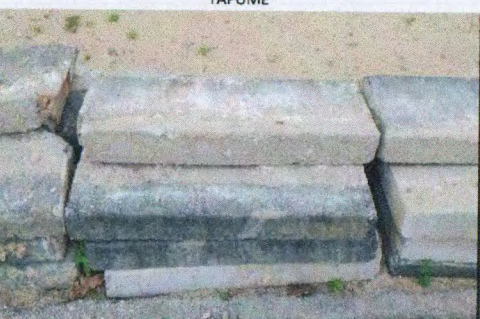
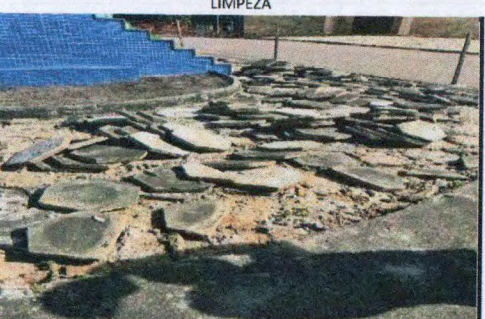


MEMÓRIA DE CÁLCULO	
BM 01 CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
285/2025/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO PRAÇA SÃO FRANCISCO (RIO DAS PEDRAS)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	
1001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022 - 2,00 X3,00=6,00 M2
1002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto - 155,00 M
1003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima - 795,17 M2
1004	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m - 2,00 UND
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	
2001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado - 156,00 M
2002	Demolição de piso em lajota hexagonal - 139,60 M2
2003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 - 228,95 M2
04 PAVIMENTAÇÃO	
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024 - 156,00 M
04.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. - 180,62 M2
04.007	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm - 42,02 M2
04.009	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto - 3,00 M2
06 REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS	
06.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela - 4,00 M2
13 DIVERSOS	
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria - 26,44 M3
14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 5,25 H
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - 10,50 H


CONSTRUTORA ROCHA LTDA



MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizila Milene S. Rodrigues Araujo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (SÃO FRANCISCO) RIO DAS PEDRAS	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 285/2025/PMI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 10/10/2025
		
		
PLACA DE OBRA DESTOCAMENTO DE ÁRVORE	TAPUME DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	LIMPEZA DEMOLIÇÃO DE LAJOTA HEXAGONAL
ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA CARDENEZA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9	FISCALIZAÇÃO:  Sheissica Bezerra de Macedo Eng.(a) Civil CREA 2722159830 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	Observações:


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (SÃO FRANCISCO) RIO DAS PEDRAS	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 285/2025/PMI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 10/10/2025
		
		
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	PISO INTERTRAVADO
PISO CIMENTADO	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA
ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270433684-3		FISCALIZAÇÃO:  Sheissica Bezerra de Macedo Eng.(a) Civil CREA 2722159830 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana
Observações:		


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
