

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas do Bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 208/2023

CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

Nº 001

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Período: 02/10/2023 a 31/10/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE													
1.1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								5.909,54	0,00	1.621,44	1.621,44	4.288,10	27,44%
1.1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,00		6,00	6,00	0,00	270,24	1.621,44	0,00	1.621,44	1.621,44	0,00	100,00%
1.1.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2 40M - REV 02_02/2022	mês	5,00			0,00	5,00	857,62	4.288,10	0,00	0,00	0,00	4.288,10	0,00%
1.2	RUA ANTÔNIO MENEZES								97.726,99	0,00	0,00	0,00	97.726,99	0,00%
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.750,82	0,00	0,00	0,00	2.750,82	0,00%
1.2.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	1005,45			0,00	1.005,45	1,12	1.126,10	0,00	0,00	0,00	1.126,10	0,00%
1.2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AE 11/2019	M2	1055,89			0,00	1.055,89	0,82	865,82	0,00	0,00	0,00	865,82	0,00%
1.2.1.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	329,96			0,00	329,96	0,80	263,96	0,00	0,00	0,00	263,96	0,00%
1.2.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)	tkm	989,89			0,00	989,89	0,50	494,94	0,00	0,00	0,00	494,94	0,00%
1.2.2	PAVIMENTAÇÃO								87.055,38	0,00	0,00	0,00	87.055,38	0,00%
1.2.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	904,58			0,00	904,58	74,63	67.508,80	0,00	0,00	0,00	67.508,80	0,00%
1.2.2.2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	336,25			0,00	336,25	30,09	10.117,76	0,00	0,00	0,00	10.117,76	0,00%
1.2.2.3	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	336,25			0,00	336,25	2,86	961,67	0,00	0,00	0,00	961,67	0,00%
1.2.2.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	73,91			0,00	73,91	99,56	7.358,47	0,00	0,00	0,00	7.358,47	0,00%

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716/04921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Engª Civil Kelly Pinto Freire
CREA: 2709362449
Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos
Prefeitura de Itabaiana - SE

José Rosenberg

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas do Bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.

CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 208/2023

Nº 001

Período: 02/10/2023 a 31/10/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.2.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)	tkm	2217,36			0,00	2.217,36	0,50	1.108,68	0,00	0,00	0,00	1.108,68	0,00%
1.2.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								7.528,67	0,00	0,00	0,00	7.528,67	0,00%
1.2.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	100,88			0,00	100,88	74,63	7.528,67	0,00	0,00	0,00	7.528,67	0,00%
1.2.4	LIMPEZA								392,12	0,00	0,00	0,00	392,12	0,00%
1.2.4.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1005,45			0,00	1.005,45	0,39	392,12	0,00	0,00	0,00	392,12	0,00%
1.3	RUA MINERVINA DOS SANTOS								80.012,23	0,00	0,00	0,00	80.012,23	0,00%
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.274,72	0,00	0,00	0,00	2.274,72	0,00%
1.3.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	832,53			0,00	832,53	1,12	932,43	0,00	0,00	0,00	932,43	0,00%
1.3.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AE 11/2019	M2	872,33			0,00	872,33	0,82	715,31	0,00	0,00	0,00	715,31	0,00%
1.3.1.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	272,60			0,00	272,60	0,80	218,08	0,00	0,00	0,00	218,08	0,00%
1.3.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)	tkm	817,81			0,00	817,81	0,50	408,90	0,00	0,00	0,00	408,90	0,00%
1.3.2	PAVIMENTAÇÃO								71.471,54	0,00	0,00	0,00	71.471,54	0,00%
1.3.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	752,93			0,00	752,93	74,63	56.191,16	0,00	0,00	0,00	56.191,16	0,00%

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Engª Civil Kelly Pinto Freire
CREA: 2709362449
Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos
Prefeitura de Itabaiana- SE

José Rosemberg
Engª Civil
CREA - 2704486174

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas do Bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 208/2023
CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	Nº 001	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 02/10/2023 a 31/10/2023	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.3.2.2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	265,35			0,00	265,35	30,09	7.984,38	0,00	0,00	0,00	7.984,38	0,00%
1.3.2.3	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	265,35			0,00	265,35	2,86	758,90	0,00	0,00	0,00	758,90	0,00%
1.3.2.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	61,06			0,00	61,06	99,56	6.079,13	0,00	0,00	0,00	6.079,13	0,00%
1.3.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)	tkm	915,95			0,00	915,95	0,50	457,97	0,00	0,00	0,00	457,97	0,00%
1.3.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								5.941,29	0,00	0,00	0,00	5.941,29	0,00%
1.3.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	79,61			0,00	79,61	74,63	5.941,29	0,00	0,00	0,00	5.941,29	0,00%
1.3.4	LIMPEZA								324,68	0,00	0,00	0,00	324,68	0,00%
1.3.4.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	832,53			0,00	832,53	0,39	324,68	0,00	0,00	0,00	324,68	0,00%
1.4	TRAVESSA JOSÉ MEIRELES TELES 04								28.151,36	0,00	0,00	0,00	28.151,36	0,00%
1.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								778,44	0,00	0,00	0,00	778,44	0,00%
1.4.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	282,93			0,00	282,93	1,12	316,88	0,00	0,00	0,00	316,88	0,00%
1.4.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AE 11/2019	M2	299,96			0,00	299,96	0,82	245,96	0,00	0,00	0,00	245,96	0,00%
1.4.1.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	93,74			0,00	93,74	0,80	74,99	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00%
1.4.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)	tkm	281,22			0,00	281,22	0,50	140,61	0,00	0,00	0,00	140,61	0,00%
1.4.2	PAVIMENTAÇÃO								24.719,94	0,00	0,00	0,00	24.719,94	0,00%

Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo

Eng^a Civil Kelly Pinto Freire
CREA: 2709362449
Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos
Prefeitura de Itabaiana - SE

José Rosemberg
Eng^a Civil
CREA - 270446174

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas do Bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 208/2023
CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	Nº 001	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 02/10/2023 a 31/10/2023	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.4.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	248,86			0,00	248,86	74,63	18.572,42	0,00	0,00	0,00	18.572,42	0,00%
1.4.2.2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	113,56			0,00	113,56	30,09	3.417,02	0,00	0,00	0,00	3.417,02	0,00%
1.4.2.3	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	113,56			0,00	113,56	2,86	324,78	0,00	0,00	0,00	324,78	0,00%
1.4.2.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	21,00			0,00	21,00	99,56	2.090,76	0,00	0,00	0,00	2.090,76	0,00%
1.4.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)	tkm	629,92			0,00	629,92	0,50	314,96	0,00	0,00	0,00	314,96	0,00%
1.4.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								2.542,64	0,00	0,00	0,00	2.542,64	0,00%
1.4.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	34,07			0,00	34,07	74,63	2.542,64	0,00	0,00	0,00	2.542,64	0,00%
1.4.4	LIMPEZA								110,34	0,00	0,00	0,00	110,34	0,00%
1.4.4.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	282,93			0,00	282,93	0,39	110,34	0,00	0,00	0,00	110,34	0,00%
1.5	TRAVESSA JOSÉ MEIRELES TELES 05								15.183,96	0,00	0,00	0,00	15.183,96	0,00%
1.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								429,96	0,00	0,00	0,00	429,96	0,00%
1.5.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	157,17			0,00	157,17	1,12	176,03	0,00	0,00	0,00	176,03	0,00%
1.5.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AE 11/2019	M2	165,03			0,00	165,03	0,82	135,32	0,00	0,00	0,00	135,32	0,00%
1.5.1.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	51,57			0,00	51,57	0,80	41,25	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00%

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo

Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos
Prefeitura de Itabaiana- SE

José Rosemberg

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas do Bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 208/2023
CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	Nº 001	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 02/10/2023 a 31/10/2023	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.5.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)	tkm	154,72			0,00	154,72	0,50	77,36	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00%
1.5.2	PAVIMENTAÇÃO								13.519,53	0,00	0,00	0,00	13.519,53	0,00%
1.5.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	141,45			0,00	141,45	74,63	10.556,41	0,00	0,00	0,00	10.556,41	0,00%
1.5.2.2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	52,40			0,00	52,40	30,09	1.576,71	0,00	0,00	0,00	1.576,71	0,00%
1.5.2.3	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	52,40			0,00	52,40	2,86	149,86	0,00	0,00	0,00	149,86	0,00%
1.5.2.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	11,55			0,00	11,55	99,56	1.149,91	0,00	0,00	0,00	1.149,91	0,00%
1.5.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)	tkm	173,28			0,00	173,28	0,50	86,64	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00%
1.5.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								1.173,18	0,00	0,00	0,00	1.173,18	0,00%
1.5.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	15,72			0,00	15,72	74,63	1.173,18	0,00	0,00	0,00	1.173,18	0,00%
1.5.4	LIMPEZA								61,29	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00%
1.5.4.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	157,17			0,00	157,17	0,39	61,29	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00%
1.6	TRAVESSA MARIA DA SILVA NUNES								95.206,68	0,00	0,00	0,00	95.206,68	0,00%
1.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.653,82	0,00	0,00	0,00	2.653,82	0,00%
1.6.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	967,00			0,00	967,00	1,12	1.083,04	0,00	0,00	0,00	1.083,04	0,00%

Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora do Núcleo

Eng^a Civil Kelly Pinto Freire
CREA: 2709362449
Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos

José Rosenberg

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas do Bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.			BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO Nº: 208/2023					
CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI			Nº 001						Período: 02/10/2023 a 31/10/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			Quantidades					Valores (R\$)					% Medido	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
1.6.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AE 11/2019	M2	1020,82			0,00	1.020,82	0,82	837,07	0,00	0,00	0,00	837,07	0,00%
1.6.1.3	CARGA MECANICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	319,01			0,00	319,01	0,80	255,20	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00%
1.6.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)	tkm	957,02			0,00	957,02	0,50	478,51	0,00	0,00	0,00	478,51	0,00%
1.6.2	PAVIMENTAÇÃO								84.142,56	0,00	0,00	0,00	84.142,56	0,00%
1.6.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	859,36			0,00	859,36	74,63	64.134,03	0,00	0,00	0,00	64.134,03	0,00%
1.6.2.2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	358,79			0,00	358,79	30,09	10.795,99	0,00	0,00	0,00	10.795,99	0,00%
1.6.2.3	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	358,79			0,00	358,79	2,86	1.026,13	0,00	0,00	0,00	1.026,13	0,00%
1.6.2.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	71,46			0,00	71,46	99,56	7.114,55	0,00	0,00	0,00	7.114,55	0,00%
1.6.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)	tkm	2143,72			0,00	2.143,72	0,50	1.071,86	0,00	0,00	0,00	1.071,86	0,00%
1.6.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								8.033,17	0,00	0,00	0,00	8.033,17	0,00%
1.6.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	107,64			0,00	107,64	74,63	8.033,17	0,00	0,00	0,00	8.033,17	0,00%
1.6.4	LIMPEZA								377,13	0,00	0,00	0,00	377,13	0,00%

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo

Engª Civil Kelly Pinto Freire
CREA: 2709362449
Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos
Prefeitura de Itabaiana- SE

José Rosemberg
Engª Civil
CREA: 2704455174

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas do Bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.			BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO Nº: 208/2023					
CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI			Nº 001						Período: 02/10/2023 a 31/10/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			Quantidades					Valores (R\$)					% Medido	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
1.6.4.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	M2	967,00			0,00	967,00	0,39	377,13	0,00	0,00	0,00	377,13	0,00%
1.7	TRAVESSA TANQUE VERMELHO 01								149.896,64	0,00	0,00	0,00	149.896,64	0,00%
1.7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								4.156,82	0,00	0,00	0,00	4.156,82	0,00%
1.7.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	1512,18			0,00	1.512,18	1,12	1.693,64	0,00	0,00	0,00	1.693,64	0,00%
1.7.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AE 11/2019	M2	1600,77			0,00	1.600,77	0,82	1.312,63	0,00	0,00	0,00	1.312,63	0,00%
1.7.1.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	500,24			0,00	500,24	0,80	400,19	0,00	0,00	0,00	400,19	0,00%
1.7.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)	tkm	1500,72			0,00	1.500,72	0,50	750,36	0,00	0,00	0,00	750,36	0,00%
1.7.2	PAVIMENTAÇÃO								131.927,88	0,00	0,00	0,00	131.927,88	0,00%
1.7.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	1335,01			0,00	1.335,01	74,63	99.631,79	0,00	0,00	0,00	99.631,79	0,00%
1.7.2.2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	590,58			0,00	590,58	30,09	17.770,55	0,00	0,00	0,00	17.770,55	0,00%
1.7.2.3	PINTURA DE MEIO FIO (CAIÇÃO)	M	590,58			0,00	590,58	2,86	1.689,05	0,00	0,00	0,00	1.689,05	0,00%
1.7.2.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	112,05			0,00	112,05	99,56	11.155,69	0,00	0,00	0,00	11.155,69	0,00%
1.7.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)	tkm	3361,61			0,00	3.361,61	0,50	1.680,80	0,00	0,00	0,00	1.680,80	0,00%
1.7.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								13.222,19	0,00	0,00	0,00	13.222,19	0,00%

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921

Engª Civil Kelly Pinto Freire
CREA: 2709362449
Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos
Prefeitura de Itabaiana - SE

José Rosenberg
Engª CIVIL

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas do Bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº: 208/2023						
CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI			Nº 001					Período: 02/10/2023 a 31/10/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA														
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.7.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	177,17			0,00	177,17	74,63	13.222,19	0,00	0,00	0,00	13.222,19	0,00%
1.7.4	LIMPEZA								589,75	0,00	0,00	0,00	589,75	0,00%
1.7.4.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1512,18			0,00	1.512,18	0,39	589,75	0,00	0,00	0,00	589,75	0,00%
1.8	TRAVESSA TANQUE VERMELHO 02								104.140,97	0,00	0,00	0,00	104.140,97	0,00%
1.8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.896,07	0,00	0,00	0,00	2.896,07	0,00%
1.8.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	1054,49			0,00	1.054,49	1,12	1.181,02	0,00	0,00	0,00	1.181,02	0,00%
1.8.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	M2	1114,58			0,00	1.114,58	0,82	913,95	0,00	0,00	0,00	913,95	0,00%
1.8.1.3	AE 11/2019 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	348,31			0,00	348,31	0,80	278,64	0,00	0,00	0,00	278,64	0,00%
1.8.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)	tkm	1044,92			0,00	1.044,92	0,50	522,46	0,00	0,00	0,00	522,46	0,00%
1.8.2	PAVIMENTAÇÃO								91.865,37	0,00	0,00	0,00	91.865,37	0,00%
1.8.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	934,32			0,00	934,32	74,63	69.728,30	0,00	0,00	0,00	69.728,30	0,00%
1.8.2.2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M	400,58			0,00	400,58	30,09	12.053,45	0,00	0,00	0,00	12.053,45	0,00%
1.8.2.3	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	400,58			0,00	400,58	2,86	1.145,65	0,00	0,00	0,00	1.145,65	0,00%
1.8.2.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	78,02			0,00	78,02	99,56	7.767,67	0,00	0,00	0,00	7.767,67	0,00%


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 27.161.049/21
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Engª Civil Kelly Pinto Freire
CREA: 2709362449


Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos

Inê Rosemberg

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas do Bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº: 208/2023						
CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI			Nº 001					Período: 02/10/2023 a 31/10/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			Quantidades					Valores (R\$)						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
1.8.2.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV.02.02/2022	tkm	2340,61			0,00	2.340,61	0,50	1.170,30	0,00	0,00	0,00	1.170,30	0,00%
1.8.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								8.968,28	0,00	0,00	0,00	8.968,28	0,00%
1.8.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	120,17			0,00	120,17	74,63	8.968,28	0,00	0,00	0,00	8.968,28	0,00%
1.8.4	LIMPEZA								411,25	0,00	0,00	0,00	411,25	0,00%
1.8.4.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1054,49			0,00	1.054,49	0,39	411,25	0,00	0,00	0,00	411,25	0,00%
1.9	TRAVESSA TANQUE VERMELHO 03								53.032,38	0,00	50.645,59	50.645,59	2.386,79	95,50%
1.9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.467,05	0,00	1.401,97	1.401,97	65,08	95,56%
1.9.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	533,28		519,58	519,58	13,70	1,12	597,27	0,00	581,92	581,92	15,35	97,43%
1.9.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	565,26		534,95	534,95	30,31	0,82	463,51	0,00	438,65	438,65	24,86	94,64%
1.9.1.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	176,64		165,83	165,83	10,81	0,80	141,31	0,00	132,66	132,66	8,65	93,88%
1.9.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)	tkm	529,93		497,49	497,49	32,44	0,50	264,96	0,00	248,74	248,74	16,22	93,88%
1.9.2	PAVIMENTAÇÃO								46.583,28	0,00	44.555,37	44.555,37	2.027,91	95,65%
1.9.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	469,31		456,76	456,76	12,55	74,63	35.024,60	0,00	34.087,99	34.087,99	936,61	97,33%


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo


 Engª Civil Kelly Pinto Freire
 CREA: 2709362449
 Secretária das Obras e dos Serv. Públicos
 Prefeitura de Itabaiana- SE


 José Rosemberg
 Engª Civil
 CREA 2704485174

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas do Bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.				BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº: 208/2023					
CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI				Nº 001										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 02/10/2023 a 31/10/2023										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.9.2.2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	213,22		209,40	209,40	3,82	30,09	6.415,78	0,00	6.300,84	6.300,84	114,94	98,21%
1.9.2.3	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	213,22			0,00	213,22	2,86	609,80	0,00	0,00	0,00	609,80	0,00%
1.9.2.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	39,57		36,37	36,37	3,20	99,56	3.939,58	0,00	3.620,99	3.620,99	318,59	91,91%
1.9.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)	tkm	1187,05		1.091,10	1.091,10	95,95	0,50	593,52	0,00	545,55	545,55	47,97	91,92%
1.9.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								4.774,08	0,00	4.688,25	4.688,25	85,83	98,20%
1.9.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	63,97		62,82	62,82	1,15	74,63	4.774,08	0,00	4.688,25	4.688,25	85,83	98,20%
1.9.4	LIMPEZA								207,97	0,00	0,00	0,00	207,97	0,00%
1.9.4.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	533,28			0,00	533,28	0,39	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97	0,00%
1.10	TRAVESSA TANQUE VERMELHO 04								102.582,63	0,00	38.490,59	38.490,59	64.092,04	37,52%
1.10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.975,79	0,00	762,41	762,41	2.213,38	25,62%
1.10.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	1097,77		398,31	398,31	699,46	1,12	1.229,50	0,00	446,10	446,10	783,40	36,28%
1.10.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AE 11/2019	M2	1134,88		29,00	29,00	1.105,88	0,82	930,60	0,00	23,78	23,78	906,82	2,56%
1.10.1.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	354,65		127,19	127,19	227,46	0,80	283,72	0,00	101,75	101,75	181,97	35,86%
1.10.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)	tkm	1063,95		381,57	381,57	682,38	0,50	531,97	0,00	190,78	190,78	341,19	35,86%
1.10.2	PAVIMENTAÇÃO								93.639,68	0,00	34.150,42	34.150,42	59.489,26	36,47%

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo

Engª Civil Kelly Pinto Freire
CREA: 2709362449
Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos

José Rosemberg
Engª Civil

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas do Bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.				BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº: 208/2023					
CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI				Nº 001					Período: 02/10/2023 a 31/10/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA														
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.10.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	1023,55		350,37	350,37	673,18	74,63	76.387,53	0,00	26.148,11	26.148,11	50.239,42	34,23%
1.10.2.2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	247,39		159,80	159,80	87,59	30,09	7.443,96	0,00	4.808,38	4.808,38	2.635,58	64,59%
1.10.2.3	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	247,39			0,00	247,39	2,86	707,53	0,00	0,00	0,00	707,53	0,00%
1.10.2.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	79,44		27,88	27,88	51,56	99,56	7.909,04	0,00	2.775,73	2.775,73	5.133,31	35,10%
1.10.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)	tkm	2383,24		836,40	836,40	1.546,84	0,50	1.191,62	0,00	418,20	418,20	773,42	35,10%
1.10.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								5.539,03	0,00	3.577,76	3.577,76	1.961,27	64,59%
1.10.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	74,22		47,94	47,94	26,28	74,63	5.539,03	0,00	3.577,76	3.577,76	1.961,27	64,59%
1.10.4	LIMPEZA								428,13	0,00	0,00	0,00	428,13	0,00%
1.10.4.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1097,77			0,00	1.097,77	0,39	428,13	0,00	0,00	0,00	428,13	0,00%
1.11	PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ MEIRELES TELES								115.549,95	0,00	0,00	0,00	115.549,95	0,00%
1.11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.206,31	0,00	0,00	0,00	3.206,31	0,00%
1.11.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	1166,64			0,00	1.166,64	1,12	1.306,63	0,00	0,00	0,00	1.306,63	0,00%
1.11.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AE 11/2019	M2	1234,57			0,00	1.234,57	0,82	1.012,34	0,00	0,00	0,00	1.012,34	0,00%
1.11.1.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	385,80			0,00	385,80	0,80	308,64	0,00	0,00	0,00	308,64	0,00%

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo

Engª Civil Kelly Vinto Freire
CREA: 2709362449
Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos

José Rosenberg

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas do Bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 208/2023
CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	Nº 001	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 02/10/2023 a 31/10/2023	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.11.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)	tkm	1157,41			0,00	1.157,41	0,50	578,70	0,00	0,00	0,00	578,70	0,00%
1.11.2	PAVIMENTAÇÃO								101.749,43	0,00	0,00	0,00	101.749,43	0,00%
1.11.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	1030,78			0,00	1.030,78	74,63	76.927,11	0,00	0,00	0,00	76.927,11	0,00%
1.11.2.2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	452,87			0,00	452,87	30,09	13.626,85	0,00	0,00	0,00	13.626,85	0,00%
1.11.2.3	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	452,87			0,00	452,87	2,86	1.295,20	0,00	0,00	0,00	1.295,20	0,00%
1.11.2.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	86,42			0,00	86,42	99,56	8.603,97	0,00	0,00	0,00	8.603,97	0,00%
1.11.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)	tkm	2592,60			0,00	2.592,60	0,50	1.296,30	0,00	0,00	0,00	1.296,30	0,00%
1.11.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								10.139,23	0,00	0,00	0,00	10.139,23	0,00%
1.11.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	135,86			0,00	135,86	74,63	10.139,23	0,00	0,00	0,00	10.139,23	0,00%
1.11.4	LIMPEZA								454,98	0,00	0,00	0,00	454,98	0,00%
1.11.4.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV.02/02/2022	M2	1166,64			0,00	1.166,64	0,39	454,98	0,00	0,00	0,00	454,98	0,00%
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								14.290,15	0,00	0,00	0,00	14.290,15	0,00%

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo

Engª Civil Kelly Pinto Freire
CREA: 2709362449
Secretaria das Obras e dos Serv. Público
Prefeitura de Itabaiana- SE

José Rosenberg
Engª Civil
CREA - 2704486174

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas do Bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.

CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BOLETIM DE MEDIÇÃO
Nº 001
Período: 02/10/2023 a 31/10/2023

CONTRATO Nº: 208/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1.12.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL D E AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50	UN	14,00			0,00	14,00	358,86	5.024,04	0,00	0,00	0,00	5.024,04	0,00%
1.12.2	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 20 X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUR OS	UN	19,00			0,00	19,00	487,69	9.266,11	0,00	0,00	0,00	9.266,11	0,00%
1.13	EQUIPE DIRIGENTE								68.365,00	0,00	6.836,50	6.836,50	61.528,50	10,00%
1.13.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250,00		25,00	25,00	225,00	133,48	33.370,00	0,00	3.337,00	3.337,00	30.033,00	10,00%
1.13.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00		50,00	50,00	450,00	69,99	34.995,00	0,00	3.499,50	3.499,50	31.495,50	10,00%
TOTAIS DA MEDIÇÃO									930.048,48	0,00	97.594,12	97.594,12	832.454,36	10,49%
PERCENTUAIS DA MEDIÇÃO									100,00%	0,00%	10,49%	10,49%	89,51%	

ASSINATURAS

CONTRATANTE:	CONTRATADA:
Atesto que os serviços foram Executados:	 José Rosenberg Engº Civil CREA - 2704486174

Kelly Pinto Freire
 Engª Civil Kelly Pinto Freire
 CREA: 2709362449
 Secretária das Obras e dos Serv. Públicos
 Prefeitura de Itabaiana- SE

Elaine da Cunha Menezes
 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de ruas do Arroio Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.

CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA


MEMÓRIA DE CÁLCULO


CONTRATO Nº: 208/2023

DO BM Nº 001

Período: 02/10/2023 a 31/10/2023

Item	Discriminação dos Serviços																		
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE																		
1.1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS																		
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022																		
	* Área da Placa da Obra: 6,00 m ²																		
1.1.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022																		
	* Período de Locação do Container na Obra: 01 mês																		
1.9	TRAVESSA TANQUE VERMELHO 03																		
1.9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.9.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																		
	* Área 1 da Pavimentação: 101,80m x 4,93m = 502,21 m ²																		
	* Área 2 da Pavimentação: ((4,98m + 7,00m)/2) x 2,90m = 17,37 m ²																		
	* Total da Locação: Área 1 + Área 2 = 519,58 m ²																		
1.9.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019																		
	* Regularização Área 1: 101,80m x 5,08m = 517,14 m ²																		
	* Regularização Área 2: ((5,13m + 7,15m)/2) x 2,90m = 17,81 m ²																		
	* Total da Regularização: Área 1 + Área 2 = 534,95 m ²																		
1.9.1.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA																		
	* Volume da Carga mecânica: 534,95 m ² x 0,31 m = 165,83 m ³																		
1.9.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)																		
	* Transporte Comercial 2km: 165,83 m ³ x 1,50 x 2,00 Km = 497,49 Tkm																		
1.9.2	PAVIMENTAÇÃO																		
1.9.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO																		
	* Área 1 da Pavimentação: 101,80m x 4,93m = 502,21 m ²																		
	* Área 2 da Pavimentação: ((4,98m + 7,00m)/2) x 2,90m = 17,37 m ²																		
	* a excluir a Área da Drenagem: ((101,80 m + 2,90 m) x 2) x 0,30 m = 62,82 m ²																		
	* Total da Pavimnatção Área 1 + Área 2 - Drenagem = 456,76 m ²																		
1.9.2.2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3																		
	* Comprimento do Meio fio: (101,80 m + 2,90 m) x 2 = 209,40 m																		
1.9.2.4	COLCHÃO DE AREIA																		
	* Volume do Colchão: 519,58 m ² x 0,07 m = 36,37 m ³																		
1.9.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)																		
	* Transporte 20 km: 36,37 m ³ x 1,50 x 20 Km = 1.091,10 TKm																		
1.9.3	DRENAGEM SUPERFICIAL																		
1.9.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO D E AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ O 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO																		
	* Área da Drenagem: ((101,80 m + 2,90 m) x 2) x 0,30 m = 62,82 m ²																		
1.10	TRAVESSA TANQUE VERMELHO 04																		
1.10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.10.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																		
	* Área 1 da Pavimentação: 29,00m x 5,10m = 147,90 m ²																		
	* Área 2 da Pavimentação: 26,10m x 5,10m = 133,11 m ²																		
	* Área 3 da Pavimentação: ((4,36m + 5,10m)/2) x 24,80m = 117,30 m ²																		


 José Rosemberg
 Engº Civil
 CREA - 2704486174


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Engª Civil Kelly Pinto Freire
 CREA: 2709362449
 Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos
 Prefeitura de Itabaiana- SE

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica do bairro Riacho Doce, No município de Itabaiana/SE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATO Nº: 208/2023

CONTRATADA: PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

DO BM Nº 001

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Período: 02/10/2023 a 31/10/2023

Item	Discriminação dos Serviços																		
	* Total da Locação: Área 1 + Área 2 + Área 3 = 398,31 m ²																		
1.10.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019																		
	* Regularização Área 1 da Pavimentação: 29,00m x 5,25m = 152,25 m ²																		
	* Regularização Área 2 da Pavimentação: 26,10m x 5,25m = 137,02 m ²																		
	* Regularização Área 3 da Pavimentação: ((4,51m + 5,25m)/2) x 24,80m = 121,02 m ²																		
	* Total da Regularização: Área 1 + Área 2 + Área 3 = 410,29 m ²																		
1.10.1.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA																		
	* Volume da Carga mecânica: 410,29 m ² x 0,31 m = 127,19 m ³																		
1.10.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)																		
	* Transporte Comercial 2km: 127,19 m ³ x 1,50 x 2,00 Km = 381,57 Tkm																		
1.10.2	PAVIMENTAÇÃO																		
1.10.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO																		
	* Área 1 da Pavimentação: 29,00m x 5,10m = 147,90 m ²																		
	* Área 2 da Pavimentação: 26,10m x 5,10m = 133,11 m ²																		
	* Área 3 da Pavimentação: ((4,36m + 5,10m)/2) x 24,80m = 117,30 m ²																		
	* a excluir a Área da Drenagem: ((29,00m + 26,10m + 24,80m) x 2) x 0,30 m = 47,94m ²																		
	* Total da Pavimentação: Área 1 + Área 2 + Área 3 = 350,37 m ²																		
1.10.2.2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3																		
	* Comprimento do Meio Fio: (29,00 m + 26,10 m + 24,80 m) x 2 = 159,80 m																		
1.10.2.4	COLCHÃO DE AREIA																		
	* Volume do Colchão: 398,31 m ² x 0,07 m = 27,88 m ³																		
1.10.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M ³)																		
	* Transporte 20 km: 27,88 m ³ x 1,50 x 20 Km = 836,40 TKm																		
1.10.3	DRENAGEM SUPERFICIAL																		
1.10.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO																		
	* Área da Drenagem: ((29,00m + 26,10m + 24,80m) x 2) x 0,30 m = 47,94m ²																		
1.13	EQUIPE DIRIGENTE																		
1.13.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																		
	* Quantidade de Horas do Profissional 250,00 x 10% = 25,00 h																		
1.13.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																		
	* Quantidade de Horas do Profissional 500,00 x 10% = 50,00 h																		

ASSINATURAS

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

Atesto que os serviços foram Executados:

Assinatura de José Rosemberg, Engº CIVIL

Assinatura de Kelly Pinto Freire, Engº Civil Kelly Pinto Freire, CREA: 2709362449, Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos, Prefeitura de Itabaiana- SE

Assinatura de Elaine da Cunha Menezes, Engº Civil CREA 2716104921, Coordenadora de Núcleo, Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas no Bairro Riacho Doce, deste município.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M.º: 01

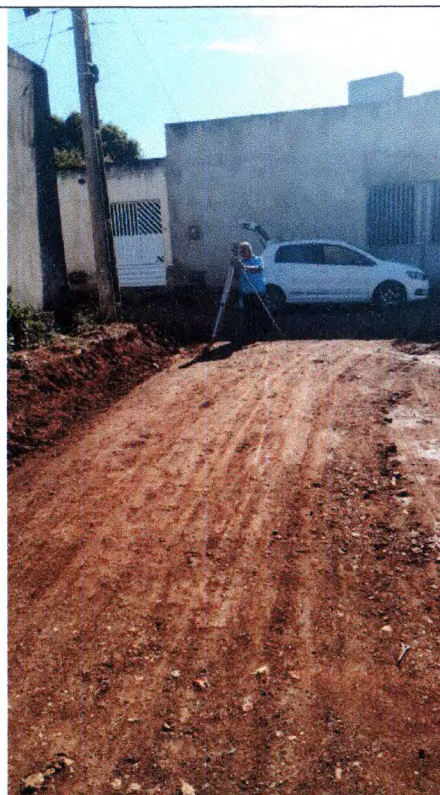
Período: 02/10/2023 - 31/10/2023

CONTRATO Nº: 208/2023

ORDEM DE SERVIÇO: 02/10/2023



CONTÊINER





TOPOGRAFIA




PLACA DE OBRA


 Eng^a Civil Kelly Pinto Freire
 CREA: 2709362449
 Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos
 Prefeitura de Itabaiana- SE

PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E
 PAVIMENTAÇÃO EIRELI

 Ruan Vinicius Moreira Rosenberg
 Titular Administrador


 Jose Rosenberg
 Eng^o CIVIL
 CREA - 2704486174


 Elaine da Cunha Menezes
 Eng^o Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA : Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas no Bairro Riacho Doce, deste município.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M.Nº: 01

Período: 02/10/2023 - 31/10/2023

CONTRATO Nº: 208/2023

ORDEM DE SERVIÇO: 02/10/2023



PAVIMENTAÇÃO TANQUE VERMELHO 04



PAVIMENTAÇÃO TANQUE VERMELHO 03



PAVIMENTAÇÃO TANQUE VERMELHO 03

Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Kelly Pinto Freire
Eng^a Civil Kelly Pinto Freire
CREA: 2709362449
Secretaria das Obras e dos Serv. Públicos

PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO EIRELI
Ruan Vinicius
Ruan Vinicius Moreira Rosenberg
Município Administrador

Jose Rosenberg
Eng^o Civil
CREA: 2704486174
