

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO ZANGUÊ			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 386/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/ 2026					ORDEN DE SERVIÇO = 24/11/2025					
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 10/01/2026 a 13/03/2026					DATA: 16/03/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir ^a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO												
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.058,36	2.058,36	0,00	2.058,36	0,00	100,00
01.01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizada, instalada - Rev02_01/2022	m²	6,00	6,00		6,00	343,06	R\$ 2.058,36	2.058,36	0,00	2.058,36	0,00	100,00
01.02	RUA NATALIA LEITE SAMPAIO							R\$ 34.104,72	R\$ 0,00	R\$ 33.897,94	R\$ 33.897,94	R\$ 206,78	99,39
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 34.104,72	R\$ 0,00	R\$ 33.897,94	R\$ 33.897,94	206,78	99,39
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	229,40		229,40	229,40	1,33	R\$ 305,10	0,00	305,10	305,10	0,00	100,00
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	229,40		229,40	229,40	0,84	R\$ 192,70	0,00	192,70	192,70	0,00	100,00
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	45,87		45,87	45,87	0,90	R\$ 41,28	0,00	41,28	41,28	0,00	100,00
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	546,50		546,50	546,50	1,09	R\$ 595,69	0,00	595,69	595,69	0,00	100,00
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	229,40		229,40	229,40	109,51	R\$ 25.121,59	0,00	25.121,59	25.121,59	0,00	100,00
01.02.001.006	Colchão de areia	m³	29,82		29,82	29,82	136,07	R\$ 4.057,61	0,00	4.057,61	4.057,61	0,00	100,00
01.02.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	1015,37		825,66	825,66	1,09	R\$ 1.106,75	0,00	899,97	899,97	206,78	81,32
01.02.001.008	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	229,40		229,40	229,40	0,49	R\$ 112,41	0,00	112,41	112,41	0,00	100,00
01.02.001.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	59,50		59,50	59,50	39,56	R\$ 2.353,82	0,00	2.353,82	2.353,82	0,00	100,00
01.02.001.007	Pintura de meio-fio (calção)	m	59,50		59,50	59,50	3,66	R\$ 217,77	0,00	217,77	217,77	0,00	100,00
01.03	RUA DO CEMITÉRIO DO POVOADO ZANGUÊ		0,00			0,00		R\$ 275.123,76	R\$ 225.621,50	R\$ 45.917,65	R\$ 271.539,15	R\$ 3.584,61	98,70
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		0,00			0,00		R\$ 275.123,76					0,00
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1790,17	1.672,90	117,27	1.790,17	1,33	R\$ 2.380,93	R\$ 2.224,96	R\$ 155,97	R\$ 2.380,93	R\$ 0,00	100,00
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	1790,17	1.672,90	117,27	1.790,17	0,84	R\$ 1.503,74	R\$ 1.405,24	R\$ 98,51	R\$ 1.503,74	R\$ 0,00	100,00
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	358,06	334,58	23,45	358,03	0,90	R\$ 322,25	R\$ 301,12	R\$ 21,13	R\$ 322,25	R\$ 0,00	100,00
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	4266,80	3.216,48	315,17	3.531,65	1,09	R\$ 4.650,81	R\$ 3.505,97	R\$ 343,54	R\$ 3.849,51	R\$ 801,30	82,77
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	1790,17	1.672,90	117,27	1.790,17	109,51	R\$ 196.041,52	R\$ 183.199,28	R\$ 12.842,24	R\$ 196.041,52	R\$ 0,00	100,00
01.02.001.006	Colchão de areia	m³	232,72	217,47	15,25	232,72	136,07	R\$ 31.666,21	R\$ 29.591,14	R\$ 2.075,07	R\$ 31.666,21	R\$ 0,00	100,00


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO ZANGUÊ			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 386/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/ 2026				ORDEM DE SERVIÇO = 24/11/2025						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 10/01/2026 a 13/03/2026				DATA: 16/03/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir ^a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.02.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	7924,11	4.948,44	422,17	5.370,61	1,09	R\$ 8.637,28	R\$ 5.393,80	R\$ 460,17	R\$ 5.853,97	R\$ 2.783,31	67,78
01.02.001.008	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1790,17		1.790,17	1.790,17	0,49	R\$ 877,18	R\$ 0,00	R\$ 877,18	R\$ 877,18	R\$ 0,00	100,00
01.02.001.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	672,00		672,00	672,00	39,56	R\$ 26.584,32	R\$ 0,00	R\$ 26.584,32	R\$ 26.584,32	R\$ 0,00	100,00
01.02.001.007	Pintura de meio-fio (calçamento)	m	672,00		672,00	672,00	3,66	R\$ 2.459,52	R\$ 0,00	R\$ 2.459,52	R\$ 2.459,52	R\$ 0,00	100,00
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					0,00		R\$ 10.092,90	R\$ 8.074,32	R\$ 2.018,58	R\$ 10.092,90	R\$ 0,00	100,00
01.03.001	Engenheiro Civil de obra junior com encargos complementares	h	30,00	24,00	6,00	30,00	146,23	R\$ 4.386,90	3.509,52	877,38	4.386,90	0,00	100,00
01.03.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	90,00	72,00	18,00	90,00	63,40	R\$ 5.706,00	4.564,80	1.141,20	5.706,00	0,00	100,00
Total geral								R\$ 321.379,74	R\$ 235.754,18	R\$ 81.834,17	R\$ 317.588,35	R\$ 3.791,39	98,82
PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500		Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2026.03.25 09:06:27 -03'00'		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__					
Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232													


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO ZANGUÊ				BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 386/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 02		ORDEN DE SERVIÇO = 24/11/2025		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 10/01/2026 a 13/03/2026		DATA: 16/03/2026		
ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO				
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO							
01.02	RUA NATALIA LEITE SAMPAIO							
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	229,40	37*6,2				
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	229,40	37*6,2				
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	45,87	(229,40*0,07)+(229,40*0,13)				
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	546,50	45,87*1,5*7,95 = 547,00 Valor medido = 546,50				
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	229,40	37*6,2				
01.02.001.006	Colchão de areia	m³	29,82	229,4*0,13				
01.02.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	825,66	45,87*1,5*12				
01.02.001.008	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	229,40	37*6,2				
01.02.001.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntadocom argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	59,50	29,75*2				
01.02.001.007	Pintura de meio-fio (calação)	m	59,50	29,75*2				
01.03	RUA DO CEMITERIO DO POVOADO ZANGUE							
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	117,27	23,50*5,00 = 117,50 Valor medido = 117,27				
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	117,27	23,50*5,00 = 117,50 Valor medido = 117,27				
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	23,45	=(117,50*0,07)+(117,50*0,13)				
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	315,17	23,45*1,5*8,96				
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	117,27	23,50*5,00 = 117,50 Valor medido = 117,27				

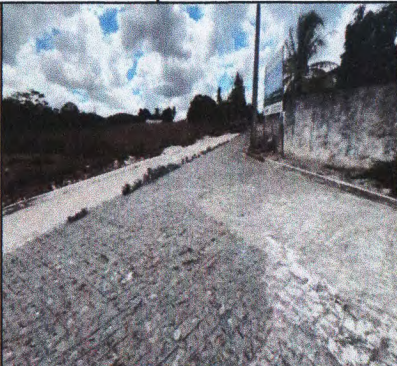

 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO
01.02.001.006	Colchão de areia	m³	15,25	117,27*0,13
01.02.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	422,17	23,45*1,5*12
01.02.001.008	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1790,17	(40x8)+(6x6,65)+(120,00x5,00)+(14,5x4,5)+(30x3,9)+(30x3,8)+(30x4,3)+(30x4,5)+(27x5)+(8,5x9)+(23,50*5,00)
01.02.001.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	672,00	336*2
01.02.001.007	Pintura de meio-fio (caliação)	m	672,00	336*2
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
01.03.001	Engenheiro Civil de obra junior com encargos complementares	h	6,00	6 HR
01.03.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	18,00	18 HR
PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2026.03.25 09:08:08 -03'00'		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__		Aprovado para pagamento Data: __/__/__
Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232				


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO ZANGUÊ		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		CONTRATO Nº 386/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 02		ORDEM DE SERVIÇO = 24/11/2025		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI		PERÍODO: 10/01/2026 a 13/03/2026		DATA: 16/03/2026		
						
COLCHÃO DE AREIA, E DAS PEDRAS		REJUNTE DA PAVIMENTAÇÃO		REJUNTE DA PAVIMENTAÇÃO		MEIO FIO , PINTURA E LIMPEZA
						
MEIO FIO, PINTURA E EXECUÇÃO DE LIMPEZA		PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDA, E EXECUÇÃO DE PINTURA				
Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2026.03.25 09:07:40 -03'00'		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:				APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:


 Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
