

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAIBA			DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02		CONTRATO Nº 031/2024	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA			VIGÊNCIA EXECUÇÃO		Período: 01/08/2024 a 31/08/2024		CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			05/01/2025		Data de medição: 16/12/2024		MINISTÉRIO DO ESPORTE	

Item	Descrição dos serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CAJAIBA, ITABAIANA-SE												
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							32.590,06	32.590,06	0,00	32.590,06	0,00	100,00
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02, 01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	424,50	5.094,00	5.094,00	0,00	5.094,00	100,00
01.01.002	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	676,53	676,53	0,00	676,53	0,00	100,00
01.01.003	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, infrasca, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	0,00	1.981,21	1.981,21	0,00	1.981,21	0,00	100,00
01.01.004	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00	20,00		20,00	0,00	300,16	6.003,20	6.003,20	0,00	6.003,20	100,00
01.01.005	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dimt até 1km	m2	1.750,00	1.750,00		1.750,00	0,00	2,34	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00	100,00
01.01.006	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	37,50	37,50		37,50	0,00	245,47	9.205,13	9.205,13	0,00	9.205,13	100,00
01.01.007	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de trabalho de madeira	m2	718,83	718,83		718,83	0,00	7,70	5.534,99	5.534,99	0,00	5.534,99	100,00
01.02	QUADRA POLIESPORTIVA							680.543,36	393.793,46	0,00	393.793,46	286.749,90	57,86
01.02.001	GALPÃO PRÉ MOLDADO							393.793,46	393.793,46	0,00	393.793,46	0,00	100,00
01.02.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	12,00	12,00		12,00	0,00	12,78	153,36	153,36	0,00	153,36	100,00
01.02.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00	18,00		18,00	0,00	1,24	22,32	22,32	0,00	22,32	100,00
01.02.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00	54,00		54,00	0,00	1,48	79,92	79,92	0,00	79,92	100,00
01.02.001.004	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, cimentagem, vãos de 15 a 25m, alitransados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1	m2	718,83	718,83		718,83	0,00	393,79	283.068,07	283.068,07	0,00	283.068,07	100,00
01.02.001.005	Telhamento com telha em aço galvanume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan - Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022	m2	718,83	718,83		718,83	0,00	153,68	110.469,79	110.469,79	0,00	110.469,79	100,00
01.02.002	QUADRA							121.237,03	0,00	0,00	0,00	121.237,03	0,00
01.02.002.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia (tapa 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	13,12	0,00		0,00	618,76	8.118,13	0,00	0,00	0,00	8.118,13	0,00
01.02.002.002	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	215,64	0,00		0,00	17,25	3.719,79	0,00	0,00	0,00	3.719,79	0,00

JOSE
ALMEIDA
ANDRADE:00
892714590

Assinado de forma
digital por JOSE
ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2024.12.16
11:54:45 -03'00'

Jose Francisco Barros da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAIÁ

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DATA DE TÉRMINO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

CONTRATO Nº
031/2024

VIGÊNCIA
EXECUÇÃO 05/01/2025

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

07/04/2025

Data de medição: 16/12/2024

CONTRATO DE REPASSE:
1.078.337-31- 914263/2021/
MINISTÉRIO DO ESPORTE

Item	Descrição dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.02.002.003	Execução de aterro compactado sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	215,64	0,00		0,00	215,64	22,53	4.858,37	0,00	0,00	4.858,37	0,00
01.02.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.940,84	0,00		0,00	1.940,84	1,48	2.872,44	0,00	0,00	2.872,44	0,00
01.02.002.005	Lona plástica preta	m2	514,96	0,00		0,00	514,96	4,82	2.482,11	0,00	0,00	2.482,11	0,00
01.02.002.006	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA 60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3,4mm (0,97 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Teflon ou similar	m2	514,96	0,00		0,00	514,96	22,44	11.555,70	0,00	0,00	11.555,70	0,00
01.02.002.007	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	514,96	0,00		0,00	514,96	44,81	23.075,36	0,00	0,00	23.075,36	0,00
01.02.002.008	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, occlusive	m2	514,96	0,00		0,00	514,96	52,00	26.777,92	0,00	0,00	26.777,92	0,00
01.02.002.009	argamassa de regularização, aplicado	m2	514,96	0,00		0,00	514,96	44,53	22.931,17	0,00	0,00	22.931,17	0,00
01.02.002.010	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	203,87	0,00		0,00	203,87	64,89	13.229,12	0,00	0,00	13.229,12	0,00
01.02.002.011	Piso em concreto simples desempenado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m	137,26	0,00		0,00	137,26	11,78	1.616,92	0,00	0,00	1.616,92	0,00
01.02.003.001	ALAMBRADO Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	8,43	0,00		0,00	8,43	59,69	503,19	0,00	0,00	503,19	0,00
01.02.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	10,11	0,00		0,00	10,11	11,69	118,19	0,00	0,00	118,19	0,00
01.02.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	30,35	0,00		0,00	30,35	1,48	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00
01.02.003.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pacotias areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	3,93	0,00		0,00	3,93	618,76	2.431,73	0,00	0,00	2.431,73	0,00
01.02.003.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	32,80	0,00		0,00	32,80	54,39	1.783,99	0,00	0,00	1.783,99	0,00
01.02.003.006	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af. 10/2022	m2	65,60	0,00		0,00	65,60	6,18	405,41	0,00	0,00	405,41	0,00
01.02.003.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	65,60	0,00		0,00	65,60	43,23	2.835,89	0,00	0,00	2.835,89	0,00
01.02.003.008	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores, Rev.03 04/2022	m2	65,60	0,00		0,00	65,60	46,87	3.074,67	0,00	0,00	3.074,67	0,00
01.02.003.009	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,62	0,00		0,00	1,62	694,58	1.125,22	0,00	0,00	1.125,22	0,00

JOSE

Assinado de forma digital por JOSE

ALMEIDA

ALMEIDA
ANDRADE:00892714

ANDRADE:0

590

Dados: 2024.12.16

0892714590

11:56:48 -03'00'

José Roberto Santos de Souza
Eng Civil CREA-2720283954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAIBA

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DATA DE TÉRMINO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

CONTRATO Nº
031/2024

VIGÊNCIA
EXECUÇÃO 05/01/2025

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

CONTRATO DE REPASSE:
1.078.337-31 - 914263/2021/
MINISTÉRIO DO ESPORTE

07/04/2025

Data de medição: 16/12/2024

Item	Descrição dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.02.003.010	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	347,20	0,00		0,00	347,20	120.683,25	0,00	0,00	0,00	120.683,25	0,00
01.02.003.011	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	5,76	0,00		0,00	870,91	5.016,44	0,00	0,00	0,00	5.016,44	0,00
01.02.004	ARQUEBANCADA							27.489,97	0,00	0,00	0,00	27.489,97	0,00
01.02.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,67	0,00		0,00	59,69	278,75	0,00	0,00	0,00	278,75	0,00
01.02.004.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	5,60	0,00		0,00	11,69	65,46	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00
01.02.004.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	km	16,81	0,00		0,00	1,48	24,88	0,00	0,00	0,00	24,88	0,00
01.02.004.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,13	0,00		0,00	2.914,96	12.038,78	0,00	0,00	0,00	12.038,78	0,00
01.02.004.005	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e=0,09m, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	23,54	0,00		0,00	79,26	1.865,78	0,00	0,00	0,00	1.865,78	0,00
01.02.004.006	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção, argamassa traço 1:3 com preparo manual, at. 10/2022	m2	47,08	0,00		0,00	6,18	290,95	0,00	0,00	0,00	290,95	0,00
01.02.004.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	47,08	0,00		0,00	43,23	2.035,27	0,00	0,00	0,00	2.035,27	0,00
01.02.004.008	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com ânuia	m3	16,90	0,00		0,00	223,31	3.773,94	0,00	0,00	0,00	3.773,94	0,00
01.02.004.009	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem torn. de material	m3	16,90	0,00		0,00	22,53	380,76	0,00	0,00	0,00	380,76	0,00
01.02.004.010	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	36,01	0,00		0,00	58,96	2.123,15	0,00	0,00	0,00	2.123,15	0,00
01.02.004.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev.03	m2	23,54	0,00		0,00	47,64	1.121,45	0,00	0,00	0,00	1.121,45	0,00
01.02.004.012	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,00	0,00		0,00	232,72	3.490,80	0,00	0,00	0,00	3.490,80	0,00
01.03	DRENAGEM PLUVIAL							20.567,77	0,00	0,00	0,00	20.567,77	0,00
01.03.001	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/escota e aguas pluviais, d= 100mm	m	130,74	0,00		0,00	61,66	8.061,43	0,00	0,00	0,00	8.061,43	0,00
01.03.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	6,00	0,00		0,00	320,17	1.921,02	0,00	0,00	0,00	1.921,02	0,00
01.03.003	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	65,20	0,00		0,00	160,98	10.495,90	0,00	0,00	0,00	10.495,90	0,00

JOSE

Assinado de forma

digital por JOSE

ALMEIDA

ALMEIDA

ANDRADE:008927145

ANDRADE:0

90

Dados: 2024.12.16

0892714590

11:59:04 -03'00'

Página 3 de 6

José Roberto Soares da Silva
Eng. Civil CREA 2720293854
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAIBA		DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02		CONTRATO Nº 031/2024	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA		VIGÊNCIA EXECUÇÃO		Período: 01/08/2024 a 31/08/2024		CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31 - 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		05/01/2025		Data de medição: 16/12/2024			

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior			Do Período
01.03.004	Suporte metálico para calha pluvial, zincado, dobrado, diâmetro entre 119 e 170 mm, para drenagem pluvial predial	un	2,00	0,00		2,00	44,71	89,42	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
01.04.001	PADRÃO DE ENTRADA							17.846,01	0,00	0,00	0,00	17.846,01	0,00
01.04.001.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em porli. Rev 03	un	1,00	0,00		1,00	557,13	557,13	0,00	0,00	0,00	557,13	0,00
01.04.001.002	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	1,00	0,00		1,00	94,87	94,87	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00
01.04.001.003	Poste auxiliar plantada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	0,00		1,00	594,69	594,69	0,00	0,00	0,00	594,69	0,00
01.04.001.004	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00	0,00		2,00	19,02	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04	0,00
01.04.001.005	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00		1,00	162,78	162,78	0,00	0,00	0,00	162,78	0,00
01.04.001.006	Caixa pré moldada em concreto c/ampas para aterramento 20x20x15cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00		1,00	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00
01.04.001.007	Cabo de alumínio 0,6/1kV multiplexados 2x1x16 +16mm²	m	50,00	0,00		50,00	8,35	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50	0,00
01.04.001.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750V / 70°C	m	57,00	0,00		57,00	12,86	733,02	0,00	0,00	0,00	733,02	0,00
01.04.002	QUADRO DISTRIBUIÇÃO							732,34	0,00	0,00	0,00	732,34	0,00
01.04.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00		1,00	304,98	304,98	0,00	0,00	0,00	304,98	0,00
01.04.002.002	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00		1,00	162,78	162,78	0,00	0,00	0,00	162,78	0,00
01.04.002.003	Caixa pré moldada em concreto c/ampas para aterramento 20x20x15cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00		1,00	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00
01.04.002.004	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	1,00	0,00		1,00	94,87	94,87	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00
01.04.002.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação, af 10/2020	un	1,00	0,00		1,00	13,93	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00
01.04.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af 10/2020	un	1,00	0,00		1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00
01.04.002.007	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5kA	un	2,00	0,00		2,00	59,57	119,14	0,00	0,00	0,00	119,14	0,00
01.04.003	PONTOS DE ILUMINAÇÃO							14.493,70	0,00	0,00	0,00	14.493,70	0,00
01.04.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	90,00	0,00		90,00	18,94	1.704,60	0,00	0,00	0,00	1.704,60	0,00
01.04.003.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	30,00	0,00		30,00	4,09	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70	0,00
01.04.003.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750V / 70°C	m	420,00	0,00		420,00	10,25	4.305,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00
01.04.003.004	Luminária industrial de embutir, em alumínio, p/ lâmpada mista ou vapor mercúrio, ref. tb-105/2, Tecnolux ou similar	un	26,00	0,00		26,00	235,88	6.132,88	0,00	0,00	0,00	6.132,88	0,00

Assinado de forma digital por JOSE

ALMEIDA

ANDRADE:0

0892714590

Dados: 2024.12.16 12:00:34 -03'00'

José Robson
Eng. Civil CREA 2720293964
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAIBA

DATA DE TÉRMINO:

CONTRATO Nº 031/2024

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VIGÊNCIA EXECUÇÃO 07/04/2025 05/01/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/08/2024 a 31/08/2024


CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Item	Descrição dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.04.003.005	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	14,00	0,00		0,00	14,00	159,18	2.228,52	0,00	0,00	2.228,52	0,00
01.05	ÁREA EXTERNA												
01.05.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos, af. 06/2016	m	59,12	0,00		0,00	59,12	54,37	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00
01.05.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	59,12	0,00		0,00	59,12	4,06	240,03	0,00	0,00	240,03	0,00
01.05.003	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, af. 10/2022	m2	132,00	0,00		0,00	132,00	94,75	12.507,00	0,00	0,00	12.507,00	0,00
01.05.004	Piso tãti direcional e de alerça, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regulamentação de base	m2	29,97	0,00		0,00	29,97	189,49	5.679,02	0,00	0,00	5.679,02	0,00
01.05.005	Leastro de brita 1	m3	28,41	0,00		0,00	28,41	240,37	6.828,91	0,00	0,00	6.828,91	0,00
01.05.006	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	355,71	0,00		0,00	355,71	64,89	23.082,02	0,00	0,00	23.082,02	0,00
01.06	DIVERSOS												
01.06.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/10usai)	par	1,00	0,00		0,00	1,00	5.287,94	5.287,94	0,00	0,00	5.287,94	0,00
01.06.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	0,00		0,00	2,00	499,84	999,68	0,00	0,00	999,68	0,00
01.06.003	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2,00	0,00		0,00	2,00	4.069,76	8.139,52	0,00	0,00	8.139,52	0,00
01.07	MURO DE FECHAMENTO												
01.07.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,50m, colunas (9x20cm) e cintoamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chafisco e reboco	m2	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	295,50	71.806,50	0,00	71.806,50	71.806,50	100,00
01.07.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	246,00	0,00		0,00	246,00	47,64	11.719,44	0,00	0,00	11.719,44	0,00
01.08	SERVIÇOS FINAIS												
01.08.001	Limpeza geral	m2	1.750,00	0,00		0,00	1.750,00	2,69	4.707,50	0,00	0,00	4.707,50	0,00
01.08.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00		0,00	1,00	2.511,58	2.511,58	0,00	0,00	2.511,58	0,00
01.08.003	Marco Inaugural - Padrão Município	un	1,00	0,00		0,00	1,00	1.484,85	1.484,85	0,00	0,00	1.484,85	0,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAIBA				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº 031/2024			
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA				VIGÊNCIA 07/04/2025 EXECUÇÃO 05/01/2025				Período: 01/08/2024 a 31/08/2024				CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 16/12/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratado	QUANTIDADE			Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$			Saldo a Medir	% Medido		
				Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período			Acumulado até o Período	
01.09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
01.09.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	150.00	66.950	11.610	80.560	69.44	136.68	40.215,00	18.847,89	3.174,08	22.021,96	18.193,04	54,76	
01.09.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	300.00	143.415	24.155	167.570	132.43	65.71	20.502,00	9.424,09	1.586,85	11.010,94	9.491,06	53,71	
Total geral									19.713,00	9.423,80	1.587,23	11.011,02	8.701,98	55,86	
									949.970,54	445.231,45	74.980,65	520.212,00	429.758,54	54,76	
JOSE ALMEIDA Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:008.9994.000692/14590 02714590-8 120416-03007				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__							


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Robson Salgado
 Eng. Civil CREA-2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAIBA			MEMORIAL DE CALCULO BM 02		CONTRATO Nº 031/2024	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA					CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			Data de medição: 16/12/2024			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE			
01	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CAJAIBA, ITABAIANA-SE					
01.07	MURO DE FECHAMENTO					
01.07.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cantamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	243,00	121,50m x 2,00 = 243,00m²		
01.09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01.09.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	11.610	(R\$ 3.174,15/2)/R\$136,68 = 11,61h		
01.09.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	24,155	(R\$ 3.174,15/2)/R\$65,71 = 24,155h		
JOSE ALMEIDA Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE-008 ANDRADE-00892214590 EPP 016 Civil Jcse 4246643/20067246 92714590 Ref: RN 27/013359700			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____			

José Robson Santos
 Eng. Civil CREA-2720293964
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 02

CONTRATO 031/2024

ORDEN DE SERVIÇO
INÍCIO - 05/07/2024




EXECUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO



EXECUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO



EXECUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO

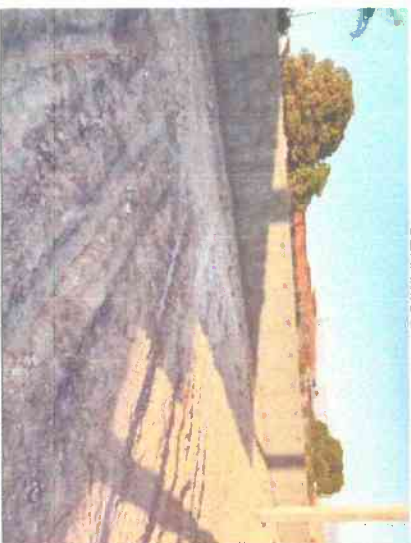

EXECUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO



EXECUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO



EXECUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO

Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008 ANDRADE:00892714590
Dados: 2024.12.16 11:53:28 -03'00'

ELABORADO POR:

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008
92714590

Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA-2722482487
Diego Oliveira Barros

Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana
