





OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.					CONTRATO: 053/2024		Boletim de Medição ADITIVO : 03							
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.							Período: 01/07/2025 a 11/07/2025							
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Data de medição: 14/07/2025							
Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.								R\$ 3.887.268,77	R\$ 1.674.189,14	R\$ 236.095,18	R\$ 1.910.284,32	R\$ 1.976.984,45	49,14
2	RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA								R\$ 34.412,30	R\$ 9.557,52	R\$ -	R\$ 9.557,52	R\$ 24.854,54	27,77
2.1	PAVIMENTAÇÃO													
2.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	31,41	31,41		31,41		R\$ 19,13	R\$ 600,87	R\$ 600,87	R\$ -	R\$ 600,87	R\$ -	100,00
2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	12,56			0,00	12,56	R\$ 1.807,72	R\$ 22.704,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.704,96	0,00
2.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	30,14			0,00	30,14	R\$ 8,00	R\$ 241,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241,12	0,00
2.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	219,82	219,82		219,82		R\$ 2,21	R\$ 485,80	R\$ 485,80	R\$ -	R\$ 485,80	R\$ -	100,00
2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	tckm	1648,65	1.648,65		1.648,65		R\$ 1,67	R\$ 2.753,25	R\$ 2.753,25	R\$ -	R\$ 2.753,25	R\$ -	100,00
2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	2260,80	1.356,30		1.356,30	904,50	R\$ 1,67	R\$ 3.775,54	R\$ 2.265,02	R\$ -	R\$ 2.265,02	R\$ 1.510,52	59,99
2.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	1507,20	904,20		904,20	603,00	R\$ 0,65	R\$ 994,75	R\$ 596,77	R\$ -	R\$ 596,77	R\$ 397,98	59,99
2.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	94,22	94,22		94,22		R\$ 30,31	R\$ 2.855,81	R\$ 2.855,81	R\$ -	R\$ 2.855,81	R\$ -	100,00
3	RUA JOÃO SILVEIRA								R\$ 220.711,88	R\$ 61.296,81	R\$ -	R\$ 61.296,85	R\$ 159.415,04	27,77
3.1	PAVIMENTAÇÃO													
3.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	201,40	201,40		201,40		R\$ 19,13	R\$ 3.852,78	R\$ 3.852,78	R\$ -	R\$ 3.852,78	R\$ -	100,00
3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	80,56			0,00	80,56	R\$ 1.807,72	R\$ 145.629,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.629,92	0,00
3.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	193,34			0,00	193,34	R\$ 8,00	R\$ 1.546,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.546,72	0,00
3.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1409,78	1.409,78		1.409,78		R\$ 2,21	R\$ 3.115,61	R\$ 3.115,61	R\$ -	R\$ 3.115,61	R\$ -	100,00
3.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	tckm	10573,35	10.573,35		10.573,35		R\$ 1,67	R\$ 17.657,49	R\$ 17.657,49	R\$ -	R\$ 17.657,49	R\$ -	100,00
3.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	14500,50	8.700,30		8.700,30	5.800,20	R\$ 1,67	R\$ 24.215,84	R\$ 14.529,50	R\$ -	R\$ 14.529,50	R\$ 9.686,34	60,00
3.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	9167,00	5.800,20		5.800,20	3.366,80	R\$ 0,66	R\$ 6.380,22	R\$ 3.828,13	R\$ -	R\$ 3.828,13	R\$ 2.552,09	60,00
3.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	604,20	604,20		604,20		R\$ 30,31	R\$ 18.313,30	R\$ 18.313,30	R\$ -	R\$ 18.313,30	R\$ -	100,00
4	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES								R\$ 134.523,02	R\$ 37.961,97	R\$ -	R\$ 37.961,97	R\$ 97.161,02	27,77
4.1	PAVIMENTAÇÃO													
4.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	122,76	122,76		122,76		R\$ 19,13	R\$ 2.348,40	R\$ 2.348,40	R\$ -	R\$ 2.348,40	R\$ -	100,00
4.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	49,10			0,00	49,10	R\$ 1.807,72	R\$ 88.750,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.750,05	0,00
4.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	117,84			0,00	117,84	R\$ 8,00	R\$ 942,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 942,72	0,00
4.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	859,30	859,30		859,30		R\$ 2,21	R\$ 1.899,05	R\$ 1.899,05	R\$ -	R\$ 1.899,05	R\$ -	100,00
4.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	tckm	6444,75	6.444,75		6.444,75		R\$ 1,67	R\$ 10.762,73	R\$ 10.762,73	R\$ -	R\$ 10.762,73	R\$ -	100,00
4.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	8838,30	5.303,10		5.303,10	3.535,20	R\$ 1,67	R\$ 14.759,96	R\$ 8.856,17	R\$ -	R\$ 8.856,17	R\$ 5.903,79	60,00
4.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	5892,20	3.535,40		3.535,40	2.356,80	R\$ 0,66	R\$ 3.888,85	R\$ 2.333,36	R\$ -	R\$ 2.333,36	R\$ 1.555,49	60,00
4.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	368,27	368,27		368,27		R\$ 30,31	R\$ 11.162,26	R\$ 11.162,26	R\$ -	R\$ 11.162,26	R\$ -	100,00
5	RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS								R\$ 55.423,08	R\$ 15.991,28	R\$ -	R\$ 15.991,28	R\$ 40.031,72	27,77
5.1	PAVIMENTAÇÃO													

ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
 TEIXEIRA:83019200415  
 ENGENHEIRO - NOVATEC

Assinado de forma digital por  
 ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
 TEIXEIRA:83019200415  
 Dados: 2025.07.15 11:35:37 -03'00'

FISCAL

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.					CONTRATO: 053/2024		Boletim de Medição ADITIVO : 03							
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.							Período: 01/07/2025 a 11/07/2025							
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Data de medição: 14/07/2025							
Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.								R\$ 3.887.268,77	R\$ 1.674.189,14	R\$ 236.095,16	R\$ 1.910.284,32	R\$ 1.976.984,45	49,14
2	RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA								R\$ 34.412,10	R\$ 9.557,52	R\$ -	R\$ 9.557,52	R\$ 24.854,54	27,77
2.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 19,13	R\$ 600,87	R\$ 600,87	R\$ 600,87	R\$ -	100,00
2.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	31,41	31,41		31,41			R\$ 19,13	R\$ 600,87	R\$ 600,87	R\$ 600,87	R\$ -	100,00
2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	12,56			12,56	12,56	1.807,72	R\$ 1.807,72	R\$ 22.704,96	R\$ -	R\$ 22.704,96	R\$ -	0,00
2.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	30,14			30,14		8,00	R\$ 8,00	R\$ 241,12	R\$ -	R\$ 241,12	R\$ -	0,00
2.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	219,82	219,82		219,82		2,21	R\$ 2,21	R\$ 485,80	R\$ 485,80	R\$ 485,80	R\$ -	100,00
2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	1648,65	1.648,65		1.648,65		1,67	R\$ 1,67	R\$ 2.753,25	R\$ 2.753,25	R\$ 2.753,25	R\$ -	100,00
2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	2260,80	1.356,30		1.356,30	904,50	1,67	R\$ 1,67	R\$ 3.775,54	R\$ 2.265,02	R\$ 2.265,02	R\$ 1.510,52	59,99
2.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkkm). af. 07/2020(asfalto)	tkkm	1507,20	904,20		904,20	603,00	0,66	R\$ 0,66	R\$ 994,75	R\$ 596,77	R\$ 596,77	R\$ 397,98	59,99
2.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	94,22	94,22		94,22		30,31	R\$ 30,31	R\$ 2.855,81	R\$ 2.855,81	R\$ 2.855,81	R\$ -	100,00
3	RUA JOÃO SILVEIRA								R\$ 220.711,88	R\$ 61.296,81	R\$ -	R\$ 61.296,81	R\$ 158.415,04	27,77
3.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 19,13	R\$ 3.852,78	R\$ 3.852,78	R\$ 3.852,78	R\$ -	100,00
3.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	201,40	201,40		201,40			R\$ 19,13	R\$ 3.852,78	R\$ 3.852,78	R\$ 3.852,78	R\$ -	100,00
3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	80,56			80,56	80,56	1.807,72	R\$ 1.807,72	R\$ 145.629,92	R\$ -	R\$ 145.629,92	R\$ -	0,00
3.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	193,34			193,34		8,00	R\$ 8,00	R\$ 1.546,72	R\$ -	R\$ 1.546,72	R\$ -	0,00
3.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1409,78	1.409,78		1.409,78		2,21	R\$ 2,21	R\$ 3.115,61	R\$ 3.115,61	R\$ 3.115,61	R\$ -	100,00
3.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	10573,35	10.573,35		10.573,35		1,67	R\$ 1,67	R\$ 17.657,49	R\$ 17.657,49	R\$ 17.657,49	R\$ -	100,00
3.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkkm	14500,50	8.700,30		8.700,30	5.800,20	1,67	R\$ 1,67	R\$ 24.215,84	R\$ 14.529,50	R\$ 14.529,50	R\$ 9.686,34	60,00
3.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkkm). af. 07/2020(asfalto)	tkkm	9667,00	5.800,20		5.800,20	3.866,80	0,66	R\$ 0,66	R\$ 6.380,22	R\$ 3.828,13	R\$ 3.828,13	R\$ 2.552,09	60,00
3.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	604,20	604,20		604,20		30,31	R\$ 30,31	R\$ 18.313,30	R\$ 18.313,30	R\$ 18.313,30	R\$ -	100,00
4	RUA JOSÉ VEIRA DE MENEZES								R\$ 134.523,02	R\$ 37.961,97	R\$ -	R\$ 37.961,97	R\$ 97.161,02	27,77
4.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 19,13	R\$ 2.348,40	R\$ 2.348,40	R\$ 2.348,40	R\$ -	100,00
4.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	122,76	122,76		122,76			R\$ 19,13	R\$ 2.348,40	R\$ 2.348,40	R\$ 2.348,40	R\$ -	100,00
4.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	49,10			49,10	49,10	1.807,72	R\$ 1.807,72	R\$ 88.759,05	R\$ -	R\$ 88.759,05	R\$ -	0,00
4.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	117,84			117,84		8,00	R\$ 8,00	R\$ 942,72	R\$ -	R\$ 942,72	R\$ -	0,00
4.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	859,30	859,30		859,30		2,21	R\$ 2,21	R\$ 1.899,05	R\$ 1.899,05	R\$ 1.899,05	R\$ -	100,00
4.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	6444,75	6.444,75		6.444,75		1,67	R\$ 1,67	R\$ 10.762,73	R\$ 10.762,73	R\$ 10.762,73	R\$ -	100,00
4.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkkm	8838,30	5.303,10		5.303,10	3.535,20	1,67	R\$ 1,67	R\$ 14.759,96	R\$ 8.856,17	R\$ 8.856,17	R\$ 5.903,79	60,00
4.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkkm). af. 07/2020(asfalto)	tkkm	3892,20	3.535,40		3.535,40	2.356,80	0,66	R\$ 0,66	R\$ 3.888,85	R\$ 2.333,36	R\$ 2.333,36	R\$ 1.555,49	60,00
4.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	368,27	368,27		368,27		30,31	R\$ 30,31	R\$ 11.162,26	R\$ 11.162,26	R\$ 11.162,26	R\$ -	100,00
5	RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS								R\$ 55.423,08	R\$ 15.391,28	R\$ -	R\$ 15.391,28	R\$ 40.031,72	27,77
5.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 19,13	R\$ 2.348,40	R\$ 2.348,40	R\$ 2.348,40	R\$ -	100,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415  
 ENGENHEIRO - NOVATEC  
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415  
 Dados: 2025.07.15 11:35:37 -03'00'

FISCAL

5.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	50,57	50,57	50,57	-	R\$ 19,13	R\$ 967,40	R\$ 967,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 967,40	R\$ -	100,00
5.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	20,23	-	0,00	20,23	R\$ 1.807,72	R\$ 36.570,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.570,18	0,00
5.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	48,55	-	0,00	48,55	R\$ 8,00	R\$ 388,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 388,40	0,00
5.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	353,99	353,99	353,99	-	R\$ 2,21	R\$ 782,32	R\$ 782,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 782,32	R\$ -	100,00
5.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	tckm	2654,93	2.654,93	2.654,93	-	R\$ 1,67	R\$ 4.433,73	R\$ 4.433,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.433,73	R\$ -	100,00
5.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	3641,10	2.184,60	2.184,60	1.456,50	R\$ 1,67	R\$ 6.080,64	R\$ 3.648,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.648,28	R\$ 2.432,36	60,00
5.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	2427,40	1.456,40	1.456,40	971,00	R\$ 0,66	R\$ 1.602,08	R\$ 961,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 961,22	R\$ 640,86	60,00
5.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	151,71	151,71	151,71	-	R\$ 30,31	R\$ 4.598,33	R\$ 4.598,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.598,33	R\$ -	100,00
<b>6</b>	<b>RUA EUCLIDES BISPO DOS SANTOS</b>													<b>0,00</b>
<b>6.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 63.286,15</b>	<b>R\$ 17.574,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.574,94</b>	<b>R\$ 45.711,15</b>	<b>27,77</b>
6.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	57,75	57,75	57,75	-	R\$ 19,13	R\$ 1.104,76	R\$ 1.104,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.104,76	R\$ -	100,00
6.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	23,10	-	0,00	23,10	R\$ 1.807,72	R\$ 41.758,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.758,33	0,00
6.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	55,44	-	0,00	55,44	R\$ 8,00	R\$ 443,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 443,52	0,00
6.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	404,20	404,20	404,20	-	R\$ 2,21	R\$ 893,28	R\$ 893,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 893,28	R\$ -	100,00
6.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	tckm	3031,50	3.031,50	3.031,50	-	R\$ 1,67	R\$ 5.062,61	R\$ 5.062,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.062,61	R\$ -	100,00
6.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	4157,70	2.494,50	2.494,50	1.663,20	R\$ 1,67	R\$ 6.943,36	R\$ 4.165,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.165,81	R\$ 2.777,55	60,00
6.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	2771,80	1.663,00	1.663,00	1.108,80	R\$ 0,66	R\$ 1.829,39	R\$ 1.097,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.097,58	R\$ 731,81	60,00
6.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	173,24	173,24	173,24	-	R\$ 30,31	R\$ 5.250,90	R\$ 5.250,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.250,90	R\$ -	100,00
<b>7</b>	<b>RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA</b>													<b>0,00</b>
<b>7.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 298.329,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.078,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.078,43</b>	<b>R\$ 270.251,10</b>	<b>9,41</b>
7.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	272,23	-	0,00	272,23	R\$ 19,13	R\$ 5.207,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.207,76	0,00
7.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	108,89	-	0,00	108,89	R\$ 1.807,72	R\$ 196.842,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.842,63	0,00
7.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	261,34	-	0,00	261,34	R\$ 8,00	R\$ 2.090,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.090,72	0,00
7.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1905,56	1.905,56	1.905,56	-	R\$ 2,21	R\$ 4.211,29	R\$ -	R\$ 4.211,29	R\$ -	R\$ 4.211,29	R\$ -	100,00
7.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	tckm	14291,70	14.291,70	14.291,70	-	R\$ 1,67	R\$ 23.867,14	R\$ -	R\$ 23.867,14	R\$ -	R\$ 23.867,14	R\$ -	100,00
7.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	19600,20	-	0,00	19.600,20	R\$ 1,67	R\$ 32.732,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.732,33	0,00
7.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	13066,80	-	0,00	13.066,80	R\$ 0,66	R\$ 8.624,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.624,09	0,00
7.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	816,68	-	0,00	816,68	R\$ 30,31	R\$ 24.753,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.753,57	0,00
<b>8</b>	<b>RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO</b>													<b>0,00</b>
<b>8.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 191.341,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 18.008,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 18.008,38</b>	<b>R\$ 173.332,89</b>	<b>9,41</b>
8.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	174,60	-	0,00	174,60	R\$ 19,13	R\$ 3.340,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.340,10	0,00
8.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	69,84	-	0,00	69,84	R\$ 1.807,72	R\$ 126.251,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.251,16	0,00
8.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	167,62	-	0,00	167,62	R\$ 8,00	R\$ 1.340,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.340,96	0,00
8.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1222,15	1.222,15	1.222,15	0,00	R\$ 2,21	R\$ 2.700,95	R\$ -	R\$ 2.700,94	R\$ -	R\$ 2.700,94	R\$ -	100,00
8.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	tckm	9166,13	9.166,13	9.166,13	0,00	R\$ 1,67	R\$ 15.307,44	R\$ -	R\$ 15.307,44	R\$ -	R\$ 15.307,44	R\$ -	100,00
8.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	12570,90	-	0,00	12.570,90	R\$ 1,67	R\$ 20.993,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.993,40	0,00
8.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	8380,60	-	0,00	8.380,60	R\$ 0,66	R\$ 5.531,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.531,20	0,00
8.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	523,79	-	0,00	523,79	R\$ 30,31	R\$ 15.876,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.876,07	0,00
<b>9</b>	<b>RUA GENIVALDO DE ARAÚJO</b>													<b>0,00</b>





16.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	365,75	-	365,75	365,75	-	R\$	30,31	R\$	11.085,88	R\$	-	R\$	11.085,88	R\$	11.085,88	R\$	-	100,00
<b>17</b>	<b>RUA PROF. MARINALVA</b>										<b>R\$ 99.941,75</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>19.441,88</b>	<b>R\$</b>	<b>19.441,88</b>	<b>R\$</b>	<b>80.499,87</b>	<b>19,45</b>
<b>17.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																			
17.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na carambal), exclusive transporte	m3	91,19	-	91,19	91,19	-	R\$	19,13	R\$	1.744,46	R\$	-	R\$	1.744,46	R\$	1.744,46	R\$	-	100,00
17.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	36,48	-	0,00	36,48	-	R\$	1.807,72	R\$	65.945,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	65.945,63	0,00
17.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	87,55	-	0,00	87,55	-	R\$	8,00	R\$	700,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	700,40	0,00
17.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	638,31	-	638,31	638,31	-	R\$	2,21	R\$	1.410,67	R\$	-	R\$	1.410,67	R\$	1.410,67	R\$	-	100,00
17.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	4.787,33	-	4.787,33	4.787,33	-	R\$	1,67	R\$	7.994,84	R\$	-	R\$	7.994,84	R\$	7.994,84	R\$	-	100,00
17.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	6565,80	-	0,00	6.565,80	-	R\$	1,67	R\$	10.964,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.964,89	0,00
17.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020(asfalto)	tkm	4377,20	-	0,00	4.377,20	-	R\$	0,66	R\$	2.888,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.888,95	0,00
17.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	273,57	-	273,57	273,57	-	R\$	30,31	R\$	8.291,91	R\$	-	R\$	8.291,91	R\$	8.291,91	R\$	-	100,00
<b>18</b>	<b>RUA PROJETADA 3</b>										<b>R\$ 98.958,86</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>98.958,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																			
18.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na carambal), exclusive transporte	m3	90,30	-	0,00	90,30	-	R\$	19,13	R\$	1.727,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.727,44	0,00
18.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	36,12	-	0,00	36,12	-	R\$	1.807,72	R\$	65.294,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	65.294,86	0,00
18.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	86,69	-	0,00	86,69	-	R\$	8,00	R\$	693,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	693,52	0,00
18.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	632,08	-	0,00	632,08	-	R\$	2,21	R\$	1.396,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.396,90	0,00
18.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	4.740,60	-	0,00	4.740,60	-	R\$	1,67	R\$	7.916,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.916,80	0,00
18.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	6501,60	-	0,00	6.501,60	-	R\$	1,67	R\$	10.857,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.857,67	0,00
18.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020(asfalto)	tkm	4334,40	-	0,00	4.334,40	-	R\$	0,66	R\$	2.860,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.860,70	0,00
18.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	270,90	-	0,00	270,90	-	R\$	30,31	R\$	8.210,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.210,98	0,00
<b>19</b>	<b>RUA SANDRA MOURA</b>										<b>R\$ 42.825,50</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>8.232,94</b>	<b>R\$</b>	<b>8.232,94</b>	<b>R\$</b>	<b>34.092,56</b>	<b>19,45</b>
<b>19.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																			
19.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na carambal), exclusive transporte	m3	38,62	-	38,62	38,62	-	R\$	19,13	R\$	738,80	R\$	-	R\$	738,80	R\$	738,80	R\$	-	100,00
19.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	15,45	-	0,00	15,45	-	R\$	1.807,72	R\$	27.929,27	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	27.929,27	0,00
19.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	37,08	-	0,00	37,08	-	R\$	8,00	R\$	296,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	296,64	0,00
19.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	270,29	-	270,29	270,29	-	R\$	2,21	R\$	597,34	R\$	-	R\$	597,34	R\$	597,34	R\$	-	100,00
19.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	2.027,18	-	2.027,18	2.027,18	-	R\$	1,67	R\$	3.385,39	R\$	-	R\$	3.385,39	R\$	3.385,39	R\$	-	100,00
19.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	2.780,40	-	0,00	2.780,40	-	R\$	1,67	R\$	4.643,27	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.643,27	0,00
19.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020(asfalto)	tkm	1.853,60	-	0,00	1.853,60	-	R\$	0,66	R\$	1.223,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.223,38	0,00
19.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	115,85	-	115,85	115,85	-	R\$	30,31	R\$	3.511,41	R\$	-	R\$	3.511,41	R\$	3.511,41	R\$	-	100,00
<b>20</b>	<b>RUA SEVERINO GERALDO</b>										<b>R\$ 54.462,47</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>10.594,16</b>	<b>R\$</b>	<b>10.594,16</b>	<b>R\$</b>	<b>43.868,310</b>	<b>19,45</b>
<b>20.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																			
20.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na carambal), exclusive transporte	m3	49,69	-	49,69	49,69	-	R\$	19,13	R\$	950,57	R\$	-	R\$	950,57	R\$	950,57	R\$	-	100,00
20.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	19,88	-	0,00	19,88	-	R\$	1.807,72	R\$	35.937,47	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	35.937,470	0,00
20.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	47,71	-	0,00	47,71	-	R\$	8,00	R\$	381,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	381,680	0,00

ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415  
Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415  
Dados: 2025.07.15 11:36:31 -03'00'

20.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	347,83	-	347,83	347,83	-	R\$	2,21	R\$	768,70	R\$	-	R\$	768,70	R\$	768,70	R\$	-	100,00	
20.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	tckm	2608,73	-	2.608,73	2.608,73	-	R\$	1,67	R\$	4.356,58	R\$	-	R\$	4.356,58	R\$	4.356,58	R\$	-	100,00	
20.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	3577,80	-	-	0,00	3.577,80	R\$	1,67	R\$	5.974,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.974,930	0,00	
20.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020(asfalto)	tckm	2385,20	-	-	0,00	2.385,20	R\$	0,66	R\$	1.574,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.574,230	0,00	
20.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusivo material de sub-base)	m²	149,07	-	149,07	149,07	-	R\$	30,31	R\$	4.518,31	R\$	-	R\$	4.518,31	R\$	4.518,31	R\$	-	100,00	
21	<b>TRAVESSA JOAQUIM ALVES</b>																				
21.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																				
21.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cambal), exclusivo transporte	m3	39,38	-	-	0,00	39,38	R\$	19,13	R\$	753,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	753,340	0,00	
21.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusivo carga e transporte. af. 11/2019	m3	15,75	-	-	0,00	15,75	R\$	1.807,72	R\$	28.471,59	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	28.471,590	0,00	
21.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020. CONCRETO ASFÁLTICO	t	37,80	-	-	0,00	37,80	R\$	8,00	R\$	302,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	302,400	0,00	
21.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	275,64	-	275,64	275,64	-	R\$	2,21	R\$	609,16	R\$	-	R\$	609,16	R\$	609,16	R\$	-	100,00	
21.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	tckm	2067,30	-	2.067,30	2.067,30	-	R\$	1,67	R\$	3.452,39	R\$	-	R\$	3.452,39	R\$	3.452,39	R\$	-	100,00	
21.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	7835,00	-	-	0,00	2.835,00	R\$	1,67	R\$	4.734,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.734,450	0,00	
21.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020(asfalto)	tckm	1890,00	-	-	0,00	1.890,00	R\$	0,66	R\$	1.247,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.247,400	0,00	
21.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusivo material de sub-base)	m²	118,13	-	-	0,00	118,13	R\$	30,31	R\$	3.580,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.580,520	0,00	
22	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO CONDOMÍNIO CHIARA</b>																				
22.1	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>																				
22.1.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af. 11/2019	m2	26320,81	26.320,81	26.320,81	-	R\$	3,10	R\$	81.594,51	R\$	81.594,51	R\$	-	R\$	-	R\$	81.594,51	R\$	-	100,00
22.1.2	Reforço do sub-leito	m3	1316,04	1.316,04	1.316,04	-	R\$	29,92	R\$	39.375,92	R\$	39.375,92	R\$	-	R\$	-	R\$	39.375,92	R\$	-	100,00
22.1.3	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusivo solo, escavação, carga e transporte. af. 11/2019	m3	4474,54	4.474,54	4.474,54	-	R\$	172,37	R\$	771.276,46	R\$	771.276,46	R\$	-	R\$	-	R\$	771.276,46	R\$	-	100,00
22.1.4	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cambal), exclusivo transporte	m3	5264,16	5.264,16	5.264,16	-	R\$	19,13	R\$	100.703,38	R\$	100.703,38	R\$	-	R\$	-	R\$	100.703,38	R\$	-	100,00
22.1.5	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³. SUB-BASE	tckm	63169,92	63.169,92	63.169,92	-	R\$	1,92	R\$	121.286,25	R\$	121.286,25	R\$	-	R\$	-	R\$	121.286,25	R\$	-	100,00
22.1.6	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusivo material de sub-base)	m²	5264,16	5.264,16	5.264,16	-	R\$	30,31	R\$	159.556,69	R\$	159.556,69	R\$	-	R\$	-	R\$	159.556,69	R\$	-	100,00
22.1.7	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusivo transporte	m3	2105,66	2.105,66	2.105,66	-	R\$	27,42	R\$	57.737,20	R\$	57.737,20	R\$	-	R\$	-	R\$	57.737,20	R\$	-	100,00
22.1.8	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³. BASE	tckm	31584,90	31.584,90	31.584,90	-	R\$	1,92	R\$	60.643,01	R\$	60.643,01	R\$	-	R\$	-	R\$	60.643,01	R\$	-	100,00
22.1.9	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	9212,28	9.212,28	9.212,28	-	R\$	2,21	R\$	20.359,14	R\$	20.359,14	R\$	-	R\$	-	R\$	20.359,14	R\$	-	100,00
22.1.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	tckm	69092,10	69.092,10	69.092,10	-	R\$	1,67	R\$	115.383,81	R\$	115.383,81	R\$	-	R\$	-	R\$	115.383,81	R\$	-	100,00
22.1.11	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020 (asfalto)	tckm	94754,88	-	0,00	94.754,88	-	R\$	1,67	R\$	158.240,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	158.240,650	0,00	
22.1.12	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020(asfalto)	tckm	63169,92	-	0,00	63.169,92	-	R\$	0,66	R\$	41.692,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41.692,150	0,00	
23	<b>DIVERSOS</b>																				
23.1	Melo-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), reunitado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4020,00	-	1.255,00	1.255,00	2.765,00	R\$	46,72	R\$	187.814,40	R\$	-	R\$	58.633,60	R\$	58.633,60	R\$	129.180,80	31,22	
23.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00	12,00	-	R\$	424,19	R\$	5.090,28	R\$	5.090,28	R\$	-	R\$	-	R\$	5.090,28	R\$	-	100,00
<b>VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO</b>										<b>R\$</b>	<b>3.887.268,77</b>	<b>R\$</b>	<b>1.674.189,14</b>	<b>R\$</b>	<b>236.095,18</b>	<b>R\$</b>	<b>1.910.284,32</b>	<b>R\$</b>	<b>1.976.984,45</b>	<b>49,14</b>	
<b>PERCENTUAL</b>											<b>100%</b>		<b>43,00%</b>		<b>6,07%</b>		<b>49,14%</b>		<b>50,86%</b>		

ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415  
ENGENHEIRO - NOVATEC

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415  
Dados: 2025.07.15 11:36:42 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
DIEGO OLIVEIRA BARROS  
Data: 18/07/2025 09:21:23-0300  
Verifique em https://validar.it.gov.br

FISCAL



Documento assinado digitalmente  
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ  
Data: 18/07/2025 09:16:40-0300  
Verifique em https://validar.it.gov.br





















OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	12	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS
ITEM:	12.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	12.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
	0,05			2229,70	m3	111,49
<b>EXECUTADO NO PERÍODO:</b>					m3	111,49
<b>ACUMULADO ANTERIOR:</b>					m3	-
<b>ACUMULADO ATUAL:</b>					m3	111,49
<b>CONTRATO:</b>					m3	111,49
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>					total	
<b>A MEDIR NO PERÍODO:</b>					m3	111,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	12	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS
ITEM:	12.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	12.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	AREA	ESP.	VOLUME	m3	TOTAL
		2229,70	0,350		780,40

EXECUTADO NO PERÍODO:	m3	780,40
ACUMULADO ANTERIOR:	m3	-
ACUMULADO ATUAL:	m3	780,40
CONTRATO:	m3	780,40
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		780,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
 CONTRATO: 053/2024



OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	12	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS
ITEM:	12.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	12.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
	0,15			2229,70	m3	334,46
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	334,46
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	334,46
CONTRATO:					m3	334,46
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					total	
À MEDIR NO PERÍODO:					m <sup>3</sup>	334,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	13	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	13.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	13.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	AREA	ESP.	VOLUME	m3	TOTAL
	1507,610	0,350	527,66		527,66

EXECUTADO NO PERÍODO:	m3	527,66
ACUMULADO ANTERIOR:	m3	-
ACUMULADO ATUAL:	m3	527,66
CONTRATO:	m3	527,66
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		527,66

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 053/2024







OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	14	RUA JOSEFINA EPIFANIA
ITEM:	14.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	14.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	VOLUME	EMP.	DIST		TOTAL
	260,37	1,50	5,00	tkm	1952,78

EXECUTADO NO PERÍODO:				tkm	1.952,78
ACUMULADO ANTERIOR:				tkm	-
ACUMULADO ATUAL:				tkm	1.952,78
CONTRATO:				tkm	1.952,78
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				tkm	1.952,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

















OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	17.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	AREA	ESP.	VOLUME	m3	TOTAL
		1823,750	0,350		638,31
<b>EXECUTADO NO PERÍODO:</b>				m3	<b>638,31</b>
<b>ACUMULADO ANTERIOR:</b>				m3	-
<b>ACUMULADO ATUAL:</b>				m3	<b>638,31</b>
<b>CONTRATO:</b>				m3	<b>638,31</b>
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>				total	-
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>					<b>638,31</b>

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
 CONTRATO: 053/2024



OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	17.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
	0,15			1823,75	m3	273,57
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	273,57
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	273,57
CONTRATO:					m3	273,57
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					total	
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	273,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO



**OBRA:** Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos  
**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA SANDRA MOURA
ITEM:	19.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	AREA	ESP.	VOLUME	m3	TOTAL
		772,260	0,350		270,29

EXECUTADO NO PERÍODO:		m3	270,29
ACUMULADO ANTERIOR:		m3	-
ACUMULADO ATUAL:		m3	270,29
CONTRATO:		m3	270,29
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			270,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
 CONTRATO: 053/2024





OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 20 RUA SEVERINO GERALDO

ITEM: 20.1 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 20.1.1 Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
	0,05			993,79	m3	49,69
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	49,69
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	49,69
CONTRATO:					m3	49,69
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					total	
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	49,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO



OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	20	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	20.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	20.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.	
	Quantidade			tkm	Total	
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	VOLUME	EMP.	DIST		TOTAL	
	347,83	1,50	5,00	tkm	2608,73	
<b>EXECUTADO NO PERÍODO:</b>					tkm	<b>2.608,73</b>
<b>ACUMULADO ANTERIOR:</b>					tkm	-
<b>ACUMULADO ATUAL:</b>					tkm	<b>2.608,73</b>
<b>CONTRATO:</b>					tkm	<b>2.608,73</b>
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>					Total	-
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>					tkm	<b>2.608,73</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 20 RUA SEVERINO GERALDO

ITEM: 20.1 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 20.1.8 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
	0,15			993,79	m3	149,07
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	149,07
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	149,07
CONTRATO:					m3	149,07
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					total	
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	149,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO





OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	23	DIVERSOS
ITEM:	23.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

N			
SERVIÇO	VALORES	UNID.	QUANT.
	Quantidade	m	Total
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPRIMENTO		TOTAL
RUA JOÃO SILVEIRA	530,00	M	
RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES	560,00	M	
RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA	165,00	M	
			1255,00

EXECUTADO NO PERÍODO:		m2	1.255,000
ACUMULADO ANTERIOR:		m2	-
ACUMULADO ATUAL:		m2	1.255,000
CONTRATO:		m2	4.020,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m	1.255,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

gov.br Documento assinado digitalmente  
 RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ  
 Data: 24/07/2025 10:45:13-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415  
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415  
 Dados: 2025.07.24 10:24:01 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente  
 DIEGO OLIVEIRA BARROS  
 Data: 24/07/2025 10:35:11-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 053/2024



EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

RELATÓRIO FOTOGRAFICO - BM 03 ADITIVO

RUA SEVERINO GERALDO



RUA LUIZ GONZAGA 16



RUA JOÃO TAVARES DE JESUS



RUA JOSINA EPIFANIA 14




RUA SANDRA MOURA



RUA SANDRA MOURA 19






RUA SANDRA MOURA 19

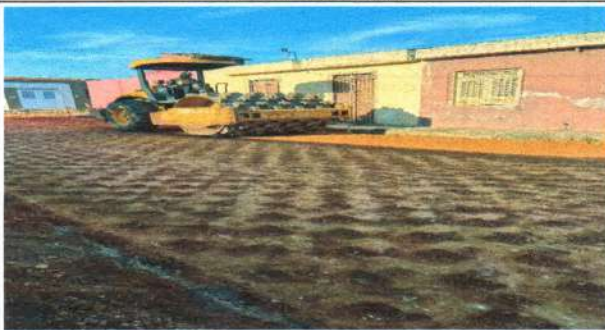

RUA SANDRA MOURA 19



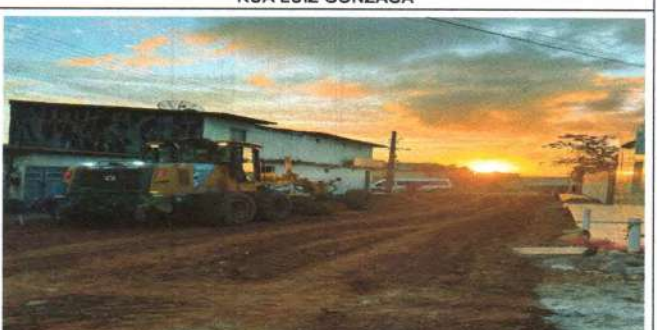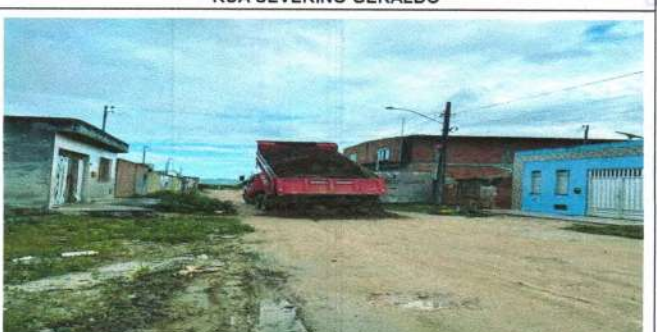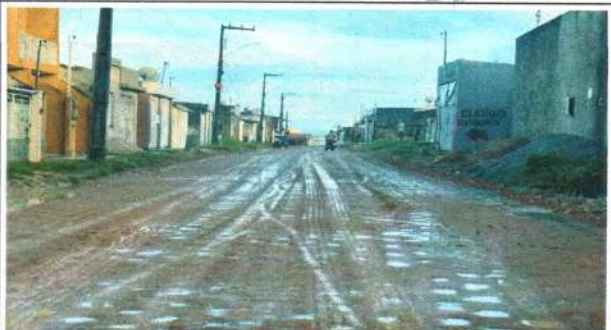

12 RUA PROF. MARINALVA



PLACA DA OBRA



21 TRAVESSA JOAQUIM ALVES



15 RUA LEDA MOURA



13 RUA JOSÉ NICOLAU



11 RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA



10 RUA GLEIDE SELMA



9 RUA GENIVALDO DE ARAUJO



8 RUA JOSÉ BELO DE ARAUJO



7 RUA EPITACIO JOSÉ DA SILVA



RUA JOÃO SILVEIRA (EXECUÇÃO DE MEIO FIO)



RUA JOÃO SILVEIRA (EXECUÇÃO DE MEIO FIO)



RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA (EXECUÇÃO DE MEIO FIO)



RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES (EXECUÇÃO DE MEIO FIO)



RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES (EXECUÇÃO DE MEIO FIO)



RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES (EXECUÇÃO DE MEIO FIO)



RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES (EXECUÇÃO DE MEIO FIO)



RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES (EXECUÇÃO DE MEIO FIO)





gov.br Documento assinado digitalmente  
 RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ  
 Data: 25/07/2025 12:17:44-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente  
 DIEGO OLIVEIRA BARROS  
 Data: 25/07/2025 12:14:37-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEXANDRE  
 ALBUQUERQUE  
 TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por  
 ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
 TEIXEIRA:83019200415  
 Dados: 2025.07.25 11:41:40  
 -03'00'
