

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO A PARELELEPIPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA</b>							883.686,28	495.306,55	162.907,18	658.213,71	225.472,57	74,48
<b>01.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							8.672,52	4.336,26	854,00	5.190,26	3.482,26	59,85
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	6,00		6,00	295,71	3.548,52	1.774,26	-	1.774,26	1.774,26	50,00
01.001.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	3,00	1,00	4,00	854,00	5.124,00	2.562,00	854,00	3.416,00	1.708,00	66,67
<b>01.002</b>	<b>TRAVESSA JOSÉ PEREIRA</b>							45.958,79	35.012,29	-	35.012,29	10.946,50	76,18
<b>01.002.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							1.796,33	1.461,12	-	1.461,12	335,21	81,34
01.002.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	473,61	374,10		374,10	1,22	577,80	456,40	-	456,40	121,40	78,99
01.002.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	503,13	414,85		414,85	0,95	477,97	394,11	-	394,11	83,86	82,45
01.002.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	157,23	129,64		129,64	0,81	127,36	105,01	-	105,01	22,35	82,45
01.002.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	471,69	388,92		388,92	1,30	613,20	505,60	-	505,60	107,60	82,45
<b>01.002.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							39.992,65	29.575,54	-	29.575,54	10.417,11	73,95
01.002.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	414,56	292,60		292,60	70,93	29.404,74	20.754,12	-	20.754,12	8.650,62	70,58
01.002.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	196,82	196,82		196,82	29,65	5.835,71	5.835,71	-	5.835,71	-	100,00
01.002.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	196,82	-		-	2,91	572,75	-	-	-	572,75	-
01.002.002.004	Colchão de areia	m3	29,02	20,78		20,78	120,62	3.500,39	2.506,48	-	2.506,48	993,91	71,81
01.002.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	522,35	368,64		368,64	1,30	679,06	479,23	-	479,23	199,83	70,57
<b>01.002.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							3.975,63	3.975,63	-	3.975,63	-	100,00
01.002.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	56,05	56,05		56,05	70,93	3.975,63	3.975,63	-	3.975,63	-	100,00
<b>01.002.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							194,18	-	-	-	194,18	-
01.002.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	473,61	-		-	0,41	194,18	-	-	-	194,18	-
<b>01.003</b>	<b>RUA JOSÉ PAULO VIEIRA</b>							51.224,97	43.470,47	-	43.470,47	7.754,50	84,86
<b>01.003.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							2.025,89	1.726,25	-	1.726,25	299,64	85,21
01.003.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	538,08	456,00		456,00	1,22	656,46	556,32	-	556,32	100,14	84,75
01.003.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	565,44	483,06		483,06	0,95	537,17	458,91	-	458,91	78,26	85,43
01.003.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	176,79	150,96		150,96	0,81	143,13	122,28	-	122,28	20,85	85,43

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CRETE/SE 272029054  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Dr. Karlo Neri Alfano Junior  
Engenheiro Civil  
PDC/ACC. 1996/2001

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.003.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	530,10	452,88		452,88	1,30	689,13	588,74	-	588,74	100,39	85,43
<b>01.003.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>45.097,18</b>	<b>37.905,49</b>	-	<b>37.905,49</b>	<b>7.191,69</b>	<b>84,05</b>
01.003.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	483,36	401,88		401,88	70,93	34.284,72	28.505,35	-	28.505,35	5.779,37	83,14
01.003.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	182,40	180,40		180,40	29,65	5.408,16	5.348,86	-	5.348,86	59,30	98,90
01.003.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	182,40	-		-	2,91	530,78	-	-	-	530,78	-
01.003.002.004	Colchão de areia	m3	33,84	28,13		28,13	120,62	4.081,78	3.393,04	-	3.393,04	688,74	83,13
01.003.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	609,03	506,34		506,34	1,30	791,74	658,24	-	658,24	133,50	83,14
<b>01.003.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>3.881,29</b>	<b>3.838,73</b>	-	<b>3.838,73</b>	<b>42,56</b>	<b>98,90</b>
01.003.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	54,72	54,12		54,12	70,93	3.881,29	3.838,73	-	3.838,73	42,56	98,90
<b>01.003.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>220,61</b>	-	-	-	<b>220,61</b>	-
01.003.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	538,08	-		-	0,41	220,61	-	-	-	220,61	-
<b>01.004</b>	<b>RUA MARIA VALDETE ARAUJO SANTOS</b>							<b>48.711,92</b>	<b>41.860,73</b>	-	<b>41.860,73</b>	<b>6.851,19</b>	<b>85,94</b>
<b>01.004.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.954,87</b>	<b>1.690,80</b>	-	<b>1.690,80</b>	<b>264,07</b>	<b>86,49</b>
01.004.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	522,59	449,82		449,82	1,22	637,56	548,78	-	548,78	88,78	86,08
01.004.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	543,92	471,54		471,54	0,95	516,72	447,96	-	447,96	68,76	86,69
01.004.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	169,98	147,36		147,36	0,81	137,68	119,36	-	119,36	18,32	86,69
01.004.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	509,93	442,08		442,08	1,30	662,91	574,70	-	574,70	88,21	86,69
<b>01.004.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>43.516,92</b>	<b>37.144,06</b>	-	<b>37.144,06</b>	<b>6.372,86</b>	<b>85,36</b>
01.004.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	479,93	406,38		406,38	70,93	34.041,43	28.824,53	-	28.824,53	5.216,90	84,67
01.004.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	142,40	142,40		142,40	29,65	4.222,16	4.222,16	-	4.222,16	-	100,00
01.004.002.003	Pintura de meio fio (caiação)						2,91	414,38	-	-	-	414,38	-

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CRECA/SE 2720739-54  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mário Neri Alfano Junior  
Engenheiro Civil  
CRECA/SE - 17900000

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.004.002.004	Colchão de areia	m3	33,60	28,45		28,45	120,62	4.052,83	3.431,64	-	3.431,64	621,19	84,67
01.004.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	604,71	512,10		512,10	1,30	786,12	665,73	-	665,73	120,39	84,89
<b>01.004.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>3.025,87</b>	<b>3.025,87</b>	-	<b>3.025,87</b>	-	<b>100,00</b>
01.004.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	42,66	42,66		42,66	70,93	3.025,87	3.025,87	-	3.025,87	-	100,00
<b>01.004.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>214,26</b>	-	-	-	<b>214,26</b>	-
01.004.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	522,59	-		-	0,41	214,26	-	-	-	214,26	-
<b>01.005</b>	<b>TRAVESSA PROJETADA</b>							<b>4.839,35</b>	-	-	-	<b>4.839,35</b>	-
<b>01.005.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>168,21</b>	-	-	-	<b>168,21</b>	-
01.005.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	42,00	-		-	1,22	51,24	-	-	-	51,24	-
01.005.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	48,30	-		-	0,95	45,89	-	-	-	45,89	-
01.005.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	15,09	-		-	0,81	12,22	-	-	-	12,22	-
01.005.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	45,28	-		-	1,30	58,86	-	-	-	58,86	-
<b>01.005.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>3.760,20</b>	-	-	-	<b>3.760,20</b>	-
01.005.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	29,40	-		-	70,93	2.085,34	-	-	-	2.085,34	-
01.005.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	42,00	-		-	29,65	1.245,30	-	-	-	1.245,30	-
01.005.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	42,00	-		-	2,91	122,22	-	-	-	122,22	-
01.005.002.004	Colchão de areia	m3	2,06	-		-	120,62	248,48	-	-	-	248,48	-
01.005.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	45,28	-		-	1,30	58,86	-	-	-	58,86	-
<b>01.005.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>893,72</b>	-	-	-	<b>893,72</b>	-
01.005.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	12,60	-		-	70,93	893,72	-	-	-	893,72	-
<b>01.005.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>17,22</b>	-	-	-	<b>17,22</b>	-
01.005.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	42,00	-		-	0,41	17,22	-	-	-	17,22	-
<b>01.006</b>	<b>TRAVESSA ZÉ DE PIXITITA</b>							<b>45.788,70</b>	-	-	-	<b>39.467,06</b>	<b>86,19</b>

Jose Robson Santos da Paixão -  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01.006.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							1.723,77	-	1.555,64	1.555,64	168,13	90,25
01.006.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	447,57	-	376,16	376,16	1,22	546,04	-	458,92	458,92	87,12	84,05
01.006.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	486,29	-	452,84	452,84	0,95	461,98	-	430,20	430,20	31,78	93,12
01.006.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	151,96	-	141,51	141,51	0,81	123,09	-	114,62	114,62	8,47	93,12
01.006.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	455,89	-	424,54	424,54	1,30	592,66	-	551,90	551,90	40,76	93,12
<b>01.006.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							38.389,32	-	32.472,51	32.472,51	5.916,81	84,59
01.006.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	370,14	-	307,29	307,29	70,93	26.254,03	-	21.796,08	21.796,08	4.457,95	83,02
01.006.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	258,10	-	255,60	255,60	29,65	7.652,67	-	7.578,54	7.578,54	74,13	99,03
01.006.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	258,10	-	-	-	2,91	751,07	-	-	-	751,07	-
01.006.002.004	Colchão de areia	m3	25,91	-	21,51	21,51	120,62	3.125,26	-	2.594,54	2.594,54	530,72	83,02
01.006.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	466,38	-	387,19	387,19	1,30	606,29	-	503,35	503,35	102,94	83,02
<b>01.006.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							5.492,11	-	5.438,91	5.438,91	53,20	99,03
01.006.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	77,43	-	76,68	76,68	70,93	5.492,11	-	5.438,91	5.438,91	53,20	99,03
<b>01.006.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							183,50	-	-	-	183,50	-
01.006.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	447,57	-	-	-	0,41	183,50	-	-	-	183,50	-
<b>01.007</b>	<b>TRAVESSA JOSÉ SIZINIO DE ALMEIDA 4</b>							51.189,08	42.740,83	-	42.740,83	8.448,25	83,50
<b>01.007.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							2.016,78	1.689,21	-	1.689,21	327,57	83,76
01.007.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	534,32	443,94		443,94	1,22	651,87	541,61	-	541,61	110,26	83,09
01.007.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	563,57	473,84		473,84	0,95	535,39	450,15	-	450,15	85,24	84,08
01.007.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	176,12	148,08		148,08	0,81	142,66	119,94	-	119,94	22,72	84,07
01.007.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	528,35	444,24		444,24	1,30	686,86	577,51	-	577,51	109,35	84,08
<b>01.007.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							44.803,82	36.902,21	-	36.902,21	7.901,61	82,36

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720299954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Luiz Mario Neri Alfano Junior  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 37444/2010

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE

PERÍODO: 14/01/2023 A 14/02/2023

DATA: 20/02/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.007.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	475,82	384,15		384,15	70,93	33.749,91	27.247,76	-	27.247,76	6.502,15	80,73
01.007.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	195,00	195,00		195,00	29,65	5.781,75	5.781,75	-	5.781,75	-	100,00
01.007.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	195,00	-		-	2,91	567,45	-	-	-	567,45	-
01.007.002.004	Colchão de areia	m3	33,31	26,89		26,89	120,62	4.017,85	3.243,47	-	3.243,47	774,38	80,73
01.007.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	528,35	484,02		484,02	1,30	686,86	629,23	-	629,23	57,63	91,61
<b>01.007.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>4.149,41</b>	<b>4.149,41</b>	<b>-</b>	<b>4.149,41</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
01.007.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	58,50	58,50		58,50	70,93	4.149,41	4.149,41	-	4.149,41	-	100,00
<b>01.007.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>219,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>219,07</b>	<b>-</b>
01.007.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	534,32	-		-	0,41	219,07	-	-	-	219,07	-
<b>01.008</b>	<b>TRAVESSA MURINO JOSÉ DA SILVA</b>							<b>170.622,50</b>	<b>150.204,47</b>	<b>8.671,90</b>	<b>158.876,35</b>	<b>11.746,15</b>	<b>93,12</b>
<b>01.008.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>6.815,50</b>	<b>6.037,51</b>	<b>415,11</b>	<b>6.452,61</b>	<b>362,89</b>	<b>94,68</b>
01.008.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.818,17	1.604,74	<b>80,86</b>	1.685,60	1,22	2.218,17	1.957,78	98,65	2.056,43	161,74	92,71
01.008.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	1.898,26	1.684,54	<b>130,68</b>	1.815,22	0,95	1.803,35	1.600,31	124,15	1.724,46	78,89	95,63
01.008.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	593,20	526,42	<b>40,83</b>	567,25	0,81	480,49	426,40	33,07	459,47	21,02	95,63
01.008.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.779,61	1.579,25	<b>122,49</b>	1.701,74	1,30	2.313,49	2.053,03	159,24	2.212,26	101,23	95,62
<b>01.008.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>151.700,69</b>	<b>132.846,53</b>	<b>8.256,79</b>	<b>141.103,31</b>	<b>10.597,38</b>	<b>93,01</b>
01.008.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.658,00	1.445,14	<b>101,91</b>	1.547,05	70,93	117.601,94	102.503,78	7.228,48	109.732,26	7.869,68	93,31
01.008.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	533,90	532,00		532,00	29,65	15.830,14	15.773,80	-	15.773,80	56,34	99,64
01.008.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	533,90	-		-	2,91	1.553,65	-	-	-	1.553,65	-
01.008.002.004	Colchão de areia	m3	116,06	101,16	<b>7,14</b>	108,30	120,62	13.999,16	12.201,92	861,23	13.063,15	936,01	93,31
01.008.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.820,79	1.820,79	<b>128,52</b>	1.949,31	1,30	2.715,80	2.367,03	167,08	2.534,10	181,70	93,31

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CRE 002.087/2023-9954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Lázaro Ricardo Neri Alfano Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 07904627

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE

PERÍODO: 14/01/2023 A 14/02/2023

DATA: 20/02/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01.008.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							11.360,86	11.320,43	-	11.320,43	40,43	99,64
01.008.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	160,17	159,60		159,60	70,93	11.360,86	11.320,43	-	11.320,43	40,43	99,64
<b>01.008.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							745,45	-	-	-	745,45	-
01.008.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.818,17	-		-	0,41	745,45	-	-	-	745,45	-
<b>01.009</b>	<b>PROLONGAMENTO DA RUA MONSENHOR CONSTANTINO</b>							63.001,32	62.264,24	-	62.264,24	737,08	98,83
<b>01.009.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							2.553,66	2.553,66	-	2.553,66	-	100,00
01.009.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	685,56	685,56		685,56	1,22	836,38	836,38	-	836,38	-	100,00
01.009.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	709,07	709,07		709,07	0,95	673,62	673,62	-	673,62	-	100,00
01.009.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	221,58	221,58		221,58	0,81	179,48	179,48	-	179,48	-	100,00
01.009.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	664,75	664,75		664,75	1,30	864,18	864,18	-	864,18	-	100,00
<b>01.009.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							56.832,16	56.376,16	-	56.376,16	456,00	99,20
01.009.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	638,55	638,55		638,55	70,93	45.292,35	45.292,35	-	45.292,35	-	100,00
01.009.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	156,70	156,70		156,70	29,65	4.646,16	4.646,16	-	4.646,16	-	100,00
01.009.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	156,70	-		-	2,91	456,00	-	-	-	456,00	-
01.009.002.004	Colchão de areia	m3	44,70	44,70		44,70	120,62	5.391,71	5.391,71	-	5.391,71	-	100,00
01.009.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	804,57	804,57		804,57	1,30	1.045,94	1.045,94	-	1.045,94	-	100,00
<b>01.009.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							3.334,42	3.334,42	-	3.334,42	-	100,00
01.009.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	47,01	47,01		47,01	70,93	3.334,42	3.334,42	-	3.334,42	-	100,00
<b>01.009.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							281,08	-	-	-	281,08	-
01.009.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	685,56	-		-	0,41	281,08	-	-	-	281,08	-
<b>01.010</b>	<b>TRAVESSA PROJETADA</b>							41.971,24	38.977,98	-	38.977,98	2.993,26	92,87
<b>01.010.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							1.664,95	1.566,23	-	1.566,23	98,72	94,07
01.010.001.001	Locação de serviços de pavimentação					414,96	1,22	540,22	506,26	-	506,26	33,96	93,71

José Robson Santos da Pinheiro  
Eng. Civil - CREA/PE 2720299954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Luiz Ricardo Neri Alfano Junior  
Engenheiro Civil  
CREA/PE- 170740222

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE

PERÍODO: 14/01/2023 A 14/02/2023

DATA: 20/02/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.010.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	464,40	437,66		437,66	0,95	441,18	415,78	-	415,78	25,40	94,24
01.010.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	145,13	136,77		136,77	0,81	117,56	110,78	-	110,78	6,78	94,23
01.010.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	435,38	410,31		410,31	1,30	565,99	533,40	-	533,40	32,59	94,24
<b>01.010.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>37.060,56</b>	<b>34.347,57</b>	-	<b>34.347,57</b>	<b>2.712,99</b>	<b>92,68</b>
01.010.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	399,60	371,28		371,28	70,93	28.343,63	26.334,89	-	26.334,89	2.008,74	92,91
01.010.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	144,00	144,00		144,00	29,65	4.269,60	4.269,60	-	4.269,60	-	100,00
01.010.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	144,00	-		-	2,91	419,04	-	-	-	419,04	-
01.010.002.004	Colchão de areia	m3	27,97	25,99		25,99	120,62	3.373,74	3.134,91	-	3.134,91	238,83	92,92
01.010.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	503,50	467,82		467,82	1,30	654,55	608,17	-	608,17	46,38	92,91
<b>01.010.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>3.064,18</b>	<b>3.064,18</b>	-	<b>3.064,18</b>	-	<b>100,00</b>
01.010.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	43,20	43,20		43,20	70,93	3.064,18	3.064,18	-	3.064,18	-	100,00
<b>01.010.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>181,55</b>	-	-	-	<b>181,55</b>	-
01.010.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	442,80	-		-	0,41	181,55	-	-	-	181,55	-
<b>01.011</b>	<b>PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ SIZINIO DE ALMEIDA</b>							<b>31.046,92</b>	<b>30.595,07</b>	-	<b>30.595,07</b>	<b>450,85</b>	<b>98,55</b>
<b>01.011.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.229,37</b>	<b>1.229,37</b>	-	<b>1.229,37</b>	-	<b>100,00</b>
01.011.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	326,70	326,70		326,70	1,22	398,57	398,57	-	398,57	-	100,00
01.011.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	343,04	343,04		343,04	0,95	325,89	325,89	-	325,89	-	100,00
01.011.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	107,20	107,20		107,20	0,81	86,83	86,83	-	86,83	-	100,00
01.011.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	321,60	321,60		321,60	1,30	418,08	418,08	-	418,08	-	100,00
<b>01.011.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>27.365,32</b>	<b>27.048,42</b>	-	<b>27.048,42</b>	<b>316,90</b>	<b>98,84</b>
01.011.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	294,03	294,03		294,03	70,93	20.855,55	20.855,55	-	20.855,55	-	100,00

Jose Robinson Paixão da Paixão  
Eng. Civil - CREMISE 272029954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Laiz Mario Neri Alfano Junior  
Engenheiro Civil  
CREMISE 272029954

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE

PERÍODO: 14/01/2023 A 14/02/2023

DATA: 20/02/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.011.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	108,90	108,90		108,90	29,65	3.228,89	3.228,89	-	3.228,89	-	100,00
01.011.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	108,90	-		-	2,91	316,90	-	-	-	316,90	-
01.011.002.004	Colchão de areia	m3	20,58	20,58		20,58	120,62	2.482,36	2.482,36	-	2.482,36	-	100,00
01.011.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	370,48	370,48		370,48	1,30	481,62	481,62	-	481,62	-	100,00
<b>01.011.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>2.317,28</b>	<b>2.317,28</b>	-	<b>2.317,28</b>	-	<b>100,00</b>
01.011.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	32,67	32,67		32,67	70,93	2.317,28	2.317,28	-	2.317,28	-	100,00
<b>01.011.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>133,95</b>	-	-	-	<b>133,95</b>	-
01.011.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	326,70	-		-	0,41	133,95	-	-	-	133,95	-
<b>01.012</b>	<b>RUA VICE PREFEITO JOSIAS DA SILVA NUNES</b>							<b>20.427,43</b>	<b>19.853,53</b>	-	<b>19.853,53</b>	<b>573,90</b>	<b>97,19</b>
<b>01.012.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>810,54</b>	<b>800,52</b>	-	<b>800,52</b>	<b>10,02</b>	<b>98,76</b>
01.012.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	215,40	212,89		212,89	1,22	262,79	259,73	-	259,73	3,06	98,84
01.012.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	226,17	223,29		223,29	0,95	214,86	212,13	-	212,13	2,73	98,73
01.012.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	70,68	69,78		69,78	0,81	57,25	56,52	-	56,52	0,73	98,72
01.012.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	212,03	209,34		209,34	1,30	275,64	272,14	-	272,14	3,50	98,73
<b>01.012.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>18.000,75</b>	<b>17.578,38</b>	-	<b>17.578,38</b>	<b>422,37</b>	<b>97,65</b>
01.012.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	193,86	192,10		192,10	70,93	13.750,49	13.625,65	-	13.625,65	124,84	99,09
01.012.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	71,80	69,30		69,30	29,65	2.128,87	2.054,75	-	2.054,75	74,12	96,52
01.012.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	71,80	-		-	2,91	208,94	-	-	-	208,94	-
01.012.002.004	Colchão de areia	m3	13,57	13,45		13,45	120,62	1.636,81	1.622,34	-	1.622,34	14,47	99,12
01.012.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	212,03	212,03		212,03	1,30	275,64	275,64	-	275,64	-	100,00
<b>01.012.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>1.527,83</b>	<b>1.474,63</b>	-	<b>1.474,63</b>	<b>53,20</b>	<b>96,52</b>

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CRETE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Luiz Mario Nori Alfano Junior  
Engenheiro Civil  
CRETE 2720298954

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 156/2022

B.M.Nº. 04/2023

ORDEM DE SERVIÇO: 21/09/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE

PERÍODO: 14/01/2023 A 14/02/2023

DATA: 20/02/2023



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.012.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	21,54	20,79		20,79	70,93	1.527,83	1.474,63	-	1.474,63	53,20	96,52
<b>01.012.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>88,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88,31</b>	<b>-</b>
01.012.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	215,40	-		-	0,41	88,31	-	-	-	88,31	-
<b>01.013</b>	<b>RUA JOSÉ VENCESLAU</b>							<b>84.169,39</b>	<b>-</b>	<b>82.398,88</b>	<b>82.398,88</b>	<b>1.770,51</b>	<b>97,90</b>
<b>01.013.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>3.336,91</b>	<b>-</b>	<b>3.332,96</b>	<b>3.332,96</b>	<b>3,95</b>	<b>99,88</b>
01.013.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	887,24	-	<b>887,24</b>	887,24	1,22	1.082,43	-	1.082,43	1.082,43	-	100,00
01.013.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	930,88	-	<b>929,25</b>	929,25	0,95	884,34	-	882,79	882,79	1,55	99,82
01.013.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	290,90	-	<b>290,39</b>	290,39	0,81	235,63	-	235,22	235,22	0,41	99,83
01.013.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	872,70	-	<b>871,17</b>	871,17	1,30	1.134,51	-	1.132,52	1.132,52	1,99	99,82
<b>01.013.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>74.278,65</b>	<b>-</b>	<b>73.106,38</b>	<b>73.106,38</b>	<b>1.172,27</b>	<b>98,42</b>
01.013.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	799,97	-	<b>799,92</b>	799,92	70,93	56.741,87	-	56.738,33	56.738,33	3,54	99,99
01.013.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	290,90	-	<b>280,08</b>	280,08	29,65	8.625,19	-	8.304,37	8.304,37	320,82	96,28
01.013.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	290,90	-	-	-	2,91	846,52	-	-	-	846,52	-
01.013.002.004	Colchão de areia	m3	56,00	-	<b>55,99</b>	55,99	120,62	6.754,72	-	6.753,51	6.753,51	1,21	99,98
01.013.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.007,96	-	<b>1007,82</b>	1.007,82	1,30	1.310,35	-	1.310,17	1.310,17	0,18	99,99
<b>01.013.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>6.190,06</b>	<b>-</b>	<b>5.959,54</b>	<b>5.959,54</b>	<b>230,52</b>	<b>96,28</b>
01.013.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	87,27	-	<b>84,02</b>	84,02	70,93	6.190,06	-	5.959,54	5.959,54	230,52	96,28
<b>01.013.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>363,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>363,77</b>	<b>-</b>
01.013.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	887,24	-		-	0,41	363,77	-	-	-	363,77	-
<b>01.014</b>	<b>RUA PROJETADA</b>							<b>35.750,83</b>	<b>-</b>	<b>31.515,34</b>	<b>31.515,34</b>	<b>4.235,49</b>	<b>88,15</b>
<b>01.014.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.425,11</b>	<b>-</b>	<b>1.289,40</b>	<b>1.289,40</b>	<b>135,71</b>	<b>90,48</b>
01.014.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	379,83	-	<b>331,23</b>	331,23	1,22	463,39	-	404,10	404,10	59,29	87,21

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREMGE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Luiz Mario Neri Alfano Junior  
Engenheiro Civil  
C.R.C. 015.408/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE

PERÍODO: 14/01/2023 A 14/02/2023

DATA: 20/02/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.014.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	397,10	-	365,55	365,55	0,95	377,25	-	347,27	347,27	29,98	92,05
01.014.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	124,09	-	114,23	114,23	0,81	100,51	-	92,53	92,53	7,98	92,06
01.014.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	372,28	-	342,69	342,69	1,30	483,96	-	445,50	445,50	38,46	92,05
<b>01.014.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>31.720,78</b>	-	<b>27.791,62</b>	<b>27.791,62</b>	<b>3.929,16</b>	<b>87,61</b>
01.014.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	345,30	-	296,91	296,91	70,93	24.492,13	-	21.059,83	21.059,83	3.432,30	85,99
01.014.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	115,10	-	114,40	114,40	29,65	3.412,72	-	3.391,96	3.391,96	20,76	99,39
01.014.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	115,10	-	-	-	2,91	334,94	-	-	-	334,94	-
01.014.002.004	Colchão de areia	m3	24,17	-	23,19	23,19	120,62	2.915,39	-	2.797,18	2.797,18	118,21	95,95
01.014.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	435,08	-	417,42	417,42	1,30	565,60	-	542,65	542,65	22,95	95,94
<b>01.014.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>2.449,21</b>	-	<b>2.434,32</b>	<b>2.434,32</b>	<b>14,89</b>	<b>99,39</b>
01.014.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	34,53	-	34,32	34,32	70,93	2.449,21	-	2.434,32	2.434,32	14,89	99,39
<b>01.014.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>155,73</b>	-	-	-	<b>155,73</b>	-
01.014.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	379,83	-	-	-	0,41	155,73	-	-	-	155,73	-
<b>01.015</b>	<b>ESTRADA P/ CERÂMICA</b>							<b>30.931,58</b>	-	-	-	<b>30.931,58</b>	-
<b>01.015.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.215,94</b>	-	-	-	<b>1.215,94</b>	-
01.015.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	322,09	-	-	-	1,22	392,95	-	-	-	392,95	-
01.015.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	339,82	-	-	-	0,95	322,83	-	-	-	322,83	-
01.015.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	106,19	-	-	-	0,81	86,01	-	-	-	86,01	-
01.015.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	318,58	-	-	-	1,30	414,15	-	-	-	414,15	-
<b>01.015.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>27.068,40</b>	-	-	-	<b>27.068,40</b>	-
01.015.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	289,63	-	-	-	70,93	20.330,67	-	-	-	20.330,67	-

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 272029954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Luiz Mario Neri Alfano Junior  
Engenheiro Civil  
CREA 09.963.732/0001-00

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.015.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	118,20	-	-	-	29,65	3.504,63	-	-	-	3.504,63	-
01.015.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	118,20	-	-	-	2,91	343,96	-	-	-	343,96	-
01.015.002.004	Colchão de areia	m3	20,06	-	-	-	120,62	2.419,64	-	-	-	2.419,64	-
01.015.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	361,15	-	-	-	1,30	469,50	-	-	-	469,50	-
<b>01.015.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>2.515,18</b>	-	-	-	<b>2.515,18</b>	-
01.015.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	35,46	-	-	-	70,93	2.515,18	-	-	-	2.515,18	-
<b>01.015.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>132,06</b>	-	-	-	<b>132,06</b>	-
01.015.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	322,09	-	-	-	0,41	132,06	-	-	-	132,06	-
<b>01.016</b>	<b>PROLONGAMENTO DA RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA</b>							<b>90.615,91</b>	-	-	-	<b>90.615,91</b>	-
<b>01.016.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>3.644,34</b>	-	-	-	<b>3.644,34</b>	-
01.016.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	975,08	-	-	-	1,22	1.189,60	-	-	-	1.189,60	-
01.016.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	1.013,57	-	-	-	0,95	962,89	-	-	-	962,89	-
01.016.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	316,74	-	-	-	0,81	256,56	-	-	-	256,56	-
01.016.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	950,22	-	-	-	1,30	1.235,29	-	-	-	1.235,29	-
<b>01.016.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>81.111,60</b>	-	-	-	<b>81.111,60</b>	-
01.016.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	898,10	-	-	-	70,93	63.702,23	-	-	-	63.702,23	-
01.016.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	256,60	-	-	-	29,65	7.608,19	-	-	-	7.608,19	-
01.016.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	256,60	-	-	-	2,91	746,71	-	-	-	746,71	-
01.016.002.004	Colchão de areia	m3	62,87	-	-	-	120,62	7.583,38	-	-	-	7.583,38	-
01.016.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.131,61	-	-	-	1,30	1.471,09	-	-	-	1.471,09	-
<b>01.016.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>5.460,19</b>	-	-	-	<b>5.460,19</b>	-

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Luiz Mario Nerl Alfano Junior  
Engenheiro Civil  
COP. 61000-074000074  
Cadastrado em 14/01/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.016.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	76,98	-	-	-	70,93	5.460,19	-	-	-	5.460,19	-
<b>01.016.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							399,78	-	-	-	399,78	-
01.016.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	975,08	-	-	-	0,41	399,78	-	-	-	399,78	-
<b>01.017</b>	<b>TRAVESSA PROJETADA</b>							27.452,89	25.990,68	-	25.990,68	1.462,21	94,67
<b>01.017.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							1.069,73	1.026,25	-	1.026,25	43,48	95,94
01.017.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	282,24	270,30	-	270,30	1,22	344,33	329,77	-	329,77	14,56	95,77
01.017.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	299,52	287,58	-	287,58	0,95	284,54	273,20	-	273,20	11,34	96,01
01.017.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	93,60	89,87	-	89,87	0,81	75,82	72,79	-	72,79	3,03	96,00
01.017.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	280,80	269,61	-	269,61	1,30	365,04	350,49	-	350,49	14,55	96,01
<b>01.017.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							23.816,10	22.513,09	-	22.513,09	1.303,01	94,53
01.017.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	247,68	235,74	-	235,74	70,93	17.567,94	16.721,04	-	16.721,04	846,90	95,18
01.017.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	115,20	115,20	-	115,20	29,65	3.415,68	3.415,68	-	3.415,68	-	100,00
01.017.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	115,20	-	-	-	2,91	335,23	-	-	-	335,23	-
01.017.002.004	Colchão de areia	m3	17,34	16,50	-	16,50	120,62	2.091,55	1.990,23	-	1.990,23	101,32	95,16
01.017.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	312,08	297,03	-	297,03	1,30	405,70	386,14	-	386,14	19,56	95,18
<b>01.017.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							2.451,34	2.451,34	-	2.451,34	-	100,00
01.017.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	34,56	34,56	-	34,56	70,93	2.451,34	2.451,34	-	2.451,34	-	100,00
<b>01.017.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							115,72	-	-	-	115,72	-
01.017.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	282,24	-	-	-	0,41	115,72	-	-	-	115,72	-
<b>01.018</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E PLACAS DE LOGRADOUROS</b>							31.311,94	-	-	-	31.311,94	-
01.018.001	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	26,00	-	-	-	398,03	10.348,78	-	-	-	10.348,78	-
01.018.002	Placa 25x50 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	52,00	-	-	-	76,15	3.959,80	-	-	-	3.959,80	-

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Roberto Neri Alfano Junior  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2720298954

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 156/2022

B.M.Nº. 04/2023

ORDEM DE SERVIÇO: 21/09/2022



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE

PERÍODO: 14/01/2023 A 14/02/2023

DATA: 20/02/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.018.003	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=1,00m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	22,00	-	-	-	772,88	17.003,36	-	-	-	17.003,36	-
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>44.052,80</b>	<b>23.450,11</b>	<b>9.361,22</b>	<b>32.811,33</b>	<b>11.241,47</b>	<b>74,48</b>
02.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	220,00	117,11	46,75	163,86	113,08	24.877,60	13.242,80	5.286,49	18.529,29	6.348,31	74,48
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	440,00	234,22	93,50	327,72	43,58	19.175,20	10.207,31	4.074,73	14.282,04	4.893,16	74,48
	<b>Total geral</b>							<b>927.739,09</b>	<b>518.756,67</b>	<b>172.268,42</b>	<b>691.026,05</b>	<b>236.714,02</b>	<b>74,48</b>

CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Aprovado para pagamento

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Luiz Mario Neri Alfano Junior*  
Engenheiro Civil  
CREA/RJ: 177004/2022

*José Robson Santos da Paixão*  
Eng. Civil - CREA/RJ 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE		MEMÓRIA DE CÁLCULO
			Contratada	Do Período	
01	PAVIMENTAÇÃO A PARELELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA				
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.001.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	6,00	1,00	1 mês
01.006	TRAVESSA ZÉ DE PIXITITA				
01.006.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.006.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	447,57	376,16	$((2,40 + 2,15/2) \times 27,80) + (((2,10 + 2,20)/2) \times 39,40) + (((4,00 + 3,90)/2) \times 18,50) + (((3,80 + 3,62)/2) \times 21,00) + (((3,62 + 3,42)/2) \times 22,20) = 376,16 \text{ m}^2$
01.006.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	486,29	452,84	$376,16 + (255,60 \times 0,30) = 452,84 \text{ m}^2$
01.006.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	151,96	141,51	$452,84 \times 1,25 \times 0,25 = 141,51 \text{ m}^3$
01.006.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	455,89	424,54	$141,51 \times 1,50 \times 2,00 = 424,54 \text{ tkm}$
01.006.002	PAVIMENTAÇÃO				
01.006.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	370,14	307,29	$376,16 - (255,60 \times 0,30) + 7,81 \text{ (in loco)} = 307,29 \text{ m}^2$
01.006.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	258,10	255,60	255,6 m
01.006.002.004	Colchão de areia	m3	25,91	21,51	$307,29 \times 0,07 = 21,51 \text{ m}^3$
01.006.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	466,38	387,19	$21,51 \times 1,5 \times 12 = 387,19 \text{ tkm}$
01.006.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				
01.006.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	77,43	76,68	$255,60 \times 0,30 = 76,68 \text{ m}^2$
01.008	TRAVESSA MURINO JOSÉ DA SILVA				
01.008.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.008.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1818,17	80,86	$((7,5 + 7,5)/2) \times 10,78 = 80,86 \text{ m}^2$

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE		MEMÓRIA DE CÁLCULO
			Contratada	Do Período	
01.008.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	1898,26	130,68	$80,86 + (26,02 * 0,30) + 42,01 \text{ (in loco)} = 130,68 \text{ m}^2$
01.008.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	593,20	40,83	$130,68 * 1,25 * 0,25 = 40,83 \text{ m}^2$
01.008.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1779,61	122,49	$40,83 * 1,50 * 2,00 = 122,49 \text{ m}^2$
<b>01.008.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
01.008.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1658,00	101,91	$80,86 - (26,02 * 0,30) + 28,86 \text{ (in loco)} = 101,91 \text{ m}^2$
01.008.002.004	Colchão de areia	m3	116,06	7,14	$101,91 * 0,07 = 7,14 \text{ m}^3$
01.008.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	2089,08	128,52	$7,14 * 1,5 * 12 = 128,52 \text{ tkm}$
<b>01.013</b>	<b>RUA JOSÉ VENCESLAU</b>				
<b>01.013.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
01.013.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	887,24	887,24	$((5,62 + 5,66)/2) * 30,50 + ((5,66 + 6,15)/2) * 7,90 + ((6,15 + 6,10)/2) * 30,00 + ((6,10 + 6,17)/2) * 28,00 + ((6,00 + 6,00)/2) * 2,20 + ((6,17 + 6,20)/2) * 30,00 + ((6,20 + 6,23)/2) * 18,39 = 887,24 \text{ m}^2$
01.013.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	930,88	929,25	$887,24 + (280,08 * 0,30) - 42,01 \text{ (in loco)} = 929,25 \text{ m}^2$
01.013.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	290,90	290,39	$929,25 * 1,25 * 0,25 = 290,39 \text{ m}^2$
01.013.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	872,70	871,17	$290,39 * 1,50 * 2,00 = 871,17 \text{ m}^2$
<b>01.013.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
01.013.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	799,97	799,92	$887,24 - (280,08 * 0,30) - 3,31 \text{ (in loco)} = 799,92 \text{ m}^2$
01.013.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	290,90	280,08	280,08 m
01.013.002.004	Colchão de areia	m3	56,00	55,99	$799,92 * 0,07 = 55,99 \text{ m}^3$
01.013.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1007,96	1007,82	$55,99 * 1,5 * 12 = 1007,82 \text{ tkm}$
<b>01.013.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				
01.013.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	87,27	84,02	$(280,08 * 0,30) = 84,02 \text{ m}^2$
<b>01.014</b>	<b>RUA PROJETADA</b>				

*Luiz Márcio Neri Alfano Junior*  
Engenheiro Civil  
CREA/SE: 270690532

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE		MEMÓRIA DE CÁLCULO
			Contratada	Do Período	
<b>01.014.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
01.014.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	379,83	331,23	$((5,65 + 5,72)/2)*32,0 + (((5,72 + 6,13)/2)*25,20) = 331,23$ m <sup>2</sup>
01.014.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	397,10	365,55	$331,23 + (114,40 * 0,30) = 365,55$ m <sup>2</sup>
01.014.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	124,09	114,23	$365,55 * 1,25 * 0,25 = 114,23$ m <sup>2</sup>
01.014.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m <sup>3</sup>	tkm	372,28	342,69	$114,23 * 1,50 * 2,00 = 342,69$ m <sup>2</sup>
<b>01.014.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
01.014.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	345,30	296,91	$331,23 - (114,40 * 0,30) = 296,91$ m <sup>2</sup>
01.014.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	115,10	114,40	114,40
01.014.002.004	Colchão de areia	m3	24,17	23,19	$331,23 * 0,07 = 23,19$
01.014.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m <sup>3</sup>	tkm	435,08	417,42	$23,19 * 1,5 * 12 = 417,42$
<b>01.014.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				
01.014.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	34,53	34,32	$(114,40 * 0,30) = 34,32$
<b>02.</b>	<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>				
02.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	220,00	46,75	46,75
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	440,00	93,50	93,50

  
Mario Neri Alfano Junior  
Engenheiro Civil  
CREA/SE: 2706905522

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CRE/SE 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - TRAVESSA ZÉ DE PIXITITA




REGULARIZAÇÃO, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, COLCHÃO DE AREIA - TRAVESSA ZÉ DE PIXITITA



REGULARIZAÇÃO, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, COLCHÃO DE AREIA - TRAVESSA ZÉ DE PIXITITA



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, COLCHÃO DE AREIA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL - TRAVESSA ZÉ DE PIXITITA

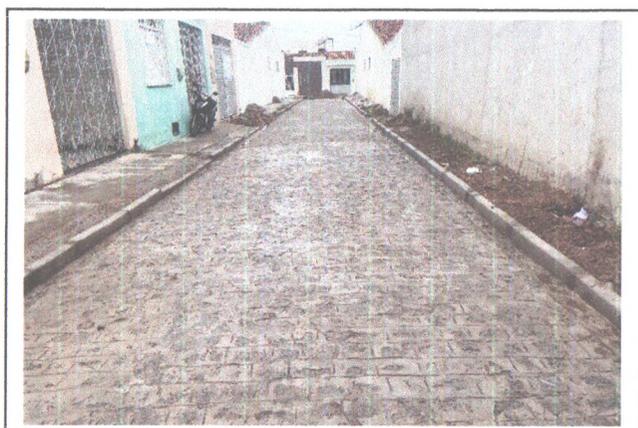

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL - TRAVESSA ZÉ DE PIXITITA




PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSA ZÉ DE PIXITITA

*Luiz Mario Neri Alfano Junior*  
Engenheiro Civil  
CPF: 012.174.065-72


*José Robson Santos da Paixão*  
Eng. Civil CREA 272029554  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana




REGULARIZAÇÃO - RUA JOSÉ VENCESLAU

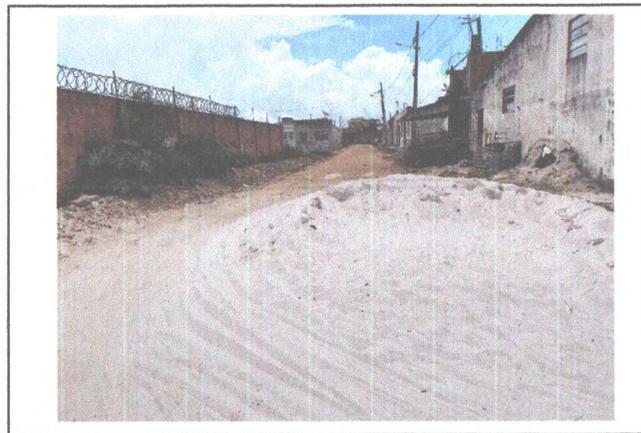

REGULARIZAÇÃO E COLCHÃO DE AREIA - RUA JOSÉ VENCESLAU

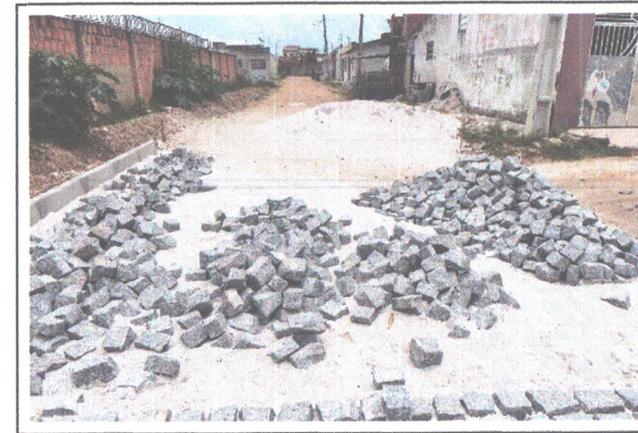


REGULARIZAÇÃO, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ VENCESLAU

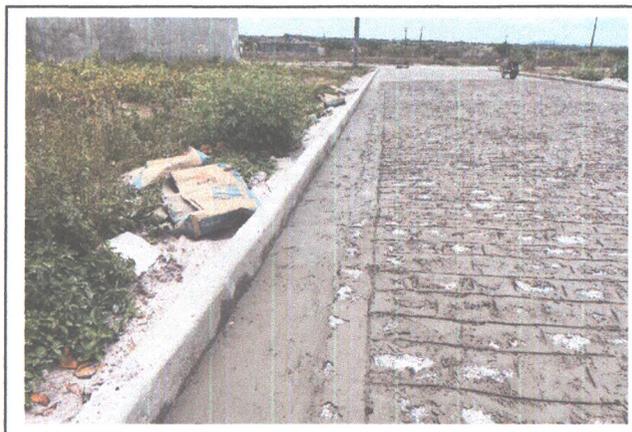

ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL, PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ VENCESLAU



PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ VENCESLAU

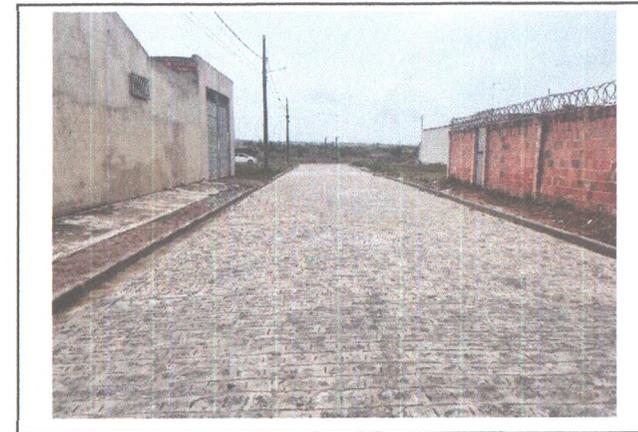

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ VENCESLAU




ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ VENCESLAU



REGULARIZAÇÃO, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO- RUA PROJETADA




ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA

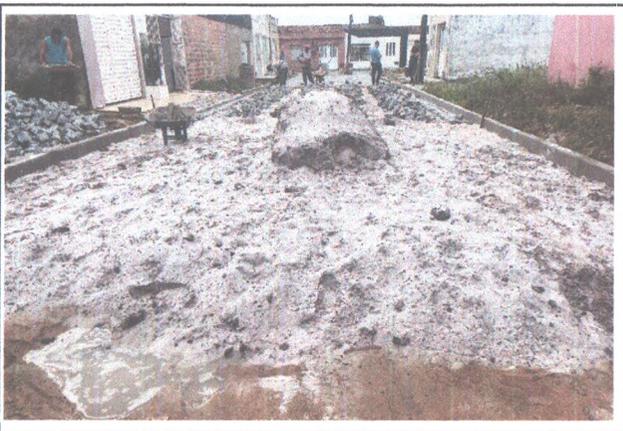

REGULARIZAÇÃO, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO- RUA PROJETADA



REGULARIZAÇÃO, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO- RUA PROJETADA

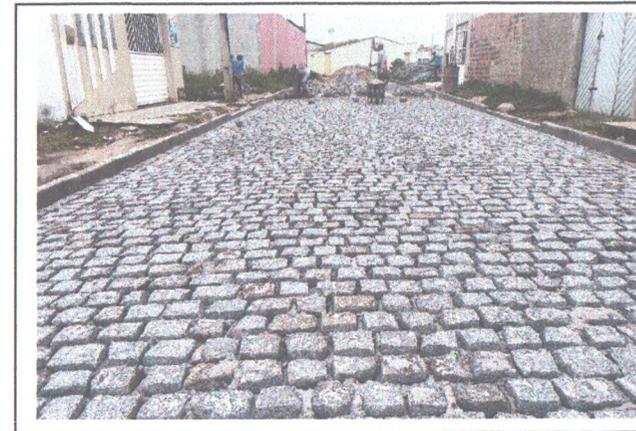

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO- RUA PROJETADA



**CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO**

Seu sonho, nosso compromisso!

(79) 99663-7327

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE  
RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO  
CRISTÓVÃO EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  
004/2022


DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO  
DE MEDIÇÃO Nº 4


BOLETIM

PERÍODO DOS SERVIÇOS:  
A 14/02/2023

14/01/2023

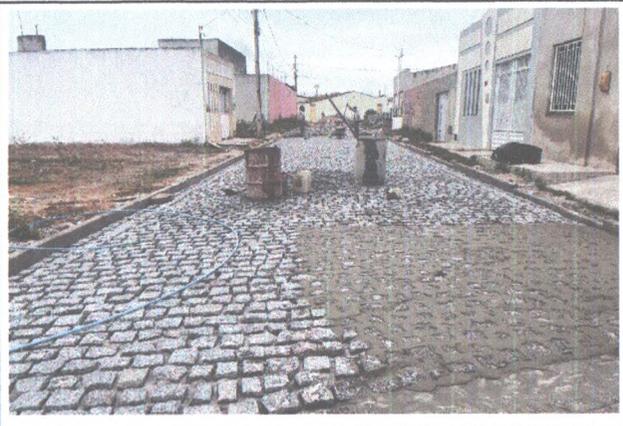

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL E  
PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA

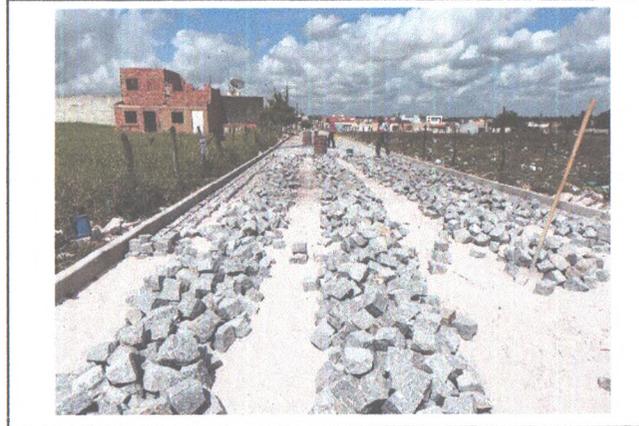

REGULARIZAÇÃO, COLCHÃO DE AREIA E PAVIMENTAÇÃO - RUA  
MURINO JOSÉ DA SILVA



PAVIMENTAÇÃO - RUA MURINO JOSÉ DA SILVA

  
Luiz Mario Neri Alfano Junior  
Engenheiro Civil  
C.R.C. 2720233954

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720233954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana
