




OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE	CONTRATO: 153/2023	Boletim de Medição: 03		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	VIGÊNCIA: 08/2023 a 04/2024	Período: 12/01/2024 a 18/01/2024		
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO: 09/2023 a 02/2024	Data de medição: 19/01/2024		

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022/MDR/CADIA								R\$ 3.231.619,37	R\$ 1.370.988,80	R\$ 1.388.072,69	R\$ 3.110.976,96	R\$ 120.642,40	96,27
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 4.918,87	R\$ 3.051,16	R\$ 1.464,64	R\$ 4.515,80	R\$ 403,07	91,81
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,000	12,000		12,000	-	R\$ 132,21	R\$ 1.586,52	R\$ 1.586,52	R\$ -	R\$ 1.586,52	R\$ -	100,00
1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (VIDROACABADORA)	km	100,000	50,000	50,00	100,000	-	R\$ 4,39	R\$ 439,00	R\$ 219,50	R\$ 219,50	R\$ 439,00	R\$ -	100,00
1.1.3	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (ROLO COMPACTADOR)	km	100,000	50,000	50,00	100,000	-	R\$ 4,39	R\$ 439,00	R\$ 219,50	R\$ 219,50	R\$ 439,00	R\$ -	100,00
1.1.4	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (FRESADORA)	km	100,000	50,000	50,00	100,000	-	R\$ 4,39	R\$ 439,00	R\$ 219,50	R\$ 219,50	R\$ 439,00	R\$ -	100,00
1.1.5	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,000	2,000	2,00	4,000	1,000	R\$ 403,07	R\$ 2.015,35	R\$ 806,14	R\$ 806,14	R\$ 1.612,28	R\$ 403,070	80,00
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO													
1.2.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO								R\$ 269.284,63	R\$ 266.312,18	R\$ -	R\$ 266.312,18	R\$ 2.972,440	98,90
1.2.1.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA													
1.2.1.1.1	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	3.093,500	3.093,500		3.093,500	-	R\$ 0,97	R\$ 3.000,69	R\$ 3.000,69	R\$ -	R\$ 3.000,69	R\$ -	100,00
1.2.1.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	154,680	154,680		154,680	-	R\$ 1.651,66	R\$ 255.478,76	R\$ 255.478,76	R\$ -	R\$ 255.478,76	R\$ -	100,00
1.2.1.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	11.136,600	11.136,580		11.136,580	0,020	R\$ 0,57	R\$ 6.347,86	R\$ 6.347,85	R\$ -	R\$ 6.347,85	R\$ -	100,00
1.2.1.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	7.424,400	7.424,400		7.424,400	-	R\$ 0,20	R\$ 1.484,88	R\$ 1.484,88	R\$ -	R\$ 1.484,88	R\$ -	100,00
1.2.1.1.5	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	80,700	-	-	-	80,700	R\$ 4,25	R\$ 342,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,970	0,00
1.2.1.1.6	Limpeza geral	m2	3.093,500	-	-	-	3.093,500	R\$ 0,85	R\$ 2.629,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.629,470	0,00
1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA								R\$ 130.849,67	R\$ 129.443,52	R\$ -	R\$ 129.443,52	R\$ 1.406,15	98,93
1.2.2.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA													
1.2.2.1.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	1.451,200	1.451,200		1.451,200	-	R\$ 3,01	R\$ 4.368,11	R\$ 4.368,11	R\$ -	R\$ 4.368,11	R\$ -	100,00
1.2.2.1.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	261,220	261,220		261,220	-	R\$ 0,57	R\$ 148,89	R\$ 148,89	R\$ -	R\$ 148,89	R\$ -	100,00
1.2.2.1.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.451,200	1.451,200		1.451,200	-	R\$ 0,97	R\$ 1.407,66	R\$ 1.407,66	R\$ -	R\$ 1.407,66	R\$ -	100,00
1.2.2.1.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	72,560	72,560		72,560	-	R\$ 1.651,66	R\$ 119.844,44	R\$ 119.844,44	R\$ -	R\$ 119.844,44	R\$ -	100,00
1.2.2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	5.224,320	5.224,320		5.224,320	-	R\$ 0,57	R\$ 2.977,86	R\$ 2.977,86	R\$ -	R\$ 2.977,86	R\$ -	100,00
1.2.2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3.482,800	3.482,800		3.482,800	-	R\$ 0,20	R\$ 696,56	R\$ 696,56	R\$ -	R\$ 696,56	R\$ -	100,00
1.2.2.1.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	40,620	-	-	-	40,620	R\$ 4,25	R\$ 172,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,63	0,00
1.2.2.1.8	Limpeza geral	m2	1.451,200	-	-	-	1.451,200	R\$ 0,85	R\$ 1.233,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.233,52	0,00

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREMSE 2720298954
Coordenador de Núcleo

Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREMSE 0715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.2.2	RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA									R\$ 363.405,64	R\$ 90.089,57	R\$ 269.376,75	R\$ 359.466,32	R\$ 3.939,32	98,92
1.2.2.2.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.030,000	1.010,000	3.020,000	4.030,000	-	R\$ 3,01	R\$ 12.130,30	R\$ 3.040,10	R\$ 9.090,20	R\$ 12.130,30	R\$ -	-	100,00
1.2.2.2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	725,400	181,800	543,600	725,400	-	R\$ 0,57	R\$ 413,47	R\$ 103,62	R\$ 309,85	R\$ 413,47	R\$ -	-	100,00
1.2.2.2.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	4.030,000	1.010,000	3.020,000	4.030,000	-	R\$ 0,97	R\$ 3.909,10	R\$ 979,70	R\$ 2.929,40	R\$ 3.909,10	R\$ -	-	100,00
1.2.2.2.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	201,500	50,500	151,000	201,500	-	R\$ 1.651,66	R\$ 332.809,49	R\$ 83.408,83	R\$ 249.400,66	R\$ 332.809,49	R\$ -	-	100,00
1.2.2.2.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	14.508,000	3.636,000	10.872,000	14.508,000	-	R\$ 0,57	R\$ 8.269,56	R\$ 2.072,52	R\$ 6.197,04	R\$ 8.269,56	R\$ -	-	100,00
1.2.2.2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.672,000	2.424,000	7.248,000	9.672,000	-	R\$ 0,20	R\$ 1.934,40	R\$ 484,80	R\$ 1.449,60	R\$ 1.934,40	R\$ -	-	100,00
1.2.2.2.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	120,900	-	-	-	120,900	R\$ 4,25	R\$ 513,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 513,82	-	0,00
1.2.2.2.8	Limpeza geral	m2	4.030,000	-	-	-	4.030,000	R\$ 0,85	R\$ 3.425,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.425,50	-	0,00
1.2.2.3	RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA									R\$ 378.713,74	R\$ -	R\$ 374.629,92	R\$ 374.629,92	R\$ 4.083,82	98,92
1.2.2.3.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.200,000	-	4.200,000	4.200,000	-	R\$ 3,01	R\$ 12.642,00	R\$ -	R\$ 12.642,00	R\$ 12.642,00	R\$ -	-	100,00
1.2.2.3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	756,000	-	756,000	756,000	-	R\$ 0,57	R\$ 430,92	R\$ -	R\$ 430,92	R\$ 430,92	R\$ -	-	100,00
1.2.2.3.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	4.200,000	-	4.200,000	4.200,000	-	R\$ 0,97	R\$ 4.074,00	R\$ -	R\$ 4.074,00	R\$ 4.074,00	R\$ -	-	100,00
1.2.2.3.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	210,000	-	210,000	210,000	-	R\$ 1.651,66	R\$ 346.848,60	R\$ -	R\$ 346.848,60	R\$ 346.848,60	R\$ -	-	100,00
1.2.2.3.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	15.120,000	-	15.120,000	15.120,000	-	R\$ 0,57	R\$ 8.618,40	R\$ -	R\$ 8.618,40	R\$ 8.618,40	R\$ -	-	100,00
1.2.2.3.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.080,000	-	10.080,000	10.080,000	-	R\$ 0,20	R\$ 2.016,00	R\$ -	R\$ 2.016,00	R\$ 2.016,00	R\$ -	-	100,00
1.2.2.3.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	120,900	-	-	-	120,900	R\$ 4,25	R\$ 513,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 513,82	-	0,00
1.2.2.3.8	Limpeza geral	m2	4.200,000	-	-	-	4.200,000	R\$ 0,85	R\$ 3.570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.570,00	-	0,00
1.2.2.4	RUA PADRE SEBASTIÃO PEDROSO DE GOIS									R\$ 232.958,85	R\$ 230.397,38	R\$ -	R\$ 230.397,38	R\$ 2.561,47	98,90
1.2.2.4.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.583,000	2.583,000	-	2.583,000	-	R\$ 3,01	R\$ 7.774,83	R\$ 7.774,83	R\$ -	R\$ 7.774,83	R\$ -	-	100,00
1.2.2.4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	464,940	464,940	-	464,940	-	R\$ 0,57	R\$ 265,01	R\$ 265,01	R\$ -	R\$ 265,01	R\$ -	-	100,00
1.2.2.4.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.583,000	2.583,000	-	2.583,000	-	R\$ 0,97	R\$ 2.505,51	R\$ 2.505,51	R\$ -	R\$ 2.505,51	R\$ -	-	100,00
1.2.2.4.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	129,150	129,150	-	129,150	-	R\$ 1.651,66	R\$ 213.311,88	R\$ 213.311,88	R\$ -	R\$ 213.311,88	R\$ -	-	100,00
1.2.2.4.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.298,800	9.298,800	-	9.298,800	-	R\$ 0,57	R\$ 5.300,31	R\$ 5.300,31	R\$ -	R\$ 5.300,31	R\$ -	-	100,00
1.2.2.4.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.199,200	6.199,200	-	6.199,200	-	R\$ 0,20	R\$ 1.239,84	R\$ 1.239,84	R\$ -	R\$ 1.239,84	R\$ -	-	100,00
1.2.2.4.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	86,100	-	-	-	86,100	R\$ 4,25	R\$ 365,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365,92	-	0,00
1.2.2.4.8	Limpeza geral	m2	2.583,000	-	-	-	2.583,000	R\$ 0,85	R\$ 2.195,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.195,55	-	0,00



 ENGENHEIRO - NOVATEC


José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil CREA 715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


1.2.2.5	RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA									R\$ 205.671,89	R\$ 203.370,52	R\$ -	R\$ 203.370,52	R\$ 2.301,37	98,88
1.2.2.5.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.280,000	2.280,000	2.280,000	-	R\$ 3,01	R\$ 6.862,80	R\$ 6.862,80	R\$ -	R\$ 6.862,80	R\$ -	R\$ 6.862,80	R\$ -	100,00
1.2.2.5.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	410,400	410,400	410,400	-	R\$ 0,57	R\$ 233,92	R\$ 233,92	R\$ -	R\$ 233,92	R\$ -	R\$ 233,92	R\$ -	100,00
1.2.2.5.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.280,000	2.280,000	2.280,000	-	R\$ 0,97	R\$ 2.211,60	R\$ 2.211,60	R\$ -	R\$ 2.211,60	R\$ -	R\$ 2.211,60	R\$ -	100,00
1.2.2.5.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	114,000	114,000	114,000	-	R\$ 1.651,66	R\$ 188.289,24	R\$ 188.289,24	R\$ -	R\$ 188.289,24	R\$ -	R\$ 188.289,24	R\$ -	100,00
1.2.2.5.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	8.208,000	8.208,000	8.208,000	-	R\$ 0,57	R\$ 4.678,56	R\$ 4.678,56	R\$ -	R\$ 4.678,56	R\$ -	R\$ 4.678,56	R\$ -	100,00
1.2.2.5.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	5.472,000	5.472,000	5.472,000	-	R\$ 0,20	R\$ 1.094,40	R\$ 1.094,40	R\$ -	R\$ 1.094,40	R\$ -	R\$ 1.094,40	R\$ -	100,00
1.2.2.5.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	85,500	-	-	85,500	R\$ 4,25	R\$ 363,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,37	0,00
1.2.2.5.8	Limpeza geral	m2	2.280,000	-	-	2.280,000	R\$ 0,85	R\$ 1.938,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.938,00	R\$ -	0,00
1.2.2.6	RUA 28 DE AGOSTO							R\$ 368.632,25	R\$ 12.724,30	R\$ 0,03	R\$ 12.724,33	R\$ 3.992,45	R\$ 3,45		
1.2.2.6.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.088,000	4.088,000	4.088,000	-	R\$ 3,01	R\$ 12.304,91	R\$ 12.304,88	R\$ 0,03	R\$ 12.304,91	R\$ -	R\$ 12.304,91	R\$ -	100,00
1.2.2.6.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	735,840	735,840	735,840	-	R\$ 0,57	R\$ 419,42	R\$ 419,42	R\$ -	R\$ 419,42	R\$ -	R\$ 419,42	R\$ -	100,00
1.2.2.6.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	4.088,000	4.088,000	4.088,000	-	R\$ 0,97	R\$ 3.965,36	R\$ 3.965,36	R\$ -	R\$ 3.965,36	R\$ -	R\$ 3.965,36	R\$ -	100,00
1.2.2.6.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	204,400	204,400	204,400	-	R\$ 1.651,66	R\$ 337.599,30	R\$ 337.599,30	R\$ -	R\$ 337.599,30	R\$ -	R\$ 337.599,30	R\$ -	100,00
1.2.2.6.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	14.716,800	14.716,800	14.716,800	-	R\$ 0,57	R\$ 8.388,57	R\$ 8.388,57	R\$ -	R\$ 8.388,57	R\$ -	R\$ 8.388,57	R\$ -	100,00
1.2.2.6.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	9.811,200	9.811,200	9.811,200	-	R\$ 0,20	R\$ 1.962,24	R\$ 1.962,24	R\$ -	R\$ 1.962,24	R\$ -	R\$ 1.962,24	R\$ -	100,00
1.2.2.6.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	121,800	-	-	121,800	R\$ 4,25	R\$ 517,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517,65	R\$ -	0,00
1.2.2.6.8	Limpeza geral	m2	4.088,000	-	-	4.088,000	R\$ 0,85	R\$ 3.474,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.474,80	R\$ -	0,00
1.2.2.7	RUA JUCA MONTEIRO							R\$ 366.110,90	R\$ 362.142,25	R\$ -	R\$ 362.142,25	R\$ 3.968,65	R\$ 98,92		
1.2.2.7.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.060,000	4.060,000	4.060,000	-	R\$ 3,01	R\$ 12.220,60	R\$ 12.220,60	R\$ -	R\$ 12.220,60	R\$ -	R\$ 12.220,60	R\$ -	100,00
1.2.2.7.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	730,800	730,800	730,800	-	R\$ 0,57	R\$ 416,55	R\$ 416,55	R\$ -	R\$ 416,55	R\$ -	R\$ 416,55	R\$ -	100,00
1.2.2.7.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	4.060,000	4.060,000	4.060,000	-	R\$ 0,97	R\$ 3.938,20	R\$ 3.938,20	R\$ -	R\$ 3.938,20	R\$ -	R\$ 3.938,20	R\$ -	100,00
1.2.2.7.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	203,000	203,000	203,000	-	R\$ 1.651,66	R\$ 335.286,98	R\$ 335.286,98	R\$ -	R\$ 335.286,98	R\$ -	R\$ 335.286,98	R\$ -	100,00
1.2.2.7.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	14.616,000	14.616,000	14.616,000	-	R\$ 0,57	R\$ 8.331,12	R\$ 8.331,12	R\$ -	R\$ 8.331,12	R\$ -	R\$ 8.331,12	R\$ -	100,00
1.2.2.7.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	9.744,000	9.744,000	9.744,000	-	R\$ 0,20	R\$ 1.948,80	R\$ 1.948,80	R\$ -	R\$ 1.948,80	R\$ -	R\$ 1.948,80	R\$ -	100,00
1.2.2.7.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	121,800	-	-	121,800	R\$ 4,25	R\$ 517,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517,65	R\$ -	0,00
1.2.2.7.8	Limpeza geral	m2	4.060,000	-	-	4.060,000	R\$ 0,85	R\$ 3.451,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.451,00	R\$ -	0,00


ENGENHEIRO - NOVATEC


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 FISCAL
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Yan Henrique Zaires Santana
 Eng.º Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.2.8	RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA									R\$	79.894,15	R\$	-	R\$	77.066,71	R\$	77.066,71	R\$	2.827,44	96,46
1.2.2.8.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	864,000	-	864,000	864,000	-	R\$	3,01	R\$	2.600,64	R\$	-	R\$	2.600,64	R\$	2.600,64	R\$	-	100,00
1.2.2.8.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	155,520	-	155,520	155,520	-	R\$	0,57	R\$	88,64	R\$	-	R\$	88,64	R\$	88,64	R\$	-	100,00
1.2.2.8.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	864,000	-	864,000	864,000	-	R\$	0,97	R\$	838,08	R\$	-	R\$	838,08	R\$	838,08	R\$	-	100,00
1.2.2.8.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	43,200	-	43,200	43,200	-	R\$	1.651,66	R\$	71.351,71	R\$	-	R\$	71.351,71	R\$	71.351,71	R\$	-	100,00
1.2.2.8.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.110,400	-	3.110,400	3.110,400	-	R\$	0,57	R\$	1.772,92	R\$	-	R\$	1.772,92	R\$	1.772,92	R\$	-	100,00
1.2.2.8.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.073,600	-	2.073,600	2.073,600	-	R\$	0,20	R\$	414,72	R\$	-	R\$	414,72	R\$	414,72	R\$	-	100,00
1.2.2.8.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	43,200	-	-	-	43,200	R\$	4,25	R\$	183,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	183,60	0,00
1.2.2.8.8	Limpeza geral	m2	3.110,400	-	-	-	3.110,400	R\$	0,85	R\$	2.643,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.643,84	0,00
1.2.2.9	RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO									R\$	237.160,50	R\$	-	R\$	234.589,68	R\$	234.589,68	R\$	2.570,82	98,92
1.2.2.9.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.630,000	-	2.630,000	2.630,000	-	R\$	3,01	R\$	7.916,30	R\$	-	R\$	7.916,30	R\$	7.916,30	R\$	-	100,00
1.2.2.9.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	473,400	-	473,400	473,400	-	R\$	0,57	R\$	269,83	R\$	-	R\$	269,83	R\$	269,83	R\$	-	100,00
1.2.2.9.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.630,000	-	2.630,000	2.630,000	-	R\$	0,97	R\$	2.551,10	R\$	-	R\$	2.551,10	R\$	2.551,10	R\$	-	100,00
1.2.2.9.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	131,500	-	131,500	131,500	-	R\$	1.651,66	R\$	217.193,29	R\$	-	R\$	217.193,29	R\$	217.193,29	R\$	-	100,00
1.2.2.9.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.468,000	-	9.468,000	9.468,000	-	R\$	0,57	R\$	5.396,76	R\$	-	R\$	5.396,76	R\$	5.396,76	R\$	-	100,00
1.2.2.9.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.312,000	-	6.312,000	6.312,000	-	R\$	0,20	R\$	1.262,40	R\$	-	R\$	1.262,40	R\$	1.262,40	R\$	-	100,00
1.2.2.9.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	78,900	-	-	-	78,900	R\$	4,25	R\$	335,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	335,32	0,00
1.2.2.9.8	Limpeza geral	m2	2.630,000	-	-	-	2.630,000	R\$	0,85	R\$	2.235,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.235,50	0,00
1.2.2.10	TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS									R\$	126.313,02	R\$	-	R\$	124.824,11	R\$	124.824,11	R\$	1.488,90	98,82
1.2.2.10.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	1.399,800	-	1.399,550	1.399,550	0,250	R\$	3,01	R\$	4.213,39	R\$	-	R\$	4.212,65	R\$	4.212,65	R\$	0,74	99,98
1.2.2.10.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	251,960	-	251,919	251,919	0,040	R\$	0,57	R\$	143,61	R\$	-	R\$	143,59	R\$	143,59	R\$	0,02	99,99
1.2.2.10.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	1.399,800	-	1.399,550	1.399,550	0,250	R\$	0,97	R\$	1.357,80	R\$	-	R\$	1.357,56	R\$	1.357,56	R\$	0,24	99,98
1.2.2.10.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	69,990	-	69,970	69,970	0,019	R\$	1.651,66	R\$	115.599,68	R\$	-	R\$	115.566,65	R\$	115.566,65	R\$	33,02	99,97
1.2.2.10.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.039,280	-	5.038,380	5.038,380	0,899	R\$	0,57	R\$	2.872,38	R\$	-	R\$	2.871,88	R\$	2.871,88	R\$	0,50	99,98
1.2.2.10.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.359,520	-	3.358,920	3.358,920	0,599	R\$	0,20	R\$	671,90	R\$	-	R\$	671,78	R\$	671,78	R\$	0,12	99,98
1.2.2.10.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	62,220	-	-	-	62,220	R\$	4,25	R\$	264,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	264,43	0,00
1.2.2.10.8	Limpeza geral	m2	1.399,800	-	-	-	1.399,800	R\$	0,85	R\$	1.189,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.189,83	0,00


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil CREA/SE 15638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.2.11	RUA MARIA TAVARES DA COSTA							R\$	260.606,03	R\$	-	R\$	250.912,85	R\$	250.912,85	R\$	9.993,16	96,28		
1.2.2.11.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.890,000	-	2.813,000	2.813,000	77,000	R\$	3,01	R\$	8.698,90	R\$	-	R\$	8.467,13	R\$	8.467,13	R\$	231,77	97,34
1.2.2.11.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	520,200	-	506,340	506,340	13,860	R\$	0,57	R\$	296,51	R\$	-	R\$	288,61	R\$	288,61	R\$	7,89	97,34
1.2.2.11.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.890,000	-	2.813,000	2.813,000	77,000	R\$	0,97	R\$	2.803,30	R\$	-	R\$	2.728,61	R\$	2.728,61	R\$	74,69	97,34
1.2.2.11.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	144,500	-	140,650	140,650	3,849	R\$	1.651,66	R\$	238.664,87	R\$	-	R\$	232.305,98	R\$	232.305,98	R\$	6.358,88	97,34
1.2.2.11.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	10.404,000	-	10.126,800	10.126,800	277,200	R\$	0,57	R\$	5.930,28	R\$	-	R\$	5.772,28	R\$	5.772,28	R\$	158,00	97,34
1.2.2.11.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	6.936,000	-	6.751,200	6.751,200	184,800	R\$	0,20	R\$	1.387,20	R\$	-	R\$	1.350,24	R\$	1.350,24	R\$	36,96	97,34
1.2.2.11.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	86,700	-	-	-	86,700	R\$	4,25	R\$	368,47	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	368,47	0,00
1.2.2.11.8	Limpeza geral	m2	2.890,000	-	-	-	2.890,000	R\$	0,85	R\$	2.456,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.456,50	0,00
1.3	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$	37.708,06	R\$	10.321,20	R\$	5.160,60	R\$	15.481,80	R\$	22.226,58			
1.3.1	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	1.581,800	-	-	-	1.581,800	R\$	13,87	R\$	21.939,56	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	21.939,56	0,00
1.3.2	Ensaio - Marshall	un	110,000	72,000	36,000	108,000	2,000	R\$	143,35	R\$	15.768,50	R\$	10.321,20	R\$	5.160,60	R\$	15.481,80	R\$	286,70	98,18
1.4	EQUIPE DIRIGENTE							R\$	169.391,20	R\$	63.136,72	R\$	50.047,40	R\$	113.184,12	R\$	56.207,60			
1.4.1	Mestre de obras com encargos complementares	h	880,000	328,000	260,000	588,000	292,000	R\$	68,34	R\$	60.139,20	R\$	22.415,52	R\$	17.768,40	R\$	40.183,92	R\$	19.955,28	66,82
1.4.2	Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares	h	880,000	328,000	260,000	588,000	292,000	R\$	124,15	R\$	109.252,00	R\$	40.721,20	R\$	32.279,00	R\$	73.000,20	R\$	36.251,80	66,82
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$	3.231.619,37	R\$	1.722.904,270	R\$	1.388.072,57	R\$	3.110.976,84	R\$	120.642,59	96,27	
PERCENTUAL										100%		53,00%		42,95%		96,27%		8,73%		

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Núcleo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.2	RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA
ITEM:	1.2.2.2.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	EXTENSÃO	LARGURA	AREA	TOTAL
	314,590	9,60	3020	
				3020,000
EXECUTADO NO PERÍODO:				3.020,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RNP Nº 180324912-9

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O
CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.10	TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS
ITEM:	1.2.2.10.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	EXTENSÃO	LARGURA	AREA	TOTAL
	49,00	4,25	208,25	
	45,00	5,60	252	
	25,00	5,60	140	
	50,00	7,10	355	
	30,00	5,40	162	
	30,00	4,25	127,5	
	36,00	4,30	154,8	
				1399,550
À MEDIR NO PERÍODO:			m2	1.399,550

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RNP nº 180324912-9

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 153/2023

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 03

RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA



RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA



RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA



RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA



RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA



RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA



RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO



RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO



NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - RHP nº 180924912-9

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
PISCA - PIS/SE

Rafael Henrique Favares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 153/2023



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 03

RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO

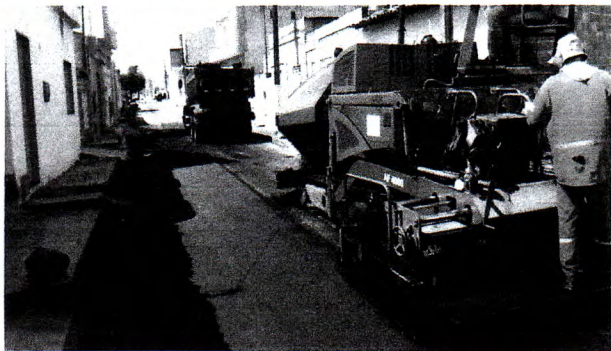


RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA



RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA

TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS



TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS

TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS



RUA MARIA TAVARES

RUA MARIA TAVARES



NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RNP Nº 180324912-9

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
